



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
*Secretaria do Planejamento e Gestão*  
*Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE*

**ATA 16ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ SWAP II**

**Data:** 17/08/10 **Início:** 14:30h **Duração:** 1:30h **Término:** 16h

**Local:** Sala de Reuniões do IPECE

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
COORDENAÇÃO SWAP II	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora SWAp II	OK
	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	Nagilane Parente	Consultara SWAP II	OK
	Anailsa Silva	Consultora SWAP II	OK
	Raquel Santos	Consultora SWAP II	OK
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	OK
	Mário Augusto Parente Monteiro	Suplente	OK
CAGECE	Emiliana Leite Filgueiras	Titular	OK
	Raimunda Aurineide Lemos	Suplente	X
CGE	Marcelo de Sousa Monteiro	Titular	X
	Kelly Cristina de Oliveira Barbosa	Suplente	X
	Ítalo Brígido	Representante	OK
CIDADES	Tércia Maria Pinheiro Martins	Titular	OK
	Wanda Gomes de Oliveira Murta	Suplente	X
CONPAM /SEMACE	Maria Goretti Gurgel Mota de	Titular	OK
	Maria Dias Cavalcante	Suplente	OK
	Breno P. Carvalho	Representante SEMACE	X
ETICE	Denise Maria Norões	Titular	X
	Sérgio Vicente de Matos Brito	Suplente	X
	João Carlos de Lima	Representante	OK
PGE	Fernando Grangeiro	Titular	OK
	Tarso Pinheiro	Suplente	X
SECITECE/NUTEC	Teresa Lenice N. da Gama Mota	Titular	X
	Ricardo Costa e Silva	Suplente	OK
	Vera Lúcia Salgado	Representante NUTEC	X
SEDUC	Maria Eneida Machado Maia	Titular	OK
	Maria Ângela Leão Hitzschky	Suplente	X
SEFAZ	Fabiano Moreira Ramos	Titular	OK
	Fabrizio Gomes Santos	Suplente	X
	Lourival Anchieta Júnior	Representante	OK
SEPLAG	Carlos Eduardo Sobreira	Titular	X
	Fátima Coelho Benevides Falcão	Suplente	OK
	Fernanda Salles	Representante	OK
	Ailson Filho	Representante	OK
SRH /COGERH	Francisca Isabel V. de Cavalcêdo	Titular	X
	Maria do Céu Ramos Colares	Suplente	OK
SESA	Vera Maria Câmara Coelho	Titular	X
	Maria Imaculada Ferreira	Suplente	OK
	Leilane Benevenuto	Representante	OK
TCE	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	OK
	José Teni Cordeiro Júnior	Suplente	X
	José Garrido B. Neto	Auditor do Projeto	OK

## I. INTRODUÇÃO

Às 14:30h, na Sala de Reuniões do IPECE, Cristina Medeiros – IPECE iniciou a reunião com dois informes:

1. Será aberto um novo processo licitatório para a contratação de um consultor individual especialista em licitações;
2. Devido a mudanças nos nomes dos representantes do Comitê SWAp II, uma nova portaria está sendo providenciada para nomear os substitutos oficialmente, conforme quadro abaixo:

ÓRGÃO	NOME DO PARTICIPANTE	NOME DO SUBSTITUTO	FUNÇÃO
ARCE	Alceu Galvão Júnior	Alexandre Caetano	Titular
CONPAM/SEMACE	Elizabeth Verçosa Leal Rocha	Breno Carvalho	Suplente
ETICE	José Aurício de Oliveira	Denise Maria Norões Olsen	Titular
PGE	Fernando Antônio da Costa Oliveira	Fernando Antônio Grangeiro	Titular
PGE	Francisco Antônio N. Bezerra	Tarso Pinheiro Borges	Suplente
SECITECE	Francisco C. Coelho	Ricardo da Costa e Silva	Suplente
SECITECE/NUTEC	-	Vera Salgado	Suplente
SEFAZ	Luiz Jarbas de Mesquita	Fabiano Ramos	Titular
SEFAZ	Paulo Sérgio Rocha	Fabrizio Santos	Suplente
SRH/COGERH	Luiz Fernando Gonçalves Viana	Maria do Céu Ramos Colares	Suplente

Seguiu-se com a apresentação em *Power Point* (**Anexo 1**).

## II. APRESENTAÇÃO

### II.1. REUNIÃO COM SETORIAIS ENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS DE DESPESAS ELEGÍVEIS DO PROJETO SWAP II

Cristina Medeiros – IPECE informou que a Reunião com os Coordenadores Administrativos Financeiros, Assessores Jurídicos e Membros do Comitê SWAp II das Setoriais envolvidas nos Programas de Despesas Elegíveis do Projeto SWAp II foi realizada no dia 12/08/10 na Sala de Reuniões do Gabinete da SEPLAG com o objetivo de proporcionar uma maior disseminação das informações referentes às Cláusulas Anti – Fraude, Anti – Corrupção e os Limites para Revisão Prévia do Banco Mundial e discutir proposta para um melhor controle das despesas dos Programas Elegíveis e apresentou a seguinte pauta:

1. Apresentando o SWAp II
2. Programas Elegíveis por Secretarias Envolvidas
3. Informação anteriormente disseminada (Ofício Circular PGE nº002/2009 e Ofício SWAP II / CE nº002/2009)
4. Cláusulas Anti-Fraude e Anti-Corrupção
5. Limites para revisão prévia
6. Programas de Gastos Elegíveis e Condição de Desembolso
7. Auditoria do Projeto SWAp II pelo TCE: Financeira e Licitações

## II.2. ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Ailson Filho – SEPLAG apresentou as Despesas Elegíveis com relação à regra dos 30% e 70% (**Anexo 2**).

Verificou-se que em relação à Regra de 30% um programa da SESA encontra-se com sinalização vermelha:

- 554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde - **0%**

Já na Regra de 70% quatro programas estão com a sinalização vermelha por apresentarem percentual de execução abaixo de 70%, que são respectivamente:

- SEDUC - 048 Qualidade da Educação Básica nas Zonas Rural e Urbana – **60,16%**
- SESA - 554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde - **0%**
- SECITECE - 033 Ceará Digital – **43,89%**
- SECITECE-196 Inovação tecnológica, pesquisa e desenvolvimento científico– **23,14%**

No **Anexo 3** encontra-se o acompanhamento do desempenho mensal de cada Programa Elegível, demonstrado por meio de gráficos.

Eneida – SEDUC informou que existe grande possibilidade de o programa 048 – Qualidade da Educação Básica, ser cumprido, pois a maior execução ocorre no segundo semestre.

Ricardo da Costa e Silva – SECITECE informou que em relação ao Programa 033, os repasses dos convênios foram bloqueados enquanto perdurar o período eleitoral.


## II.3. PENDÊNCIAS


Cristina Medeiros – IPECE apresentou o quadro com as pendências deixadas após a missão do Banco Mundial de março de 2010 para este mês de agosto, para algumas setoriais conforme planilha do **Anexo 4**.

## II.4. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Raquel Neiva – IPECE apresentou dois gráficos referentes ao Cumprimento do Plano de Licitações, tratando-se do Estágio dos Processos Licitatórios – Gráfico 1, e das Fases dos Projetos – Gráfico 2, abaixo:

**Gráfico 1: Estágio dos processos licitatórios**



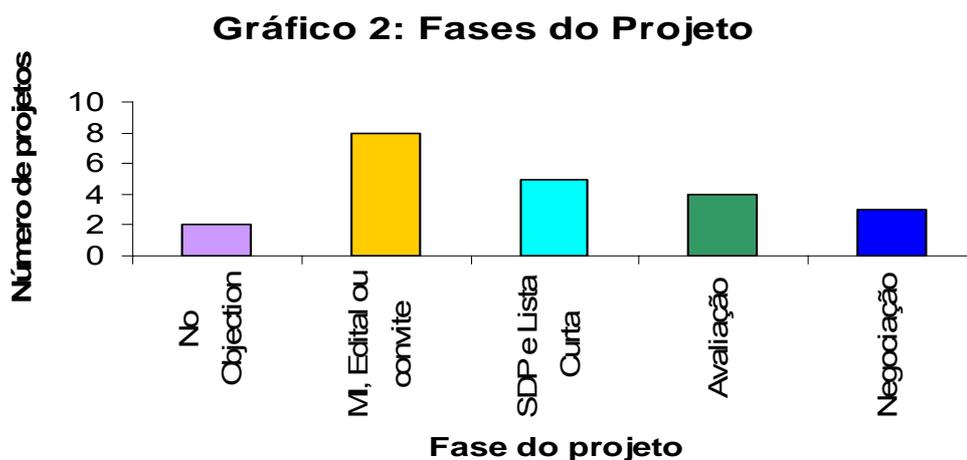

Cristina Medeiros – IPECE apresentou o quadro de acompanhamento do Cumprimento do Plano de Licitações e solicitou que cada setorial informasse por e-mail a data limite para início das licitações dos Projetos de Assistência Técnica.

## II.5. ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS SETORIAIS


### 1. SEFAZ

Representada por Fabiano Ramos e Lourival Júnior

#### INDICADORES PRIMÁRIOS

##### Indicador 1: O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes)

- Meta 2010: R\$ 1,219 milhões
- Posição em 31/07: R\$ 816,4 milhões
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE <sup>1</sup>
- Comentários: as receitas e as despesas correntes concentram-se no segundo semestre, a perspectiva é de cumprimento da meta.

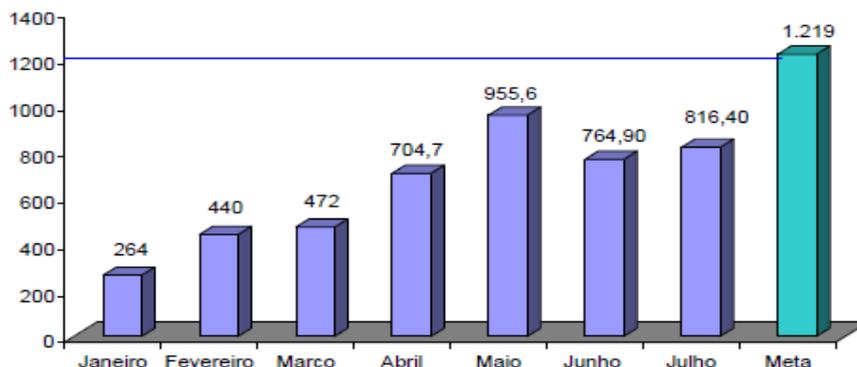


Sentido do Indicador ↑

<sup>1</sup> Legenda da Sinalização para cumprimento da meta: Verde=Alta probabilidade; Amarelo=média probabilidade; Vermelho=Baixa probabilidade;

**Indicador 2: Índice Hefirndahl de arrecadação de ICMS usando quatro setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).**


- Meta 2010:  $\leq 0,35$
- Posição em 31/07: 0,30
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a previsão é de que esse índice se mantenha na meta.



Sentido do Indicador ↓

**Indicador 14: Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas**

- Meta 2010:  $\geq 29,00\%$
- Posição em 31/07: 30,23%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE

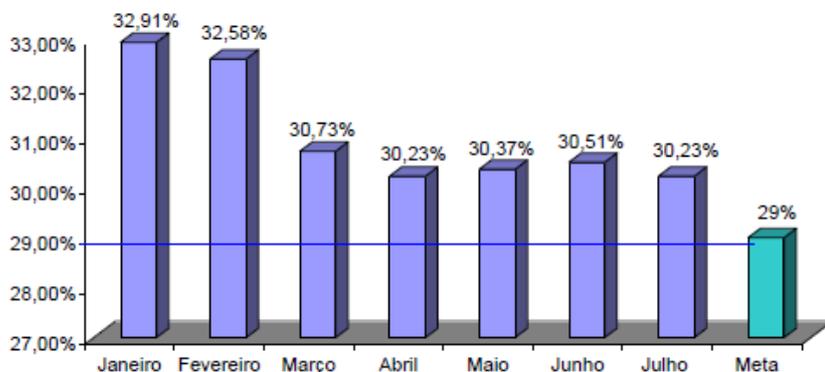

Sentido do Indicador ↑

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

**Indicador 1: Implementação da reforma da gestão financeira (com base no diagnóstico do PEFA)**

- Meta 2010: -
- Posição em 31/07: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: -
- Comentários: o protocolo do indicador ainda não foi elaborado.

## PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA<sup>2</sup>

### **Projeto 18: Financiamento de recomendações apresentadas em diagnóstico sobre implantação do PEFA no Estado – SEFAZ**

- Responsável: José Carlos
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 300 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2009 – Setembro de 2010
- Estágio Previsto: prestação do serviço
- Estágio Atual: o Termo de Referência está sendo revisado, a justificativa de dispensa de licitação foi elaborada em 16/08/10.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: -

## **2. SEPLAG**

Representada por Fátima Falcão, Fernanda Salles e Ailson Filho

### **INDICADORES PRIMÁRIOS**

#### **Indicador 3: Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGEF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.**

- Meta 2010: 11
- Posição em 31/07: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a SEPLAG está verificando a possibilidade com o setor de TI se as informações que deverão compor o relatório, possam ser disponibilizadas on line no módulo GPR do SIAP. As informações de GPR referente aos dois quadrimestres estão sendo solicitadas as setoriais.

#### **Indicador 4: Número de "Relatórios de Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.**

- Meta 2010: 5
- Posição em 31/07: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: o Edital para a licitação dos cinco RPR foi elaborado pelo IPECE e está sendo analisado pela PGE, os temas deste ano são:
  - 1 – Meio Ambiente: Destinação Final dos Resíduos Sólidos;
  - 2 – Redução das Desigualdades Sociais: Empregos Formais RMF e Interior;
  - 3 – Redução das Desigualdades Sociais: Distribuição de Renda no Estado;
  - 4 – Educação: Avaliação do Desempenho da Aprendizagem;
  - 5 – Saúde: Atendimento à População em Consultas e Exames Especializados em Unidades Públicas do Estado.

---

<sup>2</sup> Legenda da Sinalização para cumprimento dos Projetos de Assistência Técnica: Verde=Realização conforme o Plano de Licitações; Amarelo = Realização com atraso mais de um dia; Vermelho = Realização com atraso de mais de três meses.


## INDICADORES SECUNDÁRIOS

### Indicador 2: Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no discurso anual do Governador na Assembléia.

- Meta 2010: 2
- Posição em 31/07: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: as informações serão incluídas tanto no Orçamento como na mensagem do Governador, a perspectiva é de cumprimento da meta.

### Indicador 3: Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar regularidade.

- Meta 2010: 0-3 meses
- Posição em 31/07: 2,59 meses
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: o desempenho apresenta-se abaixo de 3 meses.

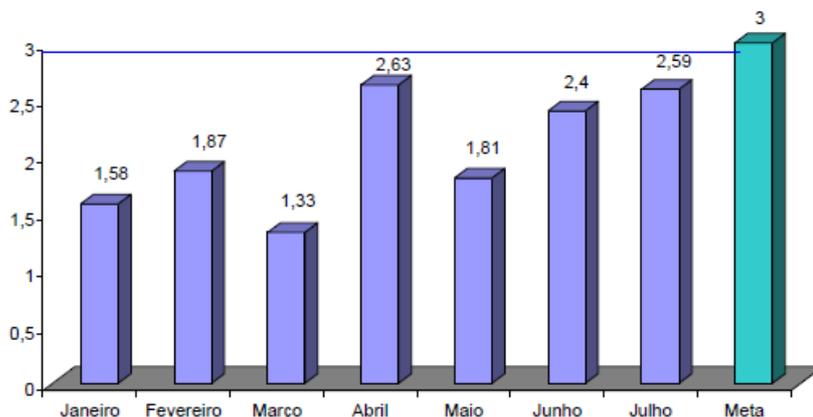

Sentido do Indicador ↓

## PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### Projeto 19: Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados – SEPLAG

- Responsável: Fátima Falcão
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 200 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2011
- Estágio Previsto: abertura pública das propostas financeiras
- Estágio Atual: em 11/08/10 o Banco Mundial enviou suas observações sobre a revisão da SDP.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

### Projeto 20: Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará - SEPLAG

- Responsável: Sérgio Lage e Fernanda Salles
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2012
- Estágio Previsto: não objeção do Banco Mundial à minuta do contrato
- Estágio Atual: adjudicação e homologação do contrato
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 21: Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras - SEPLAG**

- Responsável: Soraya e Ana Portela
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 200 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho de 2009 – Dezembro de 2011
- Estágio Previsto: Preparar e enviar convite às empresas da lista curta
- Estágio Atual: O processo licitatório está sendo cancelado por sugestão da Secretaria Executiva e será iniciado um novo processo com modificação no valor. A justificativa sobre esta mudança está sendo preparada para ser enviada para receber a não objeção do Banco Mundial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 22: Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo à sociedade em geral e as entidades representativas das empresas - SEPLAG**

- Responsável: Soraya e Ana Portela
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 30 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro de 2009 – Dezembro de 2011
- Estágio Previsto: prestação de serviços
- Estágio Atual: O processo licitatório está sendo cancelado por sugestão da secretaria executiva e será iniciado um novo processo com modificação no valor. A justificativa sobre esta mudança está sendo preparada para ser enviada para receber a não objeção do Banco Mundial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 23: Implantação de Centro de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará – SEPLAG**

- Responsável: Carlos Eduardo
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 120 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: Prestação de serviços
- Estágio Atual: Está sendo elaborado novamente o Termo de Referência com base nas recomendações do especialista do Banco Mundial.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

## Projeto 24: Desenvolvimento de Solução Informatizada para monitoramento da Cooperação Técnico-financeira do Estado do Ceará – SEPLAG

- Responsável: Mário Fracalossi
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro de 2009 – Maio de 2011
- Estágio Previsto: envio da SDP/convite à empresa vencedora
- Estágio Atual: Não objeção à SDP, lista curta e relatório de avaliação em 09/08/10.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### 3. SEDUC

Representada por Eneida Machado

#### INDICADORES PRIMÁRIOS

**Indicador 5: Resultados das avaliações externas dos alunos do 2o, 5o, 9o e 12o anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas.**

- Meta 2010:  $\geq 90\%$
- Posição em 31/07: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: receberam o material do ensino médio e estão sendo realizadas oficinas nas CREDE para discussão e aprofundamento dos resultados do SPAECE. No que se refere ao Relatório de Boas Práticas, na primeira semana de Setembro será encaminhado a Secretária para validação. A perspectiva é de cumprimento da meta.

**Indicador 6a: Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.**


- Meta 2010: 75%
- Posição em 31/07: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentário: a meta encontra-se cumprida



Sentido do Indicador ↑

**Indicador 6b: Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.**


- Meta 2010:  $\geq 75\%$
- Posição em 31/07: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentário: a meta encontra-se cumprida

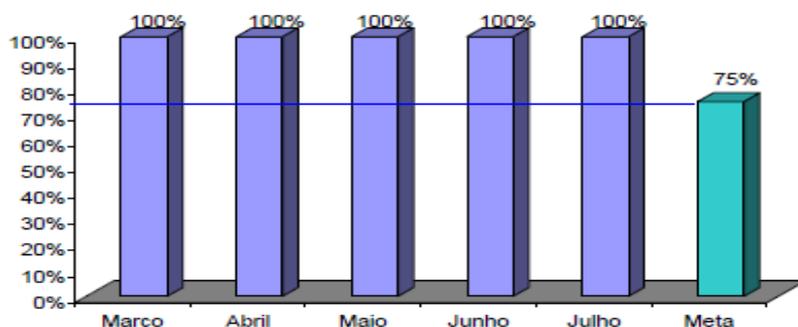

Sentido do Indicador ↑

**Indicador 6c: Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.**

- Meta 2010: 50%
- Posição em 31/07: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a ajuda financeira aos gerentes é uma forma de incentivo ao bom desenvolvimento do programa

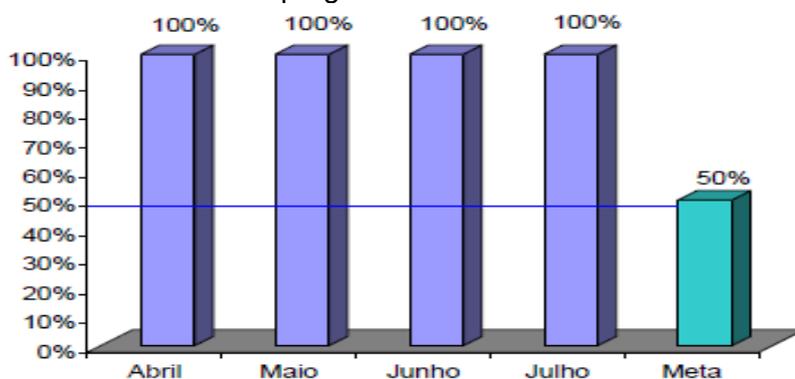

Sentido do Indicador ↑

## INDICADORES SECUNDÁRIOS

**Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série**

- Meta 2010: 68%
- Posição em 31/07: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE

## PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Projeto 15: Avaliação do Programa E - Jovem - SEDUC**

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Agosto de 2009 – Setembro de 2010
- Estágio Previsto: Prestação de serviços
- Estágio Atual: Empresa contratada encontra-se prestando os serviços. Em 20/07/10 foi publicado no DOE o extrato do aditivo ao Contrato Nº 26/2010 que estendeu o prazo de vigência do mesmo para o dia 15/09/10.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 16: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 1ª Etapa**

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 35 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho de 2009 a setembro de 2010
- Estágio Previsto: prestação de serviços
- Estágio Atual: Empresa contratada encontra-se prestando os serviços. Em 20/07/10 foi publicado no DOE o extrato do aditivo ao Contrato Nº 25/2010 que estendeu o prazo de vigência do mesmo para o dia 15/09/10.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 16: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 2ª Etapa**

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 35 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2010 a Julho de 2011
- Estágio Previsto: Início do processo
- Estágio Atual: Termo de Referência elaborado. Em 09/08/10 foi recebido a Não Objeção do Banco Mundial com a finalidade de dar continuidade ao processo com duas empresas da Lista Curta.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 17: Serviço de consultoria para a Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico – Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará**

- Responsável: Eneida Machado e Kennedy
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2010 a Agosto de 2011
- Estágio Previsto: -
- Estágio Atual: Aguardando o recebimento dos portfólios das empresas. Data limite para o recebimento das manifestações de interesse (com os portfólios) será em 16/08/10.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE


#### 4. SESA

Representada por Imaculada Fonseca e Leilane Benevenuto

#### INDICADORES PRIMÁRIOS

##### Indicador 7a: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.


- Meta 2010: 25,0%
- Posição em 31/07: 42,8%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta foi superada devido à estratégia de gratificar os articuladores regionais para ajudar na realização da AMQ.

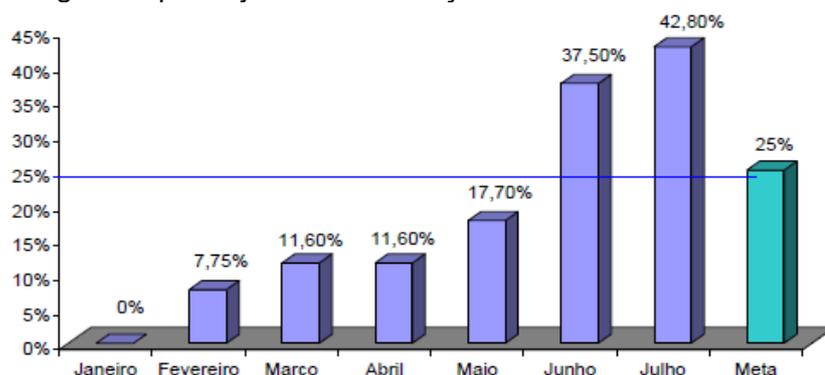

Sentido do Indicador ↑

##### Indicador 7b: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.


- Meta 2010: 25%
- Posição em 31/07: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: a SESA depende da consultoria que irá criar o sistema de informação, o resultado será analisado no encerramento do exercício de 2010.

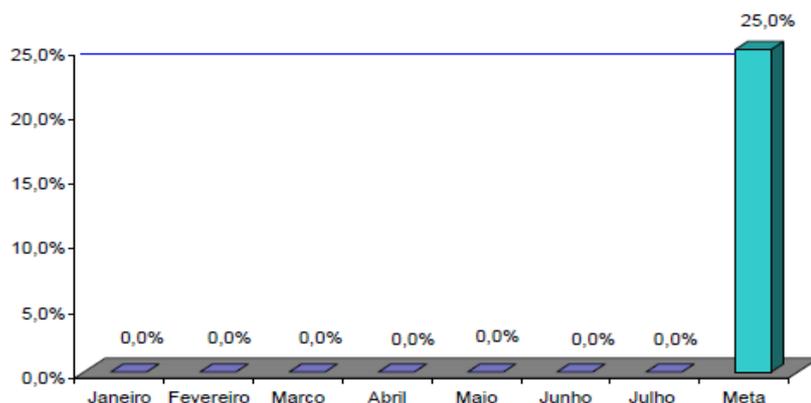

Sentido do Indicador ↑

##### Indicador 8: Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.


- Meta 2010: 10
- Posição em 31/07: 13
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta encontra-se cumprida



Sentido do Indicador ↑

**Indicador 9: Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.**

- Meta 2010: 15
- Posição em 31/07: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: o cumprimento do indicador depende da realização das Assistências Técnicas dos projetos 28 e 29. A avaliação do Relatório Final da consultoria 1 foi incluída, e hoje dia 17/08/10 encerra o recebimento dos portfólios da consultoria 2




Sentido do Indicador ↑

**INDICADORES SECUNDÁRIOS**

**Indicador 7: População Atendida pelas Equipes do PSF**

- Meta 2010: 6.394.791
- Posição em 31/07: 6.421.752
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE

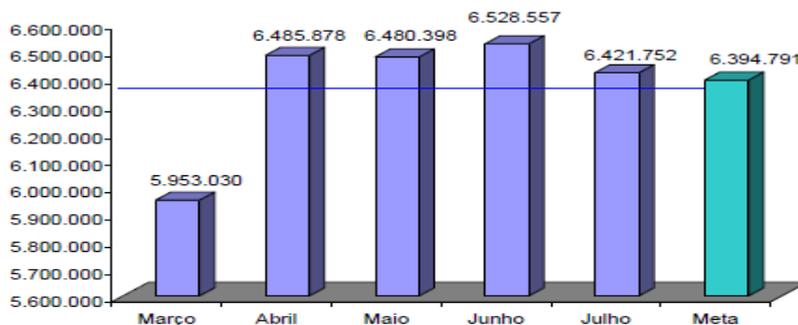


Sentido do Indicador ↑

**Indicador 8: Relatórios semestrais do “Grupo da Água para combater a diarreia infantil que leva a internação”.**

- Meta 2010: 2
- Posição em 31/07: 1<sup>3</sup>
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE

**Indicador 9: Coleta sistemática e relato peso/altura dos bebês**

- Meta 2010: 60,0%
- Posição em 31/07: 76,1%<sup>4</sup>
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE



Sentido do Indicador ↑

## PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Projeto 25: Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PFS – Sistema de Informação de AMQ**

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 40 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 – Abril de 2011
- Estágio Previsto: Notificação e adjudicação do contrato
- Estágio Atual: SDP em análise na PGE desde 26/07/10. Secretária falta enviar uma via eletrônica.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 26: Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Desenho e implantação do software de custeio por absorção**

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 30 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril de 2010 – Setembro de 2011.
- Estágio Previsto: Recebimento da proposta técnico financeira da empresa vencedora
- Estágio Atual: Aguardando publicação da Manifestação de Interesse. Atualmente o

<sup>3</sup> A SESA enviou o Relatório em 19/08/10.

<sup>4</sup> Os dados são referentes a abril de 2010.

processo encontra-se no setor de informática da SEPLAG para emissão de parecer sobre o Termo de Referência.

- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto 27: Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais- pólo – Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software**

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril de 2010 – Agosto de 2011
- Estágio Previsto: Abertura pública das propostas financeiras
- Estágio Atual: Manifestação de Interesse publicada em 03/08/10. Aguardando o recebimento dos portfólios das empresas até 17/08/10.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto 28: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Validação da Metodologia**

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 30 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 – Julho de 2010
- Estágio Previsto: término do contrato
- Estágio Atual: Término de vigência do contrato em 09/07/10. O relatório final foi entregue pelo Consultor e está sendo analisado pela SESA.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: este projeto já está sendo finalizado

**Projeto 29: Apoio para a implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Definições e ajustes no modelo de absorção**

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 50 mil
- Método de Aquisição: Seção V - Diretrizes de Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: abril de 2010 – setembro de 2011
- Estágio Previsto: avaliação dos currículos pela comissão
- Estágio Atual: elaborando relatório de avaliação e seleção de consultores desde o dia 30/07/10
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: os currículos foram avaliados e serão passados a PGE

**Projeto 30: Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PFS – Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES**

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 160 mil
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março de 2010 – Dezembro de 2010

- Estágio Previsto: elaboração do contrato
- Estágio Atual: Edital sendo elaborado. A especificação técnica está na informática da SESA para emissão do parecer.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto 31: Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informática.**

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 410 mil<sup>5</sup>
- Método de Aquisição: Pregão
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março de 2010 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: elaboração do contrato
- Estágio Atual: Edital sendo elaborado. A especificação técnica está na informática da SESA para emissão do parecer.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO
- Comentários: a quantidade de equipamentos de computação e informática necessária para a implantação do sistema de custos foi revisada.


**5. COGERH**

Representado por Maria do Céu

**INDICADOR PRIMÁRIO**

**Indicador 10: Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.**

- Meta 2010:  $\geq 27\%$
- Posição em 31/07: 21%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a demanda de água pelos usuários tende a aumentar, o que gera uma perspectiva positiva para o cumprimento da meta. A oscilação apresentada no gráfico é devido à sazonalidade da captação de água no setor de irrigação.

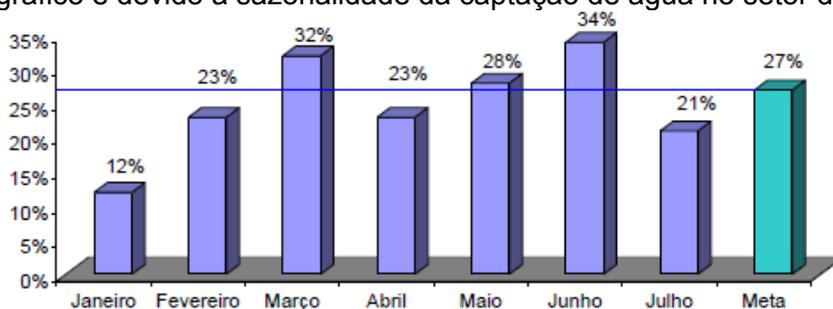

Sentido do Indicador ↑

<sup>5</sup> O valor desse projeto foi reduzido de US\$ 600 mil para US\$ 410 mil, conforme ofício N° 1729/2010- GABSEC enviado pela SESA em 17/08/10.


## 6. CAGECE

Representado por Emilian Filgueiras

### INDICADORES PRIMÁRIOS

#### Indicador 11a: Número de ligações urbanas de água.


- Meta 2010: 198.708
- Posição em 31/07: 232.114
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta encontra-se cumprida

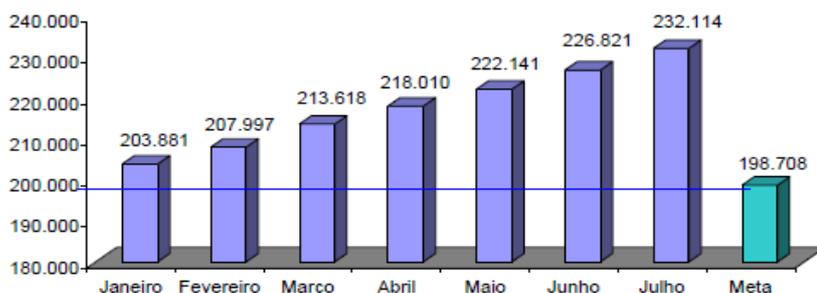

Sentido do Indicador ↑

#### Indicador 11b: Número de ligações de esgotos.


- Meta 2010: 88.717
- Posição em 31/07: 109.729
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta encontra-se cumprida. Conforme acordo com Banco Mundial a meta foi mantida a mesma do final do ano de 2009, o que justifica a meta apresentar-se cumprida desde o início do ano.

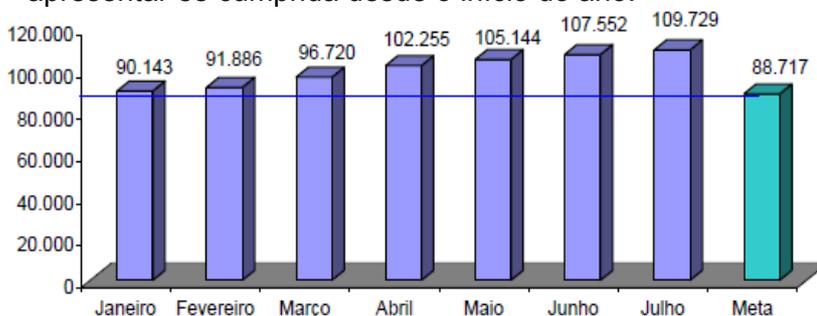

Sentido do Indicador ↑

#### Indicador 12: Percentual de Perda de Água.

- Meta 2010:  $\leq 27,00\%$
- Posição em 31/07: 25,86%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: o resultado do cumprimento desse indicador é sempre referente ao mês anterior. O gráfico apresenta uma redução sutil de maio para junho, o que gera uma expectativa favorável ao cumprimento da meta, pois quanto menor o percentual de perda de água melhor para o fechamento da meta.

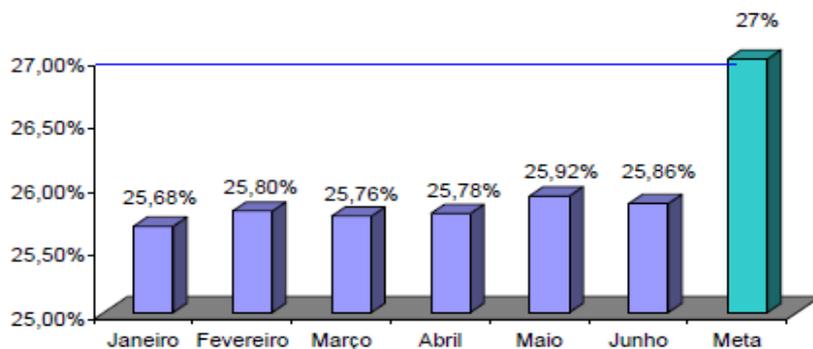


Sentido do Indicador ↓

## INDICADOR SECUNDÁRIO

### Indicador 10: Margem EBITIDA da CAGECE

- Meta 2010: 29,00%
- Posição em 31/07: 28,68%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a perspectiva é de cumprimento da meta

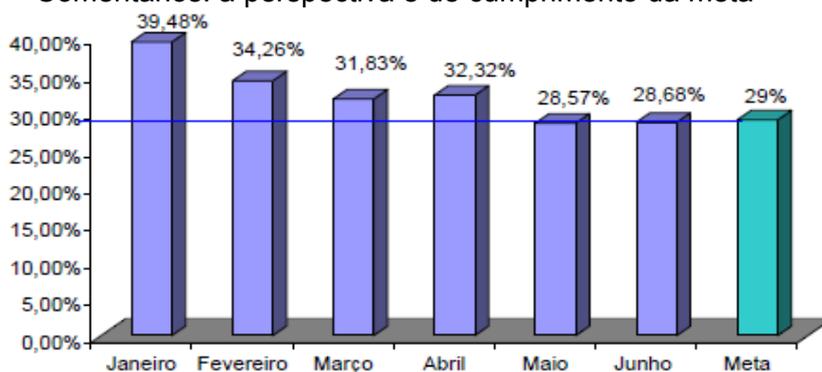

Sentido do Indicador ↑


## 7. ETICE

Representada por João Carlos

## INDICADOR PRIMÁRIO

### Indicador 13: Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.

- Meta 2010: 3.311.300
- Posição em 31/07: 3.950.061
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentário: a meta encontra-se cumprida



Sentido do Indicador ↑

## INDICADOR SECUNDÁRIO

**Indicador 12: Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com sistemas)**

- Meta 2010: 2
- Posição em 31/07: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: encontram-se em desenvolvimento os dois sistemas componentes da S2GPR: Contabilidade e Compras e Pregão Eletrônico, o primeiro está previsto para ser homologado até o final do mês.

## 8. PGE

Representada por Fernando Grangeiro

## INDICADOR SECUNDÁRIO

**Indicador 4: Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos indicadores do OECD – Número de Capacitações em Licitações)**

- Meta 2010: 37
- Posição em 31/07: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE

## PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Projeto 13: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de empresa para capacitação nas áreas de licitação e administrativa.**

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 147 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2009 – Outubro de 2011
- Estágio Previsto: recebimento das propostas da lista curta
- Estágio Atual: Minuta da Manifestação de Interesse, Termo de Referência e outros documentos do processo encontram-se na Coordenadoria Administrativo Financeira da PGE (COAF).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto 14: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Congresso para capacitação nas áreas de licitação, administrativa e de auditoria preventiva (Congresso).**

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Empresa de não consultoria
- Valor: US\$ 53 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Agosto de 2011
- Estágio Previsto: assinatura do contrato
- Estágio Atual: O Termo de Referência está sendo revisado pela PGE
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO


**9. ARCE**

Representado por Alexandre Caetano

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

**Indicador 11: Índice de Conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE**

- Meta 2010: 70%
- Posição em 31/07: 17,24%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERMELHO
- Comentários: a meta para o ano de 2010 não será cumprida

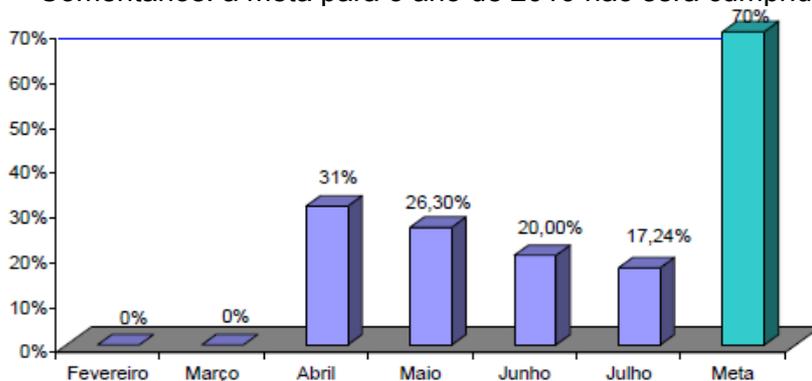

Sentido do Indicador ↑

**PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Projeto 1: Elaboração do manual de indicadores de performance para o setor de saneamento ARCE**

- Responsável: Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: Convidar empresa vencedora para a negociação do contrato
- Estágio Atual: Negociando contrato com empresa vencedora desde 09/07/10. A ARCE solicitou a UGP mais US\$ 42 mil dólares para poder contratar a primeira empresa da lista curta.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE


## 10. SECITECE

Representado por Ricardo da Costa e Silva

### INDICADOR SECUNDÁRIO

#### Indicador 13: *Número de serviços tecnológicos realizados*

- Meta 2010: 44.935
- Posição em 31/07: 28.234
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE

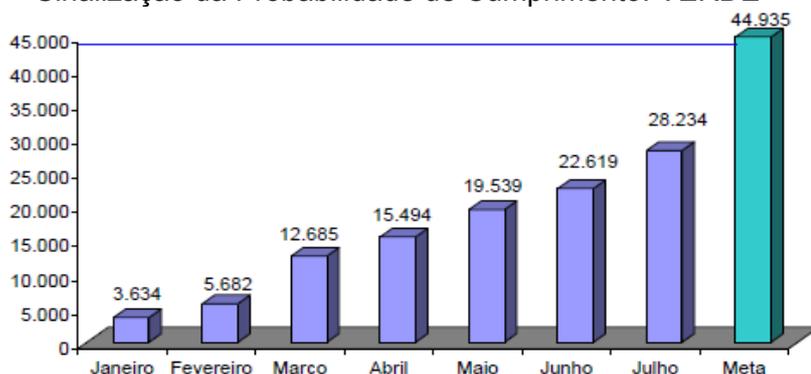

Sentido do Indicador ↑


## 11. CONPAM

Representado por Goretti Gurgel e Maria Dias

### INDICADOR SECUNDÁRIO

#### Indicador 14: *Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado*

- Meta 2010: 10%
- Posição em 31/07: 21%<sup>6</sup>
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE

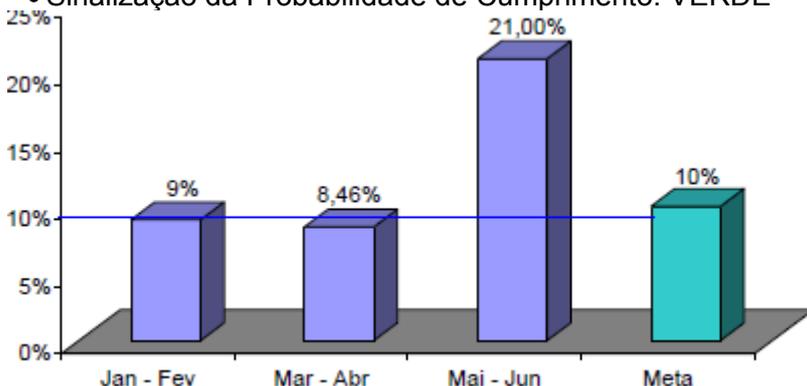

Sentido do Indicador ↓

### PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

#### Projeto 5: Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente – CONPAM

<sup>6</sup> Dado referente ao período de maio de 2010 a junho de 2010. O indicador é bimestral e calculado trimestralmente.

- Responsável: Maria Goretti de Castro e Maria Dias
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 40 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2009 – Dezembro de 2010
- Estágio Previsto: elaboração do contrato
- Estágio Atual: A PGE encontra-se elaborando o Relatório Final de finalização do processo licitatório.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## **12. CGE**

Representado por Ítalo Brígido

### **PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

#### **Projeto 2: Capacitação em processos de auditoria preventiva**

- Responsável: Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 180 mil
- Método de Aquisição: Licitação Pública Nacional
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro de 2009 – Outubro de 2010
- Estágio Previsto: Não objeção do Banco Mundial à minuta do contrato
- Estágio Atual: Enviada nova versão do Edital para a não objeção do Banco Mundial em 28/07/10
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

#### **Projeto 3: Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará**

- Responsável: Marconi Lemos
- Categoria de Licitação: Serviços de consultoria
- Valor: US\$ 170 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2009 – Março de 2011.
- Estágio Previsto: publicação da Manifestação de Interesse
- Estágio Atual: elaborando a lista curta, relatório de avaliação dos portfólios das empresas e SDP
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## **13. CIDADES**

Representado por Tércia Pinheiro

### **PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

#### **Projeto 4: Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade**

- Responsável: Tércia Pinheiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil

- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Julho de 2011
- Estágio Previsto: enviar convite/SDP à empresa vencedora
- Estágio Atual: Elaborando relatório de avaliação dos portfólios, lista curta e SDP desde 27/07/10.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### **14. IPECE**

Representado por Cristina Medeiros

#### **PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

##### **Projeto 8: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Consultoria**

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 33,8 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Outubro de 2010
- Estágio Previsto: prestação de serviços pelo consultor
- Estágio Atual: Contrato assinado em 04/08/10. Consultora contratada encontra-se prestando serviços.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

##### **Projeto 9: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos resultado da consultoria**

- Responsável: Eveline Carvalho
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 0,642
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Março de 2011
- Estágio Previsto: aguardando finalização do processo de contratação de consultores individuais
- Estágio Atual: aguardando finalização do processo de contratação dos consultores individuais
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

##### **Projeto 10: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado aos indígenas.**

- Responsável: Eveline Carvalho
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 5,561 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 – Janeiro de 2011
- Estágio Previsto: aguardando finalização do processo de contratação dos consultores individuais

- Estágio Atual: aguardando finalização do processo de contratação dos consultores individuais
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 11: Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo) – IPECE**

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 176,06 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho de 2009 – Junho de 2012
- Estágio Previsto: prestação de serviços
- Estágio Atual: consultores contratados e serviços sendo prestados.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## **15. TCE**

Representado por Giovanna Adjafre e José Garrido

### **PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Projeto 32: Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de finanças públicas, contábil, estatística, dentre outros.**

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril de 2010 – Janeiro de 2011
- Estágio Previsto: elaboração do contrato
- Estágio Atual: elaborando especificação técnica do Termo de Referência
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto 33: Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresa para realização de consultoria de tecnologia da informação.**

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 50 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2009 – Janeiro de 2011
- Estágio Previsto: início do contrato
- Estágio Atual: não objeção ao Termo de Referência em 14/07/10. Manifestação de Interesse sendo elaborada.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

**Projeto 34: Contratação de Empresa para a Realização de Consultoria em Auditoria Contábil e Análise das Demonstrações Contábeis – TCE**

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria

- Valor: US\$ 150 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro de 2011 – Abril de 2012
- Estágio Previsto: -
- Estágio Atual: -
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: o Termo de Referência será elaborado com base nas novas regras contábeis, e está previsto para fevereiro de 2011

### III. CONTATOS COM A UGP

A comunicação deve ser feita através dos seguintes e-mails:

- [ugpswap@ipece.ce.gov.br](mailto:ugpswap@ipece.ce.gov.br)
- [eveline.barbosa@ipece.ce.gov.br](mailto:eveline.barbosa@ipece.ce.gov.br)
- [cristina.medeiros@ipece.ce.gov.br](mailto:cristina.medeiros@ipece.ce.gov.br)

### IV. ESTRATÉGIAS

Cristina Medeiros – IPECE informou que a SEPLAG, IPECE e CGE tem discutido um instrumento para um maior controle sobre os gastos incluídos nos Relatórios Financeiros do Projeto SWAp II, a proposta é incluir na elaboração da Intenção de Gasto – IG a apresentação da não objeção do Banco Mundial.

Ítalo Brígido – CGE informou que na IG pode incluir a dotação orçamentária numa caixa de diálogo informando que a dotação é referente ao Projeto SWAp II. Quanto à questão de uma IG conter vários contratos, no caso do SWAp II cada projeto terá que apresentar sua respectiva IG.

### V. PARTICIPAÇÃO

O acompanhamento das participações das setoriais nas reuniões do Comitê SWAp II é realizado mensalmente conforme tabela (**Anexo 5**) e gráfico (**Anexo 6**).

### VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fernando Grangeiro – PGE informou que estão sendo providenciados os modelos dos documentos licitatórios conforme o padrão do Banco Mundial.

### VII. ENCERRAMENTO

Às 16h Cristina Medeiros – IPECE encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

### VII. ANEXOS

**Anexo 1** : Apresentação em *Power Point*

**Anexo 2**: Regra dos 30% e dos 70%

**Anexo 3**: Gráfico dos Acompanhamentos dos Programas de Despesas Elegíveis

**Anexo 4**: Quadro de Pendências

**Anexo 5**: Tabela do Sumário de Presenças nas Reuniões do Comitê SWAp II

**Anexo 6**: Gráfico do Sumário de Presenças nas Reuniões do Comitê SWAp II

# Anexo 1

# OPERAÇÃO Swap II

**Acompanhamento do Desempenho por Setorial**  
**17 de Agosto de 2010**

# OPERAÇÃO Swap II

- 1 - Reunião com setoriais envolvidas nos programas de despesas elegíveis do SWAp II**
- 2 - Acompanhamento dos Programas Elegíveis Pendências**
- 3 - Pendências**
- 4 - Projetos de Assistência Técnica**
- 5 - Acompanhamento Mensal das Setoriais**

# OPERAÇÃO Swap II

**1 - REUNIÃO COM SETORIAIS ENVOLVIDAS  
NOS PROGRAMAS DE DESPESAS ELEGÍVEIS  
DO PROJETO SWAP II**

## **Pauta da Reunião**

- I - Apresentando o SWAp II**
- II - Programas Elegíveis por Secretarias Envolvidas**
- III - Informação disseminada**
- IV - Cláusulas Anti-Fraude, Anti-Corrupção**
- V - Limites para Revisão Prévia**
- VI - Programas de Gastos Elegíveis e Condição de Desembolso**
- VII - Auditoria do Projeto SWAp II: Financeira e Licitações**

# OPERAÇÃO Swap II

## 2 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ELEGÍVEIS

# PROGRAMAS ELEGÍVEIS

## REGRA DOS 30%

Estimativa de Despesas para o período abr-setembro/2010 - **REGRA 30%**

R\$ 1

Sectorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Previsão (abr/10 a setembro/10) (a)	Realizado (até 31/jul/10) (b)	Realizado/Previsão (%) (b)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	1.000.000,0	1.107.716,9	110,77%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	25.000.000,0	37.375.482,5	149,50%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	2.000.000,0	2.773.840,1	138,68%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	150.000.000,0	353.183.247,3	235,46%	
SECITECE	104 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	8.000.000,0	17.880.949,1	220,76%	
SECITECE	106 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.000.000,0	1.358.314,6	67,92%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	40.000.000,0	83.831.782,7	209,58%	
SESA	538 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	800.000,0	16.962.863,5	2120,36%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.000.000,0	0,0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	3.000.000,0	6.435.558,1	214,52%	
TOTAL		234.800.000	520.689.554,7	221,76%	
Valor Limite do Desembolso (30% * TOTAL)		70.440.000,00		156.206.866,40	

Posição em: 31-jul-10

# PROGRAMAS ELEGÍVEIS

## REGRA DOS 70%

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2010 - **REGRA 70%**

R\$ 1

Sectorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2010 Jan - Dez (a)	Orçamento 2010 - Até 31/07 (b)	Realizado (até 31/07/10) (c)	Realizado/Previsto (%) (c)/(b)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	6.090.716,0	3.552.920,0	1.559.516	43,89%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	97.089.453,0	58.835.516,0	54.274.313,1	95,83%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.289,0	4.894.323,0	2.944.552	60,16%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	351.719.137,0	590.128.997,5	167,78%	
SECITECE	104 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.501.712,0	32.959.332,0	27.962.254	84,84%	
SECITECE	106 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	12.359.638,0	7.209.790,0	1.688.199	23,14%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.621.487,0	129.279.206,0	119.935.940,4	92,77%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	724.206,0	16.963.917	2342,42%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	10.871.070,0	0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	7.898.514,0	6.489.050	84,31%	
TOTAL		1.038.072.016,00	605.542.014,00	821.926.738,4		
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		726.650.411,20	423.879.409,80			

Posição em: 31-Jul-10

# OPERAÇÃO Swap II

## 3 - PENDÊNCIAS

# Pendências

Operação SWAp II 2009 -2012						
ACOMPANHAMENTO PENDÊNCIAS MISSÃO BANCO MUNDIAL 15 - 23 MARÇO 2010						
Órgão	Nº	Pendência	Responsável	Prazo	Posição em 17/08/2010	
ARCE	1	Enviar Nota Técnica explicativa das razões da piora do indicador IRVF até 15/08/10.	Alexandre Caetano	15/08/2010	Aguardando	
	2	Encaminhar o Termo de Ajuste de conduta com o Plano de Ação assinado com a CAGECE para alcançar a meta de 2011.	Alexandre Caetano	15/08/2010	Aguardando	
	3	Existe uma segunda proposta de AT feita pelo BM (Marcos Thadeu) e em relação a mesma, esclareceu-se que em termos técnicos essa atividade esta de acordo com os objetivos do projeto mas que ainda não foram alocados recursos para financiá-lo. A ARCE enviará uma proposta mais detalhada em junho de 2010 e neste momento será avaliado se surgiu recurso no plano de licitações para o seu financiamento.	Alexandre Caetano	30/06/2010	Aguardando	
Banco Mundial	4	Enviará comentários técnicos sobre os fatores considerados no parágrafo 4 da nota técnica da SRH/COGERH. E seriam acordados entre as partes aqueles critérios a serem utilizados durante o transcurso do projeto.	Jeffrey Rinne/Marcos Thadeu	31/03/2010	Aguardando	

# Pendências

Órgão	Nº	Pendência	Responsável	Prazo	Posição em 17/08/2010
CAGECE	5	A meta do indicador secundário (Margem EBTIDA) deve seguir os valores do PAD, conforme página 69. Acordou-se que para a revisão do projeto prevista para setembro de 2010 (midterm review) a CAGECE teria que: (i) enviar uma nota técnica em agosto de 2010 explicando e detalhando o processo corporativo de revisão e decisão da margem EBTIDA para justificar o motivo da solicitação de mudança da meta a partir de 2011; (ii) até 15 de novembro de 2010, enviar um ofício com o intervalo proposto da margem EBITDA para 2011; e (iii) até 30 janeiro de 2011 enviar ofício com o valor definitivo da da meta corporativa.	Emiliana/Aurineide	(i) 15/8/2010 (ii) 15/11/10 (iii) 30/01/10	Aguardando
	6	Enviar relatório com o fechamento da meta do indicador secundário (Margem EBTIDA) após auditoria.	Emiliana/Aurineide	05/04/2010	Aguardando
	7	Enviar proposta de novas metas para 2011 para os indicadores primários (Ligação de água, Ligação de esgoto, Perda de água). Para o indicador de perda, deverá ser preparada ainda uma nota explicativa, com base nos dados dos últimos 3 anos e considerando os efeitos da instalação de novos medidores, eventos climáticos, etc.	Emiliana/Luiz Celso	15/08/2010	Aguardando

# Pendências

Órgão	Nº	Pendência	Responsável	Prazo	Posição em 17/08/2010
COGERH	8	Encaminhar até 31/8/10 Nota Técnica informando as variáveis e valores que poderão ser utilizados para a revisão da estimativa de volume captado de água em 2010, conforme acordado com o Banco.	João Lúcio	15/08/2010	Aguardando
ETICE	9	Enviar semestralmente (Fevereiro e Agosto) relatórios de acompanhamento dos indicadores primário e secundário.	Denise	31/8/2010 28/2/11	Aguardando
MUTEC	10	O relatório para o indicador secundário 13 será enviado semestralmente: um relatório parcial será enviado ao IPECE em agosto, com resultados para o indicador de janeiro a junho, e um relatório completo, a ser enviado em fevereiro com resultados de janeiro a dezembro do ano anterior.	Vera	31/8/10 31/12/10	Aguardando

# Pendências


Órgão	Nº	Pendência	Responsável	Prazo	Posição em 17/08/2010	
SEFAZ	11	Enviar semestralmente o relatório para o indicador 3. Um relatório parcial será enviado ao IPECE em agosto, com resultados para o indicador de janeiro a junho, e um relatório completo, a ser enviado em fevereiro com resultados de janeiro a dezembro do ano anterior.	Fabiano	31/8/2010 28/02/2011	Aguardando	
	12	Entregar protocolo do indicador secundário.	José Carlos	05/04/2010	Aguardando	
	13	Apresentar a evidência do indicador 3 (gráfico de frequência referente à proporção de registros empresariais no CGF) semestralmente (Fevereiro e Agosto). Enviar a base de dados utilizada para construção do gráfico (em Excel) para disponibilizar no site do IPECE semestralmente (Fevereiro e Agosto).	Fabiano	31/8/2010 28/2/11	Aguardando	
IPECE/ UGP	14	Acordou-se que haverá uma data limite para o começo dos processos licitatórios de AT. Após esta data os recursos seriam remanejados para outras atividades de assistência técnica.	Eveline/Cristina	17/082010	A ser discutida na reunião do Comitê SWAP II de 17/8/10	

# OPERAÇÃO Swap II

## 4 - PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA


## 4.1 Cumprimento do Plano de Licitações

### Estágio dos processos licitatórios

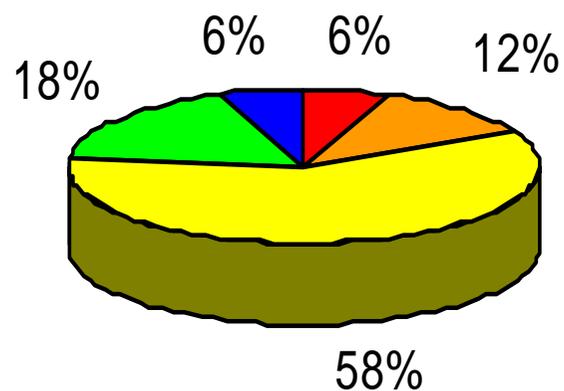

- Não iniciados
- Iniciados
- Em andamento
- Contrato assinado
- Concluído

## 4.1 Cumprimento do Plano de Licitações

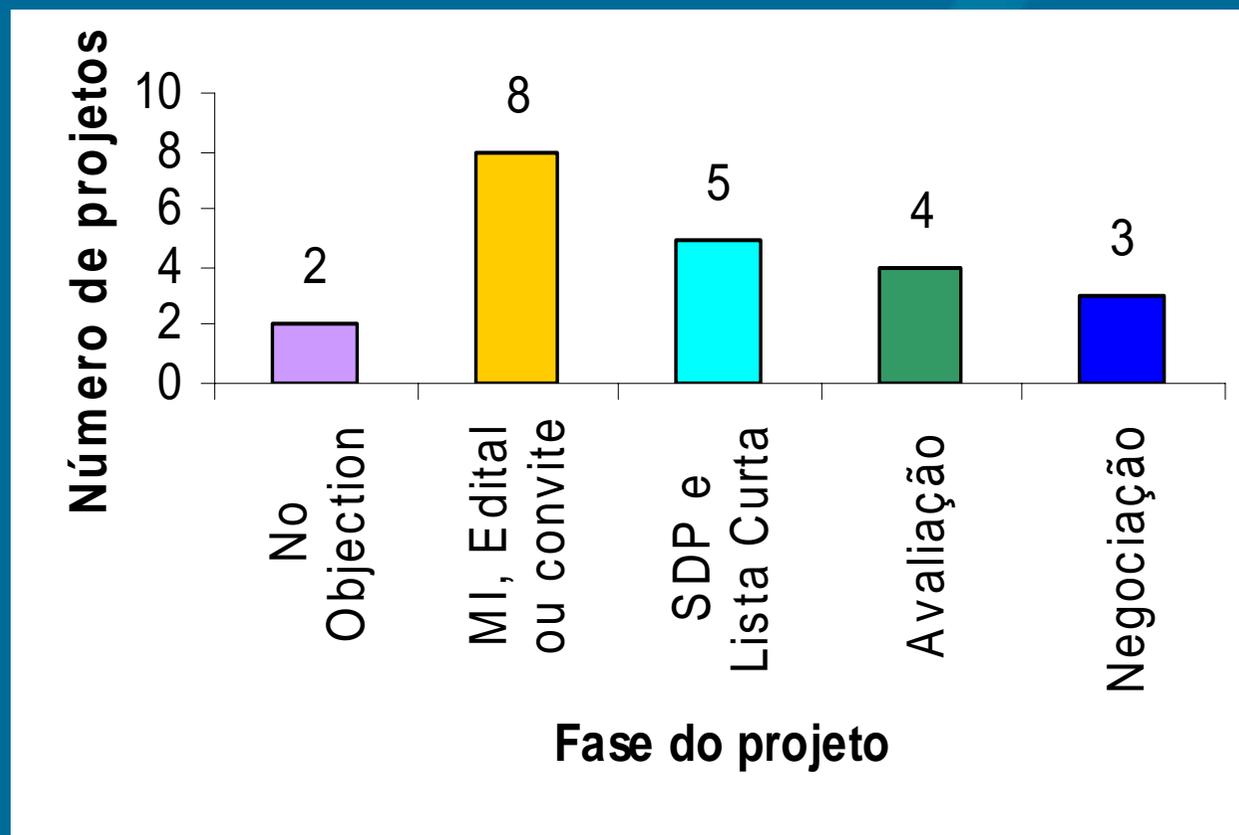

## 4.1 Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*											Concluído	
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento						
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Elaboração da SDP e Lista Curta	Avaliação das propostas e/ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato		Contrato assinado e/ou homologação (adjudicação)
1	ARCE	Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento	junho	09	dezembro	10							X		
2	CGE	Capacitação em processos de auditoria preventiva	novembro	09	março	11				X					
3	CGE	Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará	novembro	09	dezembro	10						X			
4	CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade	dezembro	09	julho	11					X				
5	CONPAM	Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente	agosto	09	janeiro	11							X		

## 4.1 Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*													
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento					Concluído		
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Elaboração da SDP e Lista Curta	Avaliação das propostas e/ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato		Contrato assinado e/ou homologação (adjudicação)	
6	ETICE	Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet	maio	09	setembro	09										X
7	ETICE	Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação	setembro	11	abril	12	X									
8	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Consultoria	dezembro	09	outubro	10									X	
9	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Evento com lideranças indígenas para apresentação do livros didáticos resultado da consultoria.	janeiro	10	março	11			X							

## 4.1 Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*												
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento					Concluído	
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Elaboração da SDP e Lista Curta	Avaliação das propostas e/ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato		Contrato assinado e/ou homologação (adjudicação)
10	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena. Serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado ao indígenas	janeiro	10	janeiro	11			X						
11	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo).	junho	09	junho	12								X	
12	IPECE	Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado - RPR.	dezembro	09	maio	10									X
13	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de Empresa para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva	agosto	09	outubro	11				X					

## 4.1 Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*												Concluído	
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento							
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Elaboração da SDP e Lista Curta	Avaliação das propostas e/ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato	Contrato assinado e/ou homologação (adjudicação)		
14	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Congressos para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva	janeiro	10	agosto	11		X								
15	SEDUC	Avaliação do Programa E-Jovem	agosto	09	Abril	10									X	
16	SEDUC	Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (1ª etapa)	julho	09	julho	10									X	
		Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (2ª etapa)	agosto	10	julho	11					X					
17	SEDUC	Serviço de Consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do estado do Ceará	agosto	10	agosto	11					X					

## 4.1 Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*													
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento						Concluído	
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Elaboração da SDP e Lista Curta	Avaliação das propostas e/ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato	Contrato assinado e/ou homologação (adjudicação)		
18	SEFAZ	Suporte à implantação das recomendações apresentadas em diagnóstico sobre implantação do PEFA no Estado - PI-15 Eficácia no Recolhimento de Impostos	novembro	09	novembro	11		X								
19	SEPLAG	Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados	julho	09	abril	11					X					
20	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	outubro	09	dezembro	11									X	
21	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras	julho	09	dezembro	11				X						

## 4.1 Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*												
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento					Concluído	
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Elaboração da SDP e Lista Curta	Avaliação das propostas e/ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato		Contrato assinado e/ou homologação (adjudicação)
22	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas.	outubro	09	dezembro	11				X					
23	SEPLAG	Implantação de Centros de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará.	novembro	09	dezembro	10		X							
24	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.	outubro	09	maio	11							X		

## 4.1 Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*												
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento						Concluído
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Elaboração da SDP e Lista Curta	Avaliação das propostas e/ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato	Contrato assinado e/ou homologação (adjudicação)	
25	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Sistema de Informação de AMQ	junho	2009	abril	11						X			
26	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Desenho e implantação do software de custeio por absorção	abril	2010	setembro	11				X					
27	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software	abril	10	agosto	11						X			

## 4.1 Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*													
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento						Concluído	
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Elaboração da SDP e Lista Curta	Avaliação das propostas e/ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato	Contrato assinado e/ou homologação (adjudicação)		
28	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia	junho	2009	julho	10									X	
29	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção	abril	10	setembro	11							X			
30	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	março	10	dezembro	10					X					

## 4.1 Cumprimento do Plano de Licitações

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Processo*											Concluído		
			Data início		Data término		Não Iniciados	Iniciados**	Em andamento							
			Mês	Ano	Mês	Ano			No objection ao TOR	Elaboração e/ou publicação da MI, Edital ou Convite as Empresas	Elaboração da SDP e Lista Curta	Avaliação das propostas e/ou análise dos CV	Fase de negociação do contrato		Contrato assinado e/ou homologação (adjudicação)	
31	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação	março	10	dezembro	10				X						
32	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de finanças públicas, contábil, estatística, dentre outros	abril	10	janeiro	11		X								
33	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação	novembro	09	janeiro	11				X	X					
34	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria contábil e análise das demonstrações contábeis	fevereiro	11	abril	12	X									

\* Posição até 17.08.10

\*\* Projetos que começaram a elaborar o TOR

## 4.2 Data limite para início das licitação dos projetos de AT

Estabelecimento de uma data limite para início da licitação (Manifestação de Interesse/edital ) dos seguintes projetos de assistência técnica:

- ETICE = 1 Projeto
- PGE = 2 Projetos
- IPECE = 2 Projetos
- SEPLAG/CECOC = 2 Projetos
- SEPLAG / CPLOG = 1 Projeto
- SEFAZ = 1 Projeto
- SESA = 3 Projetos
- TCE = 2 Projetos

**TOTAL = 14 PROJETOS DE 34 OU SEJA 41%**

# OPERAÇÃO Swap II

## 5 - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DAS SETORIAIS

# OPERAÇÃO Swap II

**SEFAZ**

# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES PRIMÁRIOS

# Gestão do Setor Público

## Secretaria da Fazenda - SEFAZ


### 1. Saldo Fiscal Corrente do Estado (Receita Correntes menos Despesas Correntes).

- **Meta 2010:** R\$ 1.219 milhões
- **Posição em 31/07:** R\$ 816,4 milhões
- **Posição em 31/07 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** As receitas e as despesas correntes se comportam conforme o esperado.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta será cumprida até o final do ano.

# Gestão do Setor Público

## Secretaria da Fazenda - SEFAZ

### Saldo Fiscal Corrente do Estado

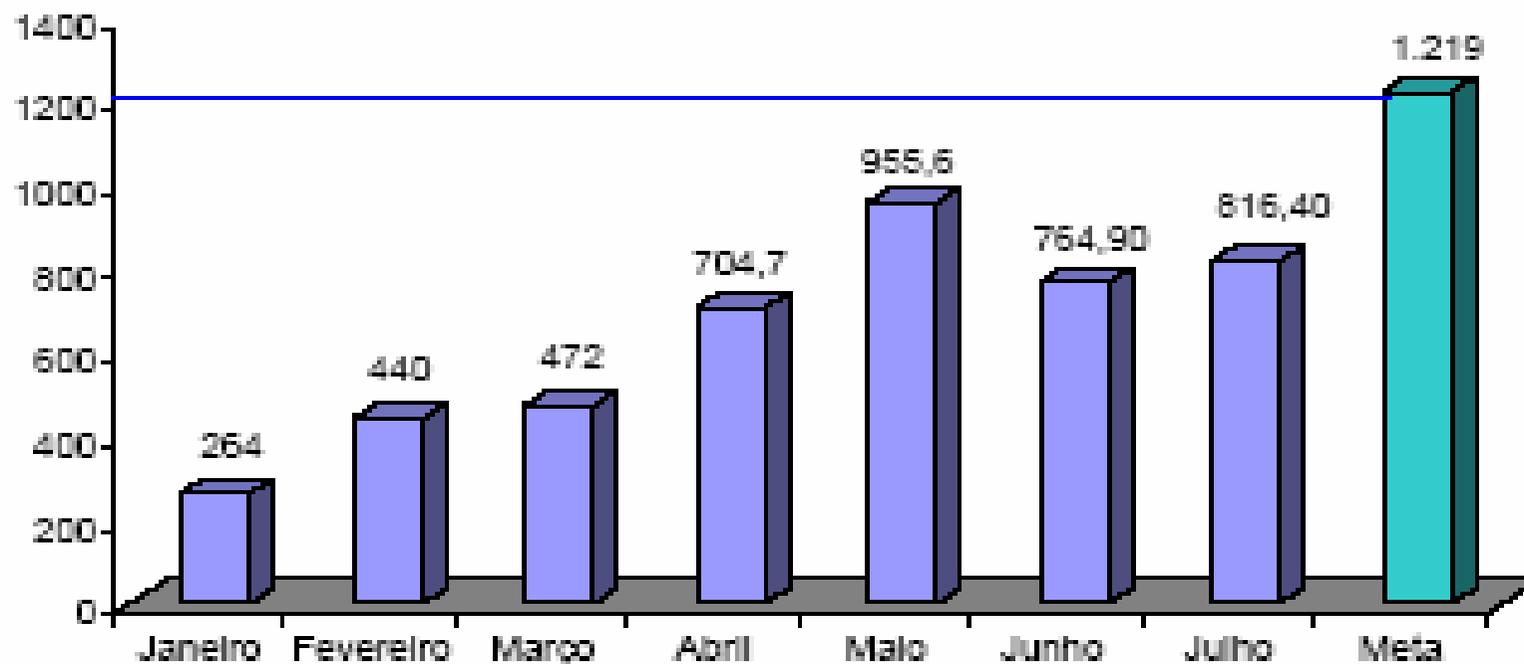

Sentido do Indicador ↑

# Gestão do Setor Público

## Secretaria da Fazenda - SEFAZ


### 2. Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).

- **Meta 2010:**  $\leq 0,35$
- **Posição em 31/07:** 0,30
- **Posição em 31/07 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Não há nenhuma indicação de que haja concentração de arrecadação de ICMS em algum dos setores estudados que possa aumentar o índice além da meta.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Permaneceremos dentro da meta até o final do ano.

# Gestão do Setor Público

## Secretaria da Fazenda - SEFAZ

### Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores

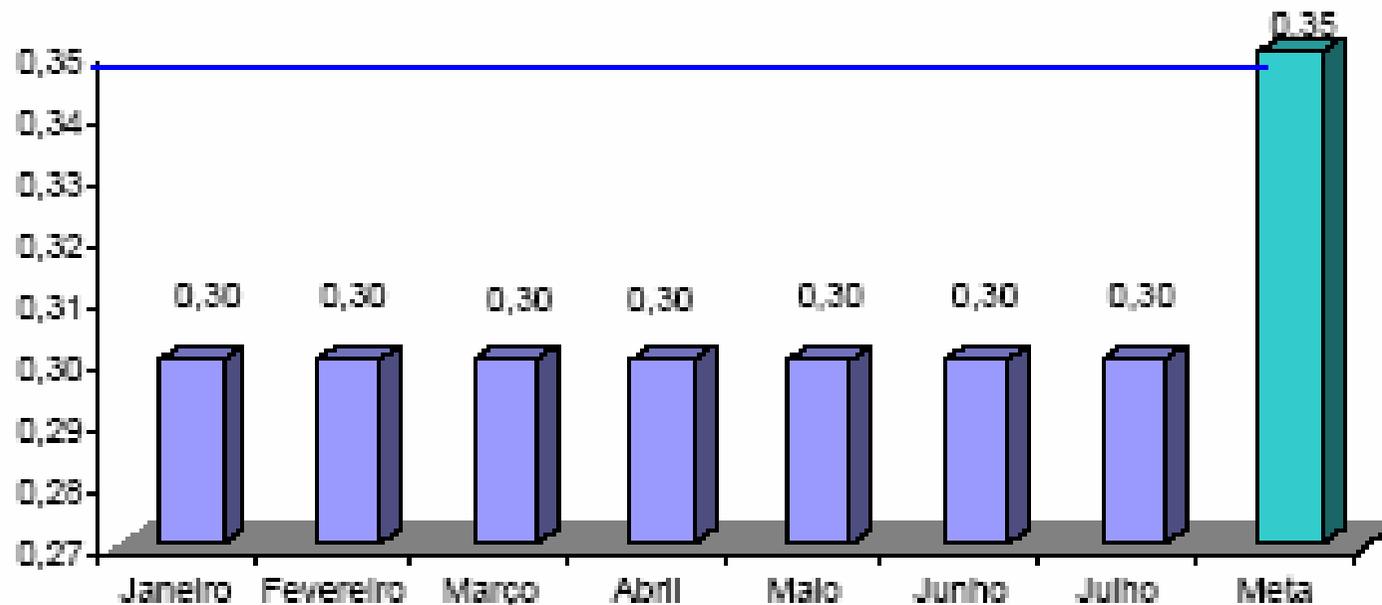

Sentido do Indicador ↓

# Negócios e Inovação

Secretaria da Fazenda - SEFAZ


## 3. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos em 72 horas.

- **Meta 2010:**  $\geq 29\%$
- **Posição em 31/07:** 30,23%
- **Posição em 31/07 em relação à meta:** 

# Negócios e Inovação

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Percentual de registros empresariais no CGF concluídos em 72 horas

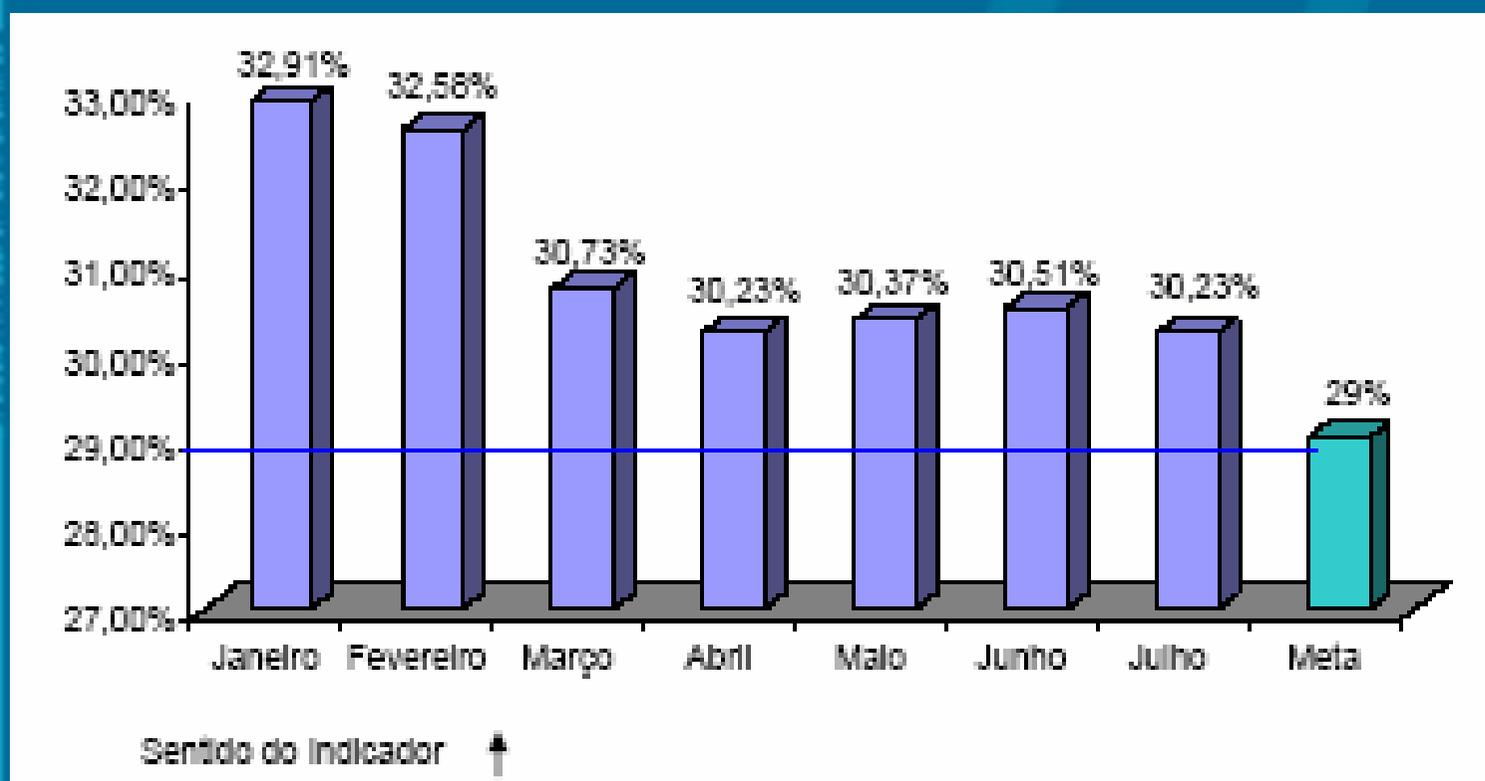

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

# Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

## 4. Implementação da reforma da gestão financeira (com base no diagnóstico do PEFA).

- Posição em 31/07 em relação à meta:
- O Protocolo do Indicador ainda não foi elaborado.
- Reunião com BM e IPECE em 05/08/10 solicitando definição do indicador da SEFAZ

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

## **5. Financiamento de recomendações apresentadas em diagnóstico sobre implantação do PEFA no Estado.**

- **Responsável: José Carlos**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 300 mil**
- **Método de Aquisição: SBQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Novembro de 2009 – Setembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Prestação dos serviços**
- **Estágio Atual: Revisando o TOR. Elaborada justificativa de dispensa de licitação em 16/08/10.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

# OPERAÇÃO Swap II

**SEPLAG**

# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES PRIMÁRIOS

# Gestão do Setor Público

## Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

### 6. Número de Secretarias Setoriais com Relatórios Anuais de Desempenho Validados pela SEPLAG e pelo COGERF e Colocados na Página Eletrônica da SEPLAG.

- **Meta 2010:** 11
- **Posição em 31/07:** -
- **Posição em 31/07 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Realizada pelas secretarias a revisão das matrizes setoriais. Redefinido relatório de acompanhamento do desempenho de programas/produtos. Em desenvolvimento no WebMapp o módulo de acompanhamento de indicadores on-line para geração dos relatórios em meio eletrônico.

### 7. Número de “Relatórios Produto- Resultado” (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- Meta 2010: 5
- Posição em 31/07: -
- Posição em 31/07 em relação à meta: 
- Perspectiva de Cumprimento: A perspectiva é de cumprimento do indicador. O edital encontra-se em análise na PGE.

# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES SECUNDÁRIOS

# Gestão do Setor Público

## Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG


### 8. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.

- **Meta 2010:** 2
- **Posição em 31/07:** -
- **Posição em 31/07 em relação à meta:** ██████████
- **Perspectiva de cumprimento:** A perspectiva é de cumprimento do indicador. A elaboração dos documentos se dá no segundo semestre.
- **Plano de ação:** Inclusão de anexo, no Orçamento, c/ posição atualizada dos indicadores estratégicos setoriais; inclusão no pronunciamento do Governador do desempenho anual dos indicadores de Governo (Mensagem à Assembléia Legislativa – sessão de abertura)

# Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG


## 9. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.

- **Meta 2010:** 0-3 meses
- **Posição em 31/07:** 2,59 meses
- **Posição em 31/07 em relação à meta:** 

# Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.**

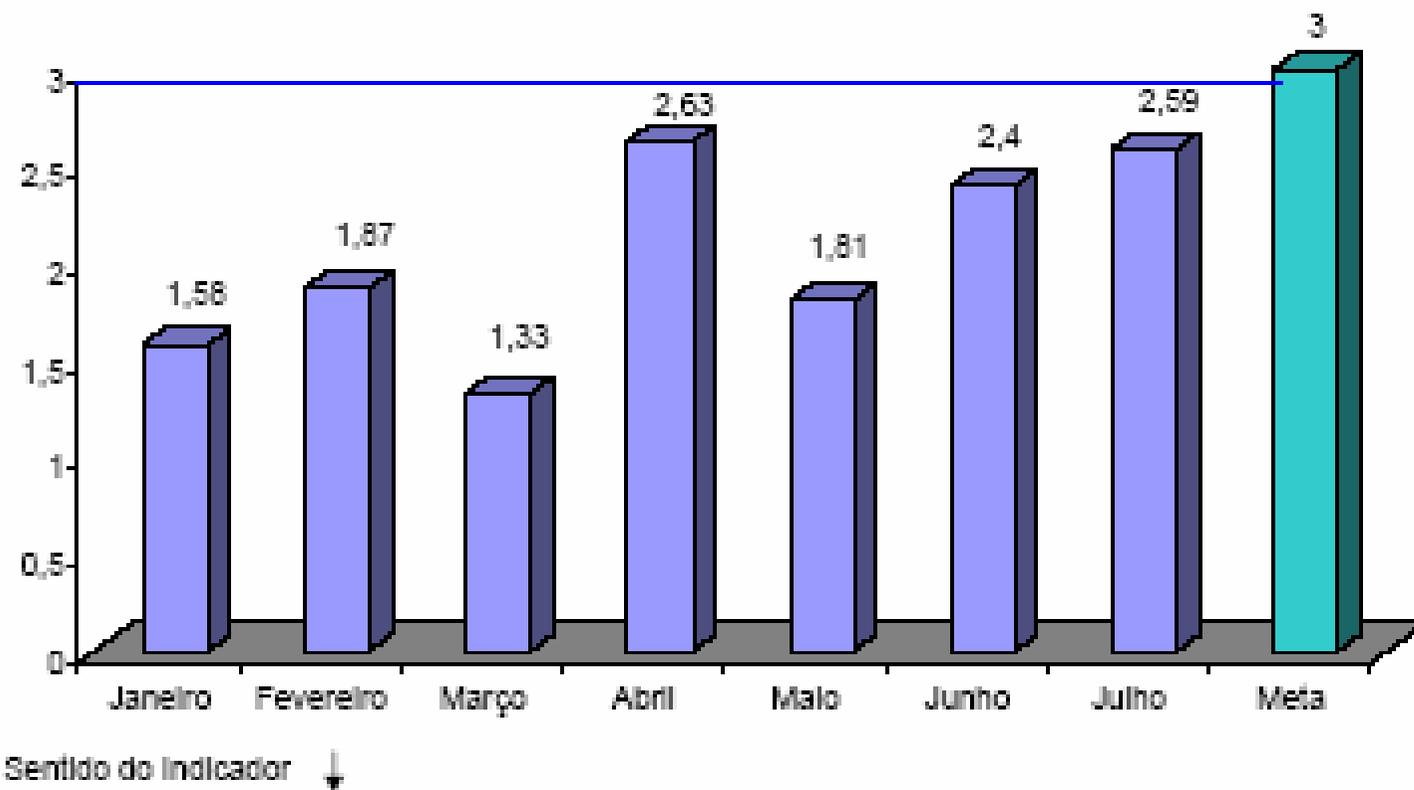

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

## **10. Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados.**

- **Responsável: Fátima Falcão**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 200 mil**
- **Método de Aquisição: SBQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2011**
- **Estágio Previsto: Abertura pública das propostas financeiras**
- **Estágio Atual: Em 11/08/10, o BM enviou suas observações à SDP.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## **11. Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará**

- **Responsável: Sérgio Lage e Fernanda Salles**
- **Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria**
- **Valor: US\$ 100 mil**
- **Método de Aquisição: Shopping**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2012**
- **Estágio Previsto: Não objeção do BM à minuta do contrato**
- **Estágio Atual: Adjudicação e homologação do contrato**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

## **12. Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras.**

**Responsável: Soraya e Ana Portela**

**Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria**

**Valor: US\$ 200 mil**

**Método de Aquisição: SBQC**

**Revisão Prévia/Posterior: Prévia**

**Início/Término: Julho de 2009 – Dezembro de 2011**

**Estágio Previsto: Preparar e enviar convite às empresas da lista curta**

**Estágio Atual: O processo será cancelado. Será elaborado um novo projeto.**

**Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

**Valor alterado com transferência de US\$60 mil para o projeto de custos recorrentes.**

**13. Realização de ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do Governo à sociedade em geral e às entidades representativas das empresas.**

- **Responsável: Soraya e Ana Portela**
- **Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria**
- **Valor: US\$ 30 mil**
- **Método de Aquisição: Shopping**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Outubro de 2009 – Dezembro de 2011**
- **Estágio Previsto: Prestação de serviços**
- **Estágio Atual: O processo será cancelado. Será elaborado um novo projeto**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

**14. Implantação de Centros de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará.**

- **Responsável: Carlos Eduardo**
- **Categoria de Licitação: Consultoria Individual**
- **Valor: US\$ 120 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Novembro de 2009 – Dezembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Prestação de serviços**
- **Estágio Atual: Reelaborando o TOR com base nas recomendações dos Especialista do BM.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

**15. Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico – Financeira do Estado do Ceará.**

- **Responsável: Mário Fracalossi**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 90 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Outubro de 2009 – Maio de 2011**
- **Estágio Previsto: Envio da SDP/convite à empresa vencedora**
- **Estágio Atual: Não objeção à SDP, lista curta e relatório de avaliação em 09/08/10.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

# OPERAÇÃO Swap II

**SEDUC**

# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES PRIMÁRIOS

# Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

**16. Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com o relatório de melhores práticas.**

- **Meta 2010:**  $\geq 90\%$
- **Posição em 31/07:** -
- **Posição em 31/07 em relação à meta:** 

# Educação

## Secretaria da Educação - SEDUC


### 17. Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.

- **Meta 2010:** 75%
- **Posição em 31/07:** 100%
- **Posição em 31/07 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Continuam designados para o PAIC 184 gerentes e dois auxiliares por município.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

# Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.

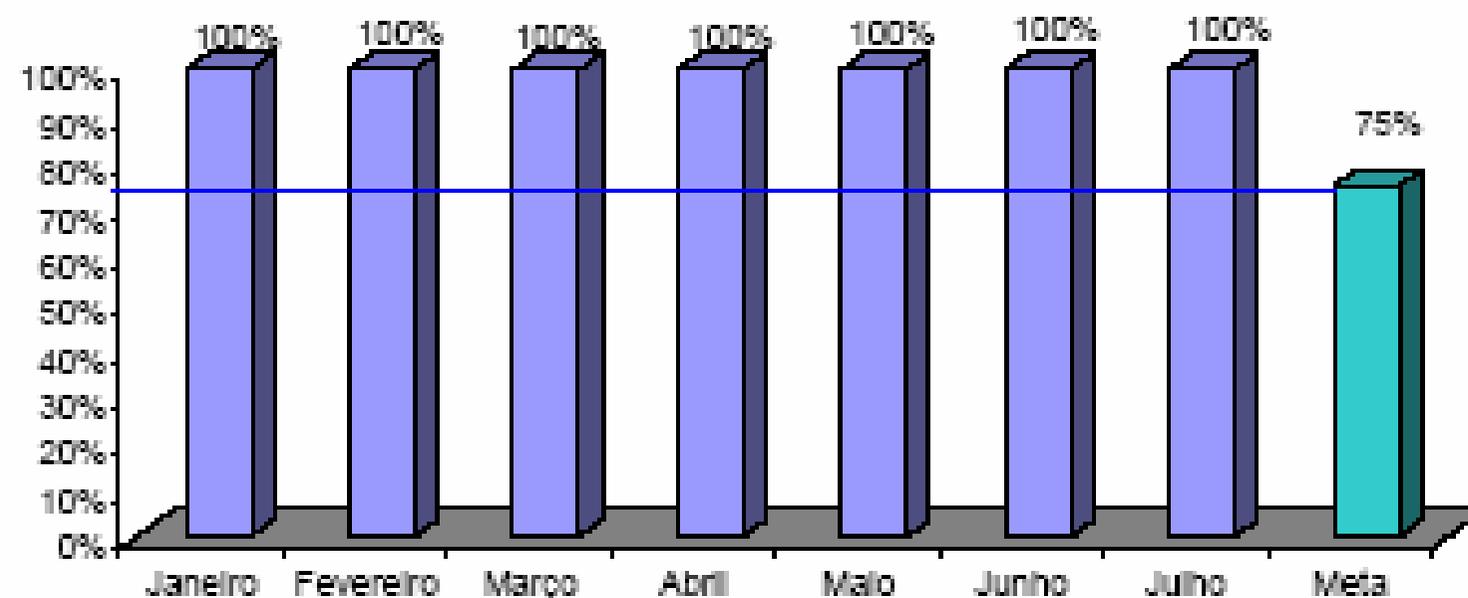

Sentido do Indicador ↑

# Educação

## Secretaria da Educação - SEDUC


**18. Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.**

- **Meta 2010:**  $\geq 75\%$
- **Posição em 31/07:** **100%**
- **Posição em 31/07 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** O material foi distribuído para todas as escolas beneficiárias do programa.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida

# Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas

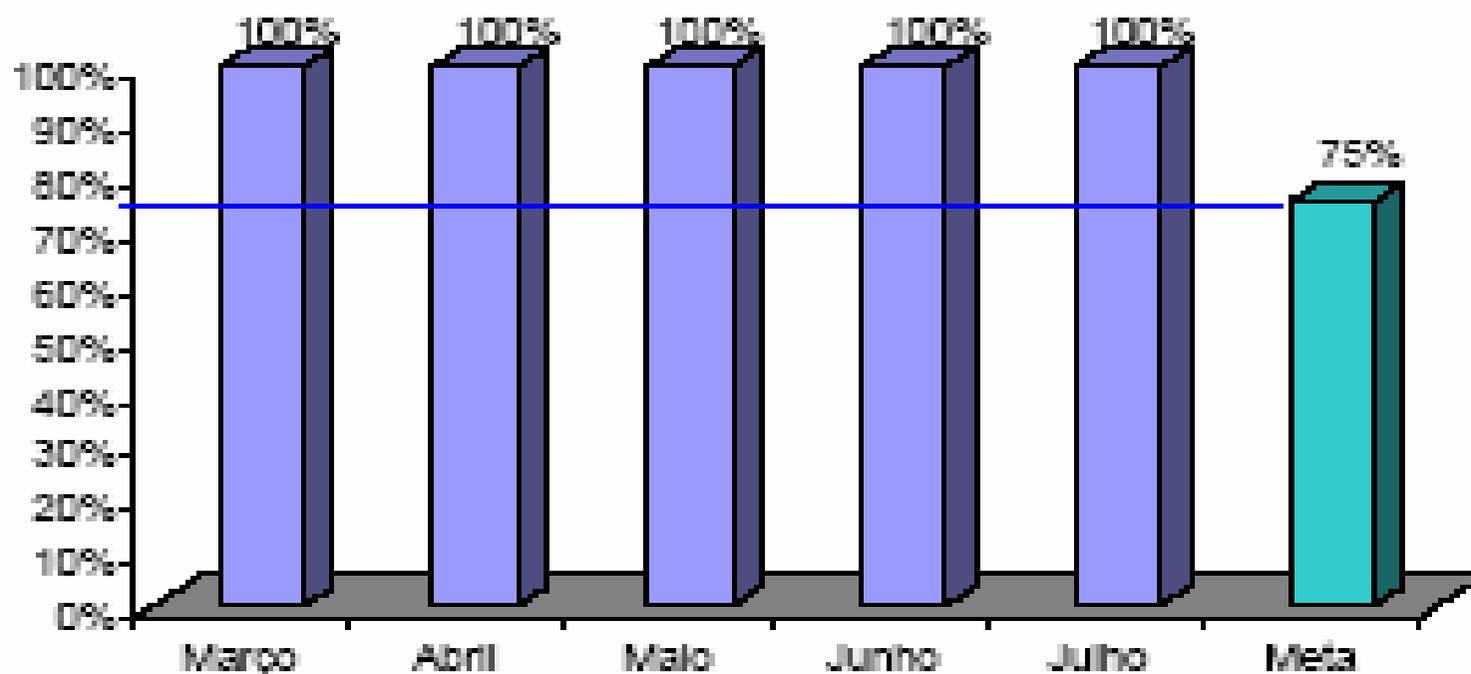

Sentido do indicador ↑

# Educação

## Secretaria da Educação - SEDUC


### 19. Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.

- **Meta 2010:** 50%
- **Posição em 31/07:** 100%
- **Posição em 31/07 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** A ajuda financeira aos gerentes é uma forma de incentivo ao bom desenvolvimento do Programa.
- **Plano de Ação:** Elaboração das folhas de pagamento mensais como base para que a FUNCAP deposite o recurso na conta de cada gerente. Os gerentes vêm sendo pagos normalmente.

# Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.

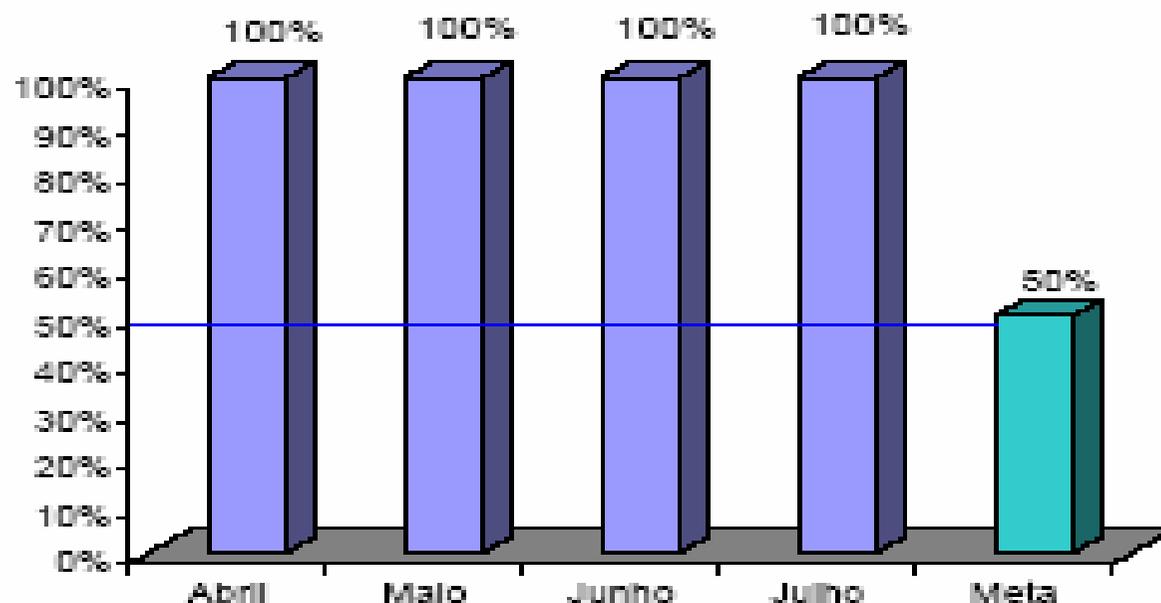

Sentido do Indicador ↑

# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES SECUNDÁRIOS

# Educação

Secretaria de Educação - SEDUC

## 20. Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- **Meta 2010:** 68%
- **Posição em 31/07:** -
- **Posição em relação à meta:** 

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

## 21. Avaliação do Programa E-Jovem.

- **Responsável: Eneida Machado**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 70 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Agosto de 2009 – Setembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Prestação de serviços**
- **Estágio Atual: Prestação de serviços. Publicação do extrato de aditivo ao contrato em 20/07/10.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

**22. Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 1ª Etapa**

- **Responsável: Eneida Machado**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 35 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Julho de 2009 a julho de 2010**
- **Estágio Previsto: Prestação do serviço**
- **Estágio Atual: Serviço sendo prestado. Publicação do extrato de aditivo ao contrato em 20/07/10**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

**23. Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 2ª Etapa**

- **Responsável: Eneida Machado**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 35 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Agosto de 2010 a julho de 2011**
- **Estágio Previsto: Início do processo**
- **Estágio Atual: TOR elaborado. Em 09/08/10 foi recebida a não objeção BM com a finalidade de dar continuidade ao processo com duas empresas da lista curta.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

**24. Serviço de consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará**

- **Responsável: Eneida Machado e Kennedy**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 90 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Agosto de 2010 a Agosto de 2011**
- **Estágio Previsto: -**
- **Estágio Atual: Data limite para recebimento das manifestações de interesse em 16/08/10.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

# OPERAÇÃO Swap II

**SESA**

# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES PRIMÁRIOS


### 25. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.

- Meta 2010: 25%
- Posição em 31/07: 42,8%
- Posição em 31/07 em relação à meta: 
- Justificativa: Os articuladores Regionais para a AMQ já estão atuando nos municípios de Fortaleza, Caucaia, Baturité, Itapipoca, Russas, Limoeiro do Norte, Sobral, Acaraú, Tianguá, Tauá, Crateús, Camocim, Juazeiro do Norte e Cascavel.

# Saúde

## Secretaria da Saúde - SESA

Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.

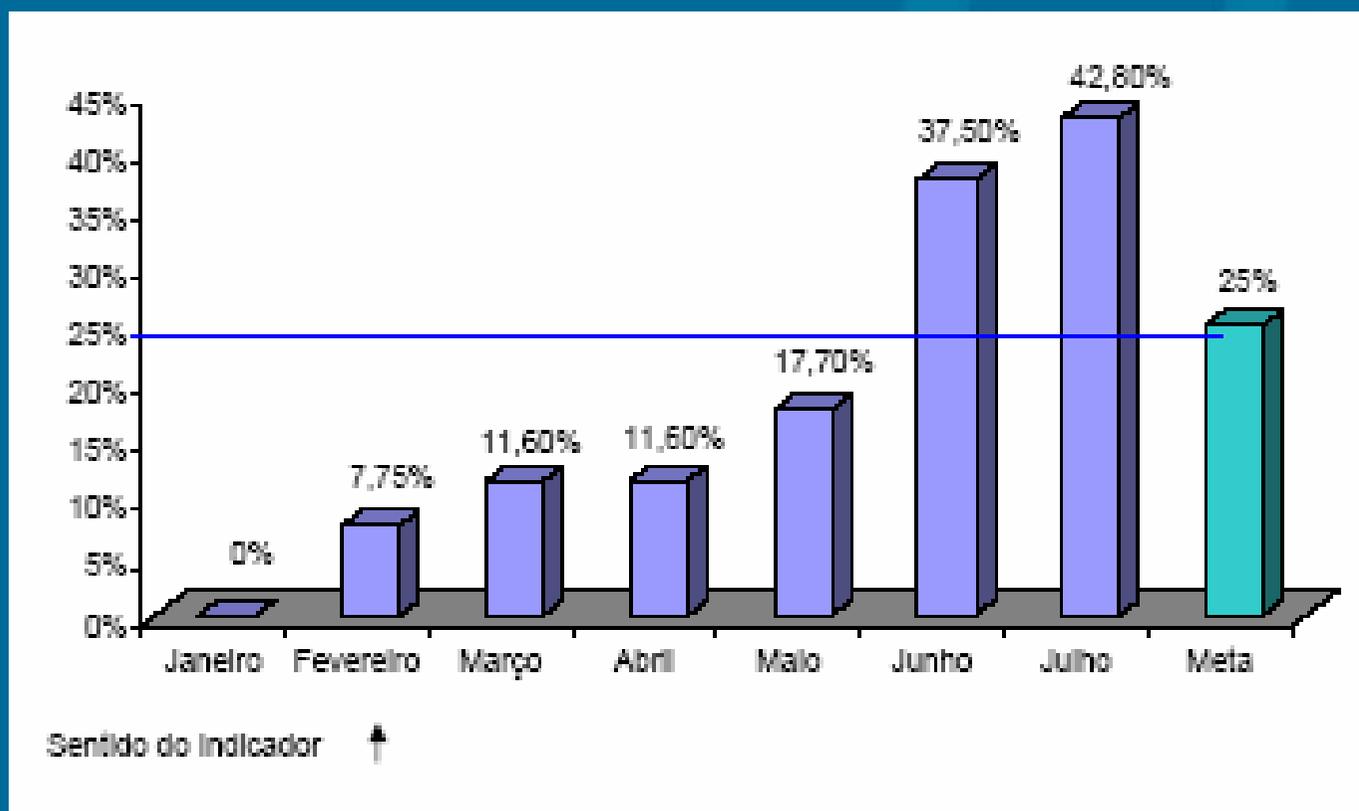


### 26. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.

- **Meta 2010:** 25%
- **Posição em 31/07:** -
- **Posição em 31/07 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** O resultado será analisado no encerramento do exercício de 2010.

# Saúde

## Secretaria da Saúde - SESA

Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ

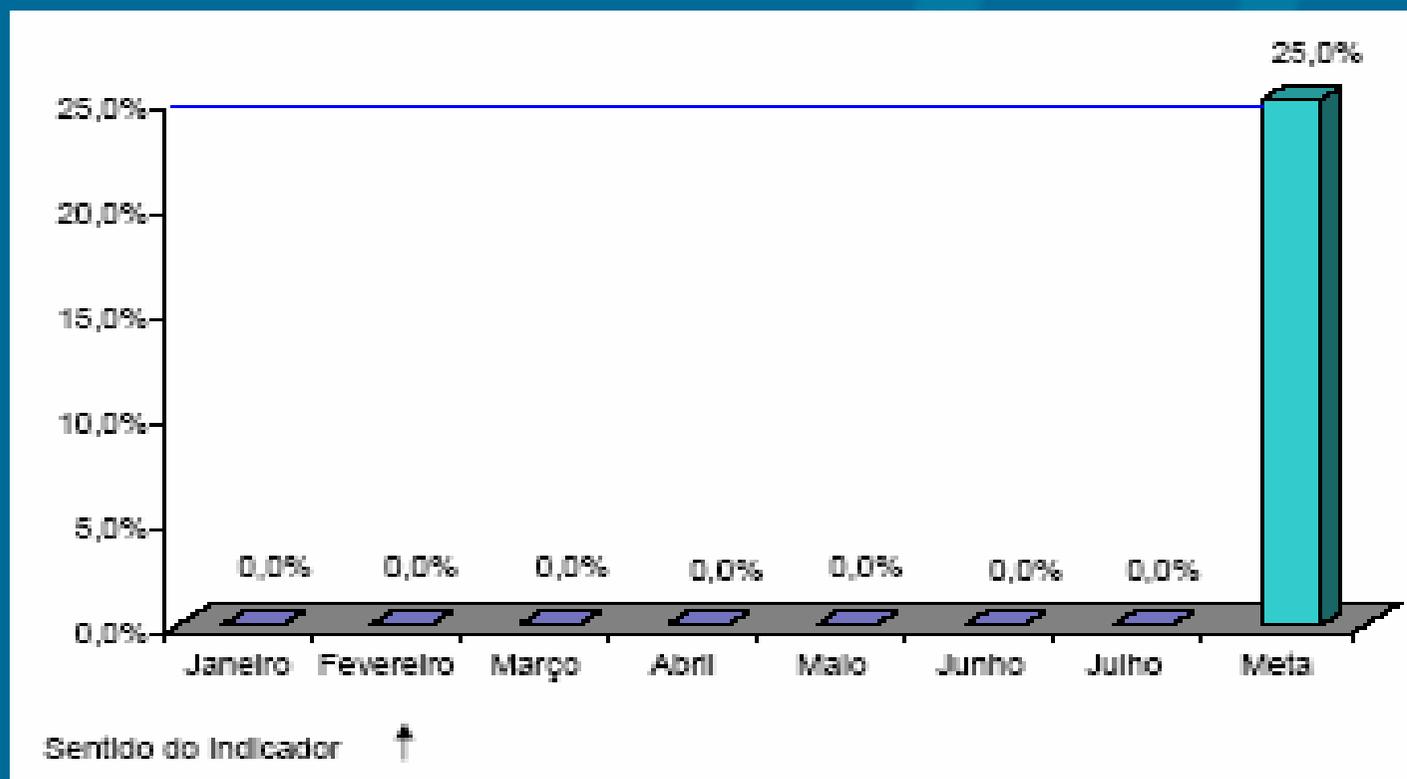

# Saúde

Secretaria da Saúde - SESA


**27. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei nº. 6.437/1977.**

- **Meta 2010: 10**
- **Posição em 31/07: 13**
- **Posição em 31/07 em relação à meta: **

# Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

## Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei nº. 6.437/1977

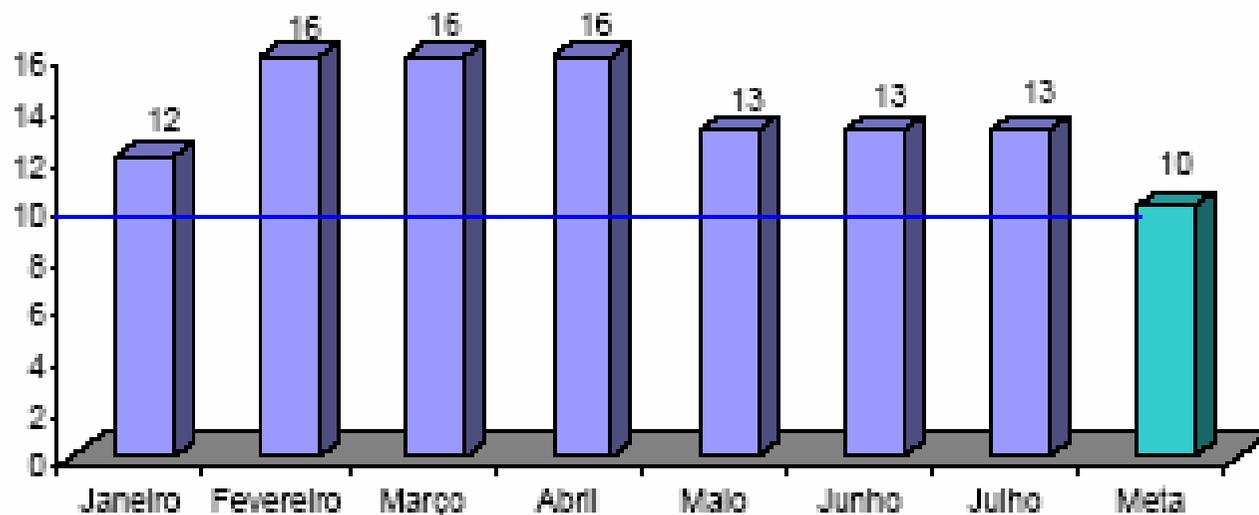

Sentido do Indicador ↑

# Saúde

## Secretaria da Saúde - SESA

**28. Nº de hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos à SESA.**

■ **Meta 2010: 15**

■ **Posição em 31/07: 0**


■ **Posição em 31/07 em relação à meta: **

■ **Justificativa: A consultoria individual para a validação do método de apuração de custos foi concluída e enviado para a SESA o Relatório Final, que será utilizado como subsídio para o desenvolvimento da consultoria 2. O alcance desta meta está diretamente relacionado aos produtos das 5 consultorias programadas nesta área.**

# Saúde

## Secretaria da Saúde - SESA

Número de hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de custos e que remetem relatórios anuais de custos à SESA

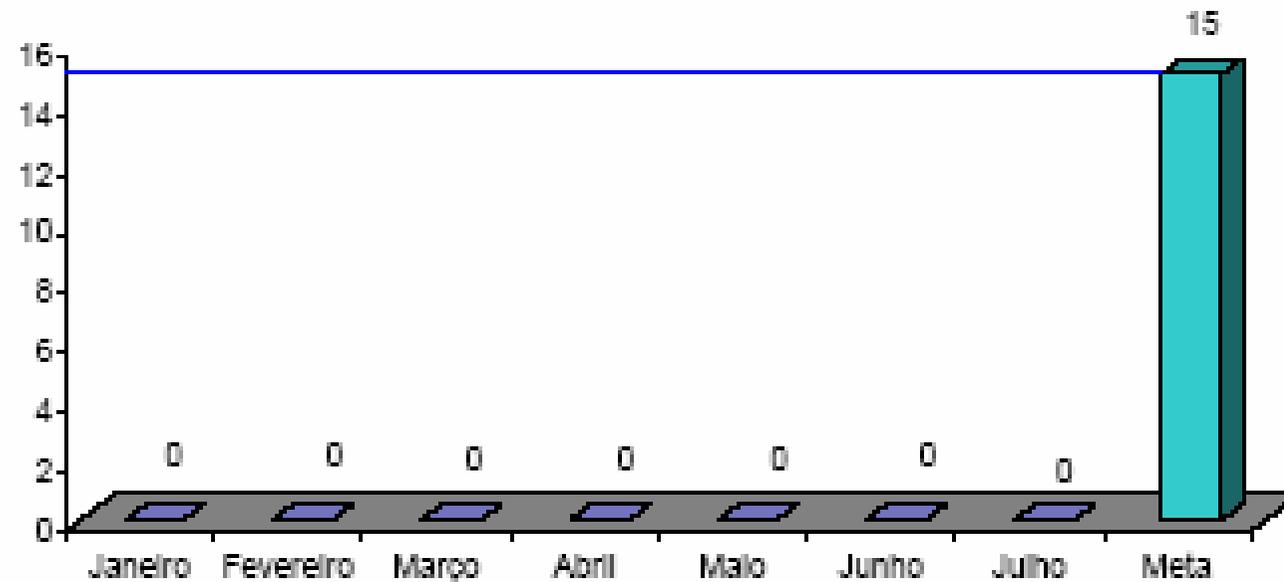


Sentido do Indicador ↑

# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES SECUNDÁRIOS


### 29. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.

- **Meta 2010:** 6.394.791
- **Posição em 31/07:** 6.421.752
- **Posição em 31/07 em relação à meta:** 

# Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

## População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.

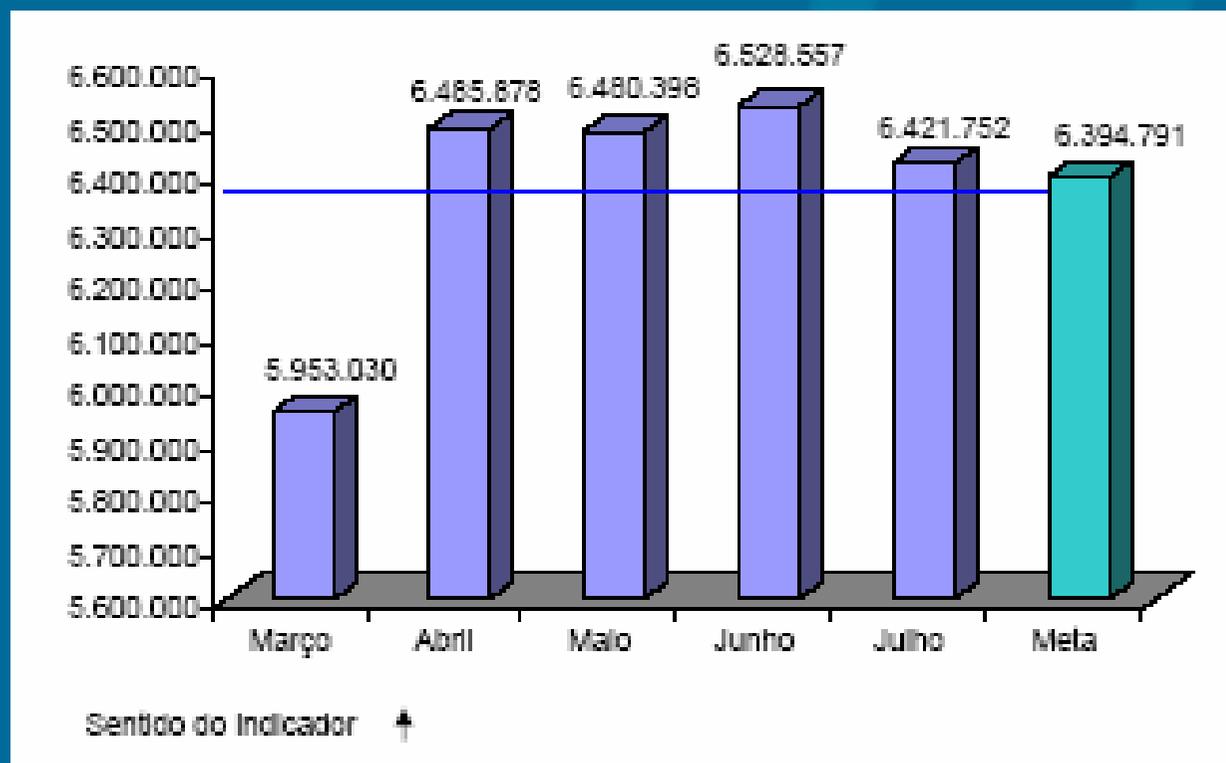

### 30. Relatórios semestrais do “Grupo da Água” para combater a diarreia infantil que leva à internação.

- **Meta 2010:** 2
- **Posição em 31/07:** 1
- **Posição em 31/07 em relação à meta:** 

# Saúde

Secretaria da Saúde - SESA


## 31. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.

- **Meta 2010:** 60%
- **Posição em 31/07:** 76,1%
- **Posição em 31/07 em relação à meta:** 

# Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

## Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês

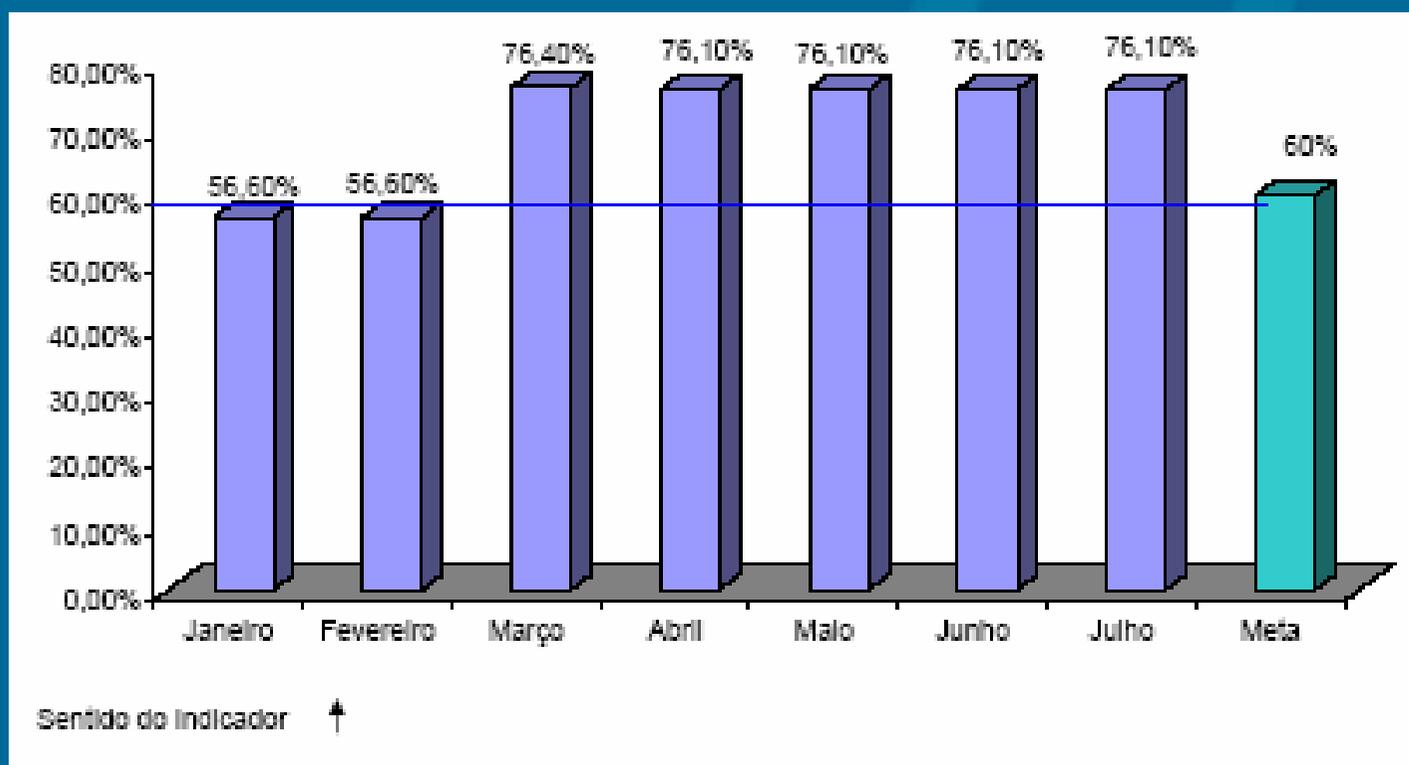

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

### **32. Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Sistema de Informação de AMQ.**

- **Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 40 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Junho de 2009 – Abril de 2011**
- **Estágio Previsto: Notificação e adjudicação do contrato**
- **Estágio Atual: SDP em análise na PGE desde 26/07/10**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

**33. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Desenho e implantação do software de custeio por absorção.**

- **Responsável: Vera Coelho e Helena Lima**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 30 mil**
- **Método de Aquisição: SBQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Abril de 2010 – Setembro de 2011**
- **Estágio Previsto: Recebimento da proposta técnico-financeira da empresa vencedora**
- **Estágio Atual: Aguardando publicação da MI. Processo encontra-se na SEPLAG para emissão de parecer.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

**34. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Estratégia de capacitação e disseminação do uso do software.**

- **Responsável: Vera Coelho e Helena Lima**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 90 mil**
- **Método de Aquisição: SBQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Abril de 2010 – Agosto de 2011**
- **Estágio Previsto: Abertura pública das propostas financeiras**
- **Estágio Atual: MI publicada em 03/08/10.  
Recebimento dos portfólios até 17/08/10.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

### **35. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais pólo – Validação da Metodologia.**

- **Responsável: Vera Coelho e Helena Lima**
- **Categoria de Licitação: Consultoria Individual**
- **Valor: US\$ 30 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de Consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Junho de 2009 – Julho de 2010**
- **Estágio Previsto: Término do contrato**
- **Estágio Atual: Contrato finalizado em 09/07/10. O relatório final entregue pelo consultor está sendo analisado pela SESA.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

### **36. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais pólo – Definições e ajustes no modelo de absorção.**

- **Responsável: Vera Coelho e Helena Lima**
- **Categoria de Licitação: Consultoria Individual**
- **Valor: US\$ 50 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V - Diretrizes de Consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Abril de 2010 – Setembro de 2011**
- **Estágio Previsto: Avaliação dos currículos pela comissão**
- **Estágio Atual: Elaborando relatório de avaliação e seleção de consultores desde o dia 30/07/10.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

**37. Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de equipamentos de informática para habilitar as CRES.**

- **Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca**
- **Categoria de Licitação: Bens**
- **Valor: US\$ 160 mil**
- **Método de Aquisição: Pregão**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Março de 2010 – Dezembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Elaboração do contrato**
- **Estágio Atual: Edital sendo elaborado. A especificação técnica está na informática da SESA para emissão de parecer.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

**38. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação.**

- **Responsável: Vera Coelho e Helena Lima**
- **Categoria de Licitação: Bens**
- **Valor: US\$ 600 mil (valor sendo redefinido)**
- **Método de Aquisição: Pregão**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Março de 2010 – Dezembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Elaboração do contrato**
- **Estágio Atual: Edital sendo elaborado. A especificação técnica está na informática da SESA para emissão de parecer.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

# OPERAÇÃO Swap II

**COGERH**

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR PRIMÁRIO**

# Água e Saneamento

## Secretaria de Recursos Hídricos - SRH


### 39. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.

- Meta 2010:  $\geq 27\%$
- Posição em 31/07: 21%
- Posição em 31/07 em relação à meta: 
- Justificativa: Durante o 1º semestre, a estimativa de captação é relativamente baixa (denominador), por isso, o indicador no primeiro semestre é sempre muito favorável. Apenas no 2º semestre, quando a estimativa de consumo aumenta, é que teremos uma melhor sinalização do indicador. Ao longo do restante do ano, a posição atual do indicador poderá diminuir em relação à meta estabelecida.
- Perspectiva de Cumprimento: Alta

# Água e Saneamento

Secretaria de Recursos Hídricos - SRH

Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.

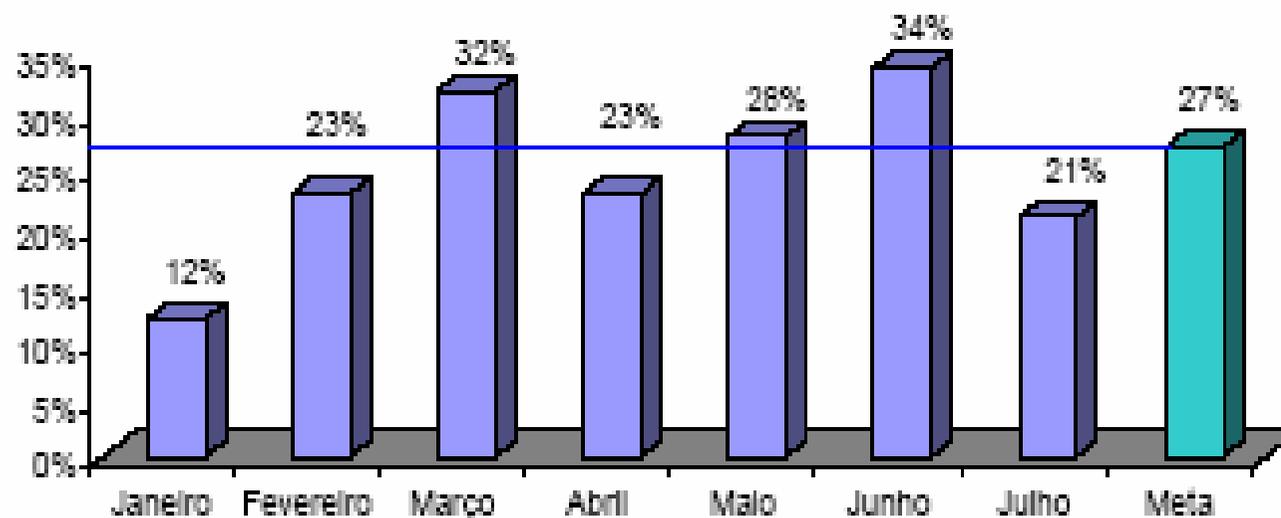

Sentido do Indicador ↑

# OPERAÇÃO Swap II

**CAGECE**

# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES PRIMÁRIOS

# Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE


## 40. Número de ligações urbanas de água.

- **Meta 2010: 198.708**
- **Posição em 31/07: 232.114**
- **Posição em 31/07 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a julho de 2010 foram executadas 232.114 ligações domiciliares de água.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

# Água e Saneamento

## Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

### Número de ligações urbanas de água

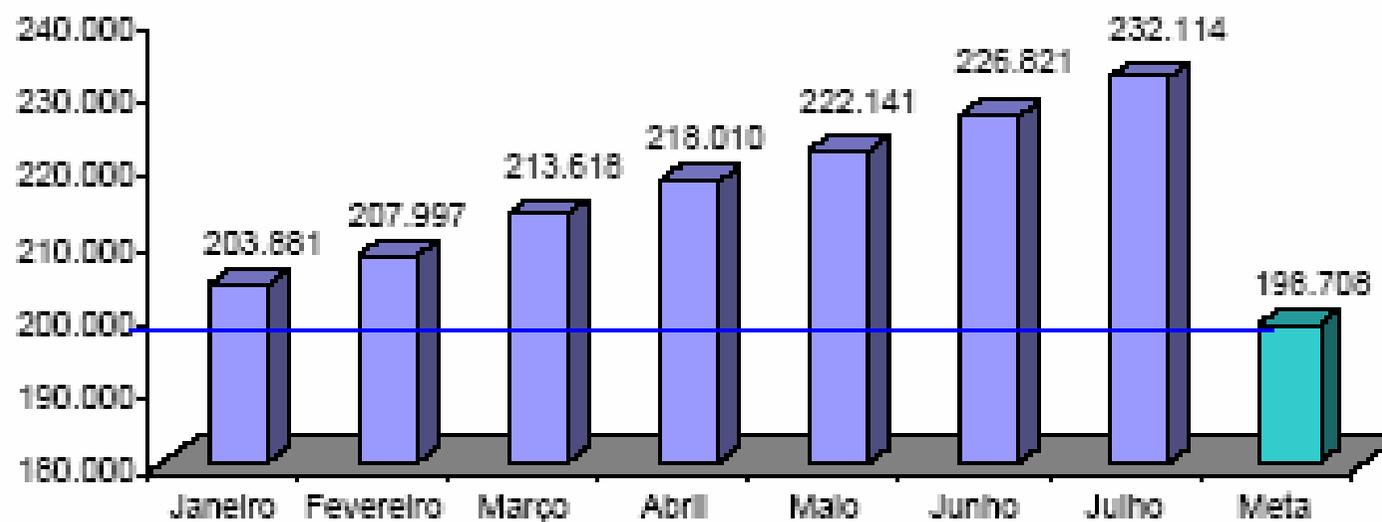


Sentido do Indicador ↑

# Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE


## 41. Número de ligações de esgotos.

- **Meta 2010:** 88.717
- **Posição em 31/07:** 109.729
- **Posição em 31/07 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a julho de 2010 foram executadas 109.729 ligações domiciliares de esgoto.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

# Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

## Número de ligações de esgoto

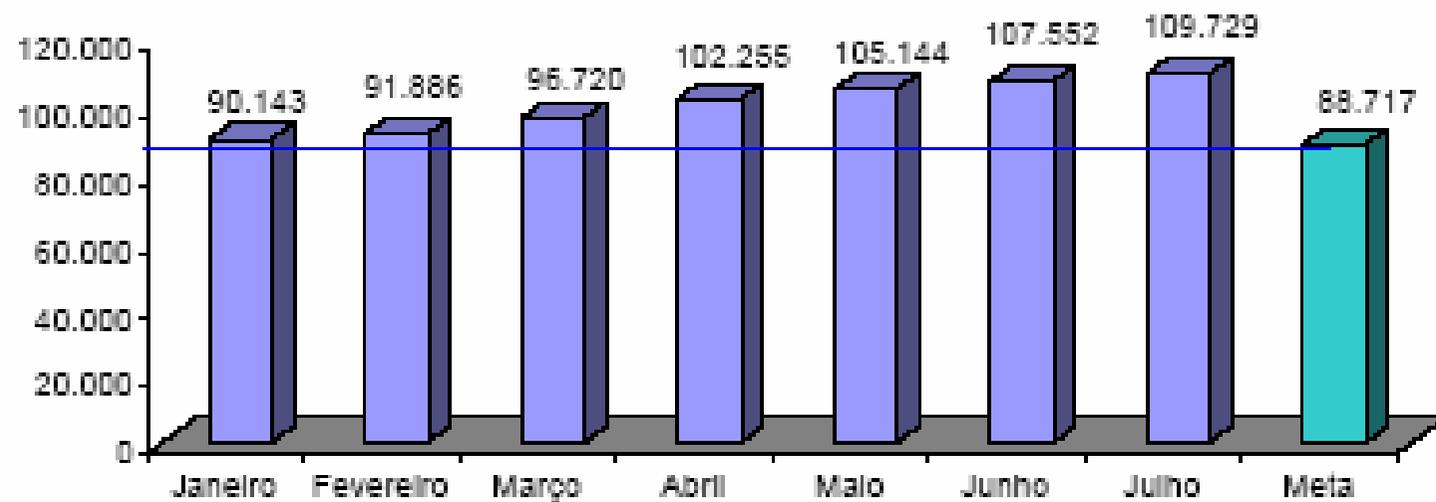

Sentido do Indicador ↑

# Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

## 42. Percentual de Perda de Água.


- **Meta 2010:**  $\leq 27\%$
- **Posição em 31/07:** 25,86%
- **Posição em 31/07 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a junho de 2010 o percentual de perda de água foi de 25,86%.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida

\* Dados de junho/2010.

# Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

## Percentual de Perda de Água

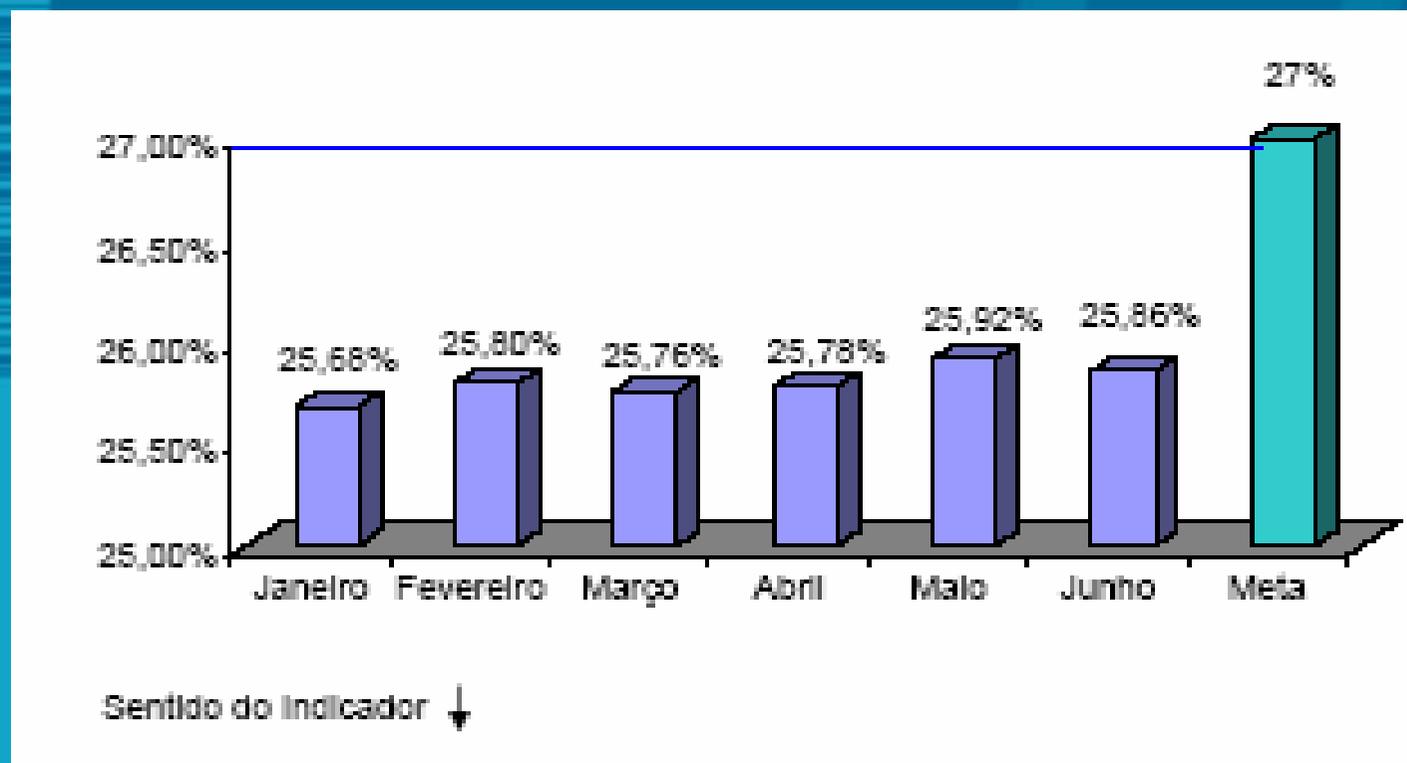

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

# Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

## 43. Margem do EBTIDA da CAGECE.


- **Meta 2010: 29,00%**
- **Posição em 31/07: 28,68%\***
- **Posição em 31/07 em relação à meta:** 

\* Dados de junho/2010.

# Água & Saneamento

## Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

### Margem do EBTIDA da CAGECE

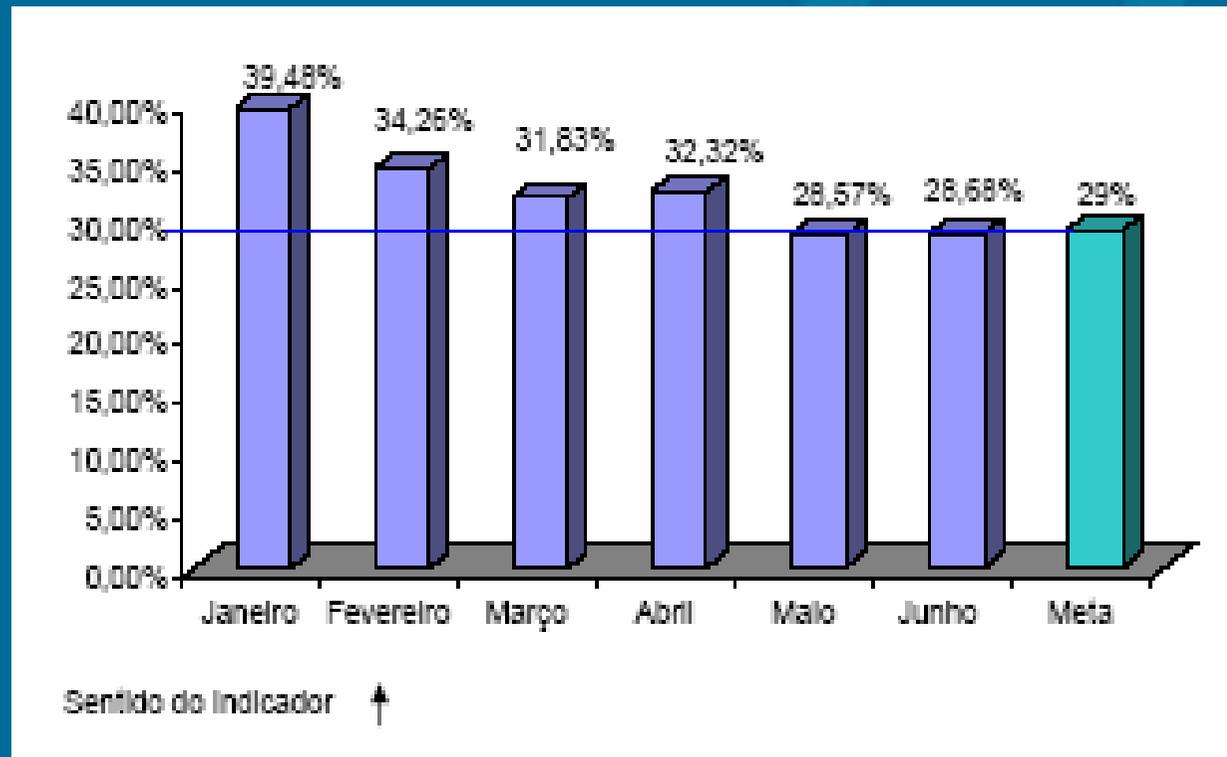

# OPERAÇÃO Swap II

**ETICE**

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR PRIMÁRIO**

# Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE


## 44. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.

- **Meta 2010:** 3.311.300
- **Posição em 31/07:** 3.950.061
- **Posição em 31/07 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** A partir do Cinturão Digital, o GoC estenderá a rede banda larga aos municípios.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

# Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE

**Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.**

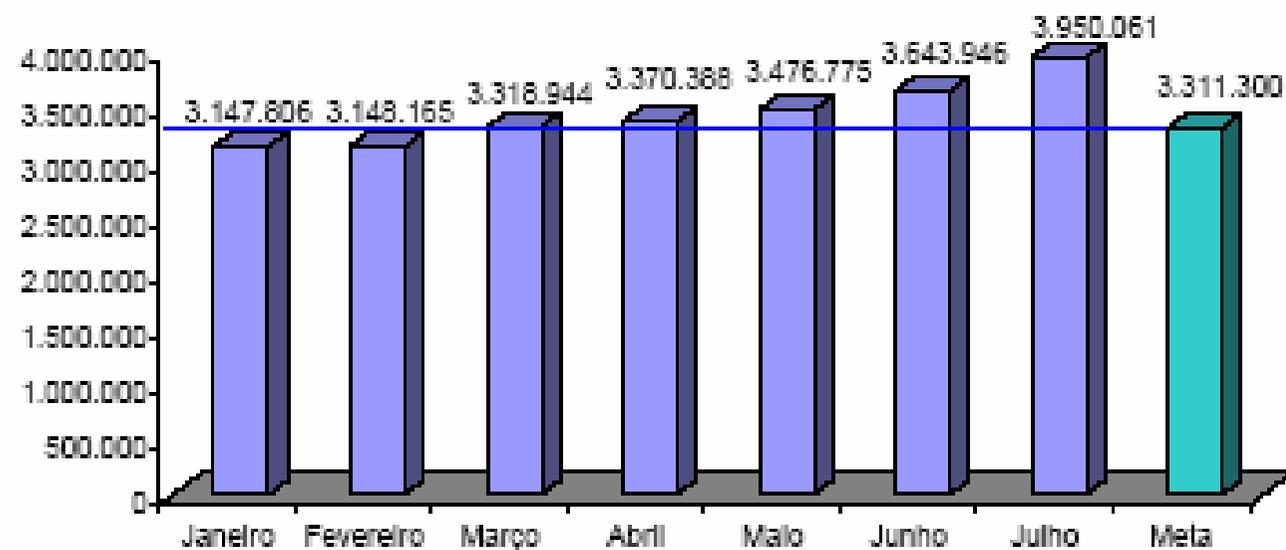

Sentido do Indicador ↑

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

### 45. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).

- **Meta 2010: 2**
- **Posição em 31/07: Encontram-se em processo de desenvolvimento os dois sistemas componentes do S2GPR que deverão estar em funcionamento em 2010: Contabilidade e Compras – Pregão Eletrônico.**
- **Posição em 31/07 em relação à meta:** 

# OPERAÇÃO Swap II

**PGE**

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

# Gestão do Setor Público

Procuradoria Geral do Estado - PGE

## 46. Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos Indicadores do OECD).

- **Meta 2010:** 37
- **Posição em 31/07:** -
- **Posição em relação à meta:** 

# OPERAÇÃO Swap II

## PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**47. Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de empresa para capacitação nas áreas de licitação e administrativa**

- **Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro**
- **Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria**
- **Valor: US\$ 147 mil**
- **Método de Aquisição: SBQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Agosto de 2009 – Outubro de 2011**
- **Estágio Previsto: Recebimento das propostas da lista curta**
- **Estágio Atual: Minuta da MI, TOR e outros documentos do processo se encontram na COAF**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

**48. Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Congresso para capacitação nas áreas de licitação e administrativa**

- **Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro**
- **Categoria de Licitação: Empresas de Não Consultoria**
- **Valor: US\$ 53 mil**
- **Método de Aquisição: Shopping**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Janeiro de 2010 – Agosto de 2011**
- **Estágio Previsto: Assinatura do contrato**
- **Estágio Atual: A PGE encontra-se revisando o TOR.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

# OPERAÇÃO Swap II

**ARCE**

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

# Água & Saneamento

Agência Reguladora do Ceará - ARCE


## 49. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).

- Meta 2010: 70%
- Posição em 31/07: 17,24%
- Posição em 31/07 em relação à meta: 
- Justificativa: 29 relatórios concluídos de jan. a jul./10, dos quais 24 constataram não-conformidades na qualidade da água.
- Perspectiva de cumprimento: A meta p/ 2010 não será cumprida.
- Plano de ação: A CAGECE elaborou o Plano de Ação, que está sendo acompanhado pela ARCE, no intuito de atingir a meta fixada para 2011.

# Água & Saneamento

## Agência Reguladora do Ceará - ARCE

### Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE

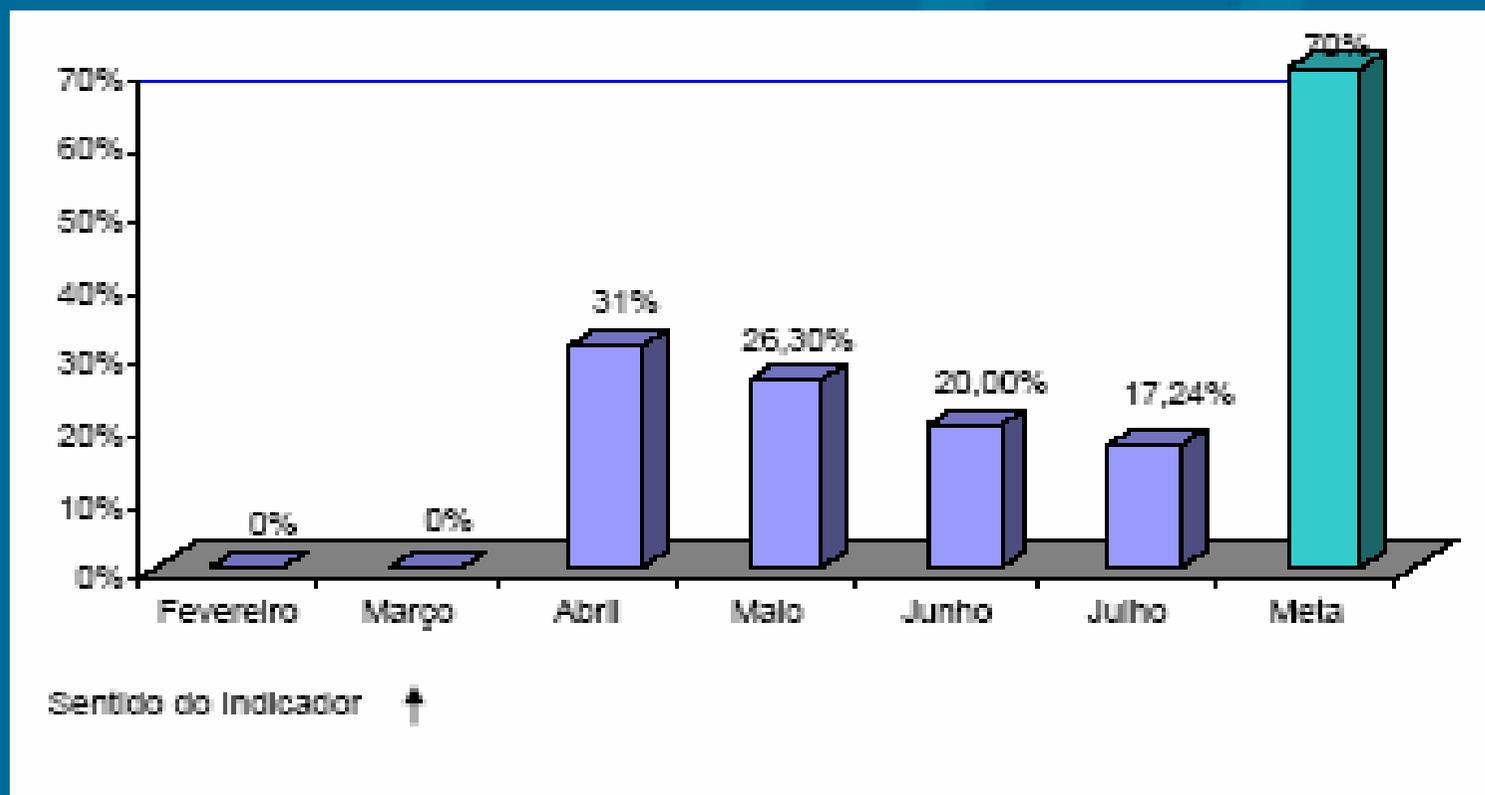

# OPERAÇÃO Swap II

## PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## **50. Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento.**

- **Responsável: Alceu de Castro Galvão Júnior**
- **Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria**
- **Valor: US\$ 70 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Junho de 2009 – Dezembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Convidar empresa vencedora p/ negociação do contrato**
- **Estágio Atual: Negociando contrato com a empresa vencedora desde 09/07.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

# OPERAÇÃO Swap II

**SECITECE**

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

# Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE


## 51. Número de serviços tecnológicos realizados

- **Meta 2010:** 44.935
- **Posição em 31/07:** 28.234
- **Posição em relação à meta:** 

# Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE

**Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.**

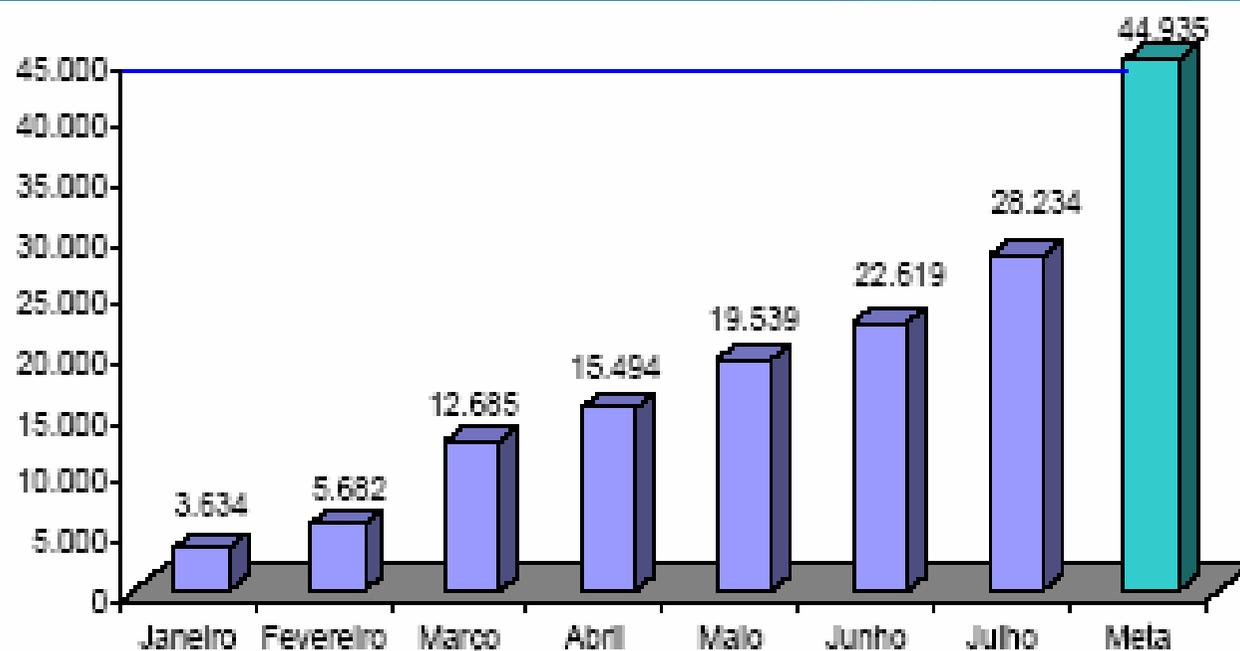

Sentido do Indicador ↑

# OPERAÇÃO Swap II

**CONPAM**

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

# Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM

**52. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado (percentual de licenças protocoladas na SEMACE no prazo de 60 dias).**


- **Meta 2010: 10%**
- **Posição em 31/07\*: 21%**
- **Posição em 31/07 em relação à meta: **

\*Dados de maio/10 a junho/10. O indicador é bimestral e calculado trimestralmente.

# Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM

Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado (percentual de licenças protocoladas na SEMACE no prazo de 60 dias).

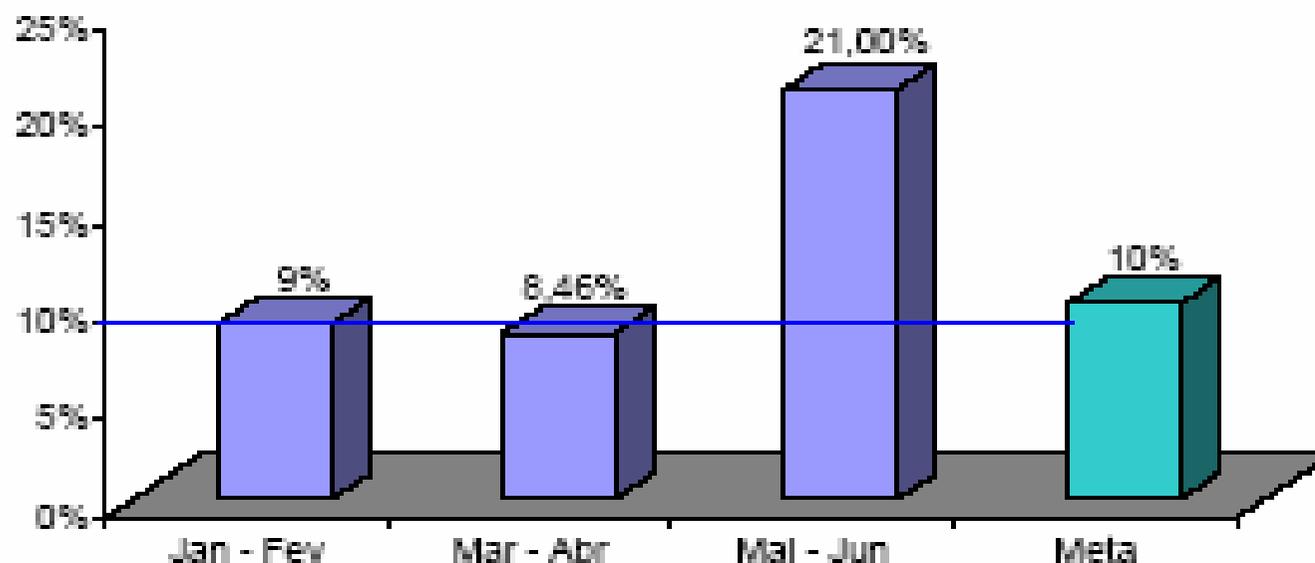

Sentido do Indicador ↓

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETO DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

**53. Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente.**

- **Responsável: Maria Goretti de Castro e Maria Dias**
- **Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria**
- **Valor: US\$ 40 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Agosto de 2009 – Janeiro de 2011**
- **Estágio Previsto: Elaboração do contrato**
- **Estágio Atual: Aguardando documentação da setorial desde 30/07. A PGE encontra-se elaborando relatório final.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

# OPERAÇÃO Swap II

**CGE**

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

## **54. Capacitação em processos de auditoria preventiva.**

- **Responsável: Paulo Roberto**
- **Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria**
- **Valor: US\$ 180 mil**
- **Método de Aquisição: Licitação Pública Nacional**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Outubro de 2009 – Outubro de 2010**
- **Estágio Previsto: Não objeção do BM à minuta do contrato**
- **Estágio Atual: Enviada nova versão do edital para não objeção do BM em 28/07.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## **55. Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará.**

- **Responsável: Marconi Lemos**
- **Categoria de Licitação: Empresas de consultoria\***
- **Valor: US\$ 170 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Novembro de 2009 – Dezembro de 2010**
- **Estágio Previsto: Publicação da MI**
- **Estágio Atual: Elaborando lista curta, relatório de avaliação dos portfólios das empresas e SDP.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

**\*Categoria modificada tendo em vista recomendações do BM, datadas de 24/06.**

# OPERAÇÃO Swap II

**CIDADES**

# OPERAÇÃO Swap II

## PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### 56. Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade.

- Responsável: Tércia Pinheiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 – Julho de 2011
- Estágio Previsto: Enviar convite/SDP à empresa vencedora
- Estágio Atual: Elaborando relatório de avaliação dos portfólios, lista curta e SDP desde 27/07.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

# OPERAÇÃO Swap II

**IPECE**

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

## **57. Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: consultoria**

- **Responsável: Eveline Barbosa**
- **Categoria de Licitação: Consultores Individuais**
- **Valor: US\$ 33.8 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Dezembro de 2009 – Outubro de 2010**
- **Estágio Previsto: Prestação de serviços pelo consultor**
- **Estágio Atual: Contrato assinado em 04/08/10. Prestação de serviços.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

**58. Desenvolvimento de um *framework* para uma política integrada p/ a população indígena: evento c/ lideranças indígenas p/ apresentação dos livros didáticos/resultados da consultoria**

- **Responsável: Eveline Barbosa**
- **Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria**
- **Valor: US\$ 0.642 mil**
- **Método de Aquisição: Shopping**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Janeiro de 2010 – Março de 2011**
- **Estágio Previsto: Aguardando finalização do processo de contratação de consultores individuais.**
- **Estágio Atual: Aguardando finalização do processo de contratação de consultores individuais.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

**59. Desenvolvimento de um *framework* para uma política integrada para a população indígena: serviços gráficos para impressão de duas publicações dos livros didáticos.**

- **Responsável: Eveline Barbosa**
- **Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria**
- **Valor: US\$ 5.561 mil**
- **Método de Aquisição: Shopping**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Janeiro de 2010 – Janeiro de 2011**
- **Estágio Previsto: Aguardando finalização do processo de contratação de consultores individuais.**
- **Estágio Atual: Aguardando finalização do processo de contratação de consultores individuais.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

**60. Suporte para funcionamento da UGP Projeto  
SWAP II (Consultores).**

- **Responsável: Cristina Medeiros**
- **Categoria de Licitação: Consultores Individuais**
- **Valor: US\$ 165 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Junho de 2009 – Junho de 2012**
- **Estágio Previsto: Prestação de serviços**
- **Estágio Atual: Consultores contratados e serviços sendo realizados**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

# OPERAÇÃO Swap II

**TCE**

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

**61. Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de empresas p/ ministrar cursos de capacitação p/ os servidores do TCE nas áreas de finanças públicas, contábil, estatística, dentre outros.**

- **Responsável: Gyovana Adjafre**
- **Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria**
- **Valor: US\$ 70 mil**
- **Método de Aquisição: Shopping**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Abril de 2010 – Janeiro de 2011**
- **Estágio Previsto: Elaboração do contrato**
- **Estágio Atual: Elaborando especificação técnica (TOR)**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

**62. Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação.**

- **Responsável: Gyovana Adjafre**
- **Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria**
- **Valor: US\$ 100 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Novembro de 2009 – Janeiro de 2011**
- **Estágio Previsto: Início do contrato**
- **Estágio Atual: Não objeção ao TOR em 14/07/10. Elaborando MI.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████**

**63. Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria contábil e análise das demonstrações contábeis.**

- **Responsável: Gyovana Adjafre**
- **Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria**
- **Valor: US\$ 100 mil**
- **Método de Aquisição: SQC**
- **Revisão Prévia/Posterior: Posterior**
- **Início/Término: Fevereiro de 2011 – Abril de 2012**
- **Estágio Previsto: -**
- **Estágio Atual: -**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

**\*TOR a ser elaborado com base nas novas regras contábeis.**

## Contato com a UGP

- Os e-mails devem ser enviados para a UGP, com cópia para Eveline e Cristina.
- ✓ [ugpswap@ipece.ce.gov.br](mailto:ugpswap@ipece.ce.gov.br)
- ✓ [eveline@ipece.ce.gov.br](mailto:eveline@ipece.ce.gov.br)
- ✓ [cristinamedeiros@ipece.ce.gov.br](mailto:cristinamedeiros@ipece.ce.gov.br)

OBRIGADA!

OPERAÇÃO  
Swap II

The background is a solid blue color. On the right side, there is a faint, light blue graphic of a globe showing latitude and longitude lines. On the left side, there are several vertical bars of varying heights and shades of blue, some with horizontal lines, resembling a bar chart or data visualization.

# Anexo 2

**Programa de Apoio a Inclusão Social e ao Crescimento Econômico do Ceará – SWAp II**  
**Relatório de Gastos dos Programas de Gastos Elegíveis**

**Despesas por Programa**

Empréstimo Nº.:	7600-BR
Categoria Nº.:	1
DESEMBOLSO Nº.:	5

Estimativa de Despesas para o período **abr-setembro/2010 - REGRA 30%**

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Previsão (abr/10 a setembro/10) (a)	Realizado (até 31/jul/10) (b)	Realizado/Previsto (%) (b)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	1.000.000,0	1.107.716,9	110,77%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	25.000.000,0	37.375.482,5	149,50%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	2.000.000,0	2.773.640,1	138,68%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	150.000.000,0	353.183.247,3	235,46%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	8.000.000,0	17.660.949,1	220,76%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.000.000,0	1.358.314,6	67,92%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	40.000.000,0	83.831.782,7	209,58%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	800.000,0	16.962.863,5	2120,36%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.000.000,0	0,0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	3.000.000,0	6.435.558,1	214,52%	
<b>TOTAL</b>		<b>234.800.000</b>	<b>520.689.554,7</b>	<b>221,76%</b>	
<b>Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]</b>		<b>70.440.000,00</b>		<b>156.206.866,40</b>	

Posição em: 31-jul-10

Estimativa de Despesas para o período **Janeiro - Dezembro de 2010 - REGRA 70%**

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2010 Jan - Dez (a)	Orçamento 2010 - Até 31/07 (b)	Realizado (até 31/07/10) (c)	Realizado/Previsto (%) (c)/(b)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	6.090.716,0	3.552.920,0	1.559.516	43,89%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	97.089.453,0	56.635.516,0	54.274.313,1	95,83%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	8.390.269,0	4.894.323,0	2.944.552	60,16%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	602.947.094,0	351.719.137,0	590.128.997,5	167,78%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.501.712,0	32.959.332,0	27.962.254	84,84%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	12.359.638,0	7.209.790,0	1.668.199	23,14%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.621.497,0	129.279.206,0	119.935.940,4	92,77%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.241.500,0	724.206,0	16.963.917	2342,42%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	18.636.118,0	10.871.070,0	0	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	13.194.019,0	7.696.514,0	6.489.050	84,31%	
<b>TOTAL</b>		<b>1.038.072.016,00</b>	<b>605.542.014,00</b>	<b>821.926.738,4</b>		
<b>Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]</b>		<b>726.650.411,20</b>	<b>423.879.409,80</b>			

Posição em: 31-jul-10


# Anexo 3

## Gráficos de Acompanhamento das Despesas dos Programas Elegíveis

### 1) SECITECE


#### 1.1) Programa 033

##### a) Regra dos 30%

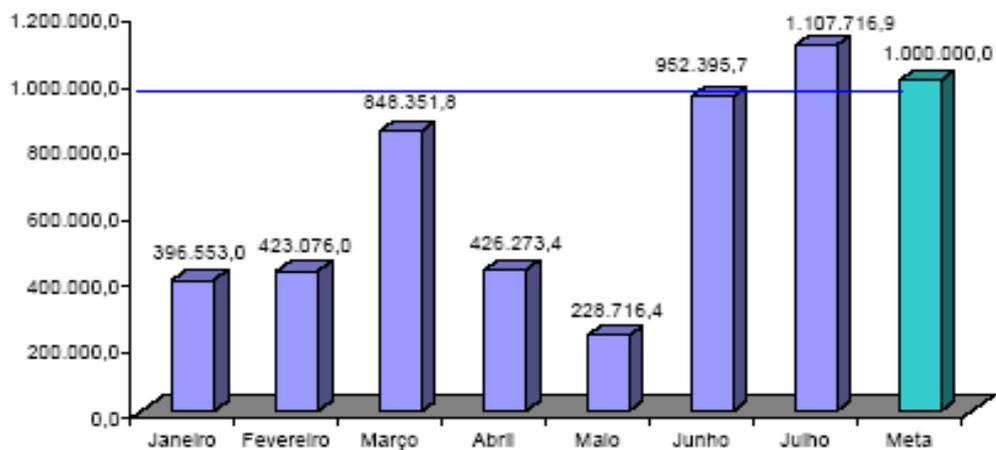


\* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

##### b) Regra dos 70%

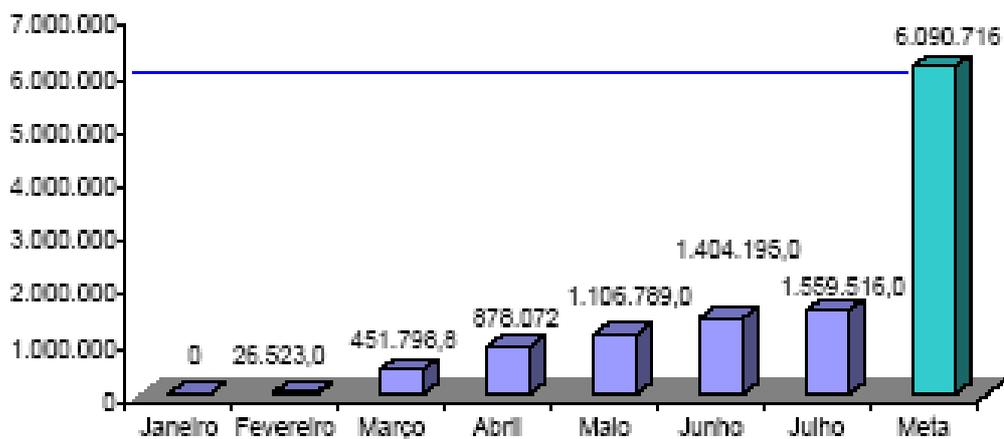


## 1.2) Programa 194

### a) Regra dos 30%

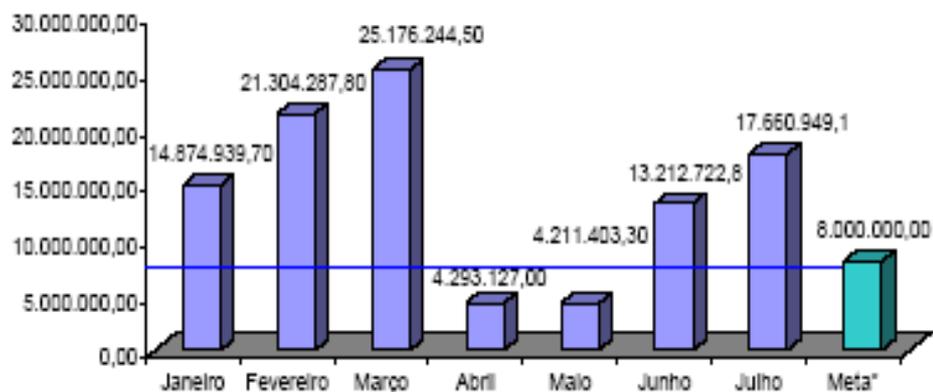


\* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

### b) Regra dos 70%

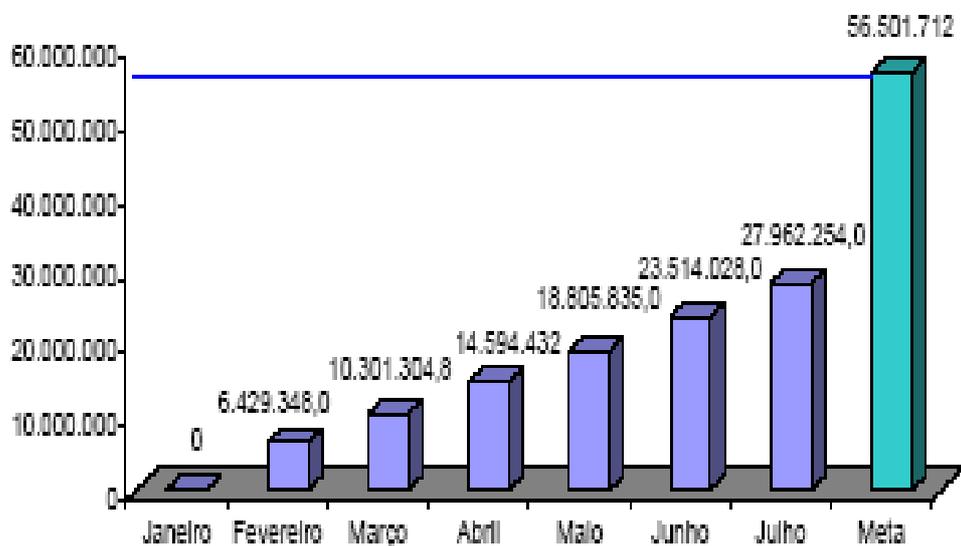


### 1.3) Programa 196

#### a) Regra dos 30%

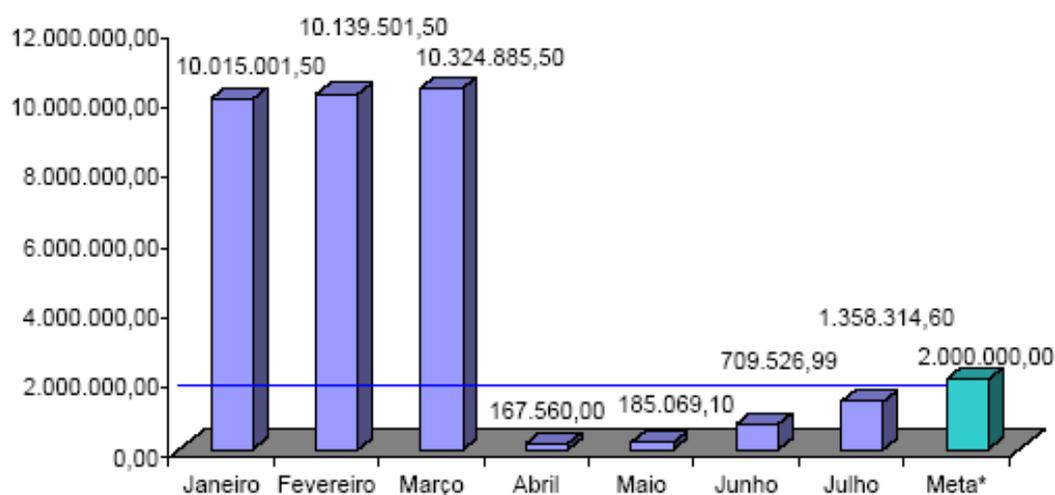

\* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.


#### b) Regra dos 70%

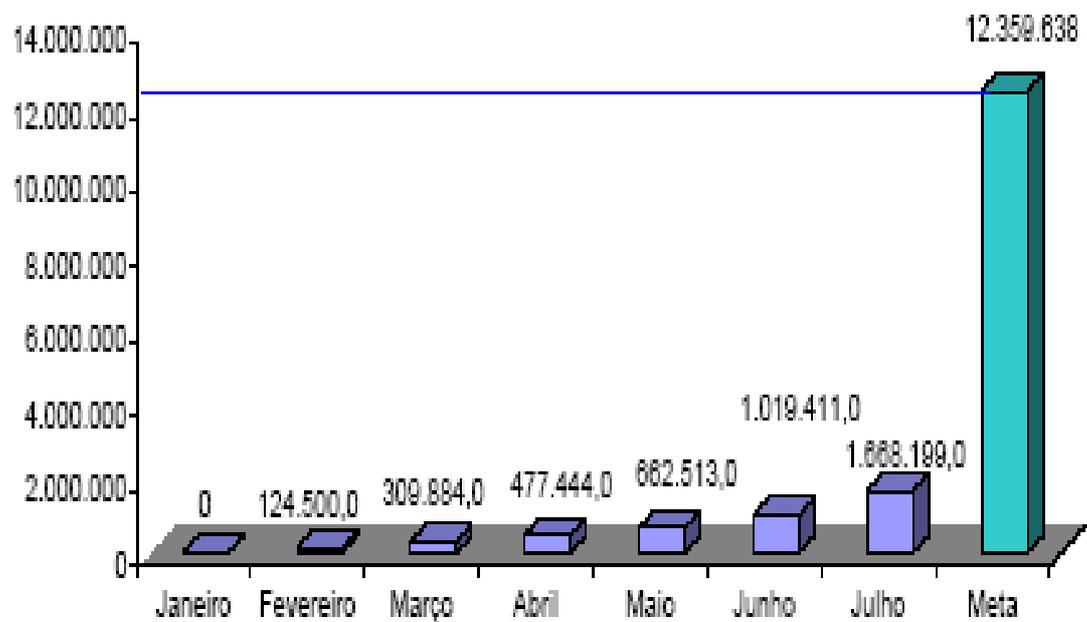

## 2) SEDUC


### 2.1) Programa 041

#### a) Regra dos 30%

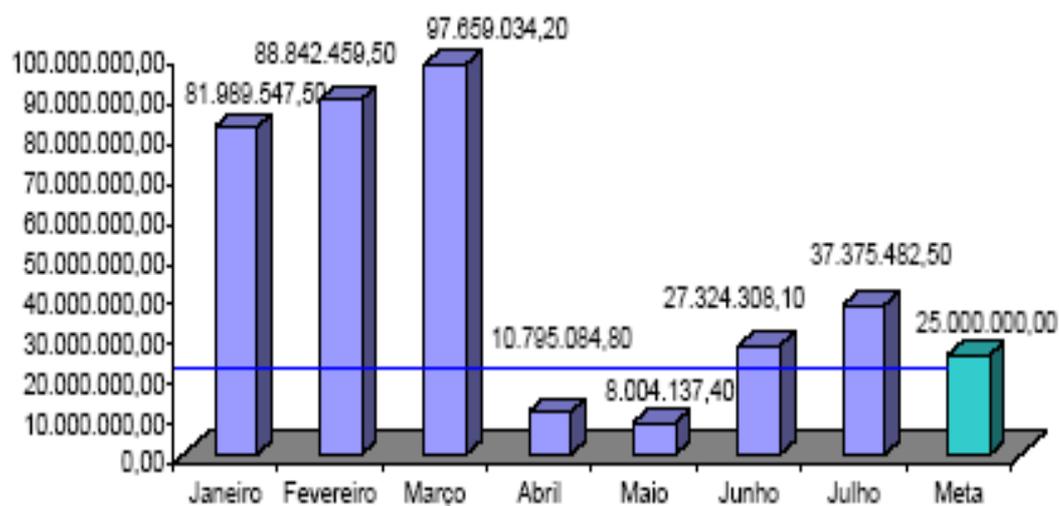


\* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

#### b) Regra dos 70%

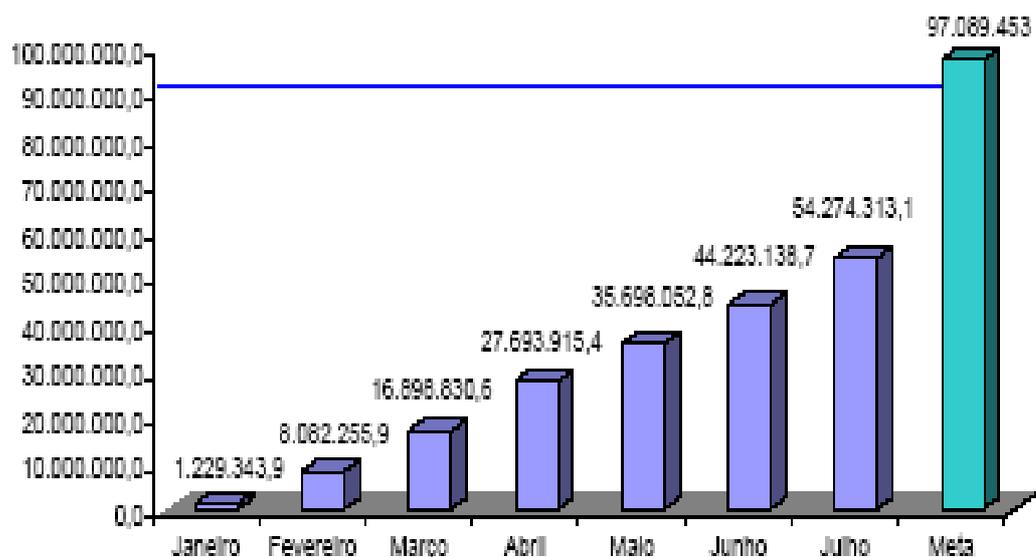


## 2.2) Programa 048

### a) Regra dos 30%

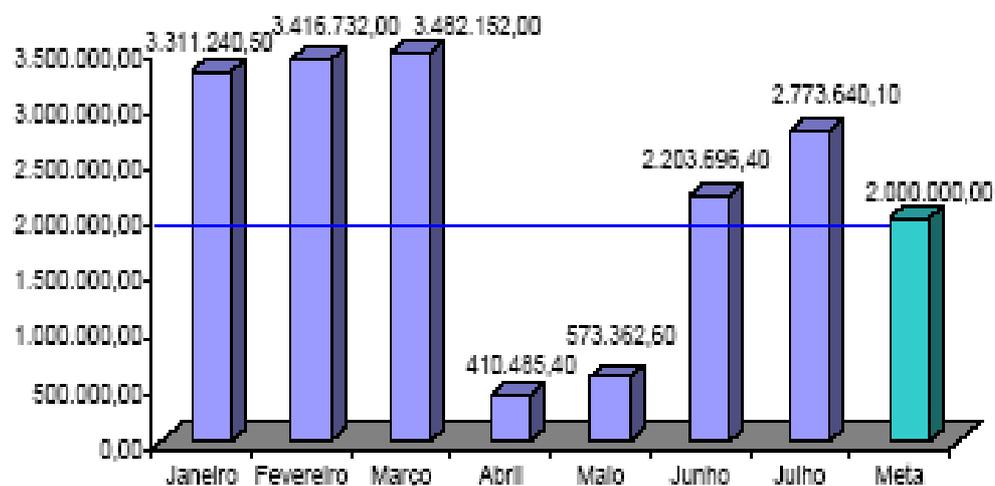


\* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

### b) Regra dos 70%

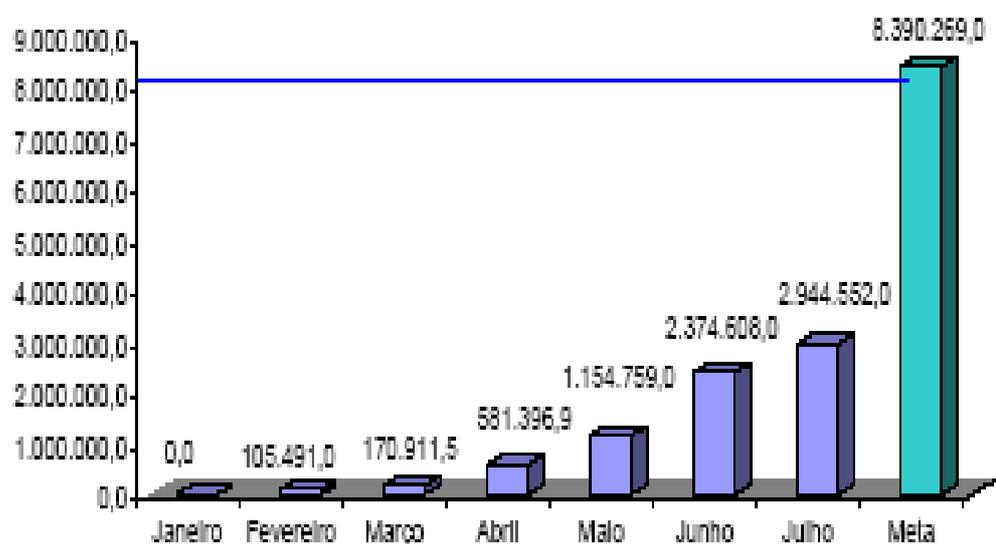


## 2.3) Programa 058

### a) Regra dos 30%

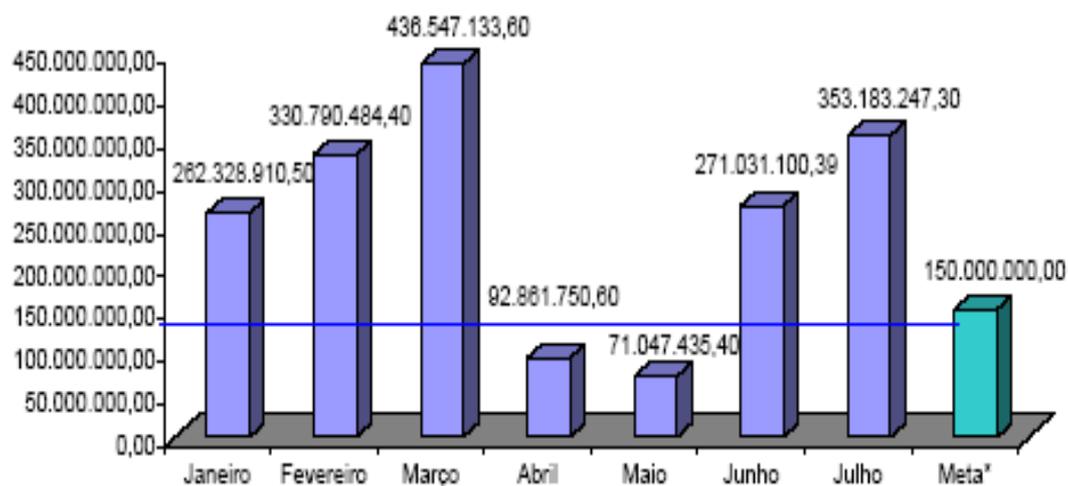

\* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.


### b) Regra dos 70%

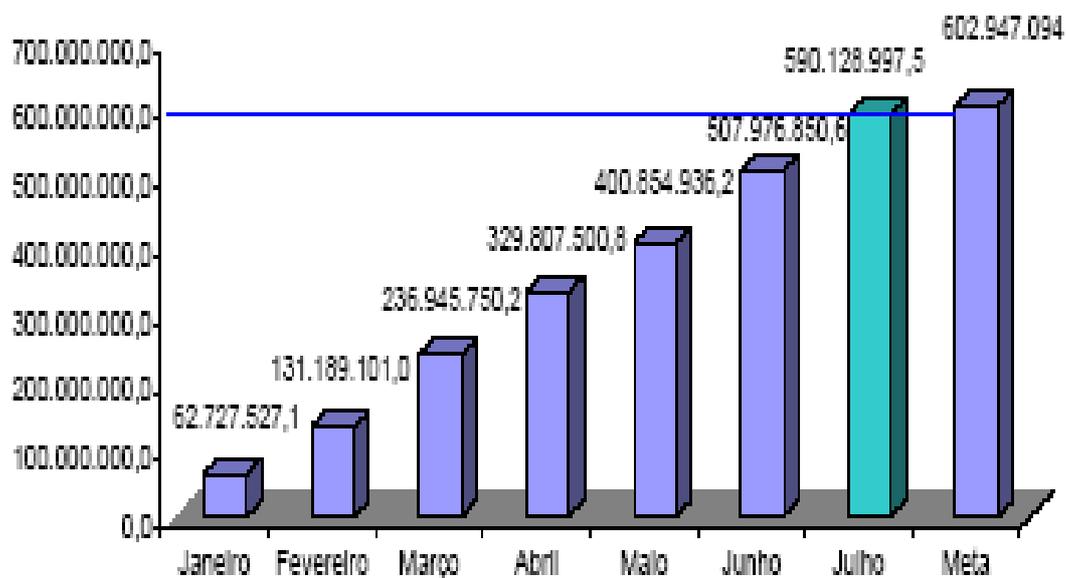

### 3) CIDADES


#### 3.1) Programa 711

##### a) Regra dos 30%

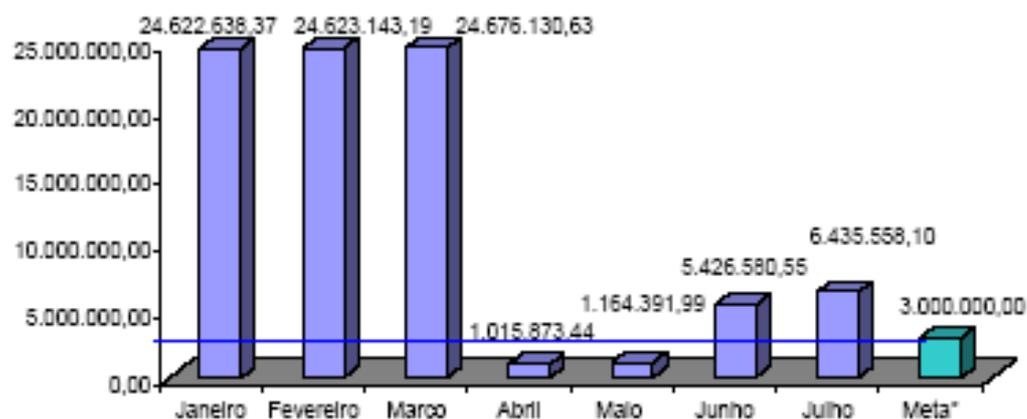

\* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 e março/10 e abril/10 a setembro/10.


##### b) Regra dos 70%

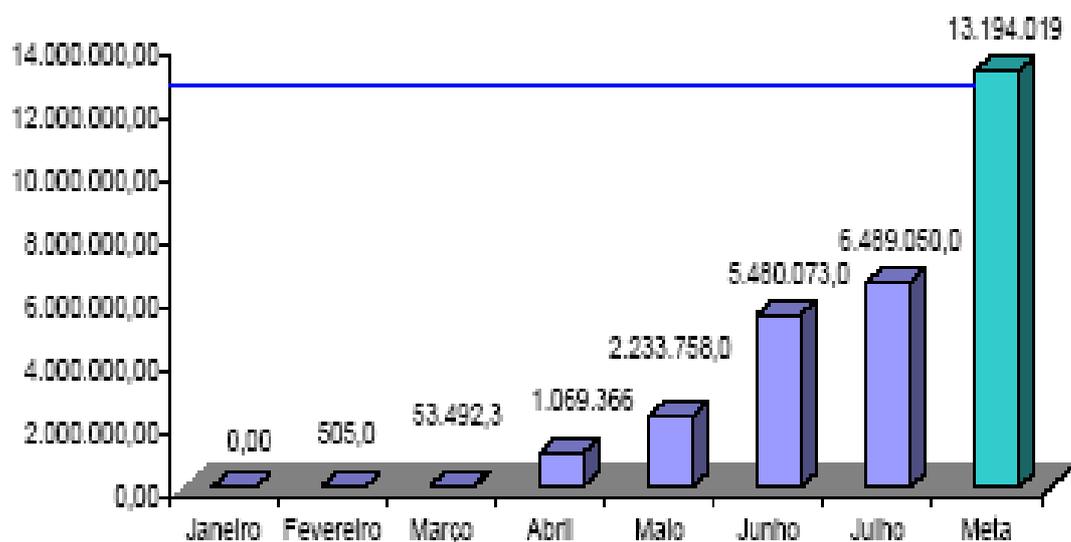

#### 4) SESA


##### 4.1) Programa 535

##### a) Regra dos 30%

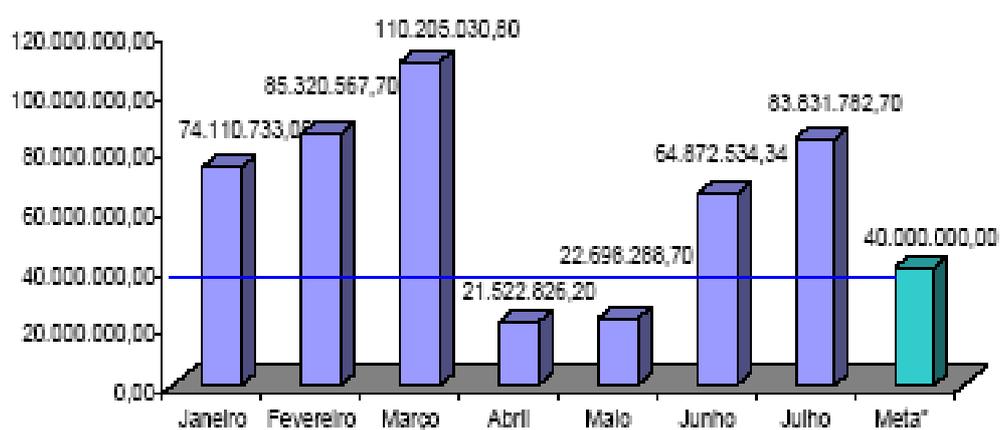


\*Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

##### b) Regra dos 70%

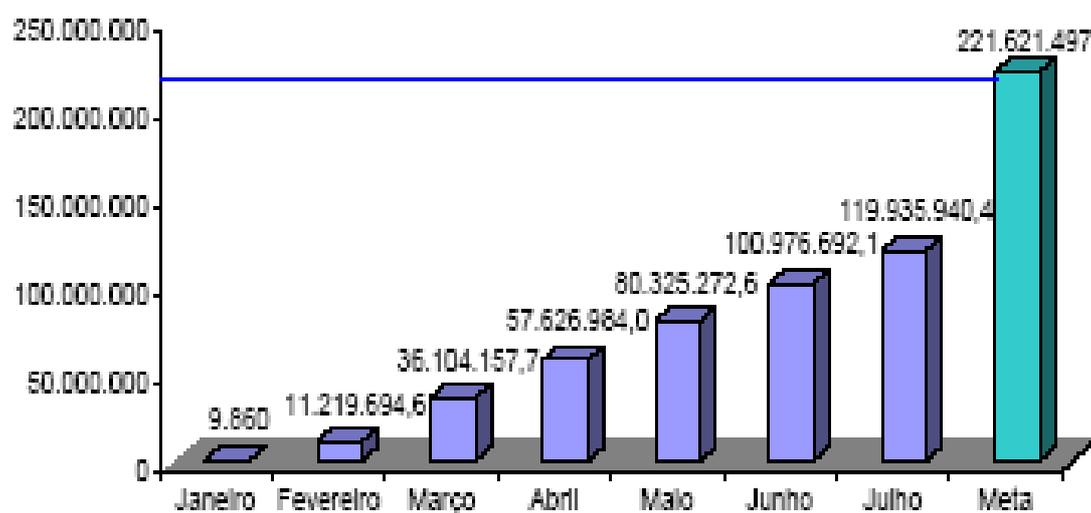


## 4.2) Programa 536

### a) Regra dos 30%

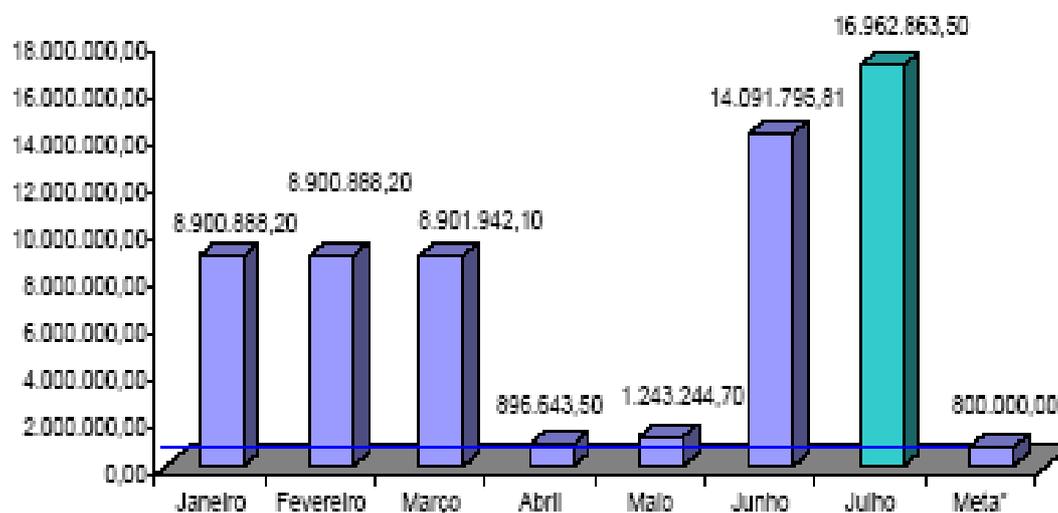


\* Meta para os seguintes períodos: outubro/09 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

### b) Regra dos 70%

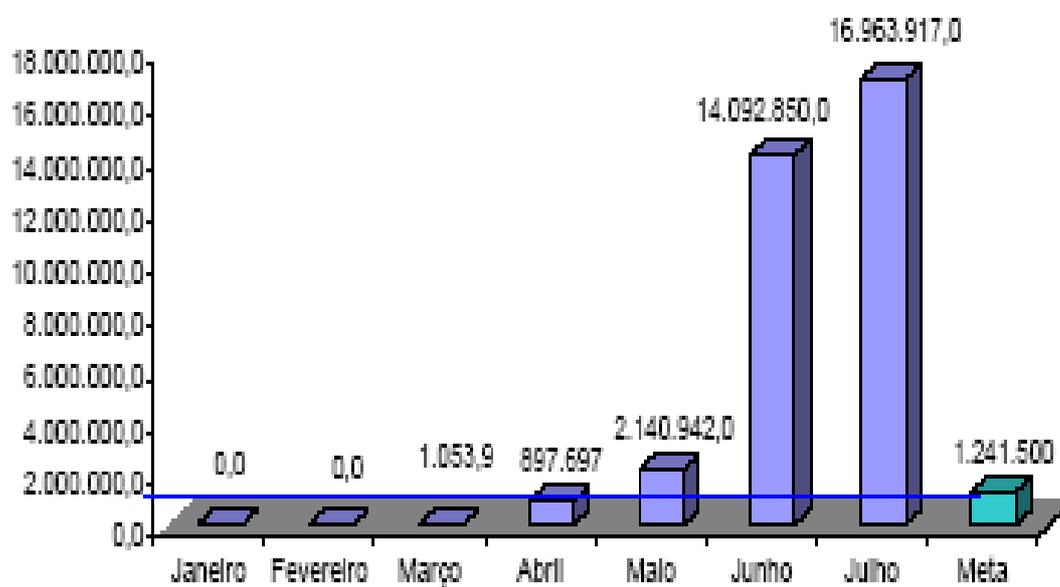


### 4.3) Programa 554

#### a) Regra dos 30%

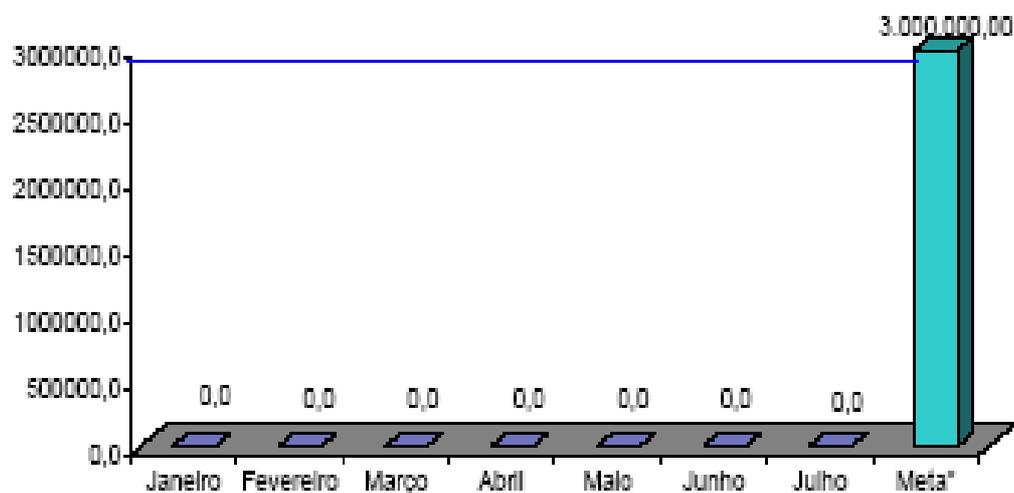

\* Meta para os seguintes períodos: outubro/00 a março/10 e abril/10 a setembro/10.

#### b) Regra dos 70%

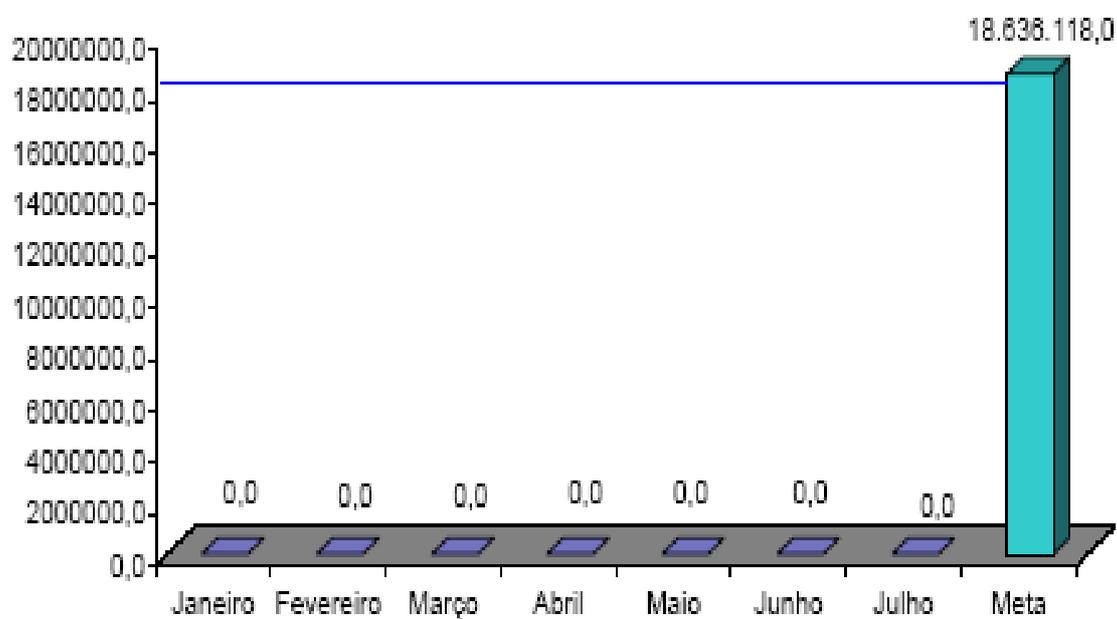

# Anexo 4

## Operação SWAp II 2009 -2012

## ACOMPANHAMENTO PENDÊNCIAS MISSÃO BANCO MUNDIAL 15 - 23 MARÇO 2010

Órgão	Nº	Pendência	Responsável	Prazo	Posição em 17/08/2010	
ARCE	1	Enviar Nota Técnica explicativa das razões da piora do indicador IRVF até 15/08/10.	Alexandre Caetano	15/08/2010	Aguardando	
	2	Encaminhar o Termo de Ajuste de conduta com o Plano de Ação assinado com a CAGECE para alcançar a meta de 2011.	Alexandre Caetano	15/08/2010	Aguardando	
	3	Existe uma segunda proposta de AT feita pelo BM (Marcos Thadeu) e em relação a mesma, esclareceu-se que em termos técnicos essa atividade esta de acordo com os objetivos do projeto mas que ainda não foram alocados recursos para financiá-lo. A ARCE enviará uma proposta mais detalhada em junho de 2010 e neste momento será avaliado se surgiu recurso no plano de licitações para o seu financiamento.	Alexandre Caetano	30/06/2010	Aguardando	
Banco Mundial	4	Enviar comentários técnicos sobre os fatores considerados no parágrafo 4 da nota técnica da SRH/COGERH. E seriam acordados entre as partes aqueles critérios a serem utilizados durante o transcurso do projeto.	Jeffrey Rinne/Marcos Thadeu	31/03/2010	Aguardando	
CAGECE	5	A meta do indicador secundário (Margem EBTIDA) deve seguir os valores do PAD, conforme página 69. Acordou-se que para a revisão do projeto prevista para setembro de 2010 (midterm review) a CAGECE teria que: (i) enviar uma nota técnica em agosto de 2010 explicando e detalhando o processo corporativo de revisão e decisão da margem EBTIDA para justificar o motivo da solicitação de mudança da meta a partir de 2011; (ii) até 15 de novembro de 2010, enviar um ofício com o intervalo proposto da margem EBITDA para 2011; e (iii) até 30 janeiro de 2011 enviar ofício com o valor definitivo da da meta corporativa.	Emiliana/Aurineide	(i) 15/8/2010 (ii) 15/11/10 (iii) 30/01/10	Aguardando	
	6	Enviar relatório com o fechamento da meta do indicador secundário (Margem EBTIDA) após auditoria.	Emiliana/Aurineide	05/04/2010	Aguardando	
	7	Enviar proposta de novas metas para 2011 para os indicadores primários (Ligação de água, Ligação de esgoto, Perda de água). Para o indicador de perda, deverá ser preparada ainda uma nota explicativa, com base nos dados dos últimos 3 anos e considerando os efeitos da instalação de novos medidores, eventos climáticos, etc.	Emiliana/Luiz Celso	15/08/2010	Aguardando	
COGERH	8	Encaminhar até 31/8/10 Nota Técnica informando as variáveis e valores que poderão ser utilizados para a revisão da estimativa de volume captado de água em 2010, conforme acordado com o Banco.	João Lúcio	15/08/2010	Aguardando	
ETICE	9	Enviar semestralmente (Fevereiro e Agosto) relatórios de acompanhamento dos indicadores primário e secundário.	Denise	31/8/2010 28/2/11	Aguardando	
NUTEC	10	O relatório para o indicador secundário 13 será enviado semestralmente: um relatório parcial será enviado ao IPECE em agosto, com resultados para o indicador de janeiro a junho, e um relatório completo, a ser enviado em fevereiro com resultados de janeiro a dezembro do ano anterior.	Vera	31/8/10 31/12/10	Aguardando	
SEFAZ	11	Enviar semestralmente o relatório para o indicador 3. Um relatório parcial será enviado ao IPECE em agosto, com resultados para o indicador de janeiro a junho, e um relatório completo, a ser enviado em fevereiro com resultados de janeiro a dezembro do ano anterior.	Fabiano	31/8/2010 28/02/2011	Aguardando	
	12	Entregar protocolo do indicador secundário.	José Carlos	05/04/2010	Aguardando	
	13	Apresentar a evidência do indicador 3 (gráfico de frequência referente à proporção de registros empresariais no CGF) semestralmente (Fevereiro e Agosto). Enviar a base de dados utilizada para construção do gráfico (em Excel) para disponibilizar no site do IPECE semestralmente (Fevereiro e Agosto).	Fabiano	31/8/2010 28/2/11	Aguardando	
IPECE/ UGP	14	Acordou-se que haverá uma data limite para o começo dos processos licitatórios de AT. Após esta data os recursos seriam remanejados para outras atividades de assistência técnica.	Eveline/Cristina	17/082010	A ser discutida na reunião do Comitê SWAP II de 17/8/10	

# Anexo 5



Governo do  
Estado do Ceará

Secretaria do Planejamento e Gestão

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE

SUMÁRIO DA PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS E REPRESENTANTES DO COMITÊ SWAP II NAS REUNIÕES DO ANO DE 2009

Órgão	Reunião	Função	15ª	14ª	13ª	12ª	11ª	10ª	9ª	8ª	7ª	6ª	5ª	4ª	3ª	2ª	1ª	Participação Setorial	Participação Setorial (%)	
			20.07.10	15.06.10	18.05.10	20.04.10	18.03.10	18.02.10	19.01.10	17.12.09	26.11.09	29.10.09	24.09.09	27.08.09	30.07.09	01.06.09	30.04.09			
Nome do Participante																				
ARCE	Alceu Galvão Júnior/ Alexandre Caetano*	Titular	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	15	100,00%							
	Mário Augusto Parente Monteiro	Suplente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Presente													
	Representante	Representante	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Ausente									
CAGECE	Emiliana Leite Filgueiras	Titular	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	13	86,60%
	Raimunda Aurineide Lemos Caldas	Suplente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Presente		
	Representante	Representante	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Ausente													
CGE	Marcelo de Sousa Monteiro	Titular	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	9	60,00%							
	Kelly Cristina de Oliveira Barbosa	Suplente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente		
	Representante	Representante	Ausente																	
CIDADES	Tércia Maria Pinheiro Martins	Titular	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	15	100,00%						
	Wanda Gomes de Oliveira Murta	Suplente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente		
	Representante	Representante	Ausente	Presente	Presente	Ausente														
CONPAM/SEMACE	Maria Goretti Gurgel Mota de Castro	Titular	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	14	93,30%
	Maria Dias Cavalcante	Suplente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Presente									
	Representante	Representante	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Presente		
ETICE	José Aurício de Oliveira/ Denise Maria Norões**	Titular	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	13	86,60%
	Sérgio Vicente da Matos Brito	Suplente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente		
	Representante	Representante	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente											
IPECE	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Titular	Presente	Ausente	Presente	15	100,00%													
	Ana Cristina Medeiros	Suplente	Presente																	
	Representante	Representante	Presente																	
PGE	Fernando Antônio Costa de Oliveira/Fernando Antônio Grangeiro*****	Titular	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	15	100,00%									
	Francisco Antônio Nogueira Bezerra/Tarso Pinheiro Borges *****	Suplente	Ausente																	
	Representante	Representante	Presente	Ausente	Presente															
SECITECE	Teresa Lenice Nogueira da Gama Mota	Titular	Ausente	15	100,00%															
	Francisco C.Coelho/Ricardo Costa e Silva***	Suplente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente									
	Representante	Representante	Presente	Ausente	Ausente															
SEDUC	Maria Eneida Machado Maia	Titular	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	15	100,00%							
	Maria Ângela Leão Hitzschky Madeira	Suplente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente										
	Representante	Representante	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente											
SEFAZ	Luiz Jarbas de Mesquita/ Fabiano Ramos****	Titular	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	13	86,60%
	Paulo Sérgio Rocha/ Fabrício Santos****	Suplente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Ausente										
	Representante	Representante	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente		
SEPLAG	Carlos Eduardo Sobreiro	Titular	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	15	100,00%						
	Fátima Coelho Benevides Falcão	Suplente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente		
	Representante	Representante	Presente																	
SRH	Francisca Isabel Vieira de Cavahedo	Titular	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	13	86,60%								
	Luiz Fernando Gonçalves Viana (COGERH)	Suplente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente		
	Representante	Representante	Ausente	Presente	Presente															
SESA	Vera Maria Câmara Coelho	Titular	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	11	73,30%
	Maria Imaculada Ferreira Fonseca	Suplente	Ausente	Presente																
	Representante	Representante	Ausente	Presente	Ausente															
TCE	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	13	86,60%							
	José Teni Cordeiro Júnior	Suplente	Ausente																	
	Representante	Representante	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente												

\*A partir da 6ª reunião o Titular mudou de Alceu da Castro Galvão Júnior para Alexandre Caetano

\*\*A partir da 3ª reunião o Titular mudou de José Aurício de Oliveira para Denise Maria Norões

\*\*\*A partir da 3ª reunião o Titular mudou de Francisco C.Coelho para Ricardo Costa e Silva

\*\*\*\* A partir da 11ª reunião o Titular mudou de Luiz Jarbas de Mesquita para Fabiano Ramos

\*\*\*\*\* A partir da 11ª reunião o Titular mudou de Paulo Sérgio Rocha para Fabrício Santos

\*\*\*\*\* A partir da 15ª reunião o Titular mudou de Fernando Antonio C. de Oliveira para Fernando Grangeiro

\*\*\*\*\* A partir da 15ª reunião o Suplente mudou de Fco. Antônio N. Bezerra para Tarso Pinheiro Borges

# Anexo 6

