



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ

*Secretaria do Planejamento e Gestão*  
*Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE*

**ATA 26ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ SWAP II**

**Data:** 16/06/2011 **Início:** 9:40 **Duração:** 1:05 **Término:** 11:45 **Local:** Sala de Reuniões do IPECE

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
COORDENAÇÃO SWAP II	Flávio Ataliba	Coordenador SWAp II	X
	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	Nagilane Parente	Consultara SWAP II	OK
	Anailsa Silva	Consultora SWAP II	OK
	Alexandre Leal	Copnsultor SWAp II	OK
	Débora Varela	Consultora SWAp II	OK
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	X
	Mário Augusto Parente Monteiro	Suplente	X
	Marcelo Silva de Almeida	Representante	OK
CAGECE	José Ricardo Meira	Titular	X
	Raimunda Aurineide Lemos Caldas	Suplente	X
	Emiliana Leite Filgueiras	Suplente	OK
CGE	Marcelo de Sousa Monteiro	Titular	X
	Kelly Cristina de Oliveira Barbosa	Suplente	X
CIDADES	Tércia Maria Pinheiro Martins	Titular	X
	Edilson Uchoa Lopes	Suplente	X
CONPAM /SEMACE	José Iraguassú T. Filho	Titular	X
	Maria Dias Cavalcante	Suplente	X
ETICE	Denise Maria Norões	Titular	X
	Sérgio Vicente de Matos Brito	Suplente	X
	João Carlos Lima	Representante	OK
PGE	Fernando Grangeiro	Titular	OK
	Tarso Pinheiro	Suplente	X
SECITECE/NUTEC	Almir Bittencourt da Silva	Titular	X
	Ricardo Costa e Silva	Suplente	OK
	Vera Lúcia Salgado	Representante NUTEC	X
SEDUC	Maria Eneida Machado Maia	Titular	OK
	Maria Ângela Leão Hitzschky Madeira	Suplente	X
	José Iran da Silva	Representante	OK
SEFAZ	Fabiano Moreira Ramos	Titular	X
	Fabrizio Gomes Santos	Suplente	X
SEPLAG	Naiana Corrêa Lima	Titular	X
	Fátima Coelho Benevides Falcão	Suplente	X
	Ailson Filho	Representante	OK
	Fábio Diogo	Representante	OK
	Fernanda Salles	Representante	OK
	Anúzia Gosson	Representante	OK
Daniele Passos	Representante	OK	
SRH /COGERH	Francisca Isabel V. de Cavalcêdo	Titular	OK
	Maria do Céu Ramos Colares	Suplente	OK
	Fhillip Falcão	Representante	OK
SESA	Vera Maria Câmara Coelho	Titular	OK
	Maria Imaculada Ferreira Fonseca	Suplente	X
	Ana Márcia	Representante	OK
TCE	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	OK
	José Teni Cordeiro Júnior	Suplente	OK
	Manuel Salgueiro	Representante	OK

## **INTRODUÇÃO**

Às 9:40, na Sala de Reuniões do IPECE, Cristina Medeiros – IPECE iniciou a reunião solicitando que todos se apresentassem.

Seguiu-se com a apresentação em *Power Point* (**Anexo 1**) cuja pauta está apresentada abaixo:

- 1 - Apresentação dos Participantes
- 2 - Auditoria
- 3 - IPECE INFORME
- 4 - Desembolso Assistência Técnica
- 5 - Acompanhamento dos Programas Elegíveis
- 6 - Sumário Projetos de Assistência Técnica
- 7 - Acompanhamento Mensal das Setoriais
  - Indicadores Primários e Secundários
  - Assistência Técnica
  - Salvaguardas

### **I. APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS SETORIAIS**

Os representantes de cada setorial se apresentaram ao grupo.

### **II. AUDITORIA**

Cristina Medeiros – IPECE informou sobre a visita do especialista do Banco Mundial, Danilo Carvalho, nos dias 26 e 27 de maio de 2011 para realização de Auditorias nas Setoriais. Informou também que o TCE irá realizar reuniões para apresentar as Setoriais os achados da Auditoria realizada pela equipe do TCE.

### **III. IPECE INFORME**

Cristina Medeiros – IPECE informou que está disponível no site do IPECE, o IPECE Informe sobre o Projeto SWAp II e que houve divulgação nos jornais de grande circulação em Fortaleza.

### **IV. DESEMBOLSO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Cristina Medeiros – IPECE informou que serão solicitadas as informações referentes aos pagamentos dos próximos seis meses para cálculo do valor a ser desembolsado no início de julho 2011.

## V. ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS ELEGÍVEIS DE 2011

Ailson Filho – SEPLAG apresentou a tabela com a regra dos 30%, e informou que os programas 058 – Cooperação entre Estado e Municípios e 194 – Fortalecimento da Educação Superior e Profissional atingiram a regra dos 30%.

### Regra dos 30%

#### Acompanhamento de Despesas dos Programas Elegíveis - Ano de 2011 - Regra dos 30%

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Previsão (abr/11 a setembro/11) (a)	Realizado (até 31/mai/11) (b)	Realizado/Previsão (%) (b)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	1.100.000,0	-	0,00%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	22.000.000,0	27.178.093,7	123,54%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	2.200.000,0	274.070,0	12,46%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	210.000.000,0	190.909.208,3	90,91%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	5.000.000,0	1.506.499,8	30,13%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	1.000.000,0	-	0,00%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	55.000.000,0	40.140.239,5	72,98%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	3.000.000,0	1.938.520,0	64,62%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	1.500.000,0	-	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	5.500.000,0	10.044.449,0	182,63%	
<b>TOTAL</b>		<b>306.300.000</b>	<b>271.991.080,2</b>	<b>88,80%</b>	
<b>Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]</b>		<b>91.890.000,00</b>		<b>81.597.324,07</b>	

Posição em: 31-mai-11

### Legenda:

- √ Se o valor pago for maior ou igual a 30% = verde;
- √ Se o valor pago for menor que 30% = vermelho;

Ailson Filho – SEPLAG apresentou a tabela com a regra dos 70%, e informou que os programas 041 – Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino, 058 – Cooperação Estado e Município e 711 – Saneamento Ambiental do Ceará atingiram a regra dos 70%.

### Regra dos 70%

#### Acompanhamento de Despesas dos Programas Elegíveis - Ano de 2011 - Regra dos 70%

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2011 Jan - Dez (a)	Orçamento 2011 - Até 31/05 (b)	Realizado (até 31/05/11) (c)	Realizado/Previsão (%) (c)/(b)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	3.268.447,0	1.361.855,0	-	0,00%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	162.534.432,0	67.722.680,0	50.055.946	73,91%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	23.826.799,0	9.927.835,0	517.870	5,22%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	975.497.717,0	406.457.380,0	476.943.818	117,34%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	12.166.208,0	5.069.255,0	3.077.101	60,70%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.835.100,0	1.181.290,0	-	0,00%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	194.927.906,0	81.219.960,0	80.700.037	99,36%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	19.151.625,0	7.979.845,0	2.231.530	27,98%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.477.726,0	1.449.055,0	-	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	34.191.184,0	14.246.325,0	14.020.707	98,42%	
<b>TOTAL</b>		<b>1.431.877.144,00</b>	<b>596.615.480,00</b>	<b>627.547.008,5</b>		
<b>Valor Limite do Desembolso [70% * TOTAL]</b>		<b>1.002.314.000,80</b>	<b>417.630.836,00</b>			

Posição em: 31-mai-11


### Legenda:

- √ 0% - 50,00% = vermelho;
- √ 50,01% - 69,99% = amarelo;
- √ 70,00% em diante = verde.

## VI. SUMÁRIO DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Alexandre Leal – IPECE apresentou o gráfico dos Projetos no Plano de Licitação em Execução, ressaltando que houve a atualização do Plano de Licitação em maio e somente três setoriais não obtiveram melhor desempenho no desenvolvimento dos projetos.

Gráfico 1 – Acompanhamento da Sinalização da Execução do Plano de Licitação dos Projetos



**Verde** ARCE (1), CGE (3), CIDADES (5), CONPAM (6,7), ETICE (8,9), IPECE (10,11,12,13,14), PGE (15), SEDUC (17,18,19), SEPLAG (21,22,23, 25), SESA (26,27,28,29,30,31), TCE (33,34)


**Amarelo** CGE (2,4), PGE (16), SEFAZ (20), SEPLAG (24), SESA (32)

OBS: o número ao lado do nome da setorial se refere a identificação do número do Projeto cuja descrição encontra-se no Acompanhamento no site do IPECE:  
[http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/assistencia/Acompanhamento\\_Projetos\\_2011.htm](http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/assistencia/Acompanhamento_Projetos_2011.htm)

Débora Varela – IPECE informou que todos receberam uma cópia do Plano de Licitações atualizado.

Débora Varela – IPECE apresentou o estágio dos processos licitatórios e os Projetos de Assistência Técnica que estão em andamento.

Gráfico 2 – Estágio dos Processos Licitatórios

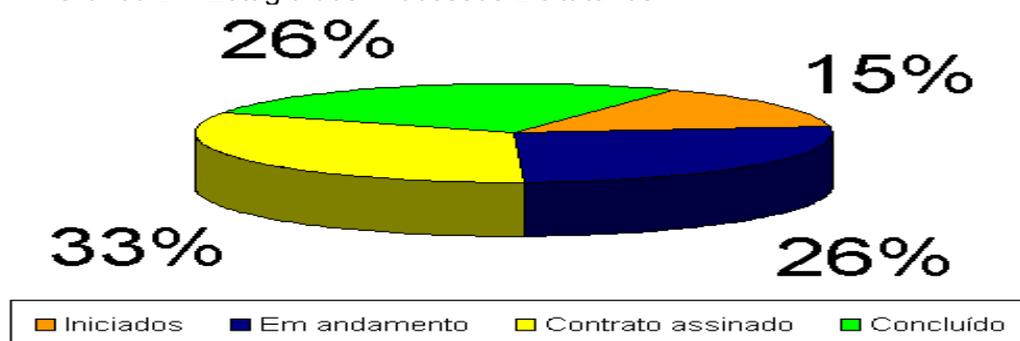


Iniciados CGE (2, 4), CIDADES (5), ETICE (9), SEFAZ (20)

Em andamento CONPAM (7), PGE (15,16), SEFAZ (20), SEPLAG (21,23,24), SESA (26,27)

Contrato assinado ARCE (1), CGE (3), IPECE (13), SEDUC (18,19), SEPLAG (22,25), SESA (28, 30), TCE (33,34)

Concluído COMPAM (6), ETICE (8), IPECE (10, 11, 12, 14), SEDUC (17), SESA (29, 31)

Gráfico 3 – Andamento dos Projetos de Assistência Técnica

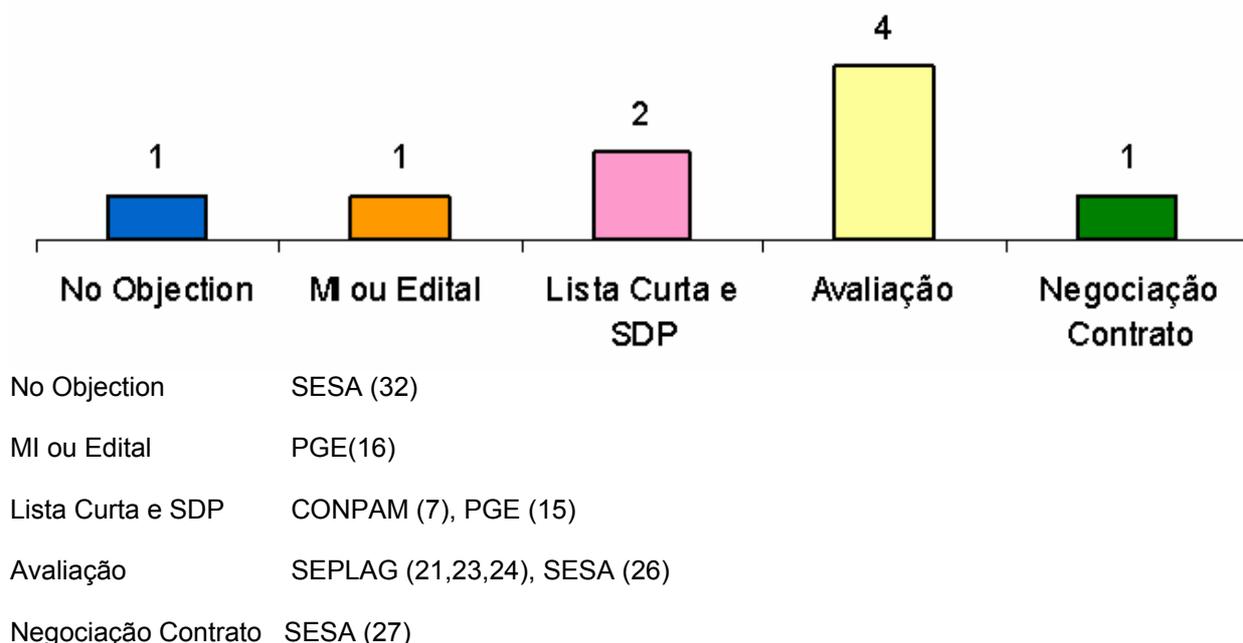

Cristina Medeiros – IPECE solicitou que a SESA, PGE, CGE e SEPLAG definam até o final do mês a viabilidade de seus projetos e caso seja constatado que não será possível realizá-los informar a UGP para que o valor seja redistribuído para outros projetos viáveis.

## VII. ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DAS SETORIAIS

### 1. SEFAZ


Os representantes não estavam presentes.

### INDICADORES PRIMÁRIOS

#### Indicador 1: O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes)

- Meta 2011: R\$ 1.293,00 milhões
- Posição em 31/05: R\$ 1.215,40 milhões
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE <sup>1</sup>
- Comentários: O indicador apresenta um bom desempenho e a expectativa é de que a meta seja atingida.


<sup>1</sup> Legenda da Sinalização para cumprimento da meta: Verde=Alta probabilidade; Amarelo=média probabilidade; Vermelho=Baixa probabilidade;

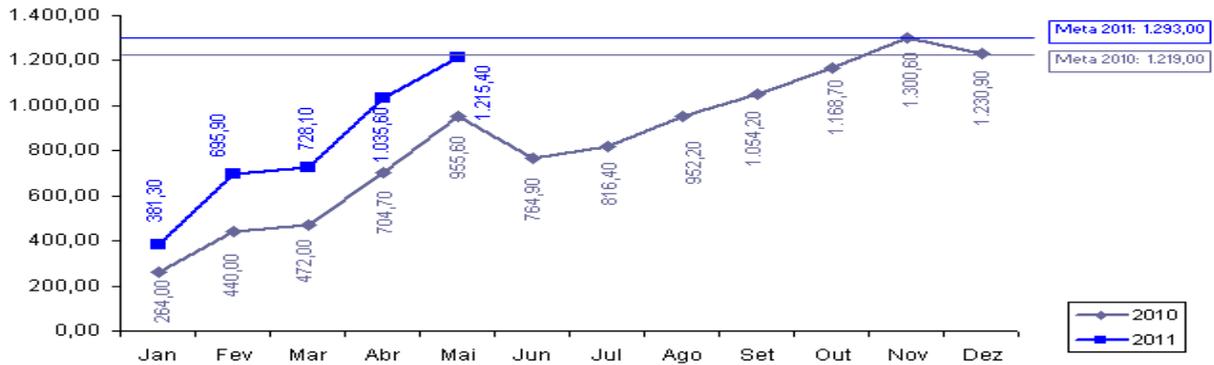

Sentido do indicador: ↑

**Indicador 2: Índice Hefirndahl de arrecadação de ICMS usando quatro setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).**


- Meta 2011:  $\leq 0,35$
- Posição em 31/05: 0,299014
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: O indicador apresenta desempenho dentro da meta, sem mudanças significativas.

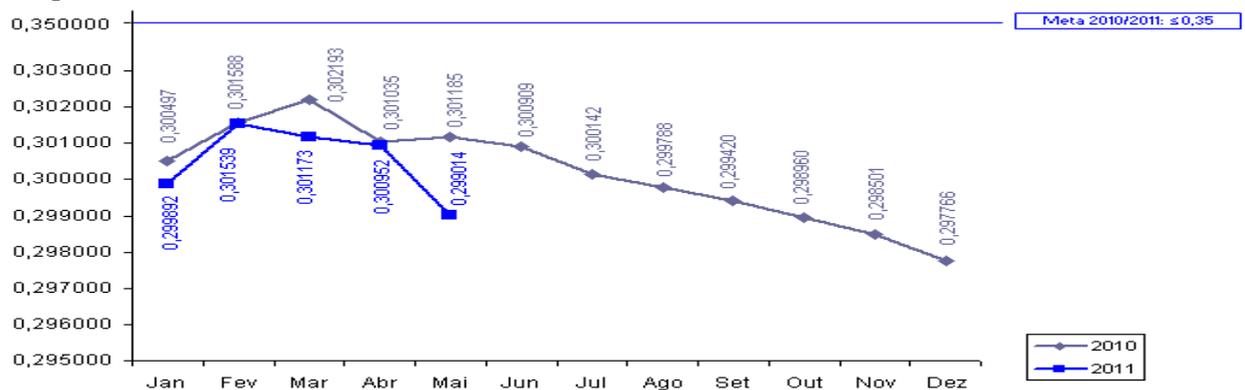

Sentido do indicador: ↓

**Indicador 14: Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas**

- Meta 2011:  $\geq 35,00\%$
- Posição em 31/05: 29,00 %
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida.

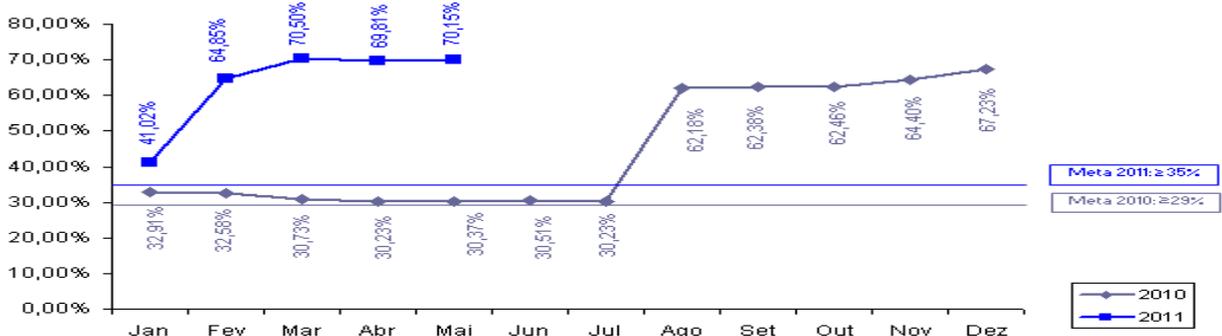


Sentido do indicador: ↑

## INDICADOR SECUNDÁRIO

**Indicador 1: Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário (% dos contribuintes ativos do regime de recolhimento normal que declaram saldo devedor na DIEF que a SEFAZ inscreve na Dívida Ativa)**

- Meta 2011: ≤10,00 %
- Posição em 31/05: 3,42 %
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Durante a Missão de Supervisão de 11-15 de abril de 2011 houve reunião entre os técnicos da SEFAZ-CE/CATRI/CEPAC e o Banco Mundial e foi acordado que tendo o indicador secundário a periodicidade de mensuração quadrimestral, a atualização deste deve seguir o cronograma de inscrição dos débitos fiscais em Dívida Ativa realizada nos meses de Abril, Agosto e Dezembro.

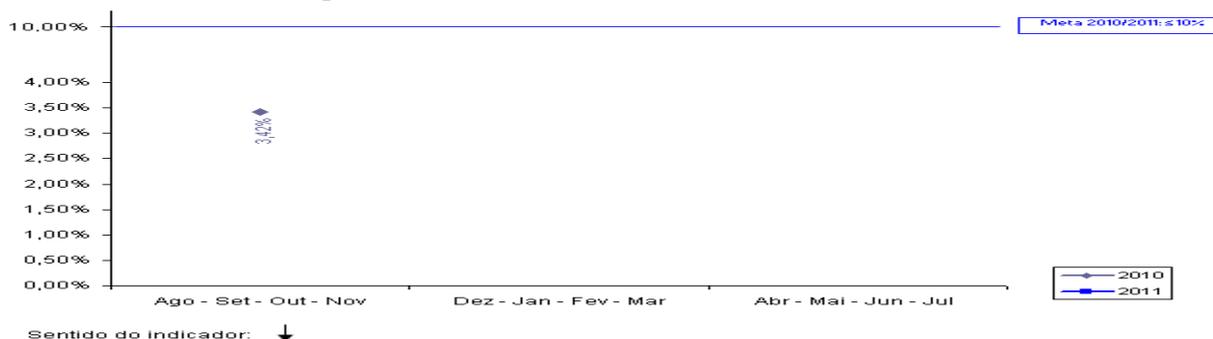

## PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA<sup>2</sup>

**Projeto 20: Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto de Auditoria Eletrônica.**

- Responsável: Eliezer Pinheiro e Rejane Muniz
- Categoria de Licitação: BENS
- Valor: US\$ 300 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março de 2011 a Novembro de 2011
- Estágio Previsto: NO do Banco Mundial ao TOR e Documentos de Licitação.
- Estágio Atual: Elaborando TOR
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### 2. SEPLAG

Representada por Ailson Filho, Fábio Diogo, Fernanda Salles, Anúzia Gosson e Daniele Passos.

## INDICADORES PRIMÁRIOS

**Indicador 3: Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGEF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.**

- Meta 2011: 15
- Posição em 31/05: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: O prazo de entrega dos 15 relatórios é até março de 2012.

<sup>2</sup> Legenda da Sinalização para cumprimento dos Projetos de Assistência Técnica:

Verde=Realização conforme o Plano de Licitações; Amarelo = Realização com atraso mais de um dia; Vermelho = Realização com atraso de mais de três meses.

**Indicador 4: Número de "Relatórios de Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.**

- Meta 2011: 7
- Posição em 31/05: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta referente ao ano de 2011 será cumprida em março de 2012. Os temas serão apresentados para escolha do COGERF ainda esse mês.


**INDICADORES SECUNDÁRIOS**

**Indicador 2: Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no discurso anual do Governador na Assembléia.**

- Meta 2011: 2
- Posição em 31/05: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: o prazo para cumprimento da meta do ano de 2011, será até fevereiro de 2012 quando a mensagem será apresentada na Assembléia.

**Indicador 3: Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar regularidade.**

- Meta 2011:  $\leq 3,00$  meses
- Posição em 31/05: 1,87 meses
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Trata-se de um índice de cruzamento de cadastros de pensões para acusar o falecimento de um pensionista, a meta continuará sendo cumprida até o final do ano.

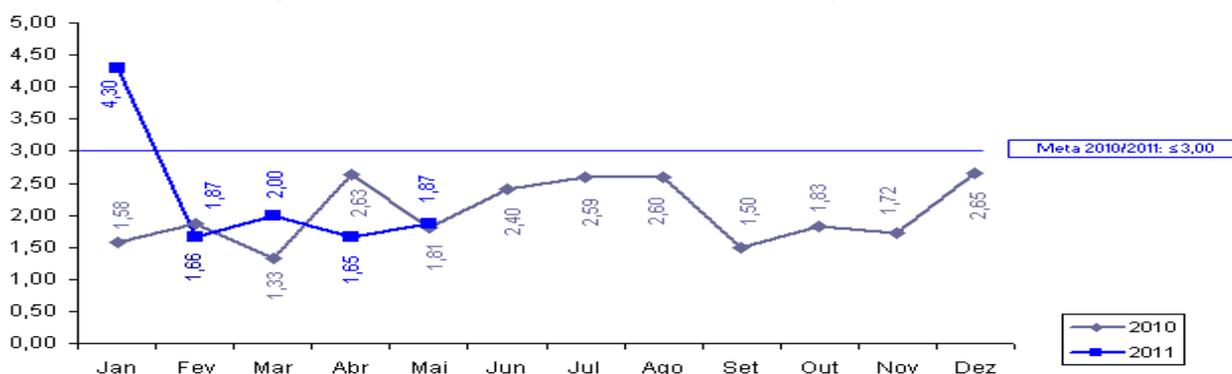

Sentido do indicador: ↓

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Projeto 21: Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados – SEPLAG**

- Responsável: Fátima Falcão
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 200 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho de 2009 a Janeiro de 2012
- Estágio Previsto: Avaliando propostas.
- Estágio Atual: Avaliação das propostas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 22: Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará - SEPLAG**

- Responsável: Sérgio Lage e Fernanda Salles
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho de 2009 – Abril de 2012
- Estágio Previsto: Prestação de Serviços.
- Estágio Atual: Empresa está executando os serviços.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 23: Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras - SEPLAG**

- Responsável: Soraya Quixadá
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 130 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro de 2010 a Janeiro de 2012
- Estágio Previsto: Recebendo propostas.
- Estágio Atual: Recebendo propostas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 24: Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo à sociedade em geral e as entidades representativas das empresas - SEPLAG**

- Responsável: Soraya Quixadá
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2010 a Abril de 2012
- Estágio Previsto: Assinatura do contrato
- Estágio Atual: Avaliando proposta
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

**Projeto 25: Desenvolvimento de Solução Informatizada para monitoramento da Cooperação Técnico-financeira do Estado do Ceará – SEPLAG**

- Responsável: Mário Fracalossi
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro de 2009 a Agosto de 2011
- Estágio Previsto: Início dos serviços.
- Estágio Atual: Início dos serviços.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### 3. SEDUC

Representada por Eneida Maia e José Iran


#### INDICADORES PRIMÁRIOS

**Indicador 5: Resultados das avaliações externas dos alunos do 2o, 5o, 9o e 12o anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas.**

- Meta 2011:  $\geq 90\%$
- Posição em 31/05: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: a meta de 2011 será cumprida até março de 2012.

**Indicador 6a: Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: "Alfabetização na Idade Certa".**


- Meta 2011:  $80\%$
- Posição em 31/05:  $100\%$
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentário: A meta deste indicador foi cumprida.

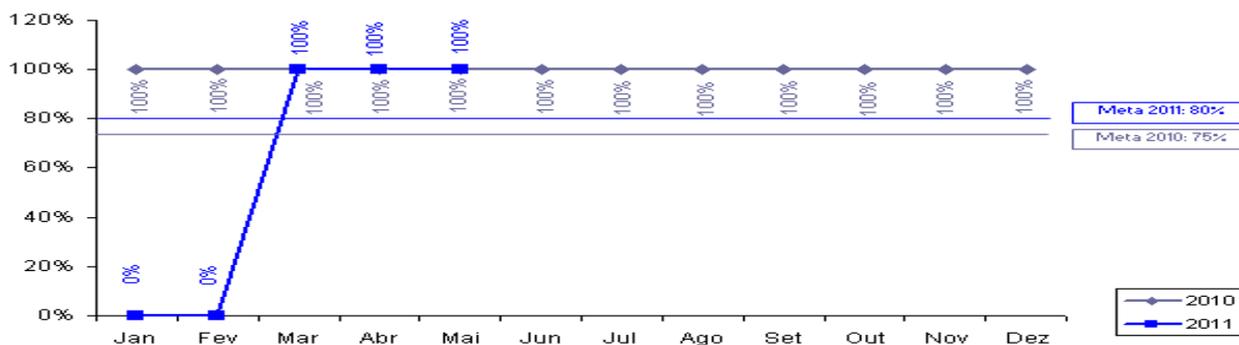

Sentido do indicador: ↑

**Indicador 6b: Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização na Idade Certa" entregue às escolas.**


- Meta 2011:  $\geq 80\%$
- Posição em 31/05:  $100\%$
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentário: A meta está cumprida.

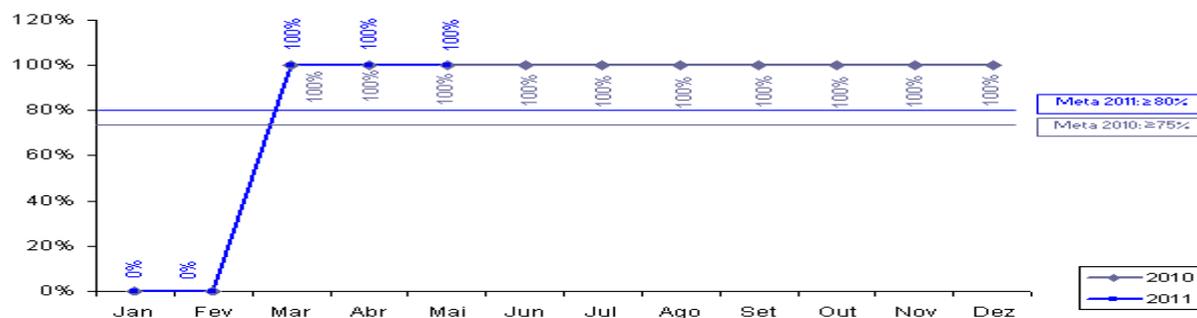

Sentido do indicador: ↑

### Indicador 6c: Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.

- Meta 2011: 60 %
- Posição em 31/05: 100 %
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida. O novo termo de cooperação com a FUNCAP foi celebrado.

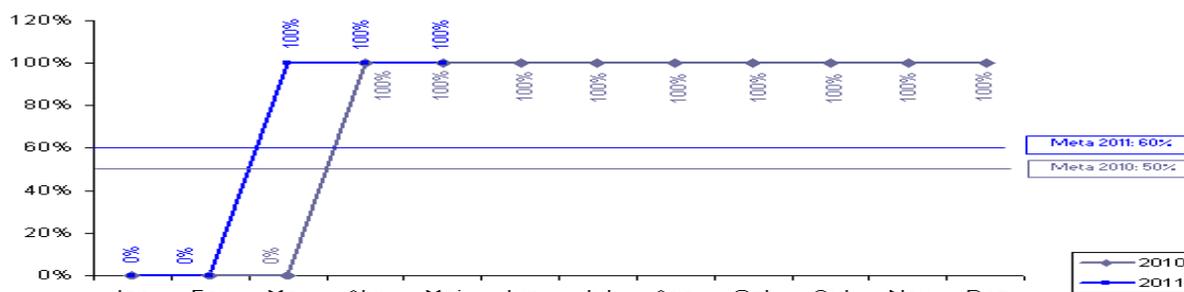

Sentido do indicador: ↑

## INDICADORES SECUNDÁRIOS

### Indicador 5: Avaliação da Implementação municipal do programa “Alfabetização da Idade Certa” (uma em 2009 e uma em 2011)

- Meta 2011: 1
- Posição em 31/05: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A avaliação foi realizada e está sendo concluída a elaboração do documento.

### Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série

- Meta 2011: 80 %
- Posição em 31/05: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A posição da meta deste indicador será obtida até 31/03/2012.

## PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### Projeto 18: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 2ª Etapa

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 35 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2010 a Julho de 2011
- Estágio Previsto: Contrato assinado.
- Estágio Atual: Contrato assinado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## Projeto 19: Serviço de consultoria para a Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico – Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará

- Responsável: Eneida Machado e Kennedy
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2010 a Agosto de 2011
- Estágio Previsto: Contrato assinado.
- Estágio Atual: Contrato assinado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE


### 4. SESA

Representada por Ana Márcia e Vera Coelho.

### INDICADORES PRIMÁRIOS

#### Indicador 7a: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.


- Meta 2011: 30,00 %
- Posição em 31/05: 64,53 %
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE

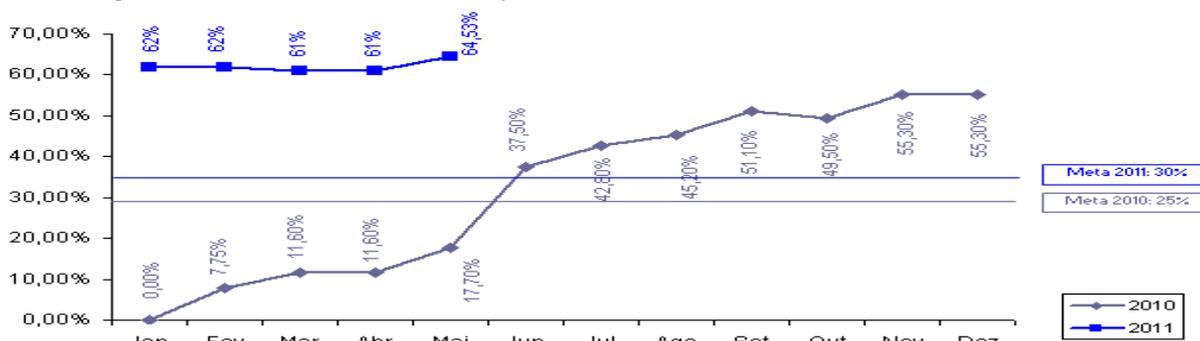

Sentido do indicador: ↑

#### Indicador 7b: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.


- Meta 2011: 30 %
- Posição em 31/05: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: O cálculo do percentual de equipes é realizado com base no número de municípios. A apuração do resultado será realizada no final do exercício de 2011. 30% das equipes do PSF/AB estão de acordo com as exigências do Banco Mundial.



Sentido do indicador: ↑

**Indicador 8a: Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.**

- Meta 2011: 12
- Posição em 31/05: 14
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta já foi superada.

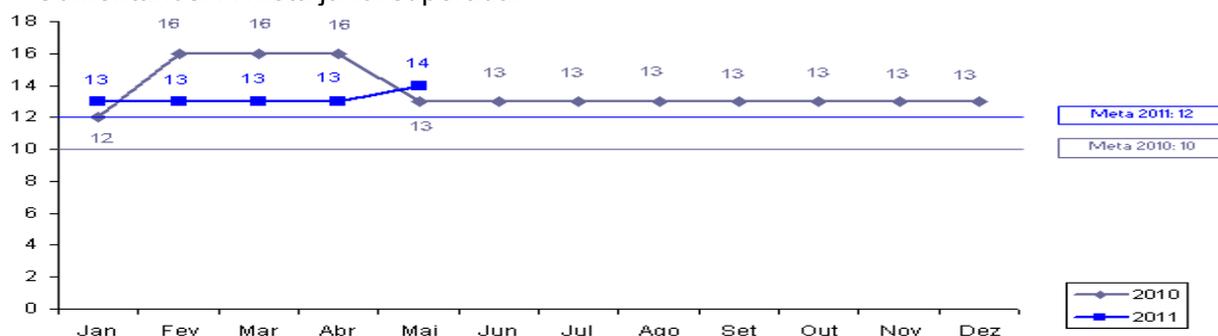


Sentido do indicador: ↑

**Indicador 8b : Número de hospitais com certificação de qualidade da ONA**

- Meta 2011: 1
- Posição em 31/05: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Foram liberadas duas parcelas do convênio. A direção do hospital informou que já foi contrastada a empresa IQG e a 1ª visita está agendada para o período de 20 a 22 de junho de 2011.

**Indicador 9: Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.**

- Meta 2011: 15
- Posição em 31/05: 0
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Foi elaborado o diagnóstico das 15 unidades hospitalares. Porém a assinatura do contrato com a empresa responsável pela capacitação das equipes destes hospitais ainda não foi assinado, pois o mesmo encontra-se na PGE.




Sentido do indicador: ↑

## INDICADORES SECUNDÁRIOS

### Indicador 7: População Atendida pelas Equipes do PSF

- Meta 2011: 6.468.331
- Posição em 31/05: 6.495.386
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A posição encontra-se acima da meta.

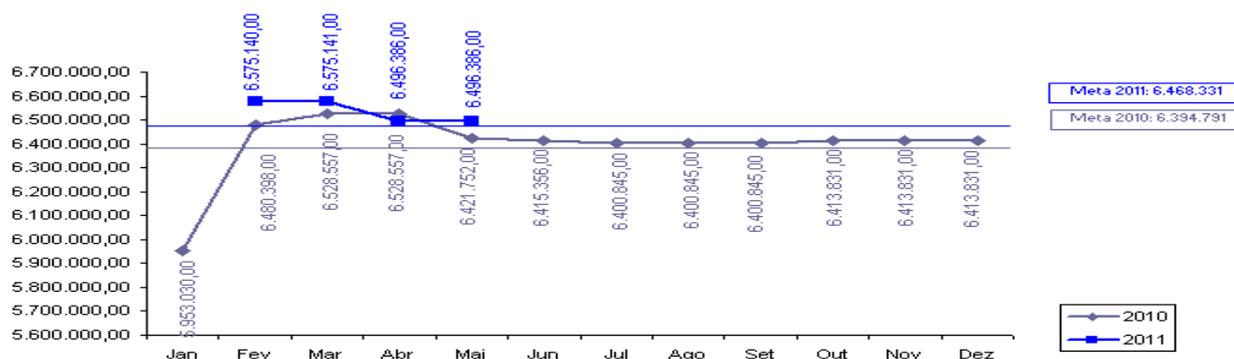


Sentido do indicador: ↑

### Indicador 8: Relatórios semestrais do “Grupo da Água para combater a diarreia infantil que leva a internação”.

- Meta 2011: 2
- Posição em 31/05: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Os relatórios são semestrais. O GT da água está tentando marcar reuniões mensais de acompanhamento.

### Indicador 9: Coleta sistemática e relato peso/altura dos bebês

- Meta 2011: 60,00%
- Posição em 31/05: 66,52%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Os dados apresentados referem-se a janeiro de 2011. O problema é de obesidade, o percentual de obesidade representa o dobro do percentual de magreza no Ceará.



Sentido do indicador: ↑

## PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### Projeto 26: Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PFS – Sistema de Informação de AMQ

- Responsável: Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 59,69 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 a Julho de 2011
- Estágio Previsto: Preparar lista curta.
- Estágio Atual: Recebimento de propostas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: O edital está sendo lançado pela 4ª vez.

### Projeto 27: Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Desenho e implantação do software de custeio por absorção

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 30 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril de 2010 a Julho de 2011
- Estágio Previsto: Enviando convite para empresas da Lista Curta
- Estágio Atual: Negociando Contrato.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### Projeto 28: Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais- pólo – Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 90 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril de 2010 a Agosto de 2011
- Estágio Previsto: Assinatura do contrato.
- Estágio Atual: Contrato assinado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## Projeto 32: Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informática.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março de 2011 a Janeiro de 2012
- Estágio Previsto: Publicar edital.
- Estágio Atual: Aguardando NO do Banco Mundial ao TOR
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## SALVAGUARDAS

### Gestão de Resíduos Sólidos Hospitalares

Relatório Trimestral de Acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares sendo elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II.


## 5. COGERH

Representado por Phillip Falcão

### INDICADOR PRIMÁRIO

#### Indicador 10: Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.

- Meta 2011:  $\geq 37\%$
- Posição em 31/05: 24 %
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Como o 1º semestre do ano é um período chuvoso, cai o faturamento, porém no 2º semestre o faturamento aumenta e a meta será cumprida.

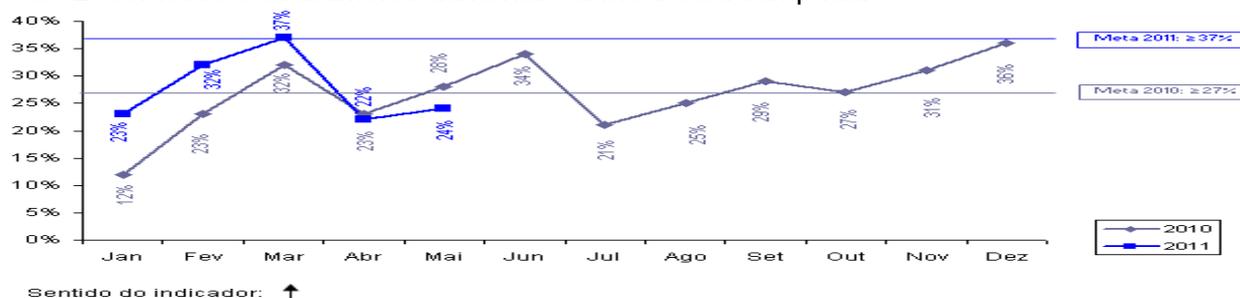


## 6. CAGECE

Representado por Emiliania Filgueiras

### INDICADORES PRIMÁRIOS

#### Indicador 11a: Número de ligações urbanas de água.


- Meta 2011: 275.122
- Posição em 31/05: 277.191
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A perspectiva de cumprimento da meta é alta.

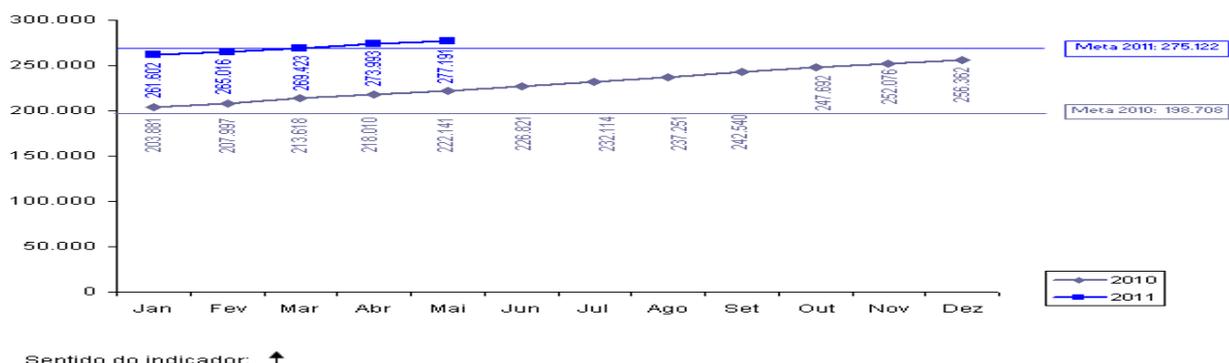

Sentido do indicador: ↑

### Indicador 11b: Número de ligações de esgotos.


- Meta 2011: 124.775
- Posição em 31/05: 125.694
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Conforme desempenho do indicador, a meta será atingida em 2011.

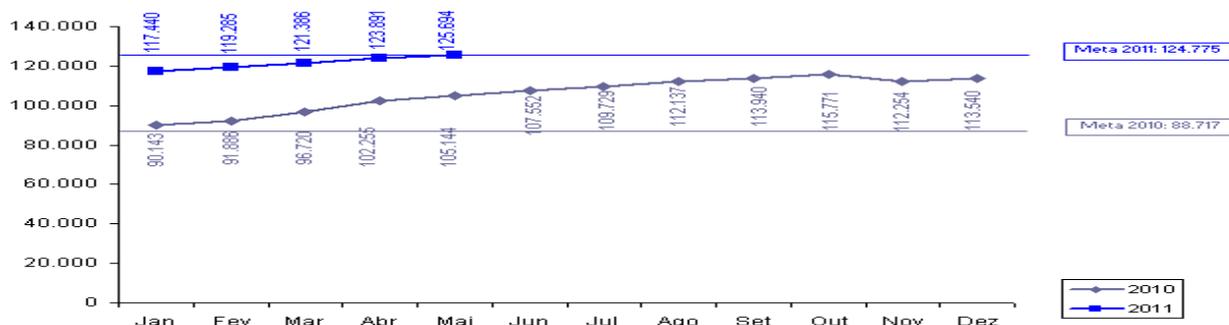

Sentido do indicador: ↑

### Indicador 12: Percentual de Perda de Água.

- Meta 2011:  $\leq 28,20\%$  <sup>3</sup>
- Posição em 31/05: 25,81%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: O aumento apresentado na posição de Maio é devido a mudança de equipamento, cuja leitura é mais precisa.

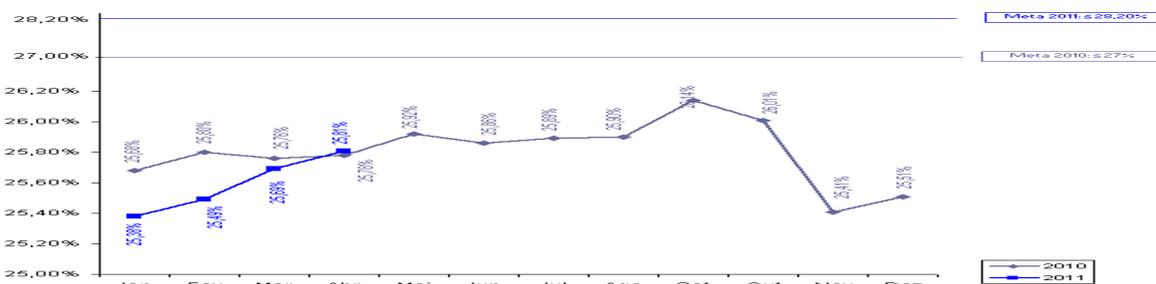


Sentido do indicador: ↓

<sup>3</sup> A meta que consta no PAD é de 28,20%, porém a CAGECE solicitou alteração para 27%, conforme ofício de 03.11.2010. o Banco Mundial solicitou os Planos Estratégico para a aprovação dessa mudança.

## INDICADOR SECUNDÁRIO

### Indicador 10: Margem EBITDA da CAGECE

- Meta 2011: 29,50 %<sup>4</sup>
- Posição em 31/05: 25,21 %
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários:

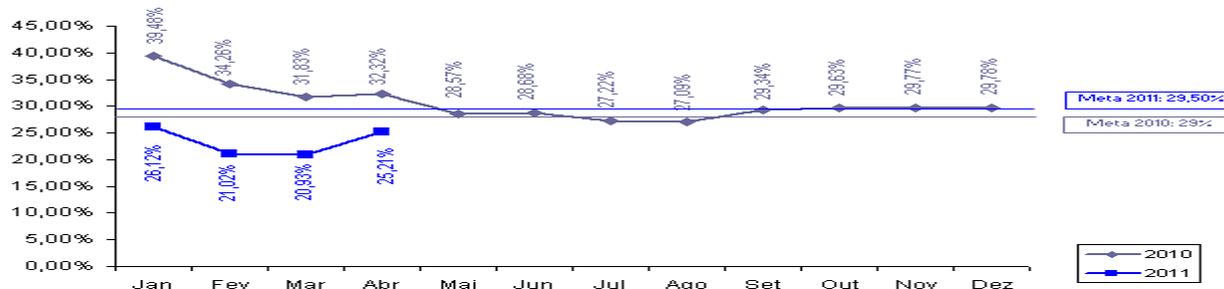

Sentido do indicador: ↑

## SALVAGUARDAS

### Reassentamento e Desapropriações

Relatório Trimestral de Acompanhamento da Salvaguardas de Reassentamento e Desapropriação sendo enviado ao Banco Mundial. Posição do 1º Trimestre de 2011 enviado em abril de 2011.


### 7. ETICE

Representado por João Carlos

## INDICADOR PRIMÁRIO

### Indicador 13: Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.

- Meta 2011: 4.365.700
- Posição em 31/05: 4.339.193
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentário: A partir do Cinturão Digital, o Governo do Ceará estenderá a rede banda larga aos municípios. O prazo de cumprimento da meta desse indicador é até agosto de 2011.

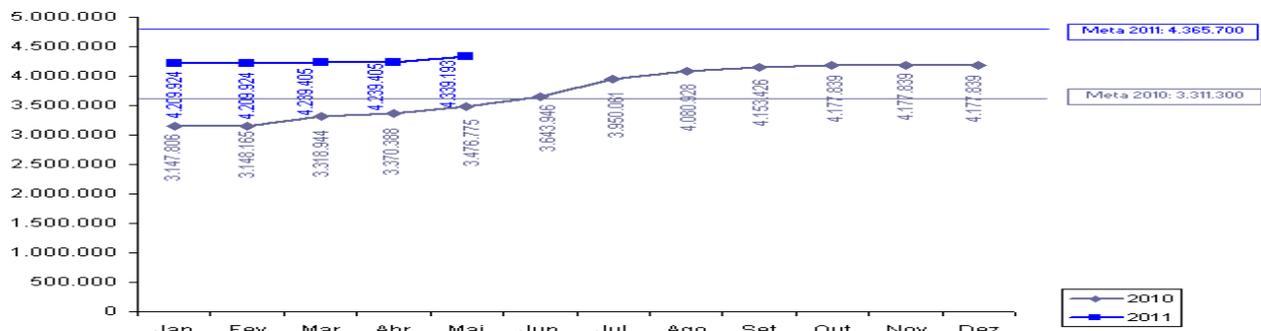

Sentido do indicador: ↑

## INDICADOR SECUNDÁRIO

<sup>4</sup> A meta que consta no PAD é de 29,50%, porém a CAGECE solicitou alteração para 25,21%, conforme ofício de 29.12.2010, o Banco Mundial solicitou os Planos Estratégico para a aprovação dessa mudança.

**Indicador 12: Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com sistemas)**

- Meta 2011: 3
- Posição em 31/05: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A SEFAZ, SEPLAG e ETICE estão agindo em conjunto no sentido de cumprir a meta.

**PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Projeto 9: Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação.**

- Responsável: Denise Olsen
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro de 2011 a Abril de 2012
- Estágio Previsto: Elaboração do TOR.
- Estágio Atual: Setorial encontra-se na fase de atividades preparatórias de elaboração do TOR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE


**8. PGE**

Representada por Fernando Grangeiro

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

**Indicador 4: Redução de processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato.**

- Meta 2011:  $\geq 10,50\%$
- Posição em 31/05: 4,88%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Posição referente a abril de 2011, pois as informações não estavam disponíveis.

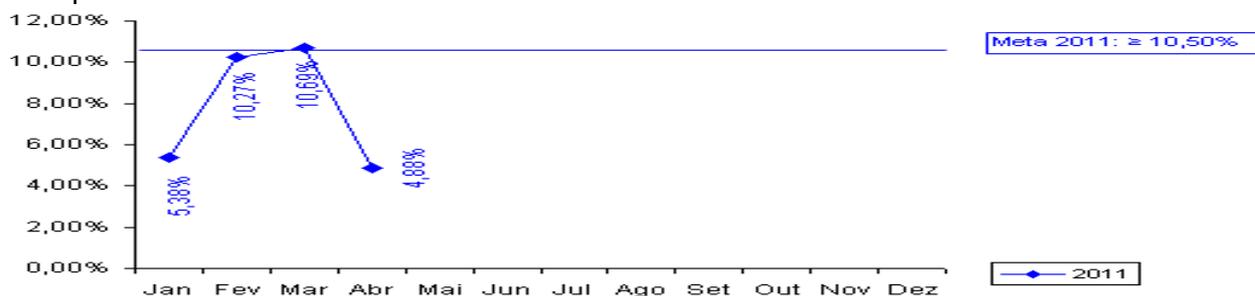

Sentido do indicador: ↑

## PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### Projeto 15: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de empresa para capacitação nas áreas de licitação e administrativa.

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 147 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto de 2009 a Abril de 2012
- Estágio Previsto: Abertura pública das propostas.
- Estágio Atual: Aguardando IG.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

### Projeto 16: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Seminários para capacitação nas áreas de licitação e administrativa.

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 53 mil
- Método de Aquisição: Seção V - Diretrizes Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 a Novembro de 2011
- Estágio Previsto: Notificar adjudicação.
- Estágio Atual: Solicitar ao Banco Mundial empresas de consultoria.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO


## 9. ARCE

Representado por Marcelo Silva

### INDICADOR SECUNDÁRIO

#### Indicador 11: Índice de Conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE

- Meta 2011: 58,00 %
- Posição em 31/05: 21,43 %
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERMELHO
- Comentários: a melhoria observada nos meses de fevereiro a abril de 2011, não se manteve no último mês. Há baixa perspectiva de atingir a meta até o final do ano.

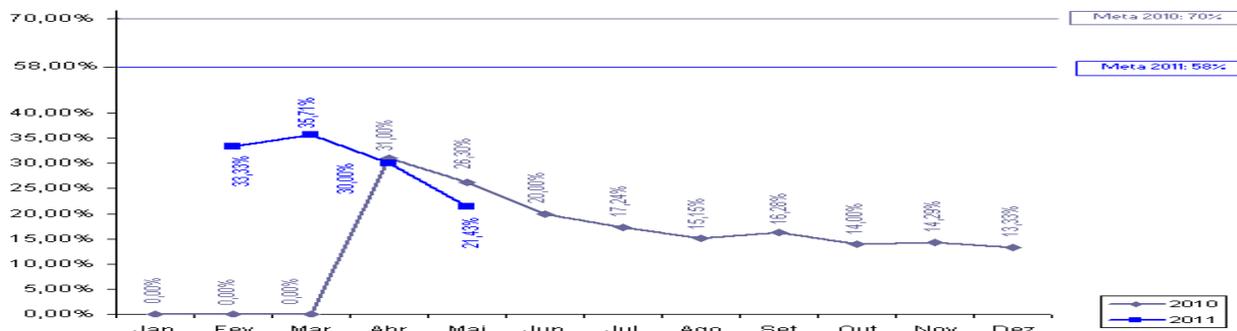

Sentido do indicador: ↑

## PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### Projeto 1: Elaboração do manual de indicadores de performance para o setor de saneamento ARCE

- Responsável: Alceu de Castro Galvão Júnior
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 112 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho de 2009 a Março de 2011
- Estágio Previsto: Finalização
- Estágio Atual: Início dos trabalhos em 11.05.11
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO


## 10. SECITECE

Representado por Ricardo Costa

### INDICADOR SECUNDÁRIO

#### Indicador 13: *Número de serviços tecnológicos realizados*

- Meta 2011: 50.837
- Posição em 31/05: 19.258
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta será cumprida.

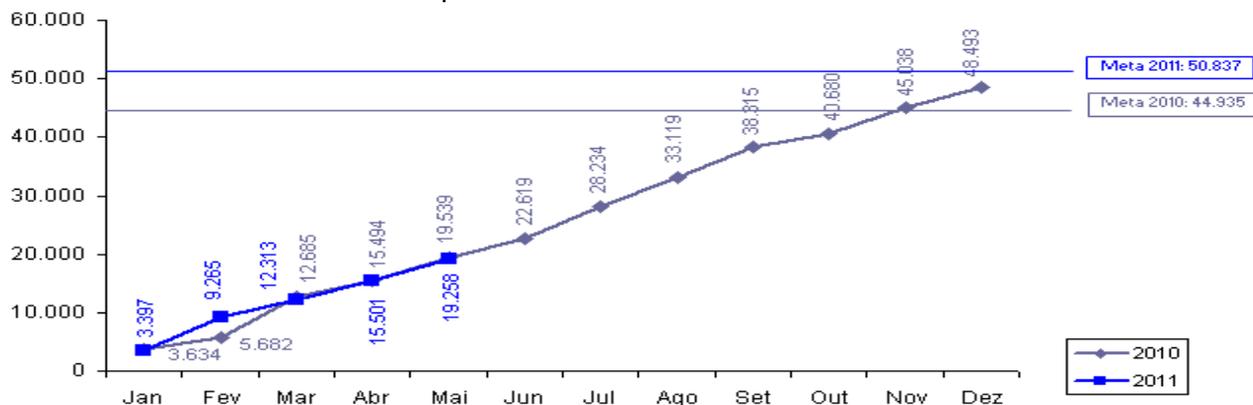

Sentido do indicador: ↑

## 11. CONPAM


Os representantes não estavam presentes.

### INDICADOR SECUNDÁRIO

#### Indicador 14: *Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado*

- Meta 2011: 20,00 %
- Posição em 31/05: 19,36%<sup>5</sup>
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: No ano de 2010 a meta foi atingida, já no ano corrente houveram mudanças na superintendência e o indicador apresentou melhoria no desempenho o que favorece o cumprimento da meta.

<sup>5</sup> Informação referente ao período de janeiro a março de 2011.

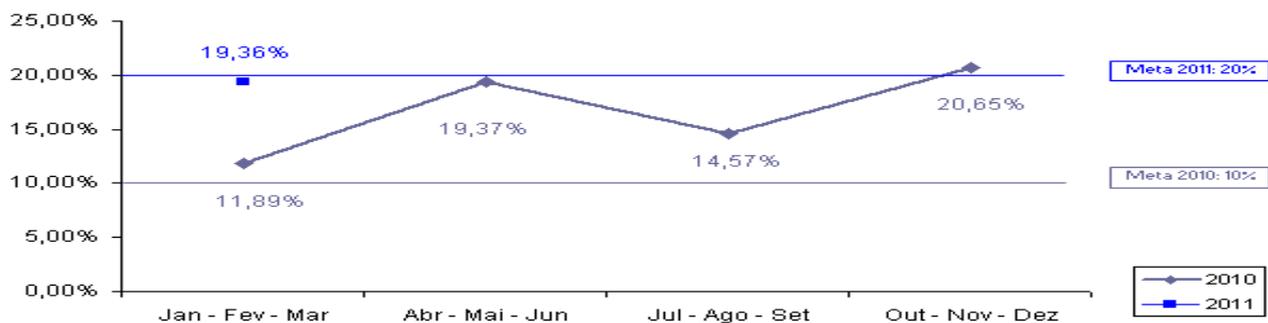

Sentido do indicador: ↑

## PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### Projeto 7: Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente – CONPAM

- Responsável: Maria Goretti de Castro e Maria Dias
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 40 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto de 2009 a Novembro de 2010
- Estágio Previsto: Término do contrato
- Estágio Atual: Término do contrato
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

### Projeto 8: Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos Sólidos de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos– CONPAM

- Responsável: Maria Dias
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 123 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março de 2011 a Dezembro de 2011
- Estágio Previsto: Preparando SDP
- Estágio Atual: Preparando SDP
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## SALVAGUARDAS

### Gestão de Resíduos Sólidos Hospitalares

Relatório Trimestral de Acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares sendo elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II.

## **12. CGE**

Os representantes não estavam presentes.

### **PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

#### **Projeto 3: Capacitação em processos de auditoria preventiva**

- Responsável: Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 180 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro de 2009 a Agosto de 2011
- Estágio Previsto: Preparando documentos de licitação.
- Estágio Atual: TOR
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### **Projeto 4: Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará**

- Responsável: Marconi Lemos
- Categoria de Licitação: Empresas de consultoria
- Valor: US\$ 170 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro de 2009 a Abril de 2011
- Estágio Previsto: Início dos trabalhos
- Estágio Atual: Trabalhos iniciados
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **Projeto 5: Desenvolvimento de modelo para apuração e controle de custos**

- Responsável: Marconi Lemos e Kelly Barbosa
- Categoria de Licitação: Empresas de consultoria
- Valor: US\$ 173,23 mil
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro de 2010 a Janeiro de 2012
- Estágio Previsto: Não objeção ao TOR
- Estágio Atual: Rever TOR
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

## **13. CIDADES**

Os representantes não estavam presentes.

### **PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

#### **Projeto 6: Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade**

- Responsável: Tércia Pinheiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 a Agosto de 2011
- Estágio Previsto: Elaboração do TOR
- Estágio Atual: Elaboração do TOR
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## **SALVAGUARDAS**

### **Gestão de Resíduos Sólidos Hospitalares**

Relatório Trimestral de Acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares sendo elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II.

#### **14. IPECE**

Representado por Cristina Medeiros

### **PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

#### **Projeto 10: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Consultoria**

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 31.34 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro de 2009 a Março de 2011
- Estágio Previsto: Término
- Estágio Atual: Término
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

#### **Projeto 11: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos resultado da consultoria**

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 7,42 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 a Março de 2011
- Estágio Previsto: Término
- Estágio Atual: Término
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE
- Comentários: este projeto está vinculado à execução do projeto anterior.

#### **Projeto 12: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado aos indígenas.**

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 1,24 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro de 2010 a Janeiro de 2011
- Estágio Previsto: Término
- Estágio Atual: Término
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 13: Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAp II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo)**

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 204,33 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho de 2009 a Junho de 2012
- Estágio Previsto: Prestação de serviços pelos consultores
- Estágio Atual: Consultores contratados encontram-se prestando serviços
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**SALVAGUARDAS**

**Povo Indígena**

No dia 15 de Abril de 2011 ocorreu um evento na aldeia indígena Jenipapo Kanindé para o lançamento das cartilhas referente ao projeto 11, que encontram-se disponíveis no site do IPECE no link: <http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/publicacoes/>.

**15. TCE**

Representado por Giovanna Adjafre.

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Projeto 33: Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de solução integrada de gerenciamento eletrônico de documentos e informações do TCE (TCE 100% digital)**

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor: US\$ 200 mil
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: novembro de 2010 a Março de 2012
- Estágio Previsto: Assinatura do contrato
- Estágio Atual: Contrato assinado
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 34: Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresa para realização de consultoria de tecnologia da informação.**

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 70 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro de 2009 a Setembro de 2011
- Estágio Previsto: Assinatura do contrato
- Estágio Atual: Contrato assinado
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

## VIII. INFORMAÇÕES FINAIS

Cristina Medeiros – IPECE informou que Regis Cunningham – Banco Mundial estará em Missão ao Ceará nos dias 21 e 22 de junho.

Cristina Medeiros – IPECE informou que será confirmada a data para a realização da reunião do COGERF, cuja pauta será: Desempenho do Projeto SWAp II e Relatório Produto Resultado.

Anúzia Gosson – SEPLAG informou que em reunião com Jimmy Oliveira – IPECE foi discutido os temas para escolha do COGERF dos sete RPR de 2011.

Cristina Medeiros – IPECE informou que SESA, PGE, CGE e SEPLAG devem definir até o final do mês a viabilidade de seus projetos de Assistência Técnica e caso seja constatado que não terão condições de realizá-los, a UGP deve ser informada para que seja redistribuindo seus respectivos valores.

## IX. CONTATOS COM A UGP

A comunicação deve ser feita através dos seguintes e-mails:

- [ugpswap@ipece.ce.gov.br](mailto:ugpswap@ipece.ce.gov.br)
- [cristina.medeiros@ipece.ce.gov.br](mailto:cristina.medeiros@ipece.ce.gov.br)

## X. PARTICIPAÇÃO

O acompanhamento das participações das setoriais nas reuniões do Comitê SWAp II é realizado mensalmente conforme tabela (**Anexo 2**) e gráfico (**Anexo 3**).

## XI. ENCERRAMENTO

Às 11:45 Cristina Medeiros - IPECE encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

## X. ANEXOS

Anexo 1: Apresentação em *Power Point*

Anexo 2: Tabela – Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais

Anexo 3: Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais

# Anexo 1

# OPERAÇÃO Swap II

**Acompanhamento Mensal do Desempenho por Setorial**  
**16 de Junho de 2011**

# OPERAÇÃO Swap II

## PAUTA DA REUNIÃO

# Pauta da Reunião

## 1 - Apresentação dos Participantes

- Representantes do Comitê SWAp II

## 2 - Auditoria

## 3 - IPECE INFORME

## 4 - Desembolso Assistência Técnica

## 5 - Acompanhamento dos Programas Elegíveis

## 6 - Sumário Projetos de Assistência Técnica

## 7 - Acompanhamento Mensal das Setoriais

- Indicadores Primários e Secundários
- Assistência Técnica
- Salvaguardas

# OPERAÇÃO Swap II

## 1- APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

# 1. Apresentação dos Participantes

- Representantes do Comitê SWAp II

# OPERAÇÃO Swap II

## 2 - AUDITORIA

## 2. Auditoria

- Houve auditoria do Consultor do Banco Mundial Danilo Carvalho nos dias 26 e 27 de maio de 2011.
- Reuniões com o TCE nos dias 13,16,17, 22 de junho de 2011 para disseminação dos achados de auditoria de 2009 com setoriais SESA, SCIDADES, SEDUC, CAGECE, SECITECE.
- Regis Cunningham estará em missão no dia 21 de junho com CGE e TCE e no dia 22 com TCE, CGE, PGE, SEPLAG e SEFAZ.

### 3. IPECE INFORME

#### IPECE Informe SWAp II

- Notícias

Diário do Nordeste  
O Povo

- SWAp III

## 4. Desembolso Assistência Técnica

- Desembolso com pagamento em julho-dezembro 2011 será efetuado no dia 1 de julho de 2011.
- Solicita-se confirmação dos meses de pagamento até 22 de junho de 2011.

# OPERAÇÃO Swap II

## 5 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ELEGÍVEIS

# PROGRAMAS ELEGÍVEIS REGRA DOS 30%

## Acompanhamento de Despesas dos Programas Elegíveis - Ano de 2011 - Regra dos 30%

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Previsão (abr/11 a setembro/11) (a)	Realizado (até 31/mai/11) (b)	Realizado/Previsto (%) (b)/(a)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	1.100.000,0	-	0,00%	Red
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	22.000.000,0	27.178.093,7	123,54%	Green
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	2.200.000,0	274.070,0	12,46%	Red
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	210.000.000,0	190.909.208,3	90,91%	Green
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	5.000.000,0	1.506.499,8	30,13%	Green
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	1.000.000,0	-	0,00%	Red
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	55.000.000,0	40.140.239,5	72,98%	Green
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	3.000.000,0	1.938.520,0	64,62%	Green
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	1.500.000,0	-	0,00%	Red
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	5.500.000,0	10.044.449,0	182,63%	Green
<b>TOTAL</b>		<b>306.300.000</b>	<b>271.991.080,2</b>	<b>88,80%</b>	Green
<b>Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]</b>		<b>91.890.000,00</b>		<b>81.597.324,07</b>	

Posição em: 31-mai-11

# PROGRAMAS ELEGÍVEIS REGRA DOS 70%

## Acompanhamento de Despesas dos Programas Elegíveis - Ano de 2011 - Regra dos 70%

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2011 Jan - Dez (a)	Orçamento 2011 - Até 31/05 (b)	Realizado (até 31/05/11) (c)	Realizado/Previsto (%) (c)/(b)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	3.268.447,0	1.361.855,0	-	0,00%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	162.534.432,0	67.722.680,0	50.055.946	73,91%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	23.826.799,0	9.927.835,0	517.870	5,22%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	975.497.717,0	406.457.380,0	476.943.818	117,34%	
SECITECE	194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	12.166.208,0	5.069.255,0	3.077.101	60,70%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.835.100,0	1.181.290,0	-	0,00%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	194.927.906,0	81.219.960,0	80.700.037	99,36%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	19.151.625,0	7.979.845,0	2.231.530	27,96%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.477.726,0	1.449.055,0	-	0,00%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	34.191.184,0	14.246.325,0	14.020.707	98,42%	
<b>TOTAL</b>		<b>1.431.877.144,00</b>	<b>596.615.480,00</b>	<b>627.547.008,5</b>		
<b>Valor Limite do Desembolso [70% * TOTAL]</b>		<b>1.002.314.000,80</b>	<b>417.630.836,00</b>			


Posição em: 31-mai-11

# OPERAÇÃO Swap II

## 6 - SUMÁRIO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE LICITAÇÕES DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

# Cumprimento do Plano de Licitações

## 34 PROJETOS NO PLANO DE LICITAÇÃO EM EXECUÇÃO

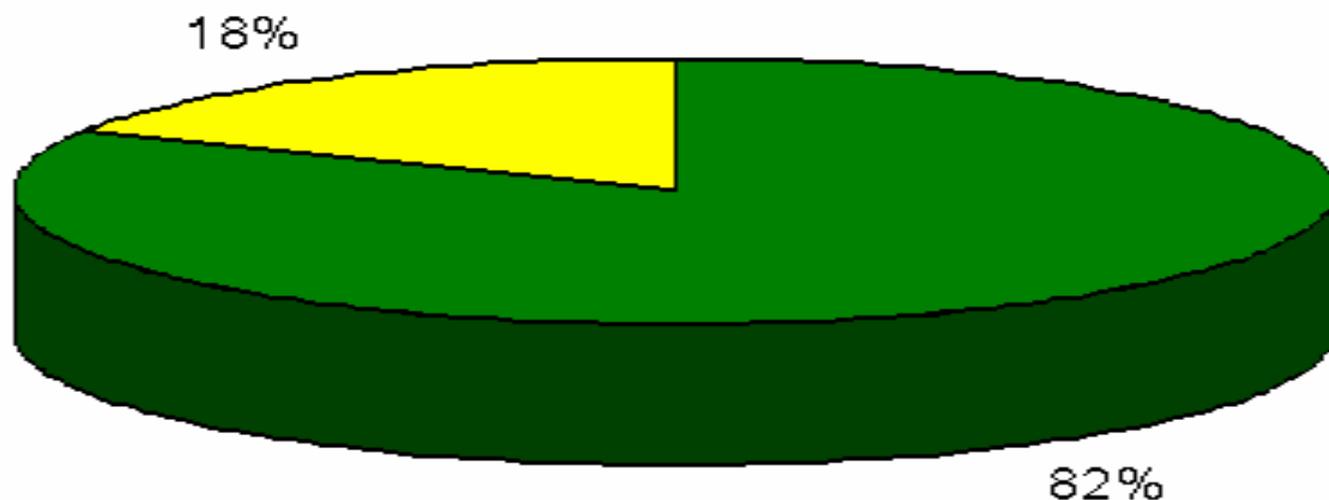


- Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
- Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia

■ ARCE (1), CGE (3), CIDADES (5), CONPAM (6,7), ETICE (8,9), IPECE (10,11,12,13,14), PGE (15), SEDUC (17,18,19), SEPLAG (21,22,23, 25), SESA (26,27,28,29,30,31), TCE (33,34)

■ CGE (2,4), PGE (16), SEFAZ (20), SEPLAG (24), SESA (32)

## Cumprimento do Plano de Licitações

34 PROJETOS NO PLANO DE LICITAÇÃO EM EXECUÇÃO

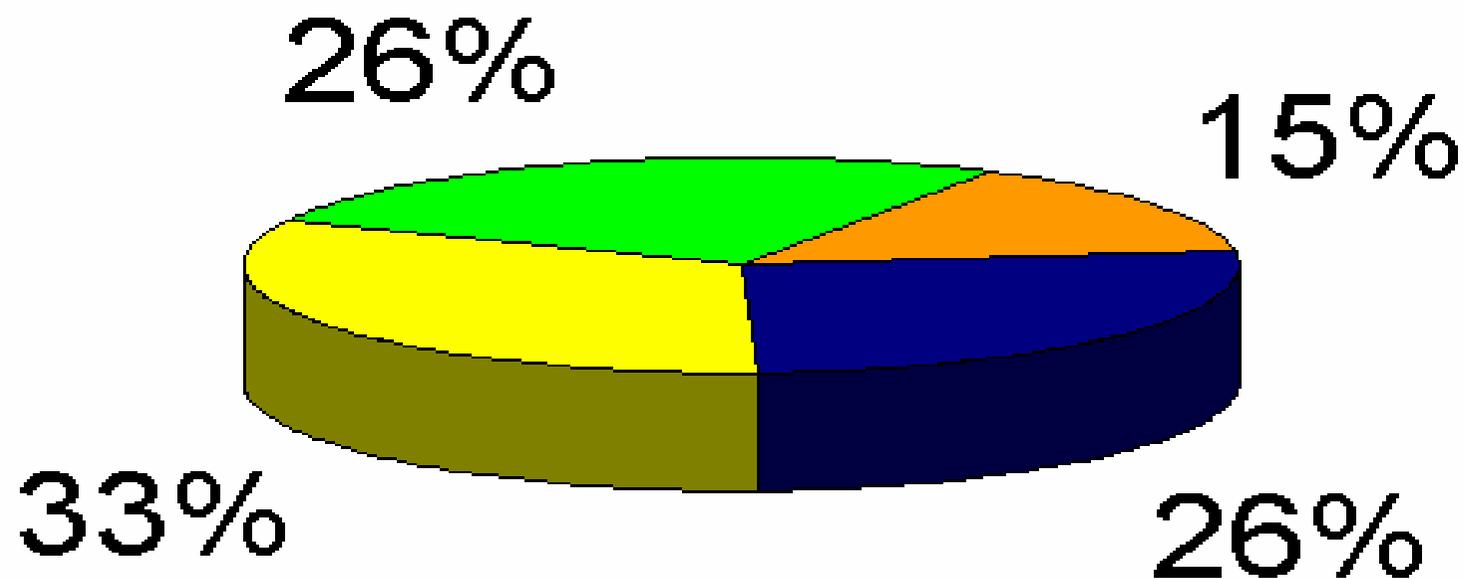

■ Inicializados ■ Em andamento ■ Contrato assinado ■ Concluído

Inicializados CGE (2, 4), CIDADES (5), ETICE (9), SEFAZ (20)


Em andamento CONPAM (7), PGE (15,16), SEFAZ (20), SEPLAG (21,23,24), SESA (26,27)

Contrato assinado ARCE (1), CGE (3), IPECE (13), SEDUC (18,19), SEPLAG (22,25), SESA (28, 30), TCE (33,34)

Concluído COMPAM (6), ETICE (8), IPECE (10, 11, 12, 14), SEDUC (17), SESA (29, 31)

# Cumprimento do Plano de Licitações

9 PROJETOS EM ANDAMENTO:

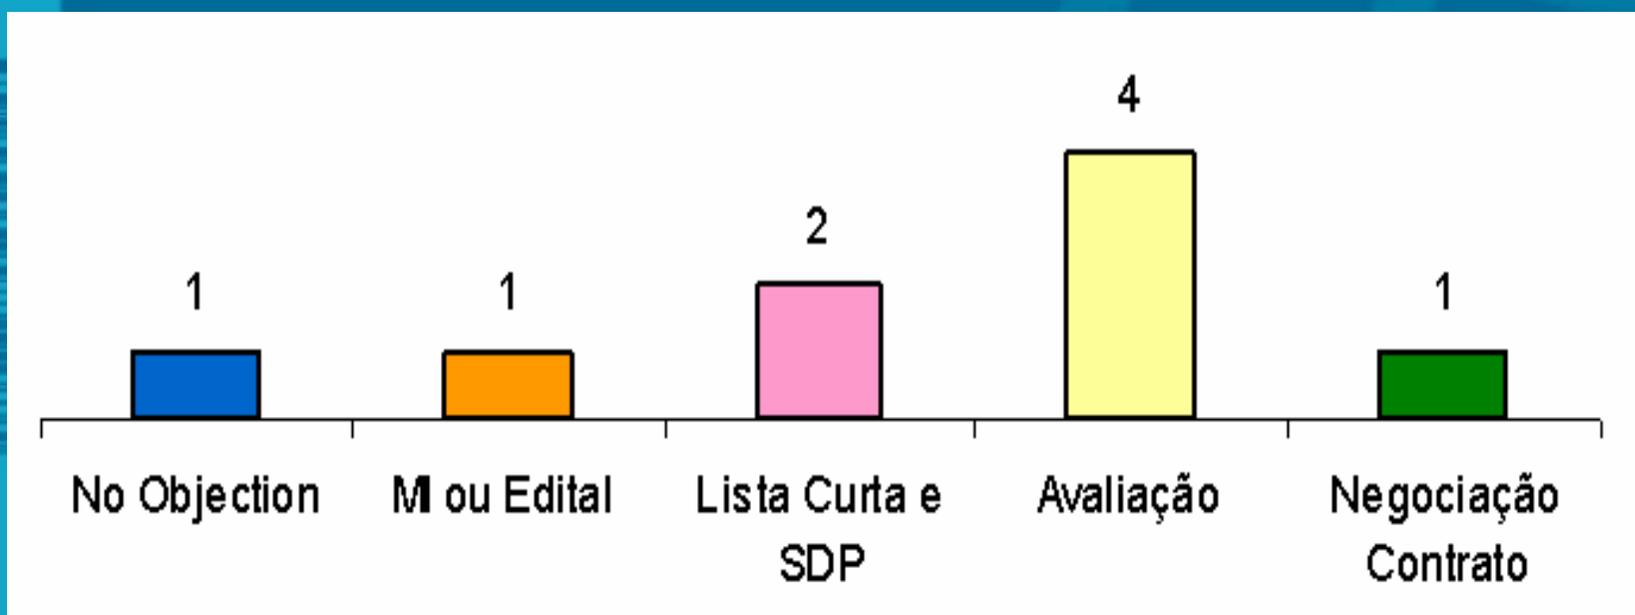

No Objection

SESA (32)

MI ou Edital

PGE(16)

Lista Curta e SDP

CONPAM (7), PGE (15)

Avaliação

SEPLAG (21,23,24), SESA (26)

Negociação Contrato

SESA (27)

# OPERAÇÃO Swap II

## 7 - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DAS SETORIAIS

# OPERAÇÃO Swap II

**SEFAZ**

# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES PRIMÁRIOS

# Gestão do Setor Público

## Secretaria da Fazenda - SEFAZ


### Indicador 1: Saldo Fiscal Corrente do Estado (Receita Correntes menos Despesas Correntes).

- **Meta 2011:** R\$ 1.293,0 milhões
- **Posição em 31/05:** R\$ 1.215,4 milhões
- **Posição em 31/05 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** As receitas e as despesas correntes se comportam conforme o esperado.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta será cumprida até o final do ano.

# Gestão do Setor Público

## Secretaria da Fazenda - SEFAZ

### Saldo Fiscal Corrente do Estado

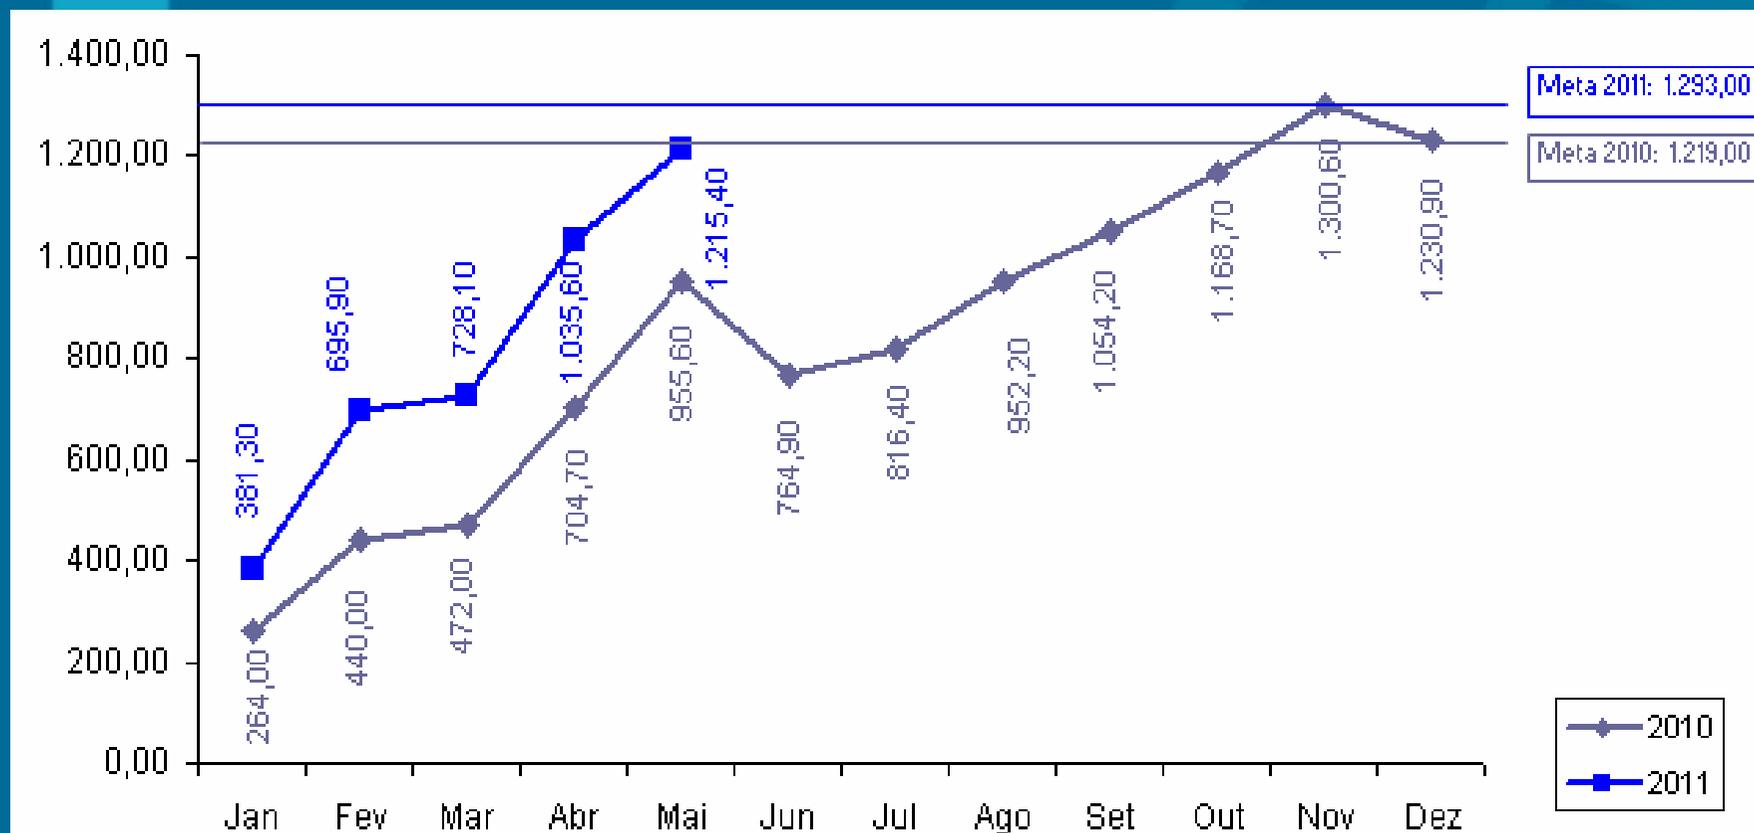

Sentido do indicador: ↑

# Gestão do Setor Público

## Secretaria da Fazenda - SEFAZ


**Indicador 2: Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).**

- **Meta 2011:  $\leq 0,35$**
- **Posição em 31/05: 0,299014**
- **Posição em 31/05 em relação à meta: **
- **Justificativa: Não há nenhuma indicação de que haja concentração de arrecadação de ICMS em algum dos setores estudados que possa aumentar o índice além da meta.**
- **Perspectiva de Cumprimento: Permaneceremos dentro da meta até o final do ano.**

# Gestão do Setor Público

## Secretaria da Fazenda - SEFAZ

### Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores

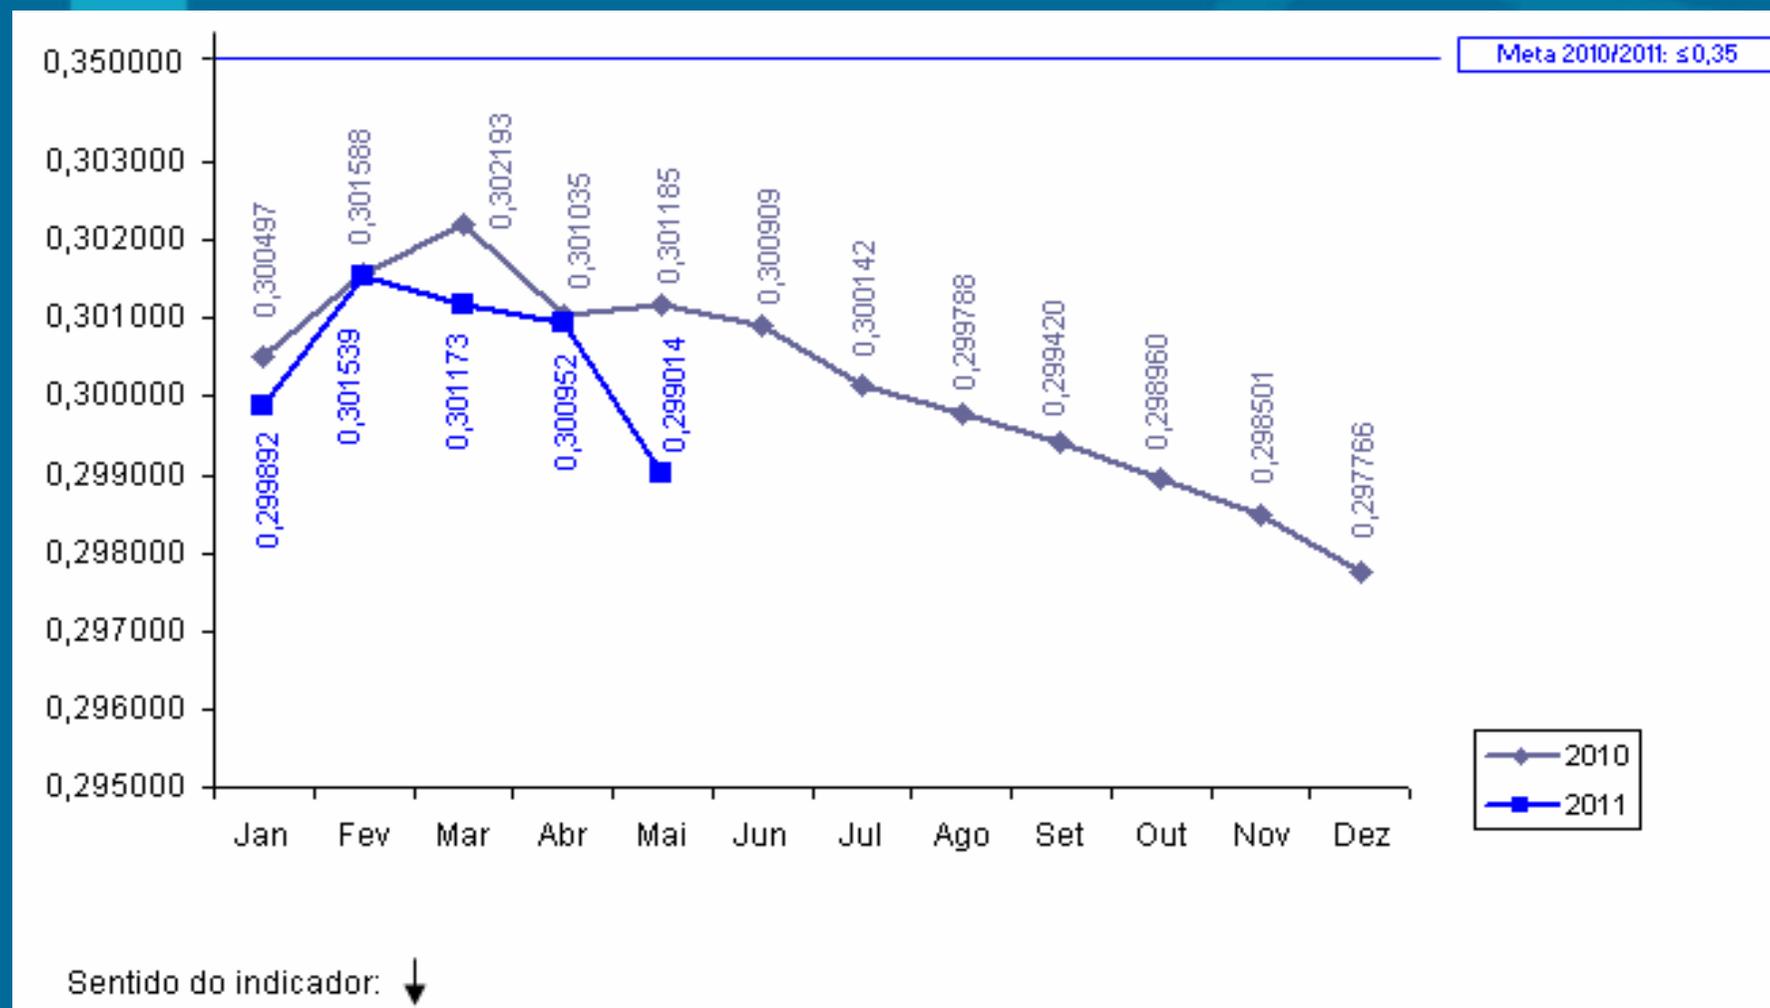

# Negócios e Inovação

Secretaria da Fazenda - SEFAZ


**Indicador 14: Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos em 72 horas.**

- **Meta 2011:  $\geq 35,00\%$**
- **Posição em 31/05: 29,00%**
- **Posição em 31/05 em relação à meta: **
- **Justificativa: Com a vigência da Lei Complementar nº. 12//2010, as empresas do MEI são cadastradas automaticamente na SEFAZ/CE a partir do registro informado pela Receita Federal. Essas informações foram disponibilizadas por este órgão desde abril de 2010 e foram introduzidas no Estatístico do Cadastro da SEFAZ/CE nesta data.**
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.**

# Negócios e Inovação

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Percentual de registros empresariais no CGF concluídos em 72 horas

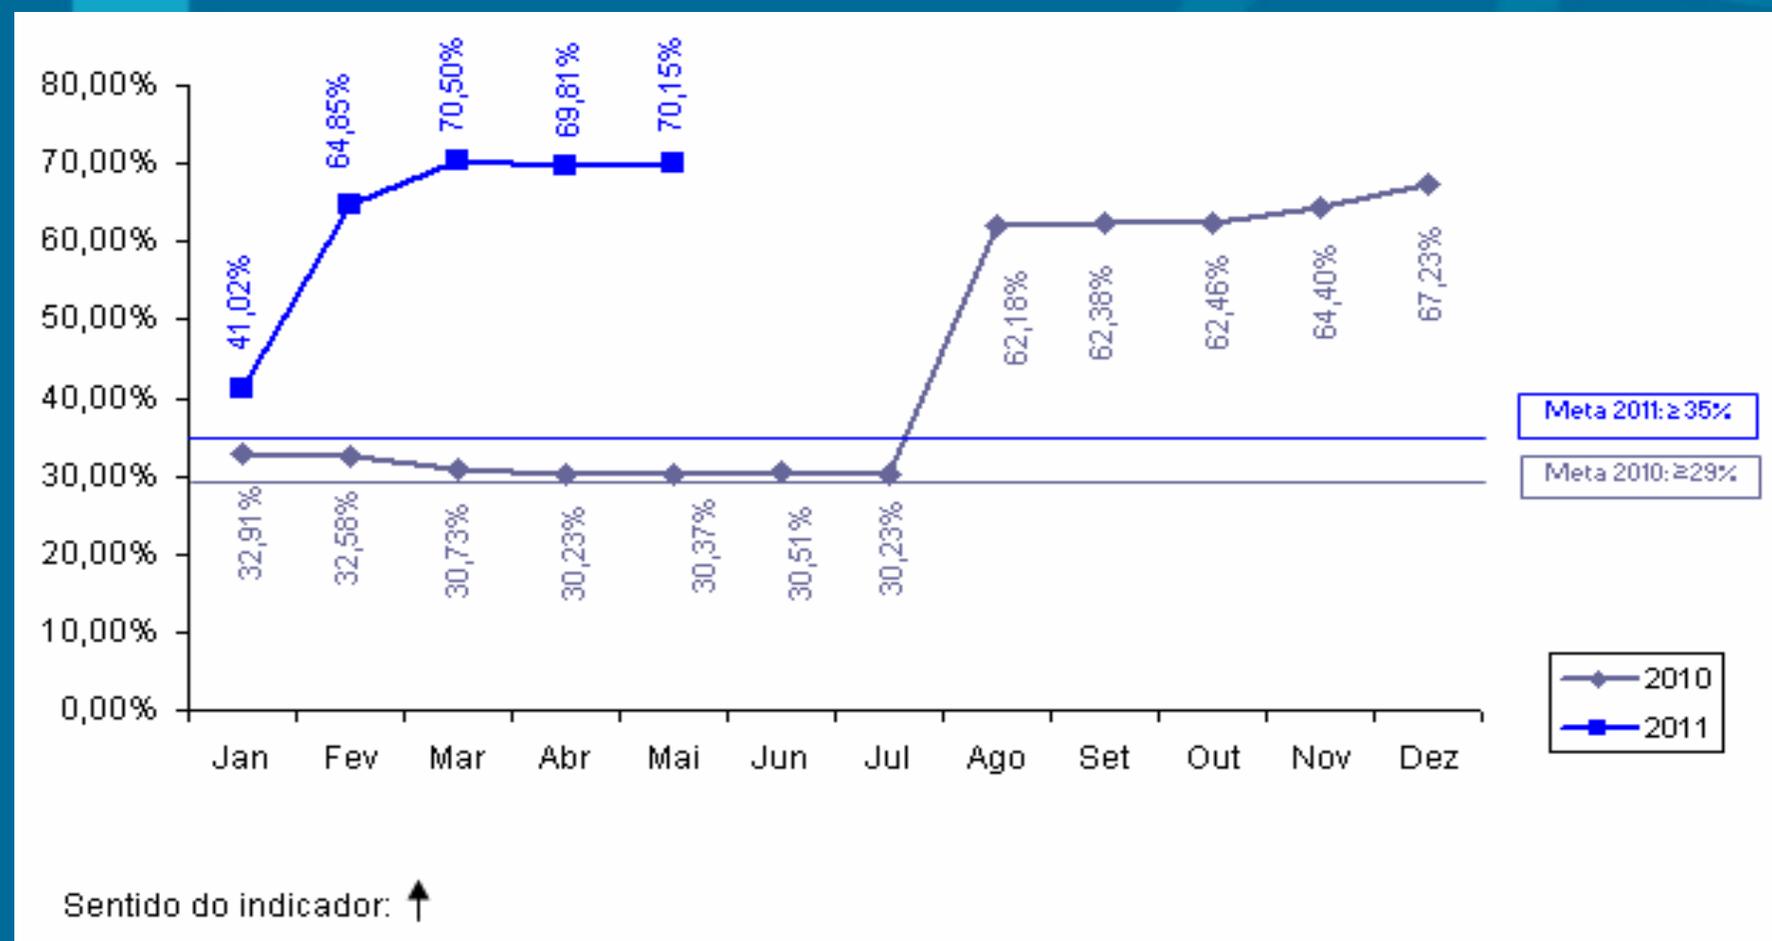

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

# Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ


**Indicador 1: Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário (% dos contribuintes ativos do regime de recolhimento normal que declararam saldo devedor na DIEF que a SEFAZ inscreve na Dívida Ativa)**

- **Meta 2011:**  $\leq 10,00\%$
- **Posição em 31/05:** 3,42%
- **Posição em 31/05 em relação à meta:** 

# Gestão do Setor Público

## Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário (% dos contribuintes ativos do regime de recolhimento normal que declararam saldo devedor na DIEF que a SEFAZ inscreve na Dívida Ativa)

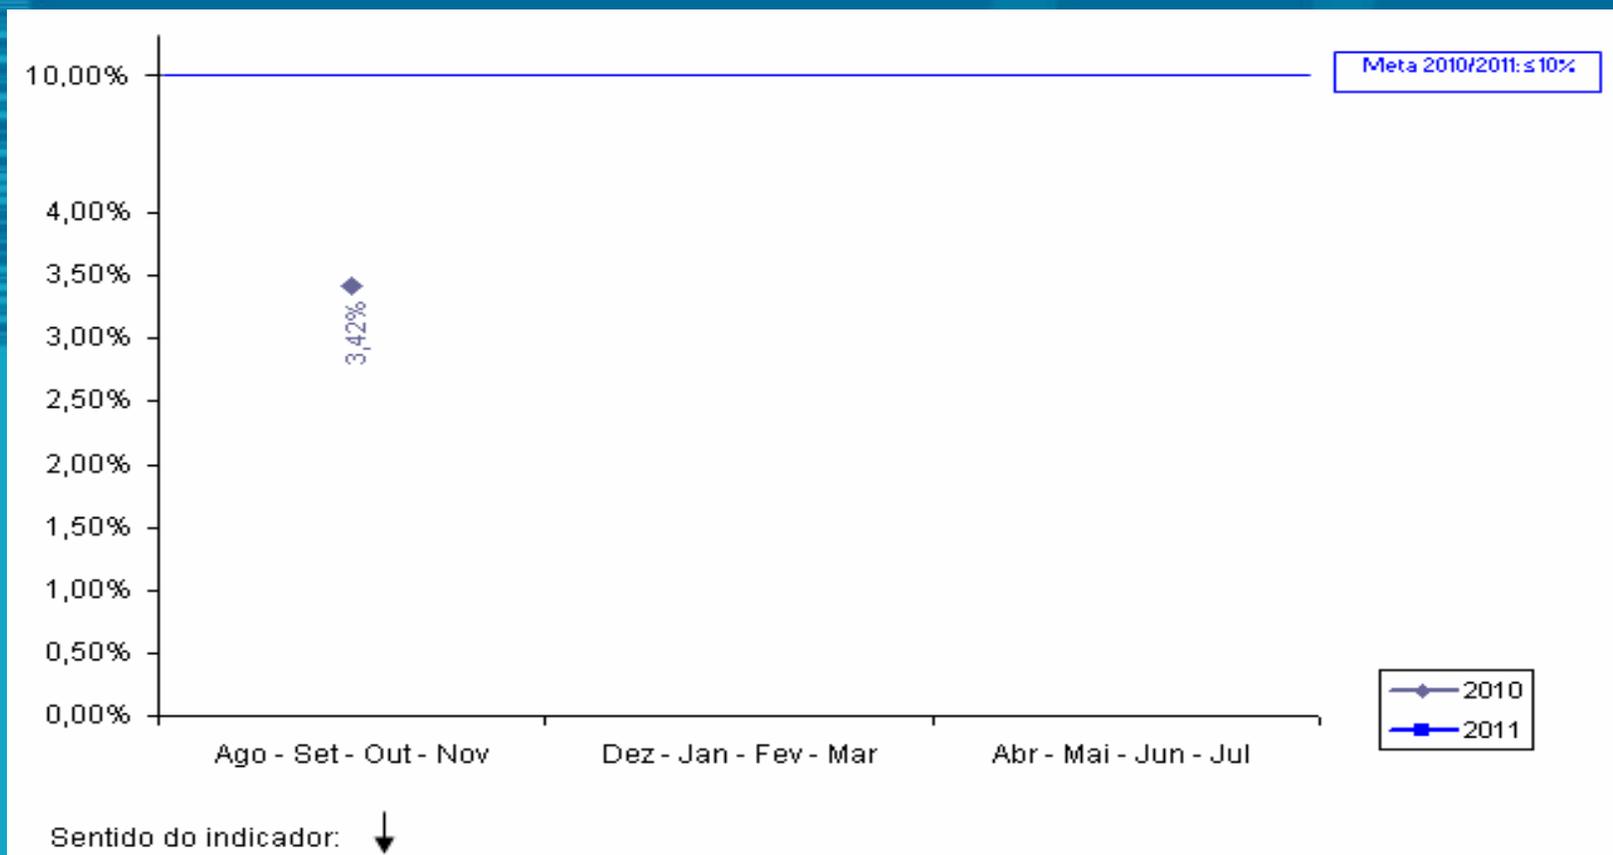

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

## Projeto 20: Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.

- **Responsável:** Eliezer Pinheiro e Rejane Muniz
- **Categoria de Licitação:** BENS
- **Valor:** US\$ 300 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão
- **Revisão Prévia/Posterior:**Prévia
- **Início/Término:** Março 2011 - Abril 2012
- **Estágio Previsto:** Não Objeção do BM ao TOR e aos Documentos de Licitação.
- **Estágio Atual:** Elaborando TOR
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

# OPERAÇÃO Swap II

**SEPLAG**

# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES PRIMÁRIOS

# Gestão do Setor Público

## Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Indicador 3: Número de Secretarias Setoriais com Relatórios Anuais de Desempenho Validados pela SEPLAG e pelo COGERF e Colocados na Página Eletrônica da SEPLAG.**

- **Meta 2011: 15**
  - **Posição em 31/05: - \***
  - **Posição em 31/05 em relação à meta: **
  - **Perspectiva de Cumprimento: O cumprimento total da meta nos prazos previstos**
- \* A meta será cumprida em março de 2012. Em relação aos onze relatórios da meta de 2010, eles foram apresentados ao COGERF para aprovação em

# Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Indicador 4: Número de “Relatórios Produto-Resultado” (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.**

- **Meta 2011: 7**
- **Posição em 31/05: - \***
- **Posição em 31/05 em relação à meta: **

**\*A meta será cumprida em março de 2012. Em relação aos RPR de 2010, 3 relatórios foram enviados ao BM e 2 relatórios estão sendo elaborados.**

# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES SECUNDÁRIOS

# Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Indicador 2: Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.**

- **Meta 2011: 2**
- **Posição em 31/05: - \***
- **Posição em 31/05 em relação à meta: **
- **Perspectiva de cumprimento: A perspectiva é de cumprimento da meta.**

**\* A meta do indicador será cumprida no início de 2012.**

# Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG


**Indicador 3: Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.**

- **Meta 2011:**  $\leq 3$  meses
- **Posição em 31/05:** 1,87 meses
- **Posição em 31/05 em relação à meta:** 

# Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.**

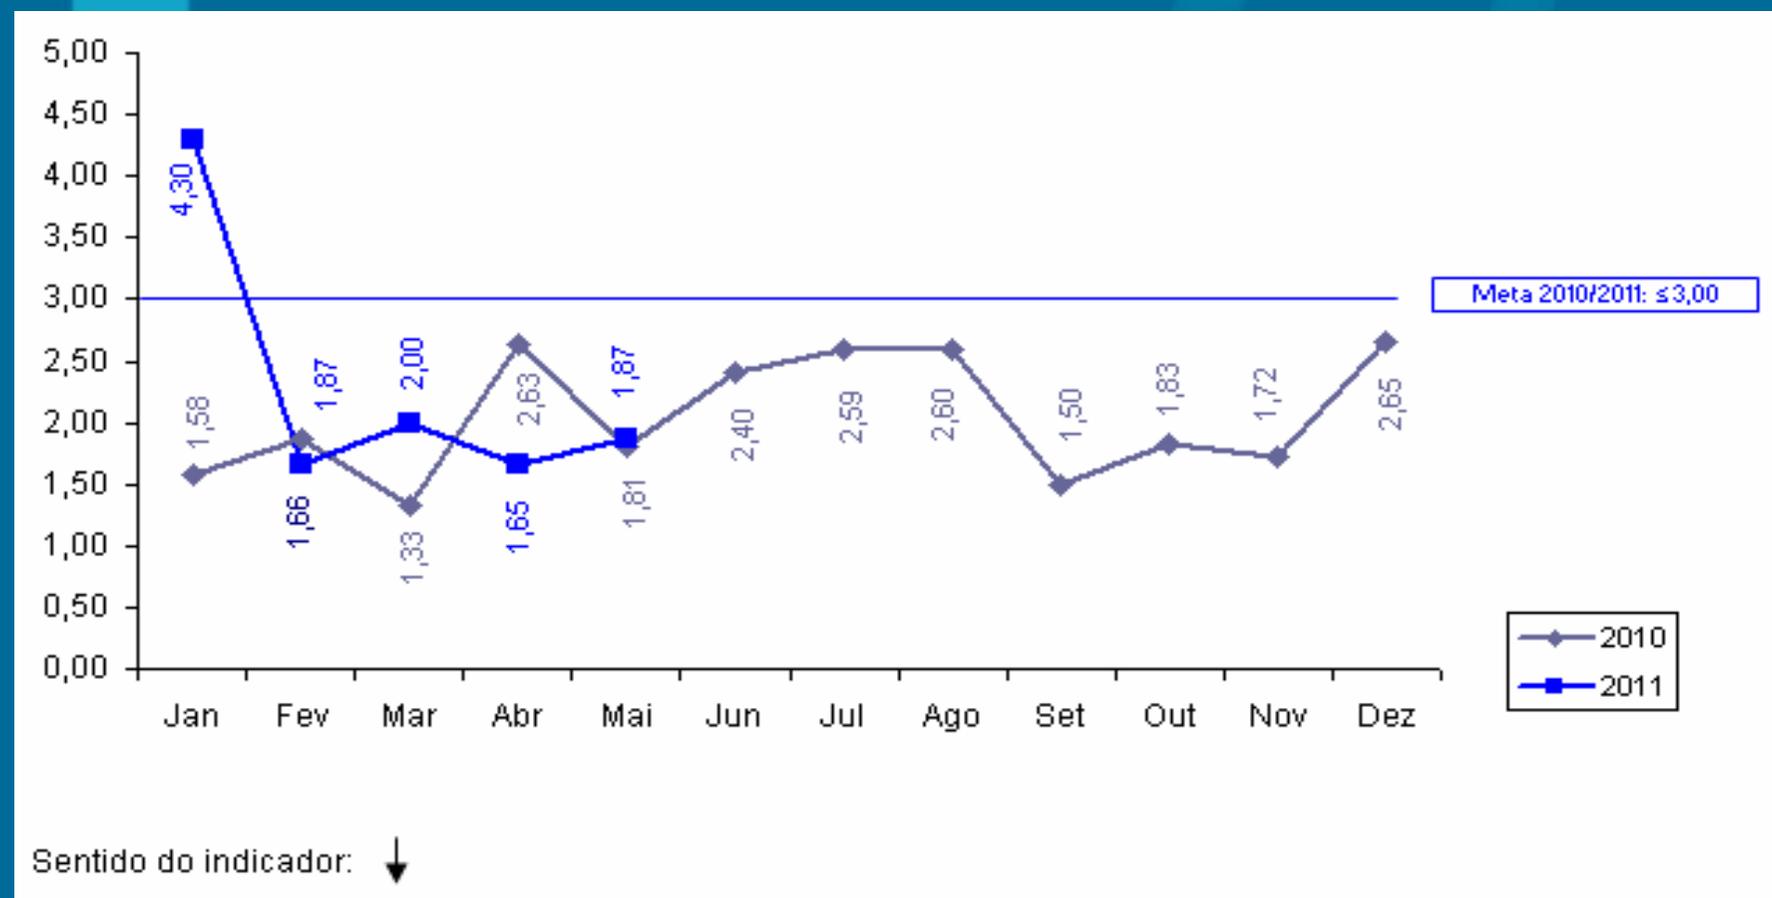

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

**Projeto 21: Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados.\***

- **Responsável:** Fátima Falcão
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 200 mil
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho de 2009 – janeiro de 2012
- **Estágio Previsto:** Avaliando Propostas
- **Estágio Atual:** Avaliando Propostas
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## **Projeto 22: Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará**

- **Responsável:** Sérgio Lage e Fernanda Salles
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 100 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho de 2009 – Abril de 2012
- **Estágio Previsto:** Prestação do serviços
- **Estágio Atual:** Empresa está executando os serviços.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

**Projeto 23: Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras.**

- **Responsável:** Soraya Quixadá
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 130 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2010 – Maio 2012
- **Estágio Previsto:** Recebendo Proposta
- **Estágio Atual:** Recebendo Proposta
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

**Projeto 24: Realização de ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do Governo à sociedade em geral e às entidades representativas das empresas.**

- **Responsável:** Soraya Quixadá
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 100 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2010 – Maio 2012
- **Estágio Previsto:** Assinatura do Contrato
- **Estágio Atual:** Avaliando Proposta
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

**Projeto 25: Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico – Financeira do Estado do Ceará.**

- **Responsável:** Mário Fracalossi
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 90 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Outubro 2009 – abril 2012
- **Estágio Previsto:** Início dos serviços
- **Estágio Atual:** Início dos serviços
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

# OPERAÇÃO Swap II

**SEDUC**

# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES PRIMÁRIOS

# Educação

## Secretaria da Educação - SEDUC

**Indicador 5: Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com o relatório de melhores práticas.**

- **Meta 2011:**  $\geq 90 \%$
- **Posição em 31/05:** - \*
- **Posição em 31/05 em relação à meta:** 

**\* O resultado do indicador será disponibilizado em março de 2012.**

# Educação

## Secretaria da Educação - SEDUC


**Indicador 6a: Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.**

- **Meta 2011: 80%**
- **Posição em 31/05: 100%**
- **Posição em 31/05 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: o indicador vem sendo cumprido**
- **Plano de Ação: A designação dos gerentes do PAIC foi concretizada.**

# Educação

## Secretaria da Educação - SEDUC

Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.

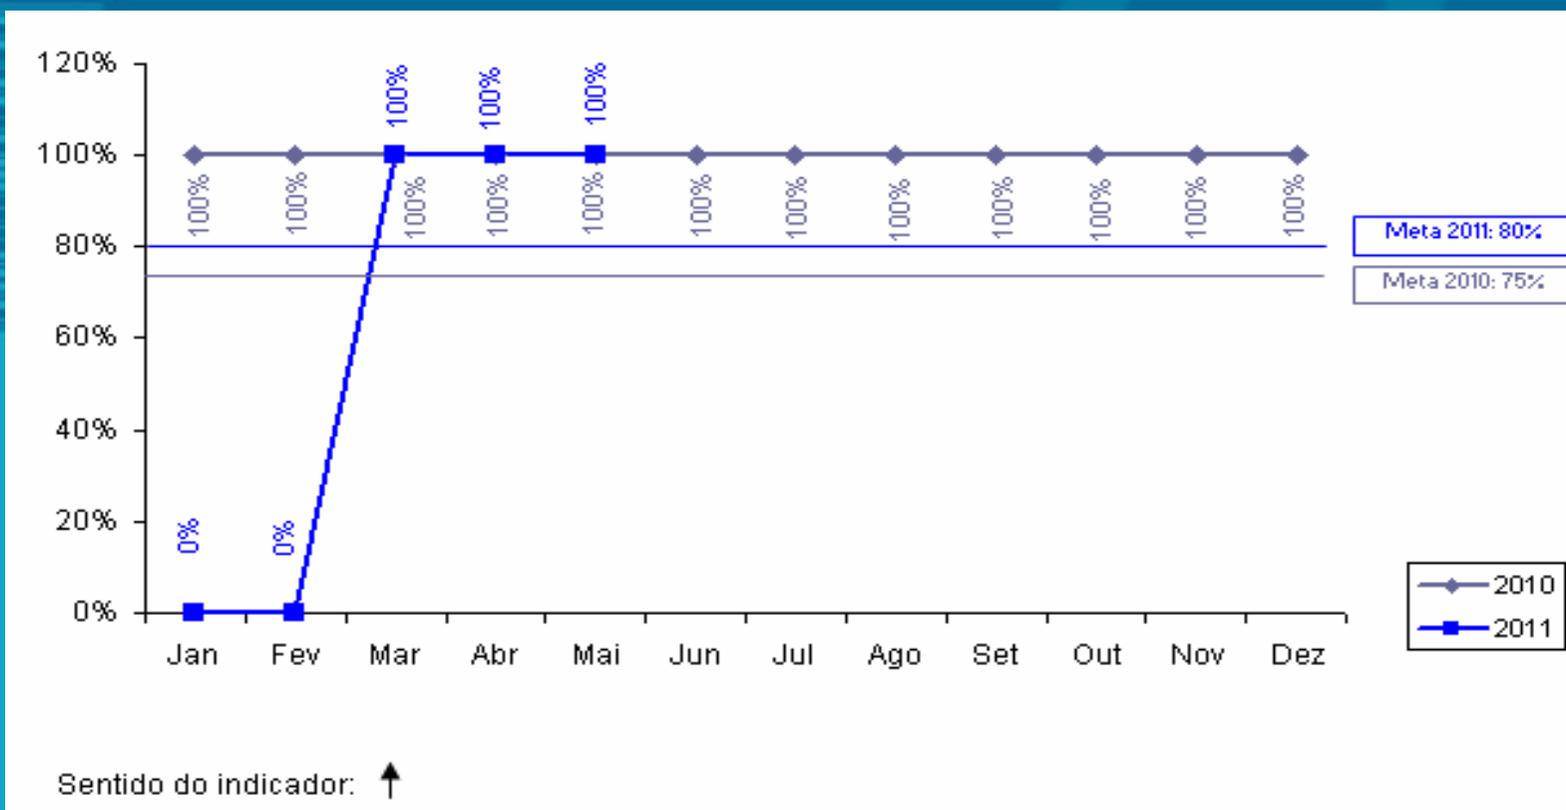

# Educação

## Secretaria da Educação - SEDUC


**Indicador 6b: Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.**

- **Meta 2011:**  $\geq 80\%$
- **Posição em 31/05:** **100%**
- **Posição em 31/05 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** o indicador foi cumprido
- **Plano de Ação:** Continuação da distribuição do material aos municípios para reinício do Programa.

# Educação

## Secretaria da Educação - SEDUC

Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas

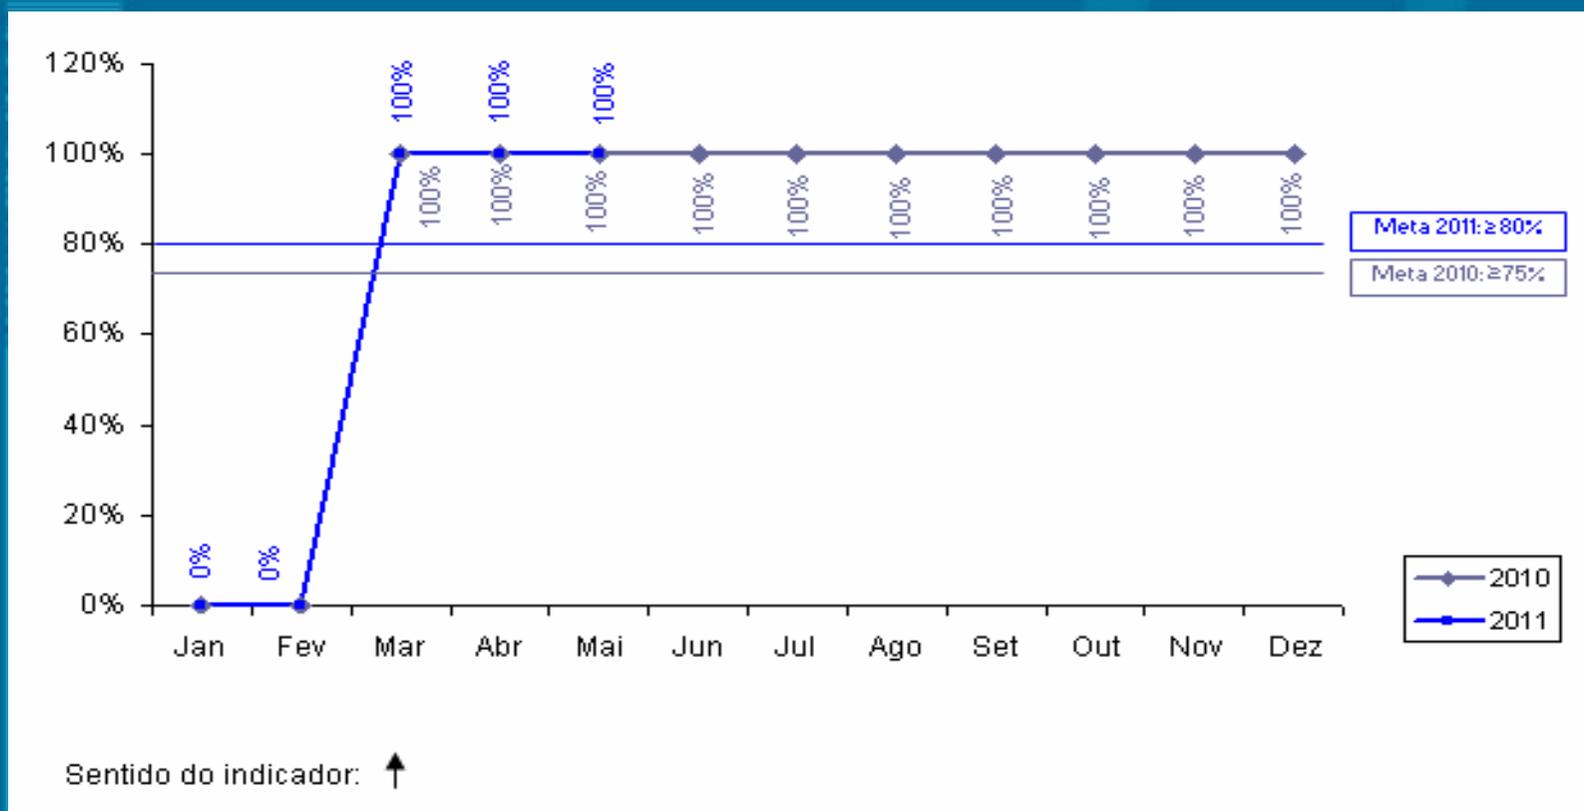

# Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


**Indicador 6c: Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.**

- **Meta 2011: 60%**
- **Posição em 31/05: 100%**
- **Posição em 31/05 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: o indicador será cumprido**
- **Plano de Ação: O novo Termo de Cooperação com a FUNCAP foi celebrado.**

# Educação

## Secretaria da Educação - SEDUC

Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.

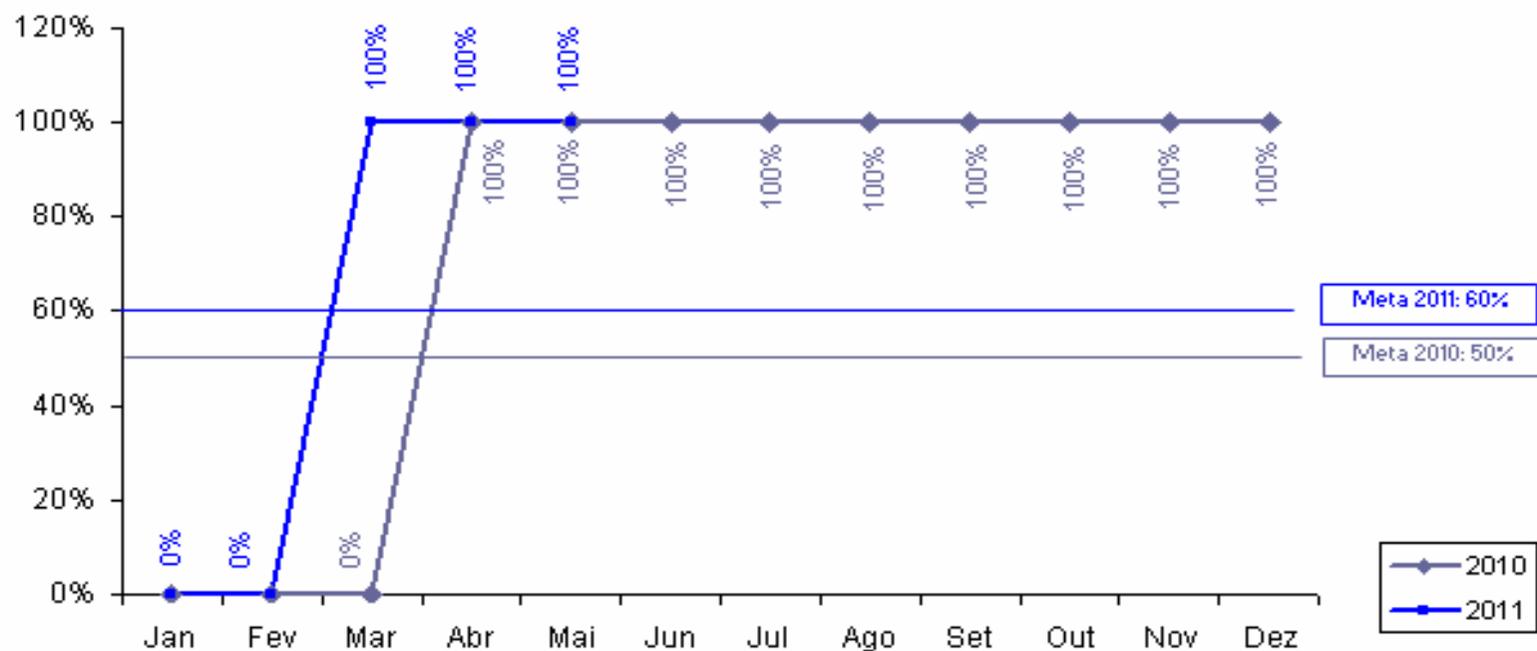

Sentido do indicador: ↑

# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES SECUNDÁRIOS

# Educação

Secretaria de Educação - SEDUC

## Indicador 5: Avaliação da implementação municipal do programa “Alfabetização da Idade Certa” (uma em 2009 e uma em 2011).

- **Meta 2011:** 1
- **Posição em 31/05:** -
- **Posição em 31/05 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** A avaliação foi realizada e o documento se encontra em fase de conclusão
- **Perspectiva de Cumprimento:** O indicador será cumprido.

# Educação

Secretaria de Educação - SEDUC

## Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- **Meta 2011:** 80%
- **Posição em 31/05:** - \*
- **Posição em relação a meta:** 

\*A informação será obtida em 31/05/2012.

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

## Projeto 18: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 2ª Etapa

- **Responsável:** Eneida Machado
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 35 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2010 - julho 2011
- **Estágio Previsto:** Contrato assinado
- **Estágio Atual:** Contrato assinado
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

## Projeto 19: Serviço de consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará

- **Responsável:** Eneida Machado e Kennedy
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 90 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2010 - Agosto 2011
- **Estágio Previsto:** Contrato assinado
- **Estágio Atual:** Contrato assinado
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

# OPERAÇÃO Swap II

**SESA**

# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES PRIMÁRIOS


### Indicador 7a: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.

- **Meta 2011:** 30,0%
- **Posição em 31/05:** 64,53%
- **Posição em 31/05 em relação à meta:** 

# Saúde

## Secretaria da Saúde - SESA

### Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ

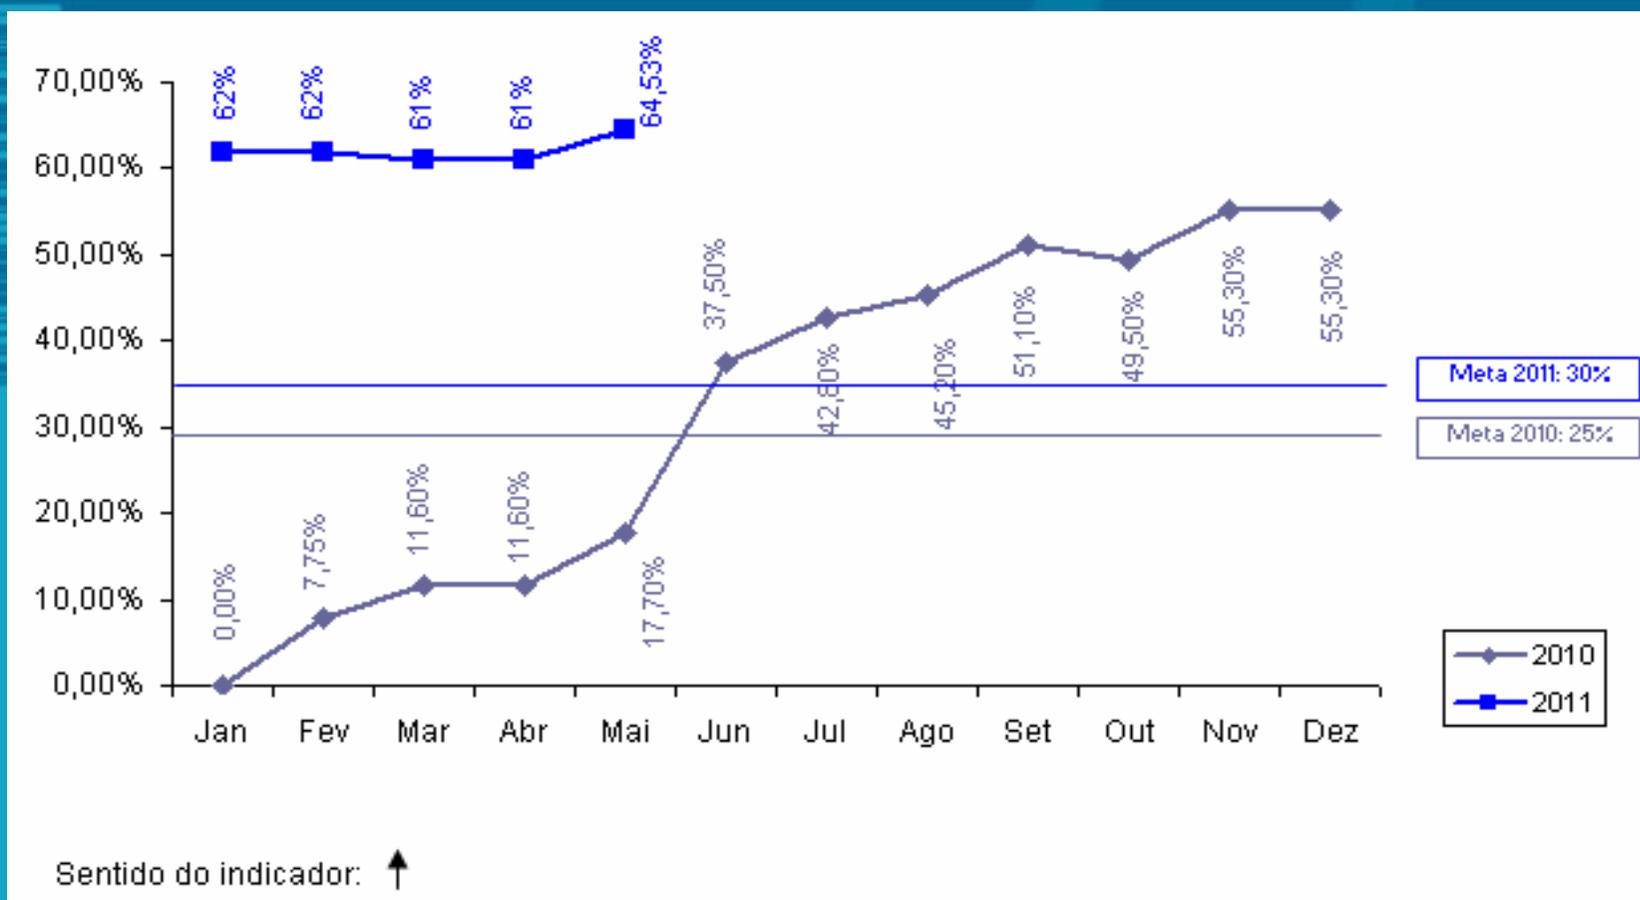

# Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

**Indicador 7b: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.**

**Meta 2011: 30%**

**Posição em 31/05: -**


**Posição em 31/05 em relação à meta: **

**Justificativa: A apuração do resultado será realizada no final do exercício de 2011.**

# Saúde

## Secretaria da Saúde - SESA

**Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.**

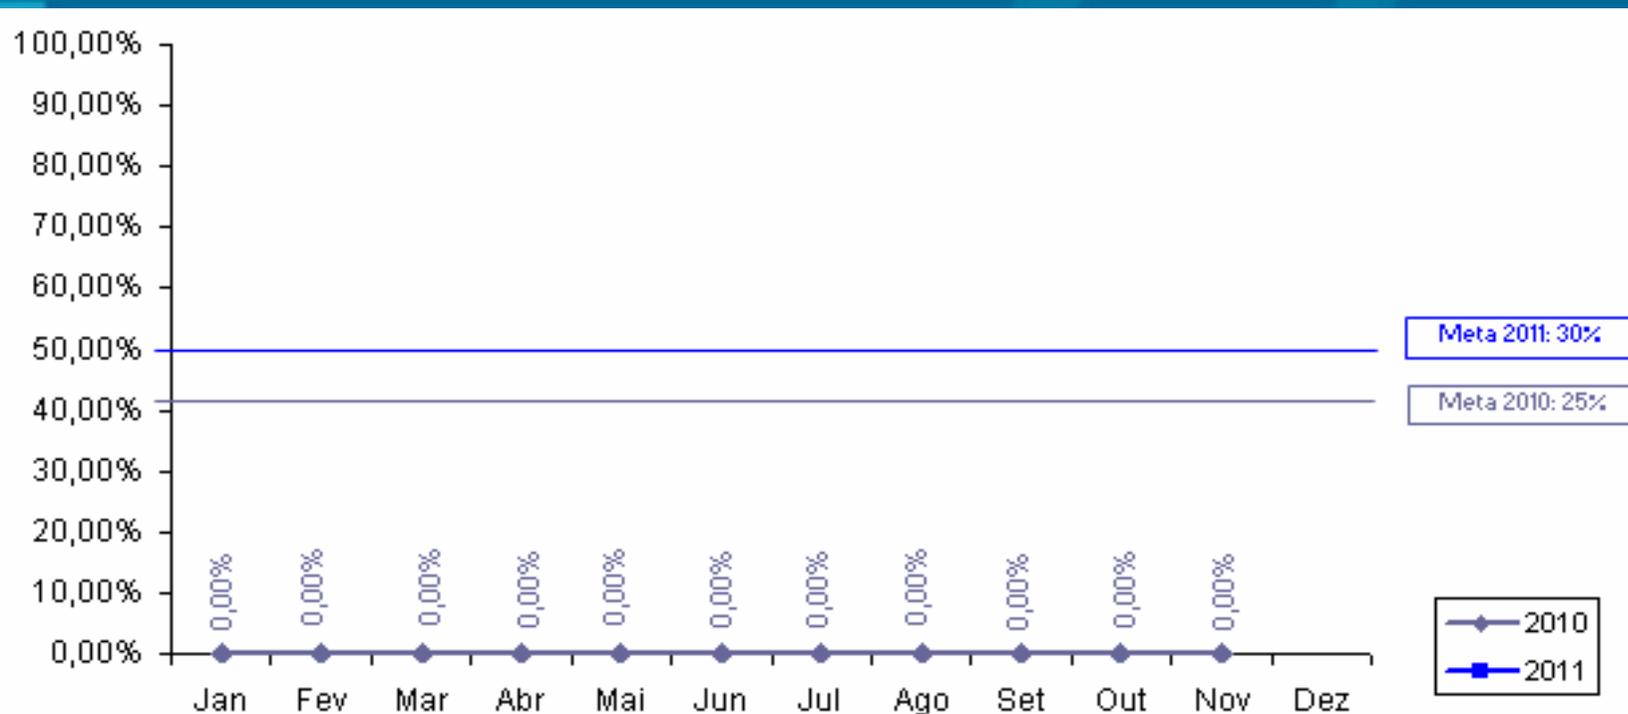

Sentido do indicador: ↑

# Saúde

Secretaria da Saúde - SESA


**Indicador 8a: Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei nº. 6.437/1977.**

- **Meta 2011: 12**
- **Posição em 31/05: 14**
- **Posição em 31/05 em relação à meta: **

# Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

## Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei nº. 6.437/1977.

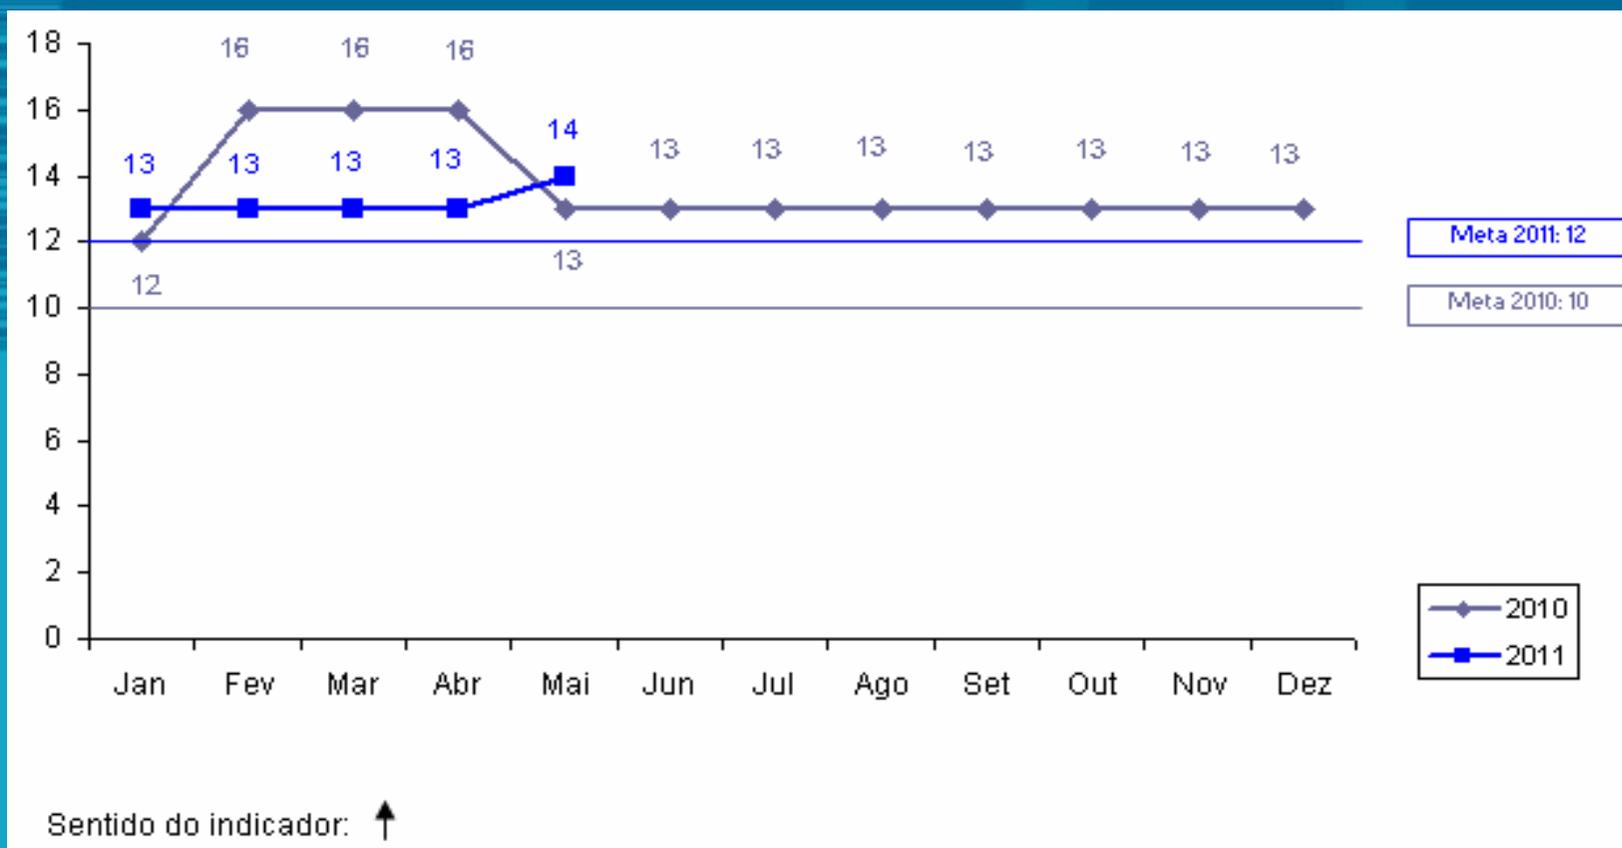

### Indicador 8b: Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.

- **Meta 2011:** 1
- **Posição em 31/05:** -
- **Posição em 31/05 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Foram liberadas duas parcelas do convênio. A direção do hospital informou que já foi contratada a empresa IQG e a 1ª visita está agendada para o período de 20 a 22 de junho de 2011.

# Saúde

## Secretaria da Saúde - SESA


**Indicador 9: Número de hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.**

- **Meta 2011: 15**
- **Posição em 31/05: 0**
- **Posição em 31/05 em relação à meta:** 
- **Justificativa: Foi elaborado o diagnóstico das 15 unidades hospitalares. Porém a assinatura do contrato com a empresa responsável pela capacitação das equipes destes hospitais ainda não foi assinado, pois o mesmo encontra-se na PGE.**

# Saúde

## Secretaria da Saúde - SESA

**Número de hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.**

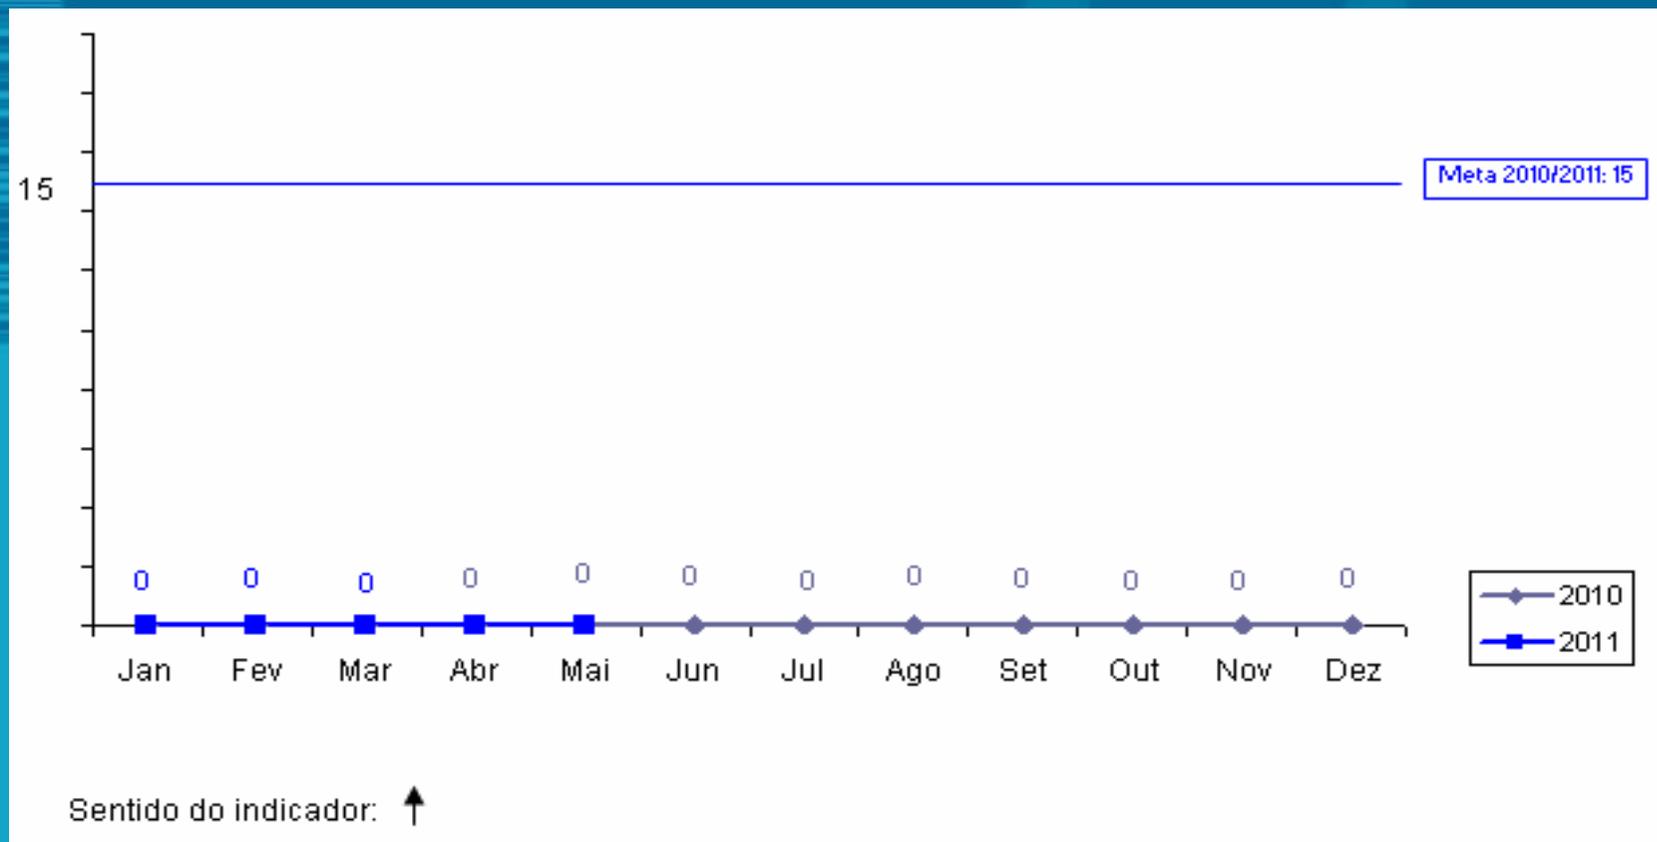

# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES SECUNDÁRIOS


### Indicador 7: População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.

- **Meta 2011:** 6.468.331
- **Posição em 31/05:** 6.495.386
- **Posição em 31/05 em relação à meta:** 

# Saúde

## Secretaria da Saúde - SESA

### População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família

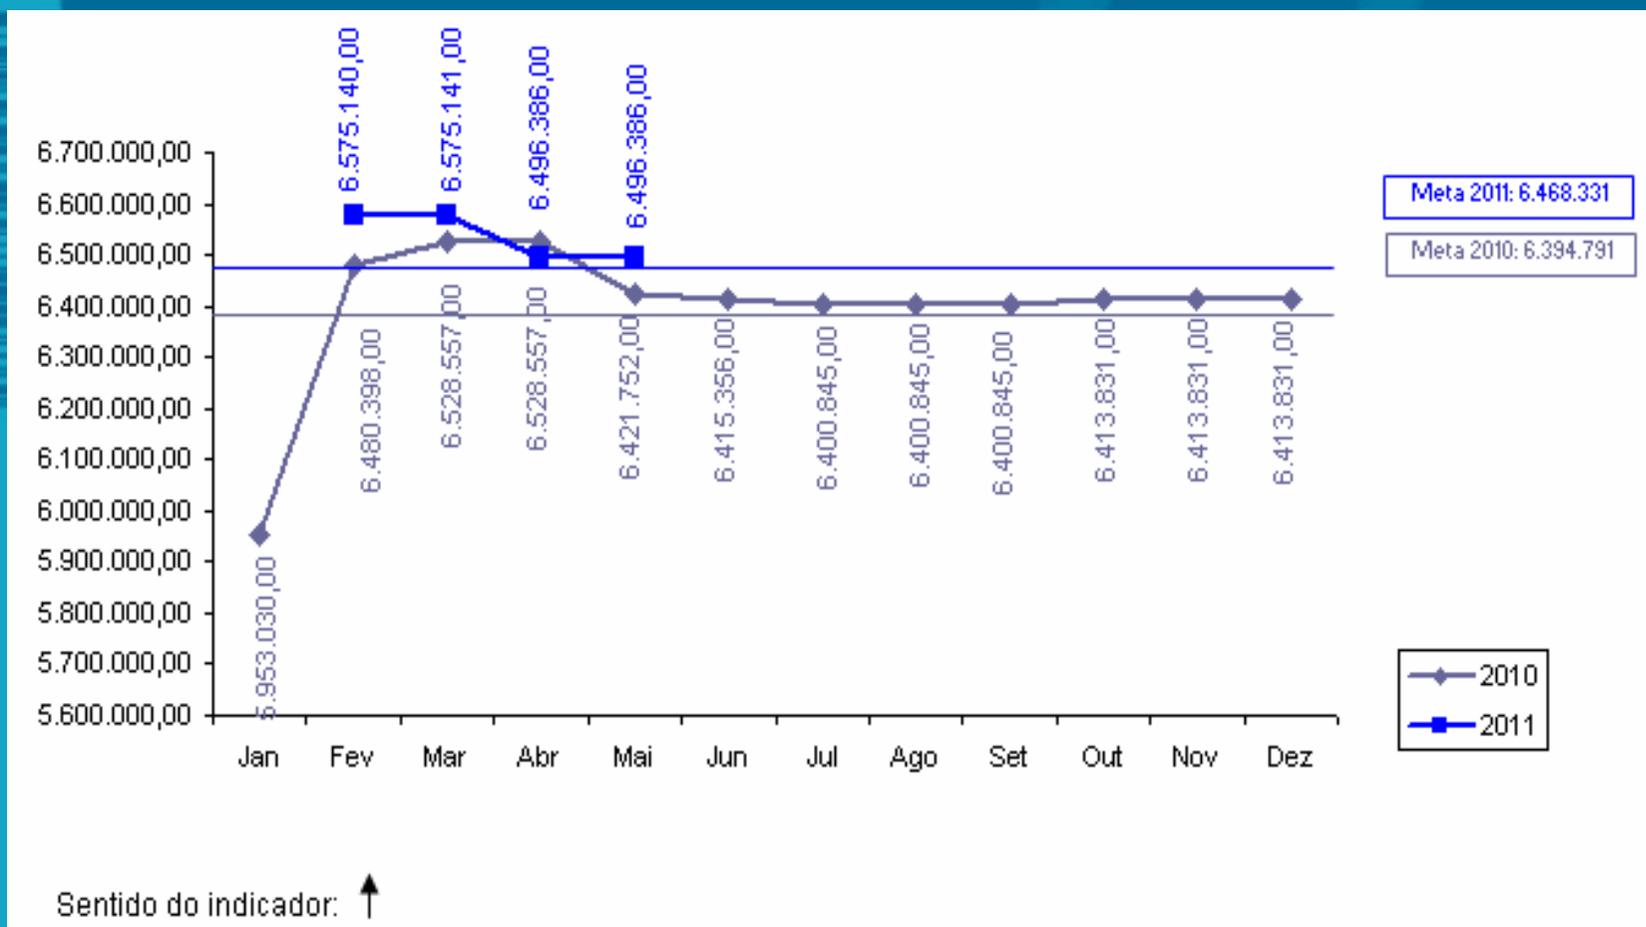

**Indicador 8: Relatórios semestrais do “Grupo da Água” para combater a diarreia infantil que leva à internação.**

- **Meta 2011: 2**
- **Posição em 31/05: -**
- **Posição em 31/05 em relação à meta: **


### Indicador 9: Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.

- **Meta 2011:** 60,00%
- **Posição em 31/05:** 66,52%
- **Posição em 31/05 em relação à meta:** 

# Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

## Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês

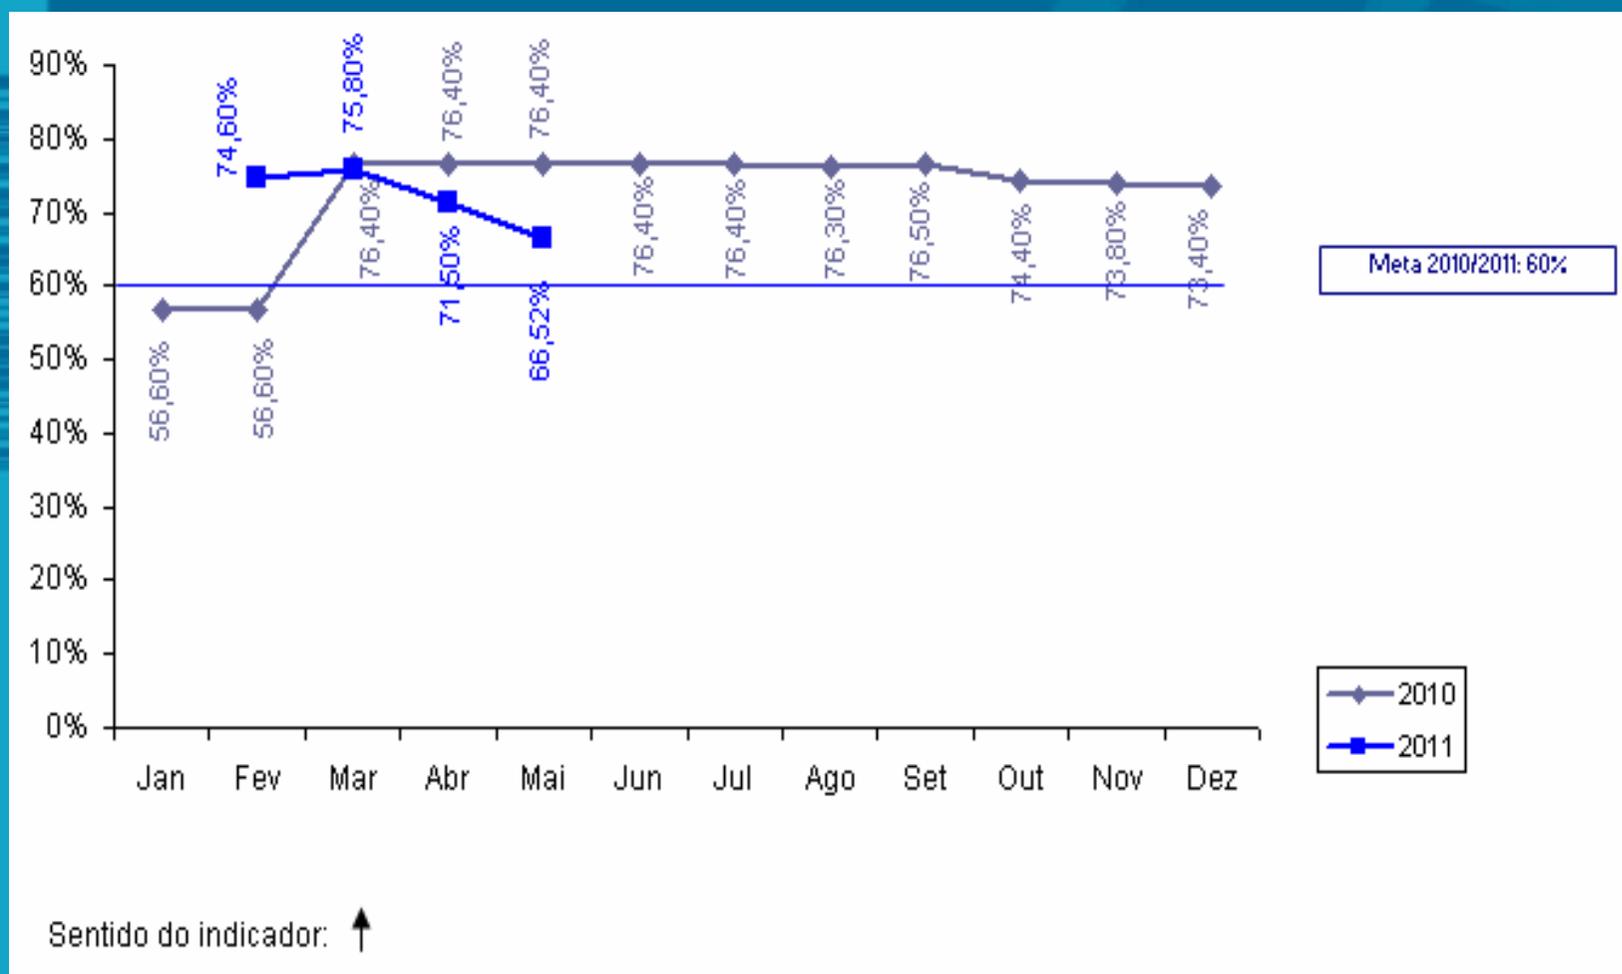

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

## Projeto 26: Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF – Sistema de Informação de AMQ

- **Responsável:** Vera Coelho e Imaculada Fonseca
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 59,69 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2009 – abril 2012
- **Estágio Previsto:** Preparar Lista Curta
- **Estágio Atual:** Recebimento de Propostas
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

## Projeto 27: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Desenho e implantação do software de custeio por absorção.

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 30 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2010 – Dezembro 2011
- **Estágio Previsto:** Enviando convite para empresas da Lista Curta
- **Estágio Atual:** Negociando Contrato
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## Projeto 28: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Estratégia de capacitação e disseminação do uso do software.

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 90 mil
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2010 – Novembro 2011
- **Estágio Previsto:** Assinatura do Contrato
- **Estágio Atual:** Contrato assinado
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

**Projeto 32 (fracionado): Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação.**

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 100 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2011 - Janeiro 2012
- **Estágio Previsto:** Publicar Edital
- **Estágio Atual:** Aguardando NO do Banco Mundial ao TOR
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

# OPERAÇÃO Swap II

**SALVAGUARDAS**

**Relatório Trimestral de Acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II. (Posição do 3º trimestre de 2010 enviado ao Banco Mundial em janeiro 2011)**

# OPERAÇÃO Swap II

**COGERH**

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR PRIMÁRIO**

# Água e Saneamento

Secretaria de Recursos Hídricos - SRH


## Indicador 10: Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.

- Meta 2011:  $\geq 37\%$
- Posição em 31/05: 24%
- Posição em 31/05 em relação à meta: 
- Justificativa: Durante o primeiro semestre a estimativa de captação é relativamente baixa (denominador). No 2º semestre a expectativa de consumo de água aumenta fazendo com que o indicador diminua e se aproxime da meta estabelecida.
- Perspectiva de Cumprimento: Alta

# Água e Saneamento

Secretaria de Recursos Hídricos - SRH

Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura

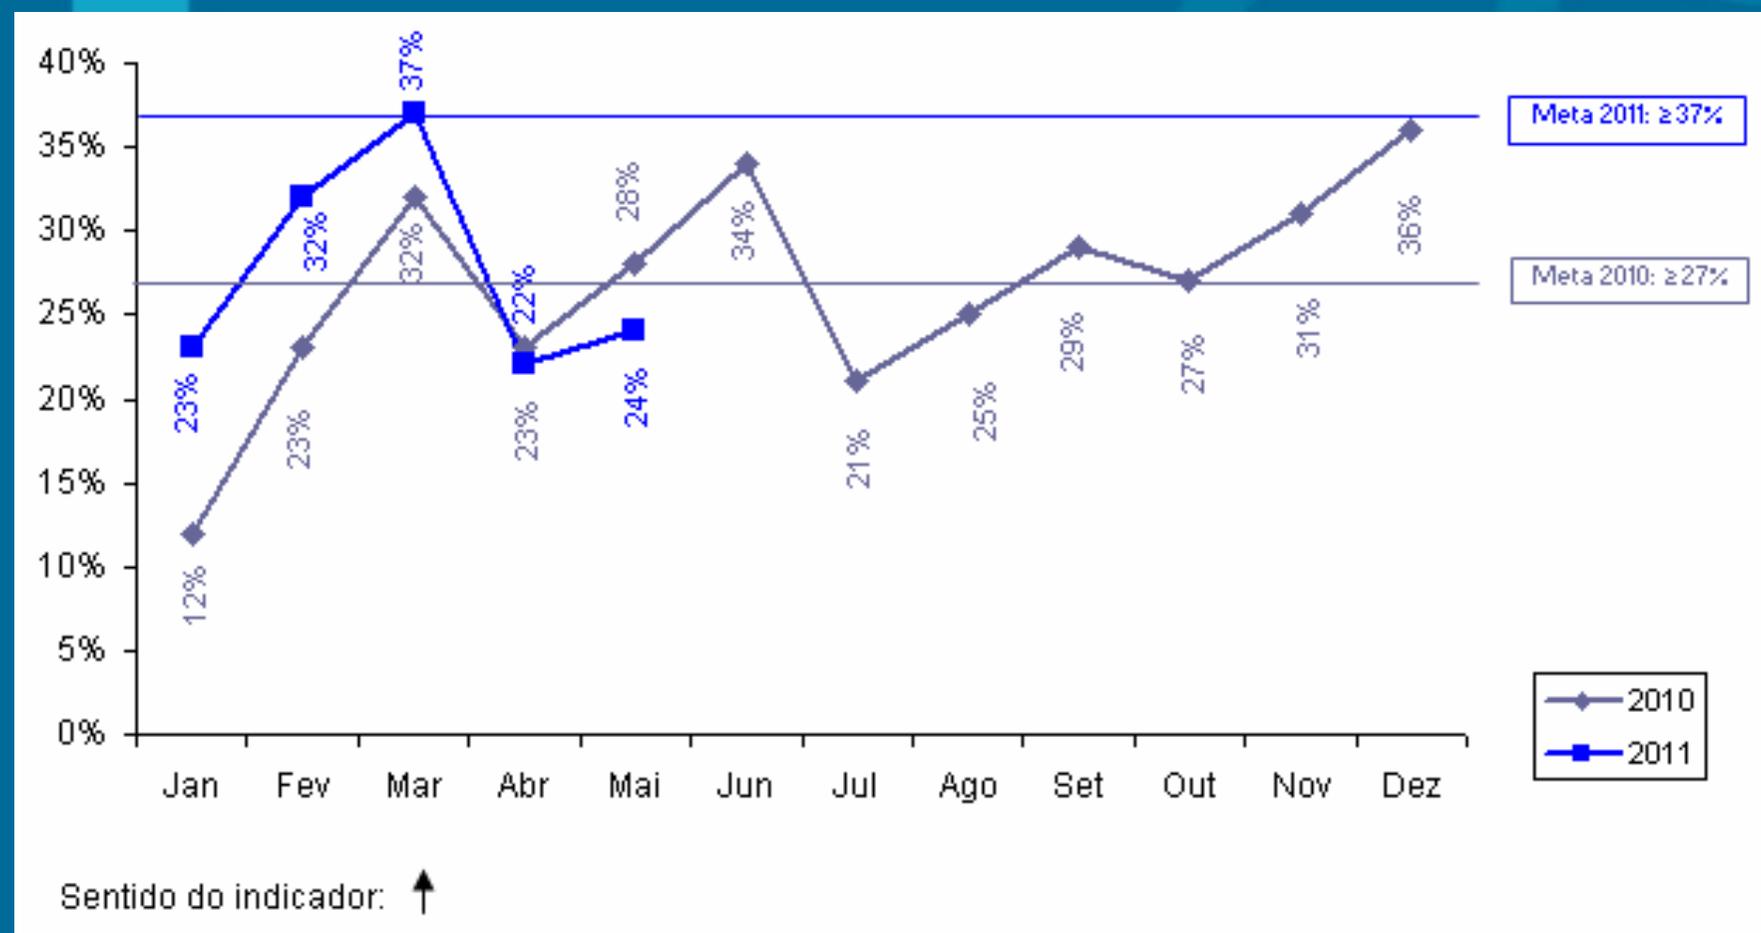

# OPERAÇÃO Swap II

**CAGECE**

# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES PRIMÁRIOS

# Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE


## Indicador 11a: Número de ligações urbanas de água.

- **Meta 2011:** 275.122
- **Posição em 31/05:** 277.191
- **Posição em 31/05 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a maio de 2011 foram executadas 277.191 ligações domiciliares de água.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta será cumprida.

# Água e Saneamento

## Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

### Número de ligações urbanas de água

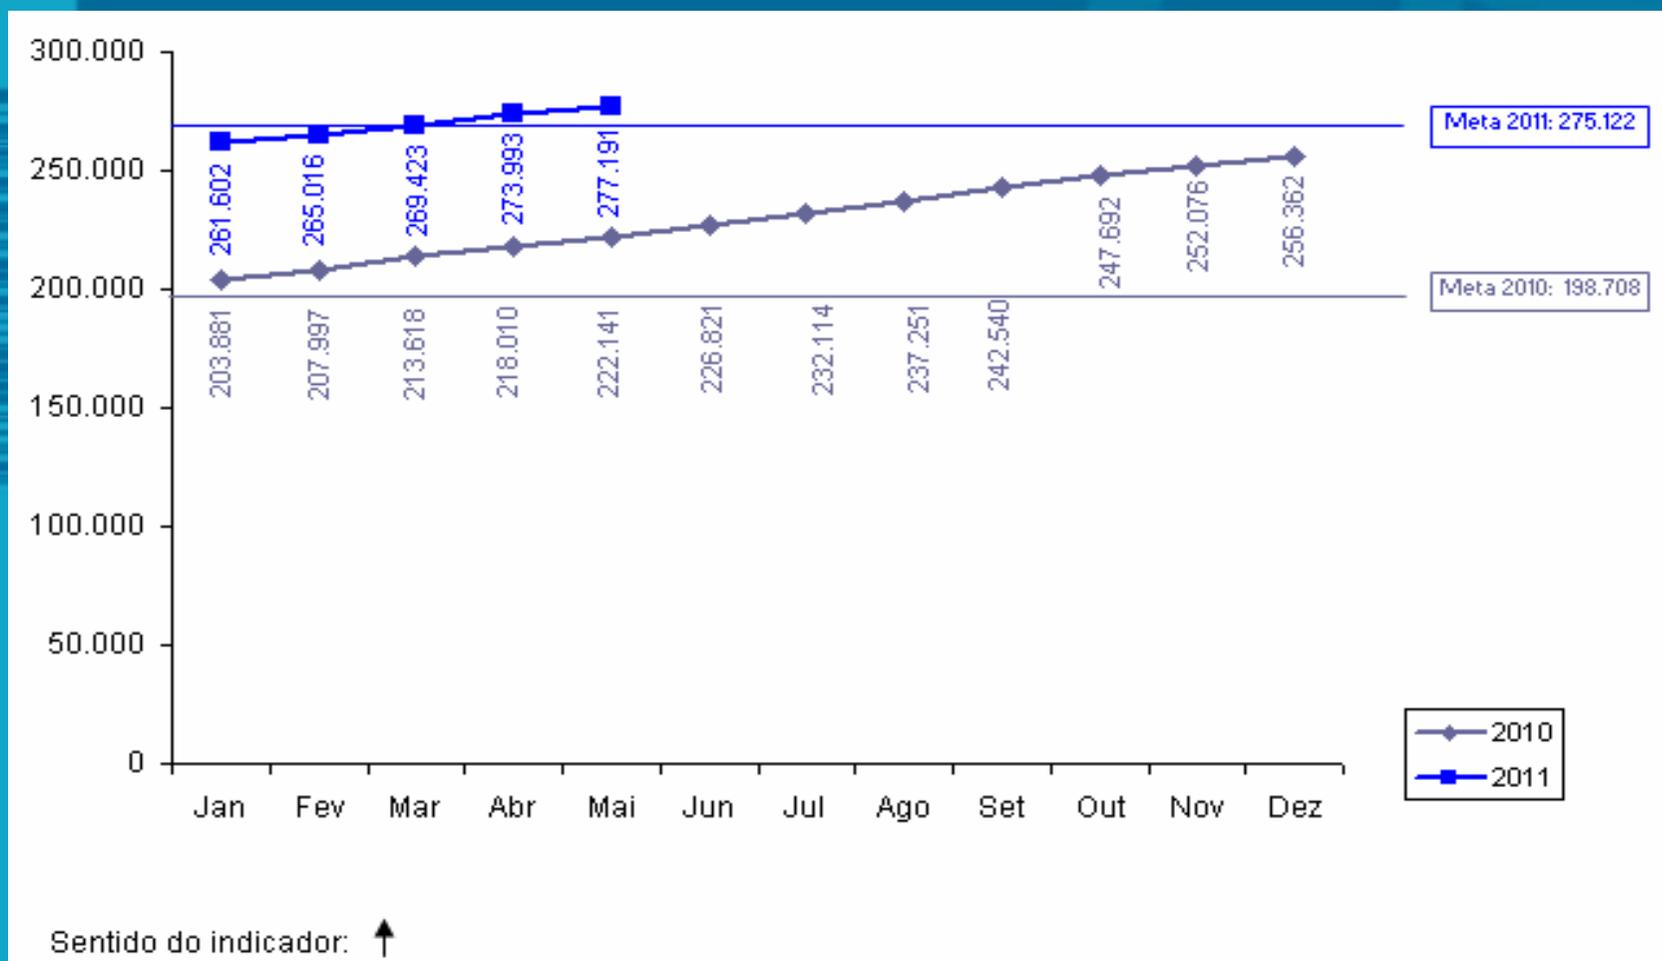

# Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE


## Indicador 11b: Número de ligações de esgotos.

- **Meta 2011:** 124.775
- **Posição em 31/05:** 125.694
- **Posição em 31/05 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a maio de 2011 foram executadas 125.694 ligações domiciliares de esgoto.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta será cumprida.

# Água e Saneamento

## Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE


### Número de ligações de esgoto

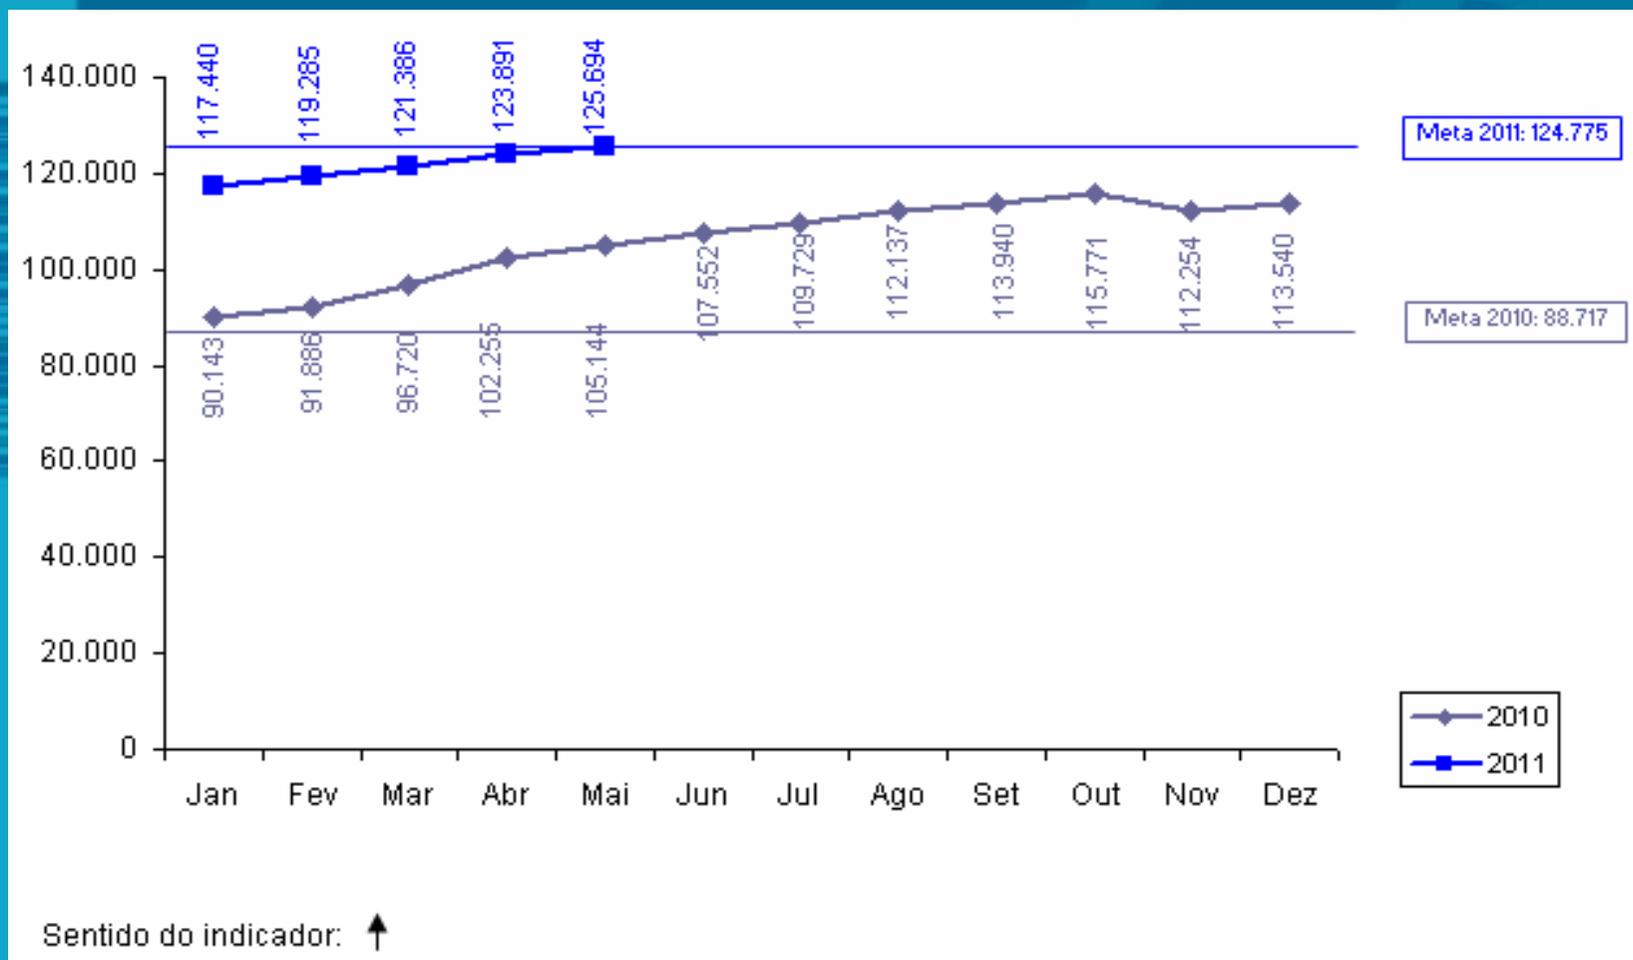

# Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

## Indicador 12: Percentual de Perda de Água.


- **Meta 2011:**  $\leq 28,20\%$  \*
- **Posição em 31/05:** 25,81%
- **Posição em 31/05 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a abril de 2011, o percentual de perda de água foi de 25,81%.

\* A meta que consta no PAD é de 28,20%, porém a CAGECE solicitou alteração para 27%, conforme ofício de 03/11/10.

# Água e Saneamento

## Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

### Percentual de Perda de Água

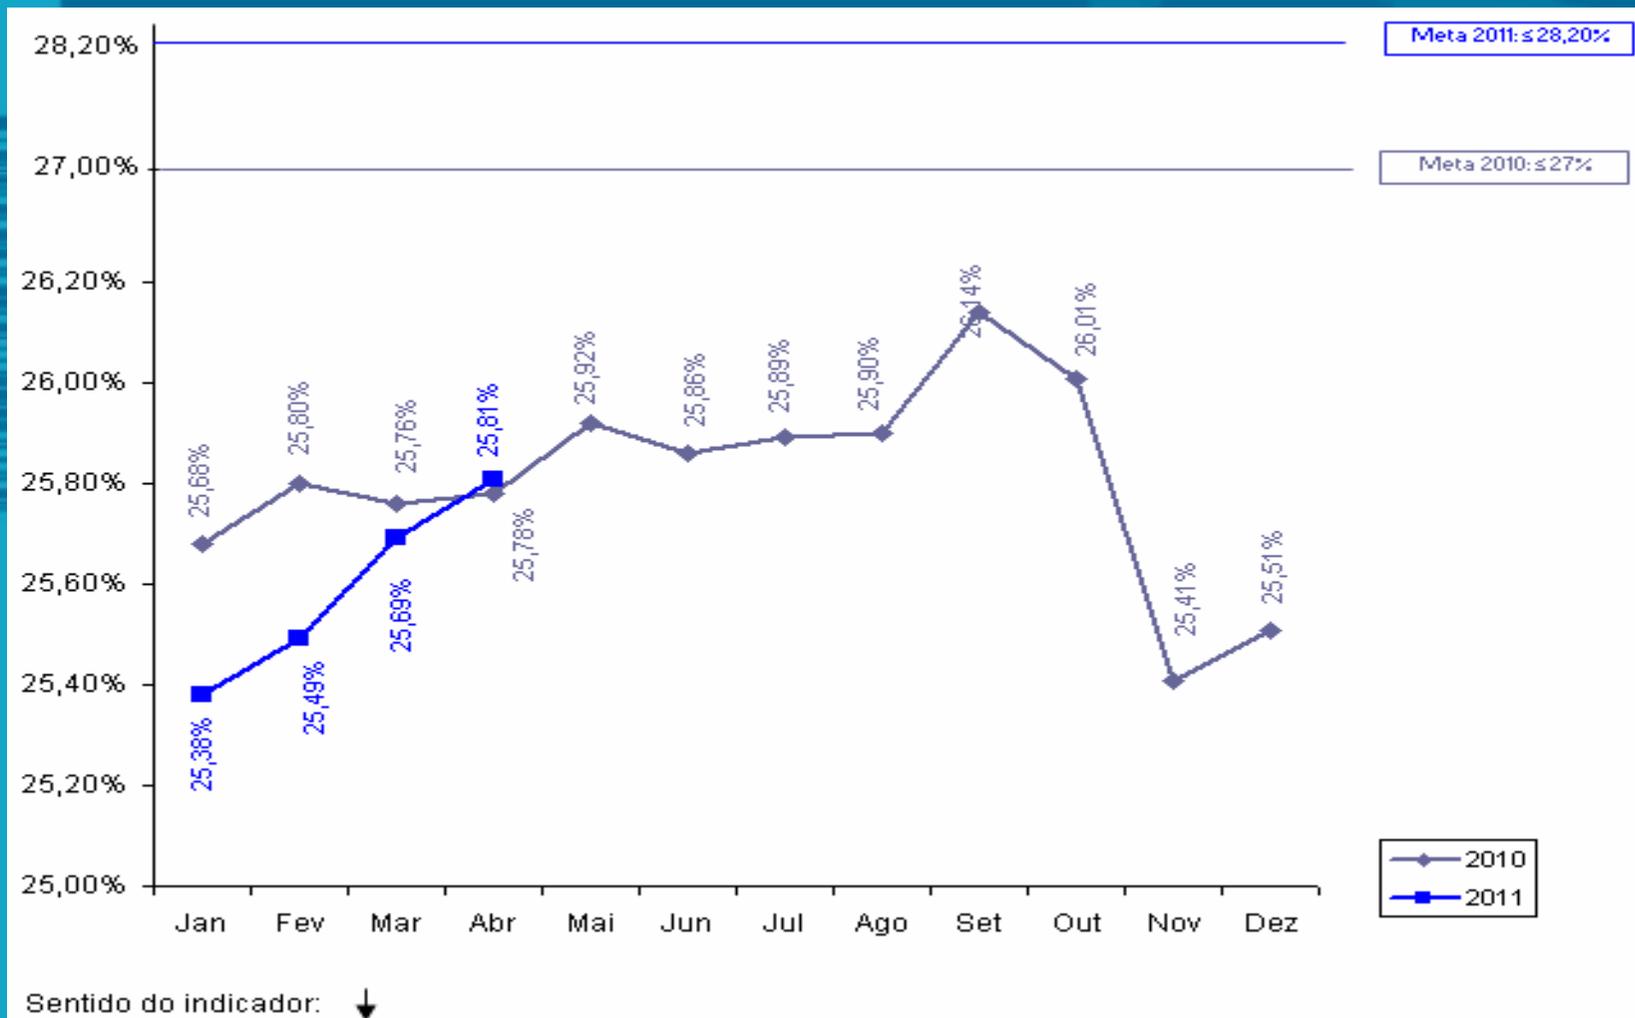

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

# Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

## Indicador 10: Margem EBITDA da CAGECE.


- **Meta 2011: 29,50% \***
- **Posição em 31/05: 25,21%**
- **Posição em 31/05 em relação à meta:** 

\* A meta que consta no PAD é de 29,50%, porém a CAGECE solicitou alteração para 25,21%, conforme ofício de 29/12/10.

# Água & Saneamento

## Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

### Margem EBITDA da CAGECE

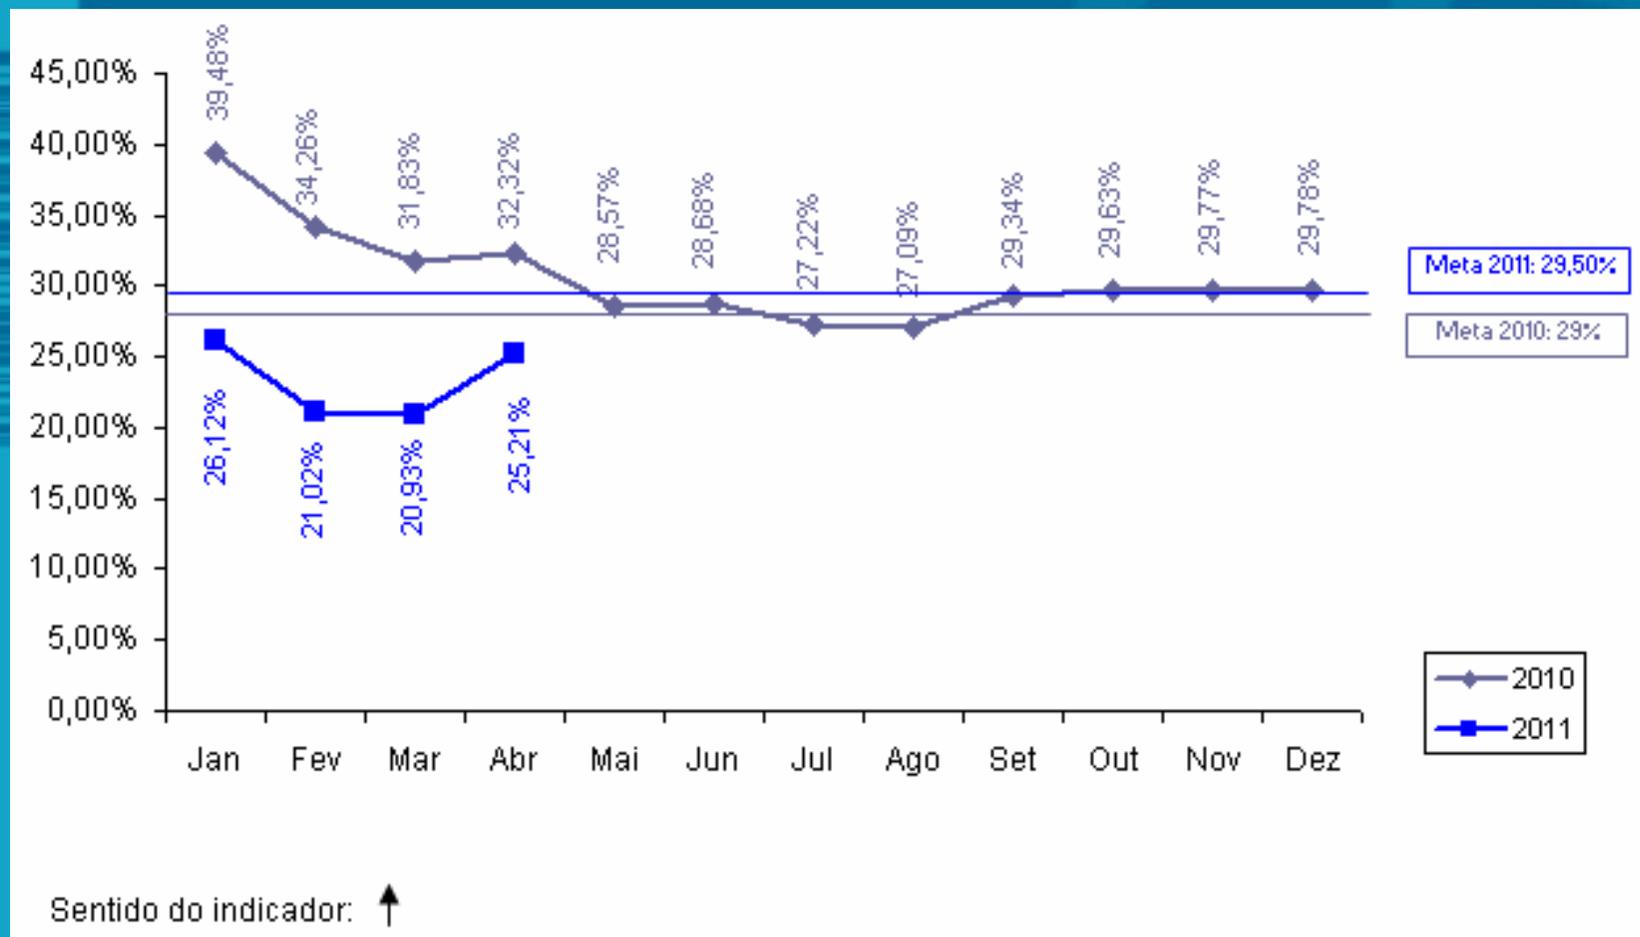

# OPERAÇÃO Swap II

## SALVAGUARDAS

# Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

**Relatório Trimestral de Acompanhamento da Salvaguarda de Reassentamento e Desapropriação enviado ao Banco Mundial. Posição do 1º Trimestre de 2011 enviado em maio de 2011.**

# OPERAÇÃO Swap II

**ETICE**

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR PRIMÁRIO**

# Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE


**Indicador 13: Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.**

- **Meta 2011: 4.365.700**
- **Posição em 31/05: 4.339.193**
- **Posição em 31/05 em relação à meta:** 
- **Justificativa: A partir do Cinturão Digital, o Governo do Ceará estenderá a rede banda larga aos municípios.**
- **Perspectiva de Cumprimento: A meta deverá ser cumprida**

# Negócios e Inovação

## Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE

Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga

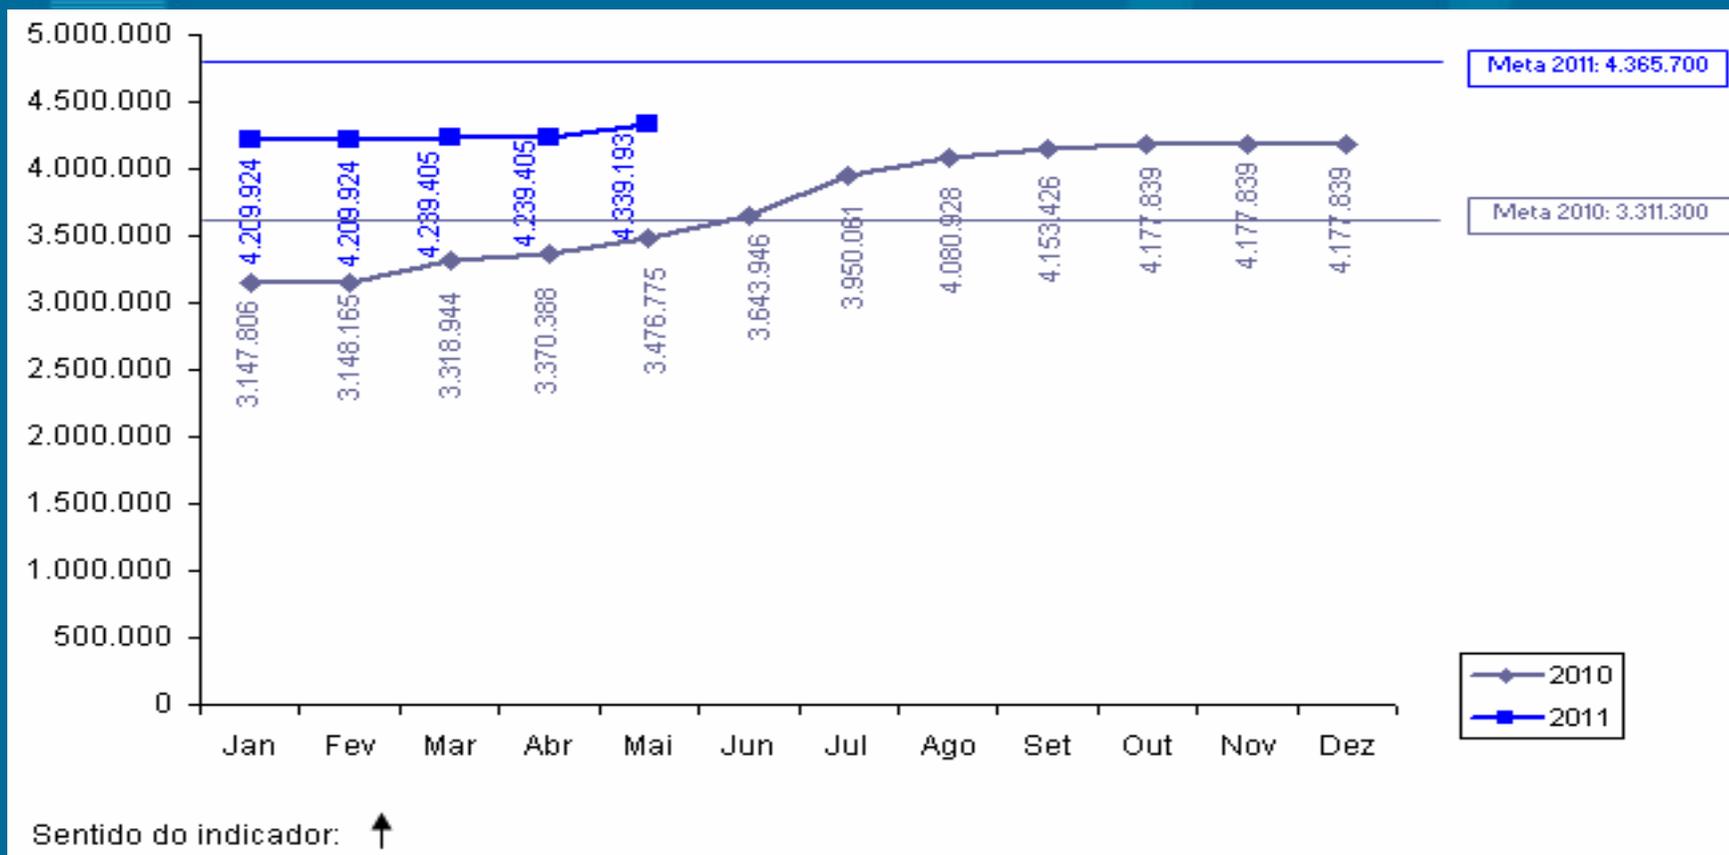

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**


### Indicador 12: Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).

- **Meta 2011:** 3
- **Posição em 31/05:** -
- **Posição em 31/05 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Os 3 sistemas componentes do S2GPR encontram-se em execução: Ciclo Orçamentário, Sistema de Cadastro do Patrimônio e Middleware de integração compreendem a meta para 2011.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta será cumprida

# OPERAÇÃO Swap II

## PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## Projeto 9: Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação

- **Responsável:** Denise Olsen
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 100 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2011 – abril 2012
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TOR
- **Estágio Atual:** Setorial encontra-se na fase de atividades preparatórias de elaboração do TOR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

# OPERAÇÃO Swap II

**PGE**

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

# Gestão do Setor Público

## Procuradoria Geral do Estado - PGE

### Indicador 4: Redução de processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato.


- **Meta 2011:** 10,5%
- **Posição em 31/05:** 4,88%\*
- **Posição em relação à meta:** 
- **Plano de Ação:** Realização de Treinamentos e Seminários para redução do percentual de processos fracassados.

\*Posição referente a abril de 2011, pois as informações não estavam disponíveis.

# Gestão do Setor Público

Procuradoria Geral do Estado - PGE

**Redução de processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato.**

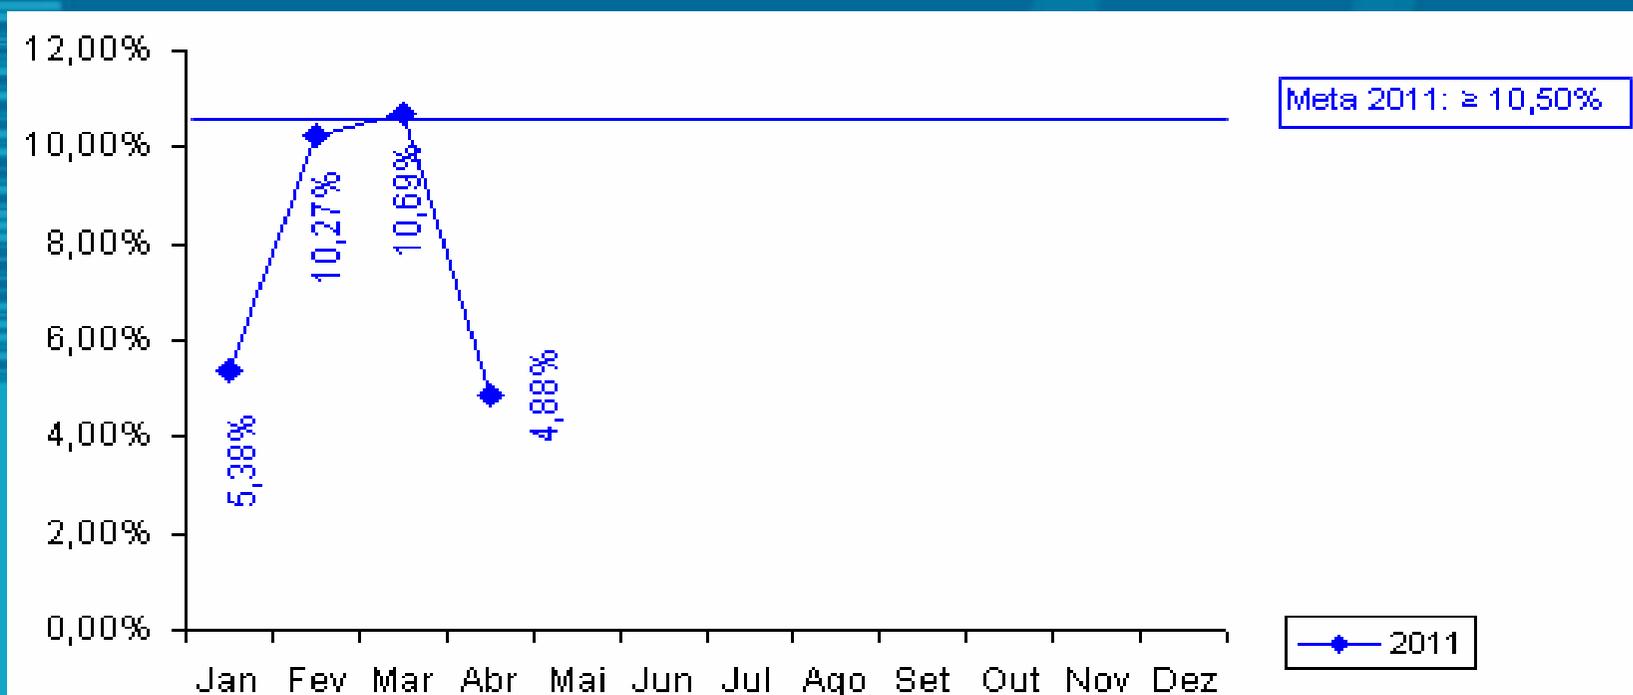

Sentido do indicador: ↑

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETO DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

**Projeto 15: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de empresa para capacitação nas áreas de licitação, Administrativa e da Auditoria Preventiva.\***

- **Responsável:** Tarso e Fernando Grangeiro
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 147 mil
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2010 – Maio 2012
- **Estágio Previsto:** Abertura Pública das Propostas
- **Estágio Atual:** Aguardando I.G
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

**Projeto 16: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Seminários para capacitação nas áreas de licitação.**

- **Responsável:** Tarso e Fernando Grangeiro
- **Categoria de Licitação:** Consultores Individuais
- **Valor:** US\$ 53 mil
- **Método de Aquisição:** Seção V - Diretrizes Consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2011 – Maio 2012
- **Estágio Previsto:** Notificar adjudicação
- **Estágio Atual:** Solicitar ao BM empresas de consultoria
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

# OPERAÇÃO Swap II

**ARCE**

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

# Água & Saneamento

Agência Reguladora do Ceará - ARCE


**Indicador 11: Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).**

- **Meta 2011: 58,00%**
- **Posição em 31/05: 21,43%**
- **Posição em 31/05 em relação à meta:** 
- **Justificativa: 28 relatórios concluídos de janeiro a maio de 2011, dos quais 22 relataram não conformidades na qualidade da água.**
- **Perspectiva de cumprimento: a melhoria observada nos meses de fevereiro a abril de 2011, não se manteve no último mês. Há baixa perspectiva de atingir a meta até o final do ano.**

# Água & Saneamento

## Agência Reguladora do Ceará - ARCE

### Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE

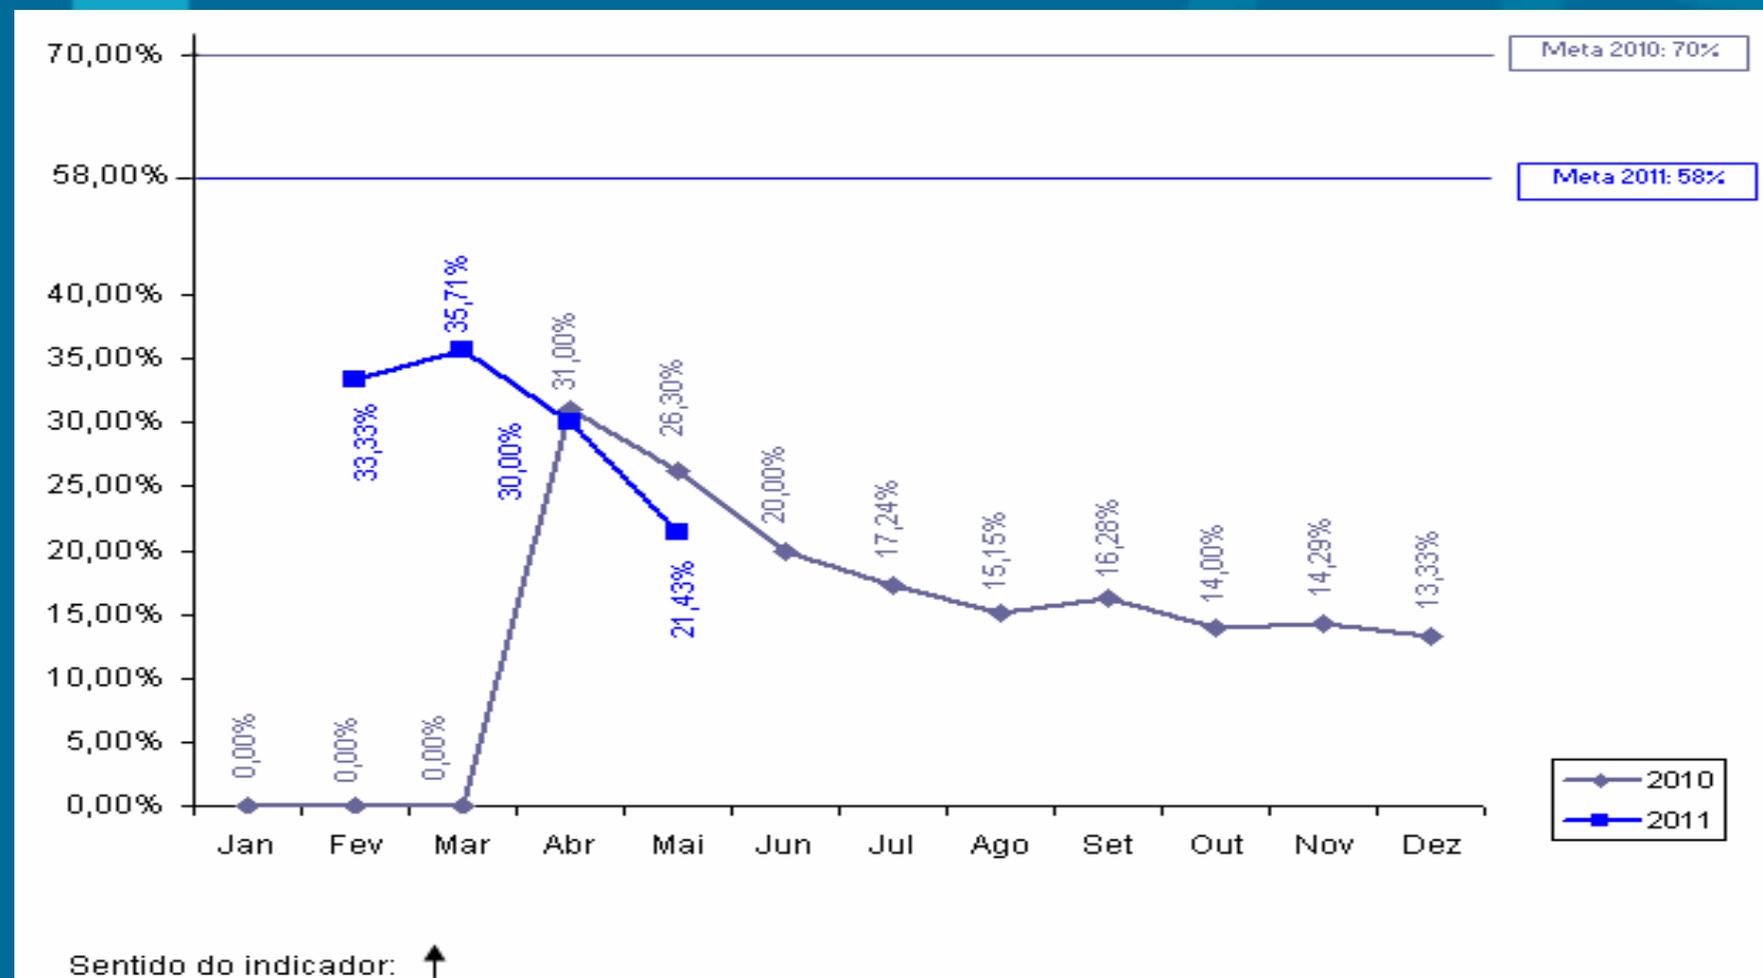

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETO DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

## **Projeto 1: Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento.**

- **Responsável:** Mário Monteiro e Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 112 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2009 – Agosto 2011
- **Estágio Previsto:** Realizando trabalhos
- **Estágio Atual:** Início dos Trabalhos em 11.05.11
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

# OPERAÇÃO Swap II

**SECITECE**

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**


## Indicador 13: Número de serviços tecnológicos realizados

- **Meta 2011:** 50.837
- **Posição em 31/05:** 19.258
- **Posição em relação à meta:** 

# Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE

## Número de serviços tecnológicos realizados

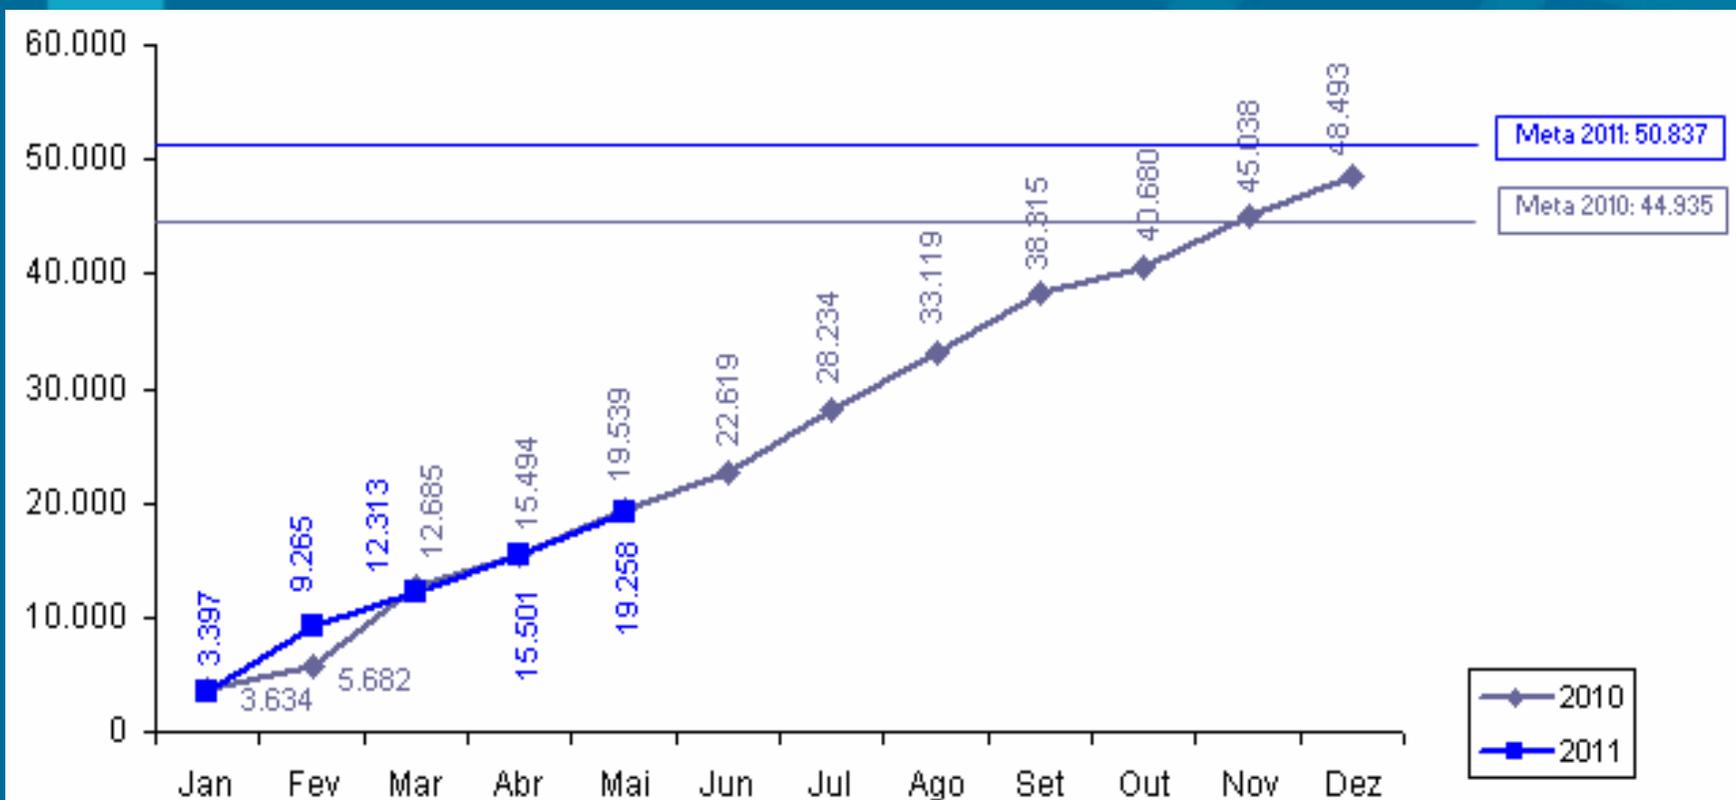

Sentido do indicador: ↑

# OPERAÇÃO Swap II

**CONPAM**

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

# Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM

**Indicador 14: Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado (percentual de licenças protocoladas na SEMACE no prazo de 60 dias).**


- **Meta 2011: 20,00%**
- **Posição em 31/05: 19,36%\***
- **Posição em relação à meta:** 

\* Informação referente ao período de janeiro a março de 2011.

# Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM

**Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado (percentual de licenças protocoladas na SEMACE no prazo de 60 dias).**

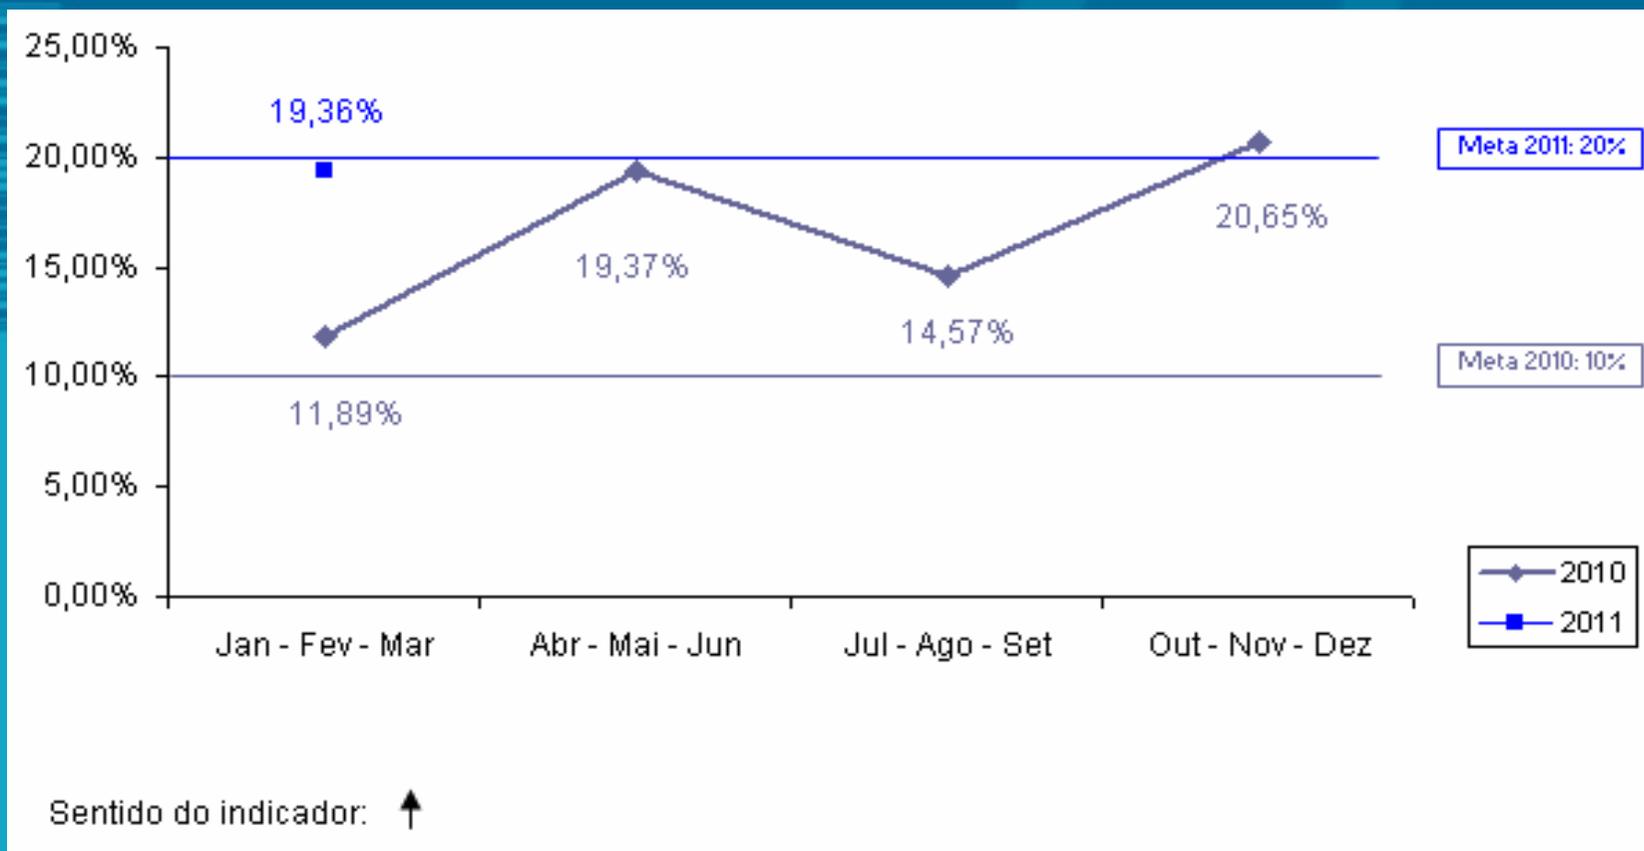

# OPERAÇÃO Swap II

## PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## **Projeto 6: Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente.**

- **Responsável:** Maria Goretti de Castro e Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 40 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2009 – Novembro 2010
- **Estágio Previsto:** Término do contrato
- **Estágio Atual:** Término do contrato
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

## **Projeto 7: Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos**

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 123 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2011 – Março 2012
- **Estágio Previsto:** Preparar SDP
- **Estágio Atual:** Preparando SDP
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

# OPERAÇÃO Swap II

## SALVAGUARDAS

**Relatório Trimestral de Acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II. (Posição do 3º trimestre de 2010 enviado ao Banco Mundial em janeiro 2011)**

# OPERAÇÃO Swap II

**CGE**

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

## **Projeto 2: Capacitação em processos de auditoria preventiva.**

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 180 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Outubro 2009 – Abril 2012
- **Estágio Previsto:** Preparando documentos de licitação
- **Estágio Atual:** TOR
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

## **Projeto 3: Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará.**

- **Responsável:** Marconi Lemos
- **Categoria de Licitação:** Empresas de consultoria
- **Valor:** US\$ 170 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Novembro 2009 – Outubro 2011
- **Estágio Previsto:** Início dos trabalhos
- **Estágio Atual:** trabalhos iniciados
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## **Projeto 4: Desenvolvimento de modelo para apuração e controle de custos**

- **Responsável:** Marconi Lemos e Kelly Barbosa
- **Categoria de Licitação:** Empresas de consultoria\*
- **Valor:** US\$ 173,23 mil
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2011 – Maio 2012
- **Estágio Previsto:** Não objeção ao TOR
- **Estágio Atual:** Rever TOR
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

# OPERAÇÃO Swap II

**CIDADES**

# OPERAÇÃO Swap II

## PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### **Projeto 6: Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade.**

- **Responsável:** Tércia Pinheiro
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 100 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2011 – Abril 2012
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TOR
- **Estágio Atual:** Elaboração do TOR
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

# OPERAÇÃO Swap II

## SALVAGUARDAS

**Relatório Trimestral de Acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II. (Posição do 3º trimestre de 2010 enviado ao Banco Mundial em janeiro 2011)**

# OPERAÇÃO Swap II

**IPECE**

# OPERAÇÃO Swap II

## SALVAGUARDAS

**Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do  
Ceará - IPECE**

# **Salvaguardas: Povo Indígena**

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

## **Projeto 10: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: consultoria**

- **Responsável:** Eveline Barbosa
- **Categoria de Licitação:** Consultores Individuais
- **Valor:** US\$ 31.34 mil
- **Método de Aquisição:** Seção V – Guidelines de consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro de 2009 – Março de 2011
- **Estágio Previsto:** término
- **Estágio Atual:** término
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## **Projeto 11: Contratação de serviços para realização de evento c/ lideranças indígenas p/ apresentação dos livros didáticos/resultados da consultoria**

- **Responsável:** Eveline Barbosa
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 7,42 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro de 2010 – Março de 2011
- **Estágio Previsto:** Término
- **Estágio Atual:** Término
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## **Projeto 12: Contratação de serviços gráficos para impressão e publicação dos livros didático-pedagógicos para as escolas indígenas do Estado do Ceará**

- **Responsável:** Eveline Barbosa
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 1,24 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro de 2010 – Março de 2011
- **Estágio Previsto:** Término
- **Estágio Atual:** Término
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## **Projeto 13: Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II- Contratação de Consultores Individuais**

- **Responsável: Cristina Medeiros**
- **Categoria de Licitação: Consultores Individuais**
- **Valor: US\$ 204,33 mil**
- **Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria**
- **Revisão Prévia/Posterior: Prévia**
- **Início/Término: Junho de 2009 – Junho de 2012**
- **Estágio Previsto: prestação de serviços pelos consultores**
- **Estágio Atual: consultores contratados encontram-se prestando serviços.**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

# OPERAÇÃO Swap II

**TCE**

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

## Projeto 33: Fortalecimento Institucional do TCE- Contratação de soluções integradas de Gerenciamento eletrônico de documento e informações do TCE (TCE 100% digital)

- **Responsável:** Gyovana Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor:** US\$ 200 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** novembro 2010 – março 2012
- **Estágio Previsto:** Assinatura do Contrato
- **Estágio Atual:** Contrato assinado
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## Projeto 34: Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação.

- **Responsável:** Gyovana Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 70 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2009 – setembro 2011
- **Estágio Previsto:** Assinatura do Contrato
- **Estágio Atual:** Contrato assinado
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OBRIGADA!

OPERAÇÃO  
Swap II

The background is a solid blue color. On the right side, there is a faint, light blue outline of a globe. On the left side, there is a vertical bar with a light blue background and a series of horizontal white lines of varying lengths, resembling a barcode or a stylized graphic element.

## Anexo 2



**Governo do Estado do Ceará**  
**Secretaria do Planejamento e Gestão**  
**Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE**

**SUMÁRIO DA PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS E REPRESENTANTES DO COMITÊ SWAP II NAS REUNIÕES DO ANO DE 2009**

Órgão	Reunião	Função	26ª	25ª	24ª	23ª	22ª	21ª	20ª	19ª	18ª	17ª	16ª	15ª	14ª	13ª	12ª	11ª	10ª	9ª	8ª	7ª	6ª	5ª	4ª	3ª	2ª	1ª	Participação Setorial	Participação Setorial (%)
			19.06.11	19.05.11	11.04.11	17.03.11	17.02.11	20.01.11	21.12.10	16.11.10	19.10.10	21.09.10	17.08.10	20.07.10	15.06.10	18.05.10	20.04.10	18.03.10	18.02.10	19.01.10	17.12.09	26.11.09	29.10.09	24.09.09	27.08.09	30.07.09	01.06.09	30.04.09		
ARCE	Alceu Galvão Júnior/ Alexandre Caetano*	Titular	Ausente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Presente	24	92%														
	Mário Augusto Parente Monteiro	Suplente	Ausente																											
	Representante	Presente																												
CAGECE	Márcio Normando B. Coelho*****	Titular	Ausente	24	92%																									
	Emiliana Leite Filgueiras *****	Suplente	Presente																											
	Representante	Ausente																												
CGE	Raimunda Aurneide Lemos Caldas	Suplente	Ausente	16	62%																									
	Marcelo de Sousa Monteiro	Titular	Ausente	Presente																										
	Representante	Ausente																												
CIDADES	Tércia Maria Pinheiro Martins	Titular	Ausente	Presente	24	92%																								
	Wanda G. de Oliveira Murta/ Edilson Uchoa Lopes*****	Suplente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente																								
	Representante	Ausente																												
CONPAM SEMACE	Maria Goretti Gurgel Mota de Castro	Titular	Ausente	Presente	21	81%																								
	Maria Dias Cavalcante	Suplente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente																								
	Representante	Ausente																												
ETICE	José Aurício de Oliveira/ Denise Maria Norões**	Titular	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	23	88%																						
	Sérgio Vicente da Matos Brito	Suplente	Ausente	Presente	Ausente																									
	Representante	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente																		
IPECE	Eveline Barbosa C Silva/Fiávio Ataliba *****	Titular	Ausente	Ausente	Presente	26	100%																							
	Ana Cristina Medeiros	Suplente	Ausente	Presente																										
	Representante	Presente																												
PGE	Fernando Antônio Costa de Oliveira/Fernando Antônio Grangeiro****	Titular	Presente	26	100%																									
	Francisco Antônio Nogueira Bezerra/Tasso Pinheiro Borges *****	Suplente	Ausente																											
	Representante	Ausente																												
SECITECE	Teresa Lenice Nogueira da Gama Mota	Titular	Ausente	26	100%																									
	Francisco C. Coelho/Ricardo Costa e Silva***	Suplente	Presente	Ausente	Presente																									
	Representante	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente																		
SEDUC	Maria Eneida Machado Maia	Titular	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	25	96%																				
	Maria Ângela Leão Hitzschky Madeira	Suplente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Presente																			
	Representante	Presente	Presente	Ausente																										
SEFAZ	Luiz Jarbas de Mesquita/ Fabiano Ramos****	Titular	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	23	88%																	
	Paulo Sérgio Rocha/ Fabrício Santos*****	Suplente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente																				
	Representante	Ausente	Ausente	Ausente	Presente																									
SEPLAG	Carlos Eduardo Sobreiro/Naiana Corrêa Lima*****	Titular	Ausente	26	100%																									
	Fátima Coelho Benevides Falcão	Suplente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Presente																					
	Representante	Presente																												
SRH	Francisca Isabel Vieira de Cavalhedo	Titular	Ausente	22	85%																									
	Luiz Fernando Gonçalves Viana/Maria do Céu R. Colares *****	Suplente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Presente																							
	Representante	Presente	Ausente	Ausente	Presente																									
SESA	Vera Maria Câmara Coelho	Titular	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	21	81%																				
	Maria Imaculada Ferreira Fonseca	Suplente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente																						
	Representante	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente																
TCE	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente	23	88%																	
	José Teni Cordeiro Júnior	Suplente	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Ausente																							
	Representante	Ausente	Presente																											

\*A partir da 6ª reunião o Titular mudou de Alceu da Castro Galvão Júnior para Alexandre Caetano

\*\*A partir da 3ª reunião o Titular mudou de José Aurício de Oliveira para Denise Maria Norões

\*\*\*A partir da 3ª reunião o Titular mudou de Francisco C. Coelho para Ricardo Costa e Silva

\*\*\*\*A partir da 11ª reunião o Titular mudou de Luiz Jarbas de Mesquita para Fabiano Ramos

\*\*\*\*\*A partir da 11ª reunião o Titular mudou de Paulo Sérgio Rocha para Fabrício Santos

\*\*\*\*\*A partir da 15ª reunião o Titular mudou de Fernando Antônio C. de Oliveira para Fernando Grangeiro

\*\*\*\*\*A partir da 15ª reunião o Suplente mudou de Fco. Antônio N. Bezerra para Tasso Pinheiro Borges

\*\*\*\*\*A partir da 16ª reunião o Suplente mudou de Luiz Fernando G Viana para Maria do Céu R. Colares

\*\*\*\*\*A partir da 19ª reunião o Titular mudou de Emiliana L. Filgueiras para Márcio Normando B Coelho

\*\*\*\*\*A partir da 19ª reunião Emiliana L. Filgueiras deixou de ser Titular e passou a ser Suplente

\*\*\*\*\*A partir da 20ª reunião o Suplente mudou de Wanda Murta para Edilson Uchoa Lopes

\*\*\*\*\*A partir da 22ª reunião o Coordenador da Operação SWAp II mudou de Eveline Barbosa para Fiávio Ataliba

\*\*\*\*\*A partir da 24ª reunião o Titular Mudou de Carlos Eduardo Sobreiro para Naiana Lima

## Anexo 3

## Gráfico da Participação por Setorial

