



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

ATA 36ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ SWAp II

Data: 19/04/2012 **Início:** 09:40 **Duração:** 1:05 **Término:** 10:45 **Local:** Sala da UGP SWAp

Quadro de Presença			
ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
COORDENAÇÃO SWAp II	Flávio Ataliba	Coordenador SWAp II	X
	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAp II	OK
	Alice Helena da Silva Pinto	Consultora SWAp II	OK
	Fabiana Silva de Castro	Consultora SWAp II	OK
	Idima Sílvia Pereira Rodrigues	Consultora SWAp II	OK
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	X
	Daniela Carvalho C. Dantas	Suplente	X
	Sérgio Miranda	Representante	OK
CAGECE	José Ricardo Meira	Titular	X
	Raimunda Aurineide Lemos Caldas	Suplente	X
	Emiliana Leite Filgueiras	Suplente	OK
CGE	Sílvia Helena Correia	Titular	X
	Paulo Roberto de Carvalho Nunes	Suplente	OK
CIDADES	Tércia Maria Pinheiro Martins	Titular	OK
	Edílson Uchoa Lopes	Suplente	X
CONPAM /SEMACE	José Iraguassú T. Filho	Titular	OK
	Maria Dias Cavalcante	Suplente	X
	José Maurício Mendes Giffoni	Suplente	X
ETICE	Denise Maria Norões	Titular	X
	Sérgio Vicente de Matos Brito	Suplente	X
	João Carlos Lima	Suplente	OK
PGE	Fernando Grangeiro	Titular	OK
	Tarso Pinheiro	Suplente	X
SECITECE/NUTEC	Almir Bittencourt da Silva	Titular	X
	Ricardo Costa e Silva	Suplente	X
	Vera Lúcia Salgado	Representante NUTEC	OK
SEDUC	Maria Eneida Machado Maia	Titular	OK
	Maria Ângela leão Hitzshky Madeira	Suplente	X
	José Iran da Silva	Suplente	OK
	Ana Maria Garcia Teixeira	Representante	OK
SEFAZ	Fabiano Moreira Ramos	Titular	X
	Fabrizio Gomes Santos	Suplente	X
	Rejane Muniz	Representante	x
SEPLAG	Naiana Corrêa Lima	Titular	X
	Fátima Coelho Benevides Falcão	Suplente	OK
SRH /COGERH	Francisca Isabel V. de Cavallhedo	Titular	X
	Denilson Marcelino Fidelis	Suplente	X
	Lorena Girão	Representante	OK
SESA	Vera Maria Câmara Coelho	Titular	OK
	Ana Márcia Rodrigues	Suplente	OK
	Ana Angélica	Suplente	X
TCE	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	OK
	José Teni Cordeiro Júnior	Suplente	X
	José Alexandre da Silva	Auditor do Projeto	OK

INTRODUÇÃO

Às 09h40m, na Sala da UGP SWAp do IPECE, Cristina Medeiros – IPECE iniciou a reunião. Seguiu-se com a apresentação em *Power Point (Anexo IV)* cuja pauta está apresentada abaixo:

- 1 - Apresentação dos Participantes;
- 2 - Informações sobre a Auditoria do Projeto;
- 3 - Posição sobre status SWAp III;
- 4 - Missões do Banco Mundial;
- 5 - Relatórios Finais;
- 6 - Evidências de comprovação das metas;
- 7 - Acompanhamento da Execução dos Programas Elegíveis;
- 8 - Sumário da Execução dos Projetos de Assistência Técnica;
- 9 - Sumário do Desempenho;
- 10 - Acompanhamento por Setorial da Execução:
 - Indicadores Primários e Secundários
 - Assistência Técnica

I. APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS SETORIAIS

Todos que estavam presentes se apresentaram, conforme quadro de presença.

Cristina Medeiros – IPECE iniciou informando a todos sobre a proposta da agenda da Missão do Banco que foi entregue a todos (**Anexo I**), passou a mostrar a Programação do Workshop (**Anexo II**). Explicou que a Casa Civil ficará com a organização do Workshop que será realizado no Palácio do Governo e eles prepararam uma relação dos secretários convidados. Informou também que na data de hoje e amanhã está acontecendo na COGERH a Missão da Consultora do Banco Mundial Iara Verocai com o objetivo de preparar o Termo de Referência da Análise Ambiental Estratégica.

II. INFORMAÇÕES SOBRE A AUDITORIA DO PROJETO

José Alexandre – TCE informou que houve uma melhora com relação à auditoria passada, até porque a metodologia adotada mudou. Antes os auditores apresentavam os achados, eram discutidos em reuniões e as setoriais depois enviavam o Plano de Ação. Esse ano, as Secretarias trouxeram o Plano de Ação para ser discutido nas reuniões. Informou que a SEDUC fez um Plano de Ação muito bom e precisará de poucos ajustes. A CIDADES e a CAGECE apresentaram um bom plano, faltando somente algumas evidências e a SESA e a SECITECE fizeram uma proposta que precisa um pouco mais de trabalho. Acrescentou também que gostaria de deixar clara a questão dos prazos acordados para que os Planos de Ação revisados sejam entregues em:

- SEDUC: 30/04/12
- SESA: 23/05/12
- SECITECE: 30/04/12
- CIDADES/CAGECE: 30/04/12
- SEPLAG: 15/05/12
- CGE: proposta por e-mail em 18/04/12 = 15/05/12

José Alexandre – TCE indagou ainda se o representante da CAGECE poderia confirmar se a visita ao Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de “Peixe”, no município de Russas, poderia ser no dia 04/05/2012 e adiantou que seria interessante se ele já estivesse funcionando.

Emiliana Leite – CAGECE informou que confirmaria a visita ao Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de “Peixe” com o Delano, Gerente da parte de obras, e depois entraria em contato com o José Alexandre.

José Alexandre - TCE agradeceu o esforço, a colaboração de todas as Secretarias, acredita que a barreira dos órgãos auditados e auditor foi rompida. Informou que as conversas foram francas e existem coisas que, por mais que o gestor queira resolver, não depende só do gestor. Então esse envolvimento e troca de informação são ricos para o Estado e acredita que o SWAp III irá contribuir no avanço do fortalecimento institucional e sugeriu que propostas nesse sentido sejam incluídas como Assistência Técnica.

III. POSIÇÃO SOBRE STATUS SWAp III

Cristina Medeiros – IPECE passou a dar uma atualização sobre o status do Projeto SWAp III, descritos a seguir:

- ✓ Janeiro – Março: Preparação das Análises dos temas do SWAp III Social, Crescimento Econômico, Meio Ambiente e Gestão para apresentação nos Workshops;
- ✓ Abril (19-20/04/12): Missão de Avaliação Ambiental Estratégica com a Consultora Iara Verocai;
- ✓ Maio (21-25/05/12): Realização dos Workshops dos temas Social, Crescimento Econômico, Ambiental e Gestão Pública;
- ✓ Julho – Setembro: Discussão e Negociação da Proposta;
- ✓ Até final de 2012: Assinatura do Contrato.

IV. MISSÕES DO BANCO MUNDIAL

Cristina Medeiros – IPECE informou sobre o status das Missões do Banco Mundial que se encontram descritas abaixo:

- ✓ **20-21/03/12**: Missão com a Especialista Anita Fiori sobre análise do Desenvolvimento Econômico;
- ✓ **26-27/03/12**: Missão com o Especialista Roland Clarke sobre Análise da Evolução da Gestão Pública;
- ✓ **19-20/04/12**: Missão de Avaliação Ambiental Estratégica com a Consultora Iara Verocai;
- ✓ **21-25/05/12**: Missão de Supervisão SWAp II e Workshops SWAp III

V. RELATÓRIOS FINAIS

Cristina Medeiros – IPECE informou que o Relatório de Desempenho está pronto e a única pendência para envio ao Banco Mundial é a evidência do Indicador 5 da SEDUC que será enviado até dia 30/04/2012. Quanto ao Relatório Lições Aprendidas, Melhores Práticas e Impacto do SWAp II o prazo para a entrega é dia 30/06/2012 e solicitou que as setoriais encaminhem as sugestões até o dia 15/05/2012. Destacou ainda que a UGP foi indicada pelo Banco Mundial para o Estado do Rio Grande do Sul como referência para passar a metodologia de trabalho exportando assim melhores práticas.

VI. EVIDÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO DAS METAS

Cristina Medeiros – IPECE informou que as evidências de comprovação das metas recebidas dos indicadores primários e secundários são as seguintes:

- PRIMÁRIOS: Recebidas comprovação de 18 dos 19 (95%)
 - SEFAZ: Indicadores 1, 2 e 14
 - SEPLAG: Indicadores 3 e 4
 - SEDUC: Indicadores 5, 6a, 6b, 6c
 - SESA: Indicadores 7a, 7b, 8a, 8b, 9
 - SRH: Indicador 10
 - CAGECE: Indicadores 11a, 11b e 12
 - ETICE: Indicador 13

- SECUNDÁRIOS: Recebidas comprovação de 13 dos 14 (93%)
 - SEFAZ: Indicador 1
 - SEPLAG: Indicadores 2 e 3
 - PGE: Indicador 4
 - SEDUC: Indicador 5
 - SESA: Indicadores 7, 8 e 9
 - CAGECE: Indicador 10
 - ARCE: Indicador 11
 - ETICE: Indicador 12
 - SECITECE: Indicador 13
 - SEMACE: Indicador 14

OBS: Aguarda-se uma parte do indicador primário 5 (Relatório de Melhores Práticas) e o secundário 6 da SEDUC

Cristina Medeiros – IPECE agradeceu a colaboração de todas as setoriais.

VII. ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Cristina Medeiros – IPECE apresentou o quadro dos Programas Elegíveis que se encontra abaixo:

Quadro 1 – Acompanhamento dos Programas Elegíveis

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2011 - **REGRA 70%**

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2011 Jan-Dez (a)	Orçamento 2011 - Até 31/12 (b)	Realizado (até 31/03/12) (c)	Meta (até 31/03/12) (d)	Diferença (e) = (d) - (c)	Realizado/Previsão (%) (c)/(b)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	3.268.447	3.268.447	-	2.287.913	2.287.913	0,00%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	162.534.432	162.534.432	124.073.727	113.774.102	(10.299.625)	76,34%	76,34%
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	23.826.799	23.826.799	21.861.549	16.678.759	(5.182.789)	91,75%	91,75%
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	975.497.717	975.497.717	1.185.536.948	682.848.402	(502.688.546)	121,53%	121,53%
SECITECE	194 Formação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento	12.166.208	12.166.208	8.695.912	8.516.346	(179.566)	71,48%	71,48%
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.835.100	2.835.100	415.600	1.984.570	1.568.970	14,66%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	194.927.906	194.927.906	219.573.769	136.449.534	(83.124.235)	112,64%	112,64%
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	19.151.625	19.151.625	15.118.094	13.406.138	(1.711.957)	78,94%	78,94%
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.477.726	3.477.726	2.477.726	2.434.408	(43.318)	71,25%	71,25%
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	34.191.184	34.191.184	32.891.484	23.933.829	(8.957.655)	96,20%	96,20%
TOTAL		1.431.877.144,00	1.431.877.144	1.610.644.809,4	1.002.314.001			
Valor Limite do Desembolso [70% * TOTAL]		1.002.314.001	1.002.314.001					

Notas:

¹ O Programa 033 - Ceará Digital corresponde ao Programa 070 - Ciência, Tecnologia e Inovação em 2012.

² O Programa 048 - Qualidade da Educação Básica corresponde ao Programa 073 - Organização e Gestão da Educação Básica em 2012.

³ O Programa 196 - Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico corresponde ao Programa 070 - Ciência Tecnologia e Inovação em 2012.

Posição em: 31-mar-12

Cristina Medeiros – IPECE parabenizou o desempenho da CIDADES e SESA pelo cumprimento das metas dos seus Programas Elegíveis na data 31/12/11. Informou que a SEDUC cumpriu dois até 31/12/11 e um até 31/03/12. Informou que a SECITECE cumpriu um até 31/12/11 e ainda tem problemas com licitação e pagamento das despesas nos programas 033 e 196 e eles tem uma grande probabilidade de não serem cumpridos. Adiantou que enviou um e-mail para o Banco Mundial, relatando os esforços da Secretaria, solicitando um aumento

no prazo e a possibilidade de um pedido de *Waiver*. (OBS: A coordenação enviou em 25/04/12 ofício SWAp II CE 37/2012 ao Secretário da SECITECE informando que o prazo de execução do Programa 196 foi estendido pelo Banco Mundial até 18/05/12 e que o Programa 033 precisava entregar Nota Técnica até 15/05/12 justificando o não cumprimento do prazo para ser considerado o pedido de *Waiver* pelo Banco.)

Vera Coelho – SESA questionou sobre a observação na apresentação “Valores ainda estão sendo revisados pela SEDUC e SESA para a elaboração do IFR na posição de 31/03”.

Cristina Medeiros – IPECE informou que no caso da SESA a posição é 31/12/2011. Mas como o Banco Mundial autorizou a prorrogação da execução dos programas 196 e 033 da SECITECE e 48 da SEDUC para 31/03/2012 a SEPLAG esta elaborando um IFR – Revisado e esse é o momento para se verificar se existe algum valor para ser retirado.


Cristina Medeiros – IPECE solicitou a Vera Coelho que lhe enviasse um e-mail informando se há alguma modificação nos programas da SESA na posição é 31/12/2011.

Vera Coelho – SESA informou que a revisão já foi feita e quem enviará a declaração é o Gabinete.

VIII. SUMÁRIO DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Cristina Medeiros – IPECE passou a apresentar a posição de 16/04/012 dos Projetos de Assistência Técnica, explicando que dos 32 projetos 30 estão com a execução conforme o Plano de Licitação e 2 estão com atraso, conforme apresentado no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Acompanhamento da Sinalização da Execução do Plano de Licitação dos Projetos



■ Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
■ Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia
■ Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses


Sinalização	Setorial com o número do Projeto
Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações	30 PROJETOS: ARCE (1), CGE (2,3), CIDADES(4), CONPAM (5,6), ETICE (7,8), IPECE (09,10,11,12,13), PGE(14,15), SEDUC (16,18,19,20), SEPLAG (22,23,24,25), SESA (26,27,28,29,30), TCE (31, 32).
Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia	
Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses	2 PROJETOS: SEDUC (17), SEFAZ (21).

OBS: O número ao lado do nome da setorial se refere à identificação do número do Projeto cuja descrição encontra-se no Acompanhamento no site do IPECE:

http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/assistencia/Acompanhamento_Projetos_2011.htm

Cristina Medeiros – IPECE passou a explicar que em relação aos estágios dos processos licitatórios, dos 32 Projetos de Assistência Técnica (posição de 16/04/2012), 16 estão concluídos e 16 estão sendo executados, sendo que desses, 6 estão com seu processo licitatório em andamento e 10 estão com seus contratos assinados e os serviços estão sendo prestados, conforme apresentado no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Estágio dos Processos Licitatórios




6 em andamento=	IPECE (12), PGE (15), SEDUC (20), SEFAZ (21), SEPLAG (23), TCE (31).
10 Contratos assinados =	CGE (2,3), CIDADES (4), COMPAM (6), ETICE (8), PGE (14), SEDUC (19), SEPLAG (22,24,25).
16 Concluídos =	ARCE (1), COMPAM (5), ETICE (7), IPECE (09, 10, 11, 13), SEDUC (16,17, 18), SESA (26, 27, 28, 29, 30), TCE(32).

Cristina Medeiros – IPECE informou também que dos 6 projetos em andamento, 3 estão com estágio de preparação do Edital, 1 no estágio de preparação do Relatório de Avaliação e 2 estão Negociando Contrato, de acordo com o gráfico 3.

(OBS: A coordenação enviou em 25/04/12 os ofícios SWAP CE 38/2012, 39/2012, 40/2012, 41/2012, 42/2012, 43/2012, 44/2012, 45/2012, 46/2012 e 47/2012 respectivamente as setoriais: CGE, CIDADES, COMPAM, ETICE, PGE, SEDUC, SEFAZ, SEPLAG, SESA e TCE lembrando o prazo final para a execução desses projetos é 30/06/12, quando do encerramento do SWAp II e solicitando atenção no acompanhamento dos referidos projetos para garantir o uso dos recursos financiados pelo Banco Mundial.

Gráfico 3 – Projetos em Andamento



MI ou Edital = 3	IPECE (12), PGE (15), TCE (31).
Lista Curta e SDP = 1	SEPLAG (23).
Avaliação = 1	SEFAZ (21).
Negociação Contrato = 1	SEDUC (20).

Cristina Medeiros – IPECE questionou com a Vera Coelho e Ana Márcia sobre o pagamento do projeto de aquisição dos servidores.

Ana Márcia – SESA informou que são duas empresas. Uma delas forneceu os quatro servidores e está na fase da elaboração do parecer técnico para enviar o processo para pagamento. A outra ainda não entregou os equipamentos e informou que entraram em contato com a empresa, em 17 de abril, para que esta se posicionasse sobre a entrega dos mesmos.

Cristina Medeiros – IPECE informou que, se necessário, como parte da coordenação do Projeto está à disposição para reunir com a SESA e a empresa de forma a somar esforços para tentar minimizar o problema que a empresa está apresentando. Relembrou um fato que ocorreu com a SEDUC na qual a empresa IETS estava com problema no último produto. Foi solicitada uma reunião com a empresa, SEDUC e a Coordenação do SWAp, ocorrida no dia 02/04/2012, e as pendências foram resolvidas a partir daí.

IX. SUMÁRIO DO DESEMPENHO

Cristina Medeiros – IPECE informou que hoje faria uma apresentação rápida do sumário do desempenho de 2011 e que a posição dos Indicadores Primários estão demonstrados no Quadro 2 e a posição dos Indicadores Secundários estão demonstrados no Quadro 3:

Quadro 2 – Indicadores Primários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011						
Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento	Entrega de Evidências
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).	1.293,0 milhões	1.882,2 milhões	cumprido	03/02/2012
		2. Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).	≤0,35	0,297695	cumprido	03/02/2012
	SEPLAG	3. Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG. ¹	15	15	cumprido	30/03/2012
		4. Número de "Relatórios Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG. ¹	7	7	cumprido	11/04/2012
Educação	SEDUC	5. Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas. ¹	≥90%	100%	cumprido	30/03/2012
		6.a Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: "Alfabetização na Idade Certa". ¹	≥80%	100%	cumprido	16/03/2012
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização na Idade Certa" entregue às escolas.	≥80%	100%	cumprido	16/03/2012
		6.c Percentual de gerentes do programa "Alfabetização na Idade Certa" remunerados pelo Estado.	60%	100%	cumprido	16/03/2012
Saúde	SESA	7a. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	30%	76,40%	cumprido	15/02/2012
		7b. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	30%	30,70%	cumprido	14/03/2012
		8a. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.	12	13	cumprido	15/02/2012
		8b. Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.	1	-	Não será cumprido (1)	14/03/2012
Água & Saneamento	CAGECE SRH	9. Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.	15	15	cumprido	15/12/2011
		10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥37%	39%	cumprido	10/02/2012
		11.a Número de ligações urbanas de água.	275.122	315.803	cumprido	07/02/2012
		11.b Número de ligações de esgotos.	124.775	139.845	cumprido	07/02/2012
Negócios & Inovação	SEFAZ ETICE	12. Percentual de perda de água.	≤27%	26,03% ⁵	cumprido	07/02/2012
		13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	4.365.700	4.387.816	cumprido	09/02/2012
Negócios & Inovação	SEFAZ ETICE	14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥35%	80,00%	cumprido	06/03/2012

(1) Banco Mundial irá considerar um *Waiver*, mas solicitou plano de ação à SESA para a realização da certificação.

Quadro 3– Indicadores Secundários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011						
Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento	Entrega de Evidências
Setor Público	SEFAZ	1. Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário.	≤ 10%	3,26%	cumprido	08/03/2012
		2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembleia.	2	2	cumprido	25/01/12 e 02/02/12
	POE	3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	≤ 3 meses	1,24*	cumprido	01/02/2012
		4. Percentual processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato reduzidos	≤ 10,5%	8,60%	cumprido	14/02/2012
Educação	SEDUC	5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa" (uma em 2009 e uma em 2011).	1	1	cumprido	01/12/2011
		6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.	80%	81,40%	cumprido	27/04/2012
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.468.331	7.028.280	cumprido	14/03/2012
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva à internação.	2	2	cumprido	01/02/2012
		9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	60%	70,13%	cumprido	15/02/2012
Água & Saneamento	ARCE CAGECE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	22,72% ⁶	25,75%	cumprido	07/02/2012
		11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).	58%	20,34%	Não será cumprido	24/01/2012
Negócios & Inovação	ETICE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).	3	3	cumprido	09/02/2012
		13. Número de serviços tecnológicos realizados.	47.181	43.655	Não será cumprido	10/02/2012
Melo Ambiente	CONPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	≥ 20%	20,80%	cumprido	12/03/2012

(*) O valor da média anual é foi de 1,99

Cristina Medeiros – IPECE informou que o Banco Mundial sinalizou que irá considerar um *Waiver* (perdão) para o indicador Primário 8b. da SESA, por reconhecer seus esforços, mas, em contrapartida, solicitou a entrega de um Plano de Ação para a certificação do hospital.

Vera Coelho – SESA informou que para a elaboração desse Plano, é necessário um trabalho em conjunto com a diretoria do hospital e a equipe do Hospital Waldemar Alcântara, mas no momento ela está muito envolvida com as inaugurações das UPA's pelo Governador, faltando ainda duas inaugurações e que a Secretaria não poderia elaborar um Plano de Ação sem a equipe do Hospital Waldemar Alcântara.

Cristina Medeiros – IPECE informou que o Plano de Ação precisaria estar pronto antes do dia da Missão de Supervisão do Banco Mundial. (OBS: A coordenação enviou em 25/04/12 ofício SWAp II CE 36/2012 ao Secretário da SESA informando do prazo de entrega do Plano de Ação 15/05/12.)

X. ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DAS SETORIAIS – SUMÁRIO

Cristina Medeiros – IPECE informou que passaria a apresentar as informações daqueles indicadores que tiveram mudança desde a última reunião e que ainda precisam ser monitorados, mas que o relatório completo com todos os indicadores está anexada a Ata dessa reunião (**Anexo III**), a ser disponibilizada no site do IPECE da Operação SWAp.

Segue abaixo os indicadores discutidos na reunião de hoje, cujas maiores informações detalhadas encontram-se no Anexo 1.

SEFAZ – não foi representada.

Projeto 21: Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto de Auditoria Eletrônica.

- Documentação da 11^a colocada em análise na SEFAZ.

SEPLAG - Representada por Fátima Falcão

Indicador 3: Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

Fátima Falcão – SEPLAG informou que já fora publicado os 15 relatórios em 30/03/2012.

Indicador 4: Número de "Relatórios de Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

Fátima Falcão – SEPLAG informou o cumprimento do Relatório de Desempenho Setorial e do Relatório de Produto-Resultado. Destacou que este último é um indicador da SEPLAG cuja elaboração dos Relatórios está sob a coordenação do IPECE e que são estudos interessantes com temas em educação, saúde, assistência social e segurança. Saliu que os estudos são aprofundados naqueles indicadores que são preocupantes, como no caso da saúde, a gravidez na adolescência, e sugeriu as Secretarias darem uma olhada nesse trabalho.

Fátima Falcão – SEPLAG informou que os relatórios foram aprovados pelo COGERF mas infelizmente, nem todas as Secretarias estavam presentes na reunião do COGERF e eles estão disponíveis na página da SEPLAG.

Cristina Medeiros – IPECE informou que passaria o link para todos os representantes do Comitê (enviado em 11/05/12, a saber:

http://www.seplag.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1826&Itemid=1488).
Fátima Falcão – SEPLAG também informou que o Secretário Adjunto, Philippe Nottingham, solicitou que, a coordenadora atual, fizesse uma seleção dos principais pontos para serem apresentados ao Senhor Governador.

Projeto 23: Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras.

SEDUC - Representada por Maria Eneida, José Iran e Ana Maria Garcia

Indicador 5: Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com o relatório de melhores práticas.

Eneida Machado – SEDUC informou que o Daniel está elaborando o Relatório de Melhores Práticas.

Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- Aguardando entrega até 30/04/12

Projeto 17: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 2ª Etapa.

Ana Garcia – SEDUC informou que após reunião com a empresa IETS, a Secretaria e a Coordenação, o produto está sendo revisado pela empresa e atendendo as expectativas.

Projeto 20: Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (3ª etapa).

- Contrato sendo assinado até 19/04/12.

ETICE - Representada por João Carlos Lima

Projeto 8: Desenvolvimento de Sistema de Avaliação de Resultados do Cinturão Digital do Ceará.

João Carlos Lima – ETICE informou que a empresa já está prestando serviço, já foi validado um produto, mas está com problemas com a parcela na SEPLAG.

PGE - Representada por Fernando Grangeiro.

Projeto 14: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de empresa para capacitação nas áreas de licitação, Administrativa e da Auditoria Preventiva.

Fernando Grangeiro – PGE informou que a empresa contratada é a Treide Apoio Empresarial e esta já está ministrando o curso de Licitações Públicas e Contratos Administrativos. O encerramento do curso está previsto para o dia 21/06/12 com um seminário ministrado pelo Ministro do TCU, Benjamin Zymler.

Projeto 15: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Aquisição de Equipamentos.

- Elaborando edital.

TCE - Representado por Giovanna Adjafre e José Alexandre da Silva.

Projeto 31: Fortalecimento Institucional do TCE - TCE 100% digital. (Parte A) – Digitalização.

Giovanna Adjafre – TCE informou que o produto foi entregue, estão fazendo a conferência, pois são muitas imagens, e se estiver tudo correto, será feito o pagamento.

Projeto 31: Fortalecimento Institucional do TCE - TCE 100% digital. (Parte B) – Storage

Giovanna Adjafre – TCE informou que a licitação está prevista para esta segunda, 23/05/2012. Informou também que o projeto inicial era de uma adesão, mas a ata era da Prefeitura de Fortaleza e o Banco Mundial não aceitou. Diante da negação será feito um pregão. O prazo é curto, mas acredita que será cumprido.

Cristina Medeiros – IPECE informou que ainda falta solicitar o último desembolso de Assistência Técnica e o grande desafio da Coordenação é o Estado conseguir executar todos os projetos.

Projeto 32: Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação. (Parte B) – Inscrição CISA.

Giovanna Adjafre – TCE informou que a prova é no mês de junho, já está marcada, é uma prova aplicada simultaneamente no mundo todo.

XI. CONTATOS COM A UGP

A comunicação deve ser feita através dos seguintes e-mails:

- ugpswap@ipece.ce.gov.br e cristina.medeiros@ipece.ce.gov.br

XII. ENCERRAMENTO

Ana Garcia – SEDUC aproveitou o momento e agradeceu à colaboração da Cristina Medeiros para acelerar os Projetos que estavam em atraso, destacando a importância da sua presença na reunião com o fornecedor.

Às 10:45 Cristina Medeiros encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

XIII. PARTICIPAÇÃO

O acompanhamento das participações das setoriais nas reuniões do Comitê SWAp II é realizado mensalmente conforme tabela (**Anexo V**) e gráfico (**Anexo VI**).

XIV. ANEXOS

Anexo I – Agenda da Missão do Banco

Anexo II – Programação do Workshop

Anexo III - Relatório Completo de Acompanhamento do Desempenho;

Anexo IV - Apresentação em *Power Point* – SWAp II;

Anexo V- Tabela – Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais;

Anexo VI - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais.

Anexo 1

AGENDA DA MISSÃO BANCO MUNDIAL NO CEARÁ - PROJETO SWAp II E SWAp III - 21 a 25 De Maio de 2012

Nº	HORÁRIO	ÓRGÃO	ATIVIDADE: REUNIÕES E WORKSHOPS	PARTICIPANTES			LOCAL
				BANCO MUNDIAL	SETORIAIS	Coordenação IPECE	
Segunda-Feira (21/05/12) MANHÃ							
1	9h30m - 11h	COMITÊ SWAp II	<ul style="list-style-type: none"> Reunião COMITÊ SWAp II: Desempenho SWAp II 2011. 	Thomas Kenyon, José Guilherme, Joseph Kizito, Gunars Platais, Anita Fiori, Francis Fragano, Lisa Bhansali.	Philippe Nottingham	SEPLAG	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros, Consultores UGP.
					Mário Fracalossi	SEPLAG	
2	11h - 12h	SEFAZ	<ul style="list-style-type: none"> SWAp II: Indicadores Primário, Secundário e Projetos de Assistência Técnica. 	Thomas Kenyon, José Guilherme, Joseph Kizito, Gunars Platais, Ricardo Silveira, Anita Fiori, Francis Fragano, Lisa Bhansali.	Naiana Lima	SEPLAG	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros.
					Francisco Ailson	SEPLAG	
					Representantes Comitê	TODOS	
					Sandra Machado	SEFAZ	
					Fabrizio Santos	SEFAZ	
					Fabiano Ramos	SEFAZ	
Najja e Olavo Junior	SEFAZ						
					Rejane Muniz	SEFAZ	
Segunda-Feira (21/05/12) TARDE							
3	15h - 16h30m	TCE	<ul style="list-style-type: none"> SWAp II: Projetos de Assistência Técnica. 	Thomas Kenyon, José Guilherme, Joseph Kizito, Francis Fragano, Lisa Bhansali.	Presidente TCE (confirmar)	TCE	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros, Consultores UGP.
					Giovanna Adjafre	TCE	
					Alexandre da Silva	TCE	
					Audidores SWAp	TCE	
Terça-Feira (22/05/12) MANHÃ							
4	9h - 10h	CGE	<ul style="list-style-type: none"> SWAp II: Projetos de Assistência Técnica. 	Thomas Kenyon, Joseph Kizito, José Guilherme, Anita Fiori, Francis Fragano, Lisa Bhansali.	Paulo Roberto	CGE	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros, Consultores
					Silvia Correia	CGE	
5	10h - 11h	PGE	<ul style="list-style-type: none"> SWAp II: Indicador Secundário e Projetos de Assistência Técnica. 	Thomas Kenyon, Joseph Kizito, José Guilherme, Anita Fiori, Francis Fragano, Lisa Bhansali.	Marconi Lemos	CGE	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros.
					Fernando Grangeiro	PGE	
6	11h - 12h	ETICE	<ul style="list-style-type: none"> SWAp II: Indicadores Primário, Secundário e Projetos de Assistência Técnica. 	Thomas Kenyon, Joseph Kizito, José Guilherme, Anita Fiori, Francis Fragano, Lisa Bhansali.	Tarso Pinheiro	PGE	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros.
					Fernando Carvalho	ETICE	
					Denise Olsen	ETICE	
Terça-Feira (22/05/12) TARDE							
7	14h - 15h30m	SEPLAG	<ul style="list-style-type: none"> SWAp II: Indicadores Primário, Secundário e Projetos de Assistência Técnica. 	Thomas Kenyon, Joseph Kizito, José Guilherme, Anita Fiori, Francis Fragano, Lisa Bhansali.	Mário Fracalossi	SEPLAG	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros, Consultores UGP.
					Naiana Lima	SEPLAG	
					Ana Lúcia / Fátima Falcão	SEPLAG	
					Sérgio Lage	SEPLAG	
					Carmen Silva / Soraya / Ana	SEPLAG	
8	15h30m - 17h	SECITECE/ NUTEC	<ul style="list-style-type: none"> SWAp II: Indicador Secundário e Programas Elegíveis. 	Thomas Kenyon, Joseph Kizito, José Guilherme, Anita Fiori, Francis Fragano, Lisa Bhansali.	Francisco Ailson	SEPLAG	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros, Consultores UGP
					Almir Bittencourt	SECITECE	
					Ricardo C. Silva	SECITECE	
					Vera Salgado	NUTEC	
Quarta-Feira (23/05/12) MANHÃ							
9	9h - 10h30m	SESA	<ul style="list-style-type: none"> SWAp II: Indicadores Primário, Secundário, Programas Elegíveis e Projetos de Assistência Técnica. 	Thomas Kenyon, José Guilherme, Ricardo Silveira, Anita Fiori, Francis Fragano, Lisa Bhansali.	Vera Coelho	SESA	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros e Consultores UGP.
					Ana Márcia	SESA	
					Ana Angélica	SESA	
10	10h30m-11h30m	SEDUC	<ul style="list-style-type: none"> SWAp II: Indicadores Primário, Secundário, Programas Elegíveis e Projetos de Assistência Técnica. 	Thomas Kenyon, José Guilherme Reis, Ricardo Silveira, Anita Fiori, Francis Fragano, Lisa Bhansali.	Eneida Maia	SEDUC	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros e Consultores UGP.
					José Iran	SEDUC	
					Noemi Cordeiro	SEDUC	
Quarta-Feira (23/05/12) TARDE							
11	14h - 16h30m	CIDADES	<ul style="list-style-type: none"> SWAp II: Salvaguardas do Projeto - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde e Reassentamentos; SWAp II: Indicadores Primário, Secundário, Programas Elegíveis e Projeto de Assistência Técnica: ARCE, COGERH /SRH, CAGECE, CIDADES, CONPAM, SEMACE. 	Thomas Kenyon, José Guilherme, Gunars Platais, Anita Fiori, Marcos Thadeu, Francis Fragano, Lisa Bhansali.	Tércia Martins	CIDADES	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros e Consultores UGP.
		CAGECE			Paulo Abreu Alves	CIDADES	
		SESA			Ricardo Meira	CAGECE	
		CONPAM/ SEMACE			Marta Regia	CAGECE	
					Vera Coelho	SESA	
		ARCE			Tereza Rosane	SESA	
					Paulo Lustosa	CONPAM	
		SRH/ COGERH			Maria Dias	CONPAM	
					Maurício Giffoni	SEMACE	
					Alexandre Caetano	ARCE	
					Daniela Dantas	ARCE	
					João Lúcio	COGERH	
Denilson Fidelis	COGERH						
					Mônica Holanda	SRH	
12	17h - 18h	IPECE	<ul style="list-style-type: none"> Fechamento da Missão de Supervisão SWAp II. 	Thomas Kenyon e todos os Especialistas	Coordenação	IPECE	Flávio, Cristina Medeiros

Quinta-Feira (24/05/12) MANHÃ									
13	8h30m-12h30m	ESTADO	<ul style="list-style-type: none"> WORKSHOP TEMA: GESTÃO PÚBLICA (Roland Clark ou substituto) WORKSHOP TEMA: CRESCIMENTO ECONÔMICO (Anita Fiori, José Guilherme) 	Thomas Kenyon, José Guilherme Reis, Ricardo Silveira, Gunars Platais, Anita Fiori, Marcos Thadeu, Francis Fragano	Participantes Convidados	Estado	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros e Consultores UGP.	Auditório Palácio da Abolição	
Quinta-Feira (24/05/12) TARDE									
14	13h30m-18h	ESTADO	<ul style="list-style-type: none"> WORKSHOP TEMA: COMBATE AS DESIGUALDADES SOCIAIS (Armando Castelar) WORKSHOP TEMA: SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (Gunars Platais) 	Thomas Kenyon, José Guilherme Reis, Ricardo Silveira, Gunars Platais, Anita Fiori, Marcos Thadeu, Francis Fragano	Participantes Convidados	Estado	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros e Consultores UGP.	Auditório Palácio da Abolição	
Sexta-Feira (25/05/12) MANHÃ									
15	8h30m-12h30m	ESTADO	<ul style="list-style-type: none"> Fechamento do Workshop com a presença do Governador. 	Thomas Kenyon, José Guilherme Reis, Ricardo Silveira, Gunars Platais, Anita Fiori, Marcos Thadeu, Francis Fragano	Participantes Convidados	Estado	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros e Consultores UGP.	Auditório Palácio da Abolição	
Sexta-Feira (25/05/12) TARDE									
16	14h - 16h	IPECE SEPLAG	<ul style="list-style-type: none"> Apresentação do Program for Results (PforR) x SWAp III; Discussão da nova proposta: Próximos passos, Programas Elegíveis, Indicadores e Projetos de Assistência Técnica. 	Thomas Kenyon, José Guilherme Reis, Ricardo Silveira, Anita Fiori, Gunars Platais, Marcos Thadeu, Francis Fragano	Philippe Nottingham	SEPLAG	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros e Consultores UGP.	SEPLAG	
					Mário Fracalossi	SEPLAG			
					Naiana Lima	SEPLAG			
					Carlos Eduardo	Casa Civil			
					Sílvia Correia	CGE			
					Jurandir Gurgel	SEFAZ			
Tarso Pinheiro	PGE								
17	16h30m-17h30m	IPECE SEPLAG	<ul style="list-style-type: none"> Resultado das reuniões setoriais SWAp II; Resultado do Workshop, discussão da nova proposta (PforR) para o SWAp III; Fechamento da Missão e próximos passos. 	Thomas Kenyon, José Guilherme Reis, Ricardo Silveira, Gunars Platais, Anita Fiori, Marcos Thadeu, Francis Fragano	Eduardo Diogo (a confirmar)	SEPLAG	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros.	SEPLAG	
					Philippe Nottingham	SEPLAG			
					Mário Fracalossi	SEPLAG			

Anexo 2



Programação do Workshop Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades Sociais e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará SWAp III

Dia 24 de Maio de 2012

08h **CREENCIAMENTO**

08h45min **ABERTURA**

Eduardo Diogo – Secretário de Planejamento e Gestão do Ceará

Tom Kenyon – Gerente do Projeto SWAp III – Banco Mundial

09hmin **PAINEL I – GESTÃO PÚBLICA**

Expositor: Roland Clarck - Banco Mundial (20minutos)

Moderador: Carlos Eduardo Pires Sobreira - Casa Civil

Comentários dos Secretários de Governo:

- Secretário da SEPLAG (10 minutos)
- Secretário Adjunto da SEFAZ (10 minutos)
- Controlador e Ouvidor Geral (10 minutos)
- Procurador Geral do Estado (10 minutos)
- Observações dos participantes (10 minutos)

Plenária (20 minutos)

10h30min- 10h45min - Intervalo



10h45min

PAINEL II: CRESCIMENTO ECONÔMICO

Expositores: Anita Fiori – Banco Mundial (15 minutos)

José Guilherme Reis - Banco Mundial (15 minutos)

Moderador: Adriano Sarquis – IPECE

Comentários dos Secretários de Governo:

- Secretário Adjunto da SEPLAG (10 minutos)
- Secretário da SEINFRA (10 minutos)
- Secretário da SECITECE (10 minutos)
- Secretário da SEFAZ (10 minutos)
- Presidente da ADECE (10 minutos)

Plenária (20 minutos)

Almoço 12h35min - 13h35min

13h35min

Painel III: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Expositor: Armando Castelar - Consultor Banco Mundial (20 Minutos)

Moderador: Flávio Ataliba – IPECE

Comentários dos Secretários de Governo:

- Secretário da STDS (10 minutos)
- Secretário da SDA (10 minutos)
- Secretário da SEDUC (10 minutos)
- Secretário da SESA (10 minutos)
- Secretário das CIDADES (10 minutos)

Plenária (20 minutos)

15h05min – 15h20min – Intervalo



15h20min PAINEL IV: SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Expositor: Gunars Platais - Banco Mundial (20 minutos)

Moderador: Philipe Nottingham – SEPLAG

Comentários dos Secretários de Governo:

- Presidente do CONPAM (10 minutos)
- Secretário da SRH (10 minutos)
- Secretário das CIDADES (10 minutos)
- Secretário da SESA (10 minutos)

Plenária (20 minutos)

Dia 25 de Maio de 2012

09h CONTEXTUALIZAÇÃO: Secretário da SEPLAG

Eduardo Diogo (05min)

09h10min EXPOSIÇÃO DA SÍNTESE WORKSHOP AO GOVERNADOR:

Diretor Geral do IPECE - Flávio Ataliba (20min)

09h40min EXPOSIÇÃO: Representante do Banco Mundial

Tom Kenyon (20min)

10h CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

Governador - Banco Mundial - SEPLAG - IPECE

Anexo 3


RELATÓRIO COMPLETO DE ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DAS SETORIAIS

1. SEFAZ

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 1: Saldo Fiscal Corrente do Estado (Receitas Correntes menos Despesas Correntes).


- Meta 2011: R\$ 1.293,00 milhões
- Posição em 31/12: R\$ 1.882,18 milhões
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: As receitas e as despesas correntes se comportam conforme o esperado.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta superada.

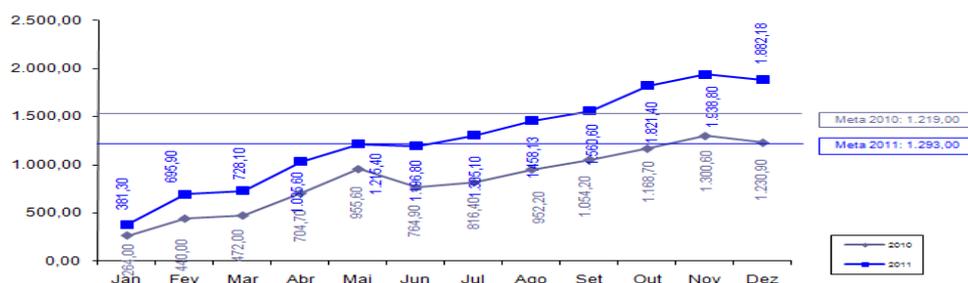

Sentido do indicador: ↑

Indicador 2: Índice Hefirndahl de arrecadação de ICMS usando quatro setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).

- Meta 2011: $\leq 0,35$
- Posição em 31/12: 0,297695
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: Não há nenhuma indicação de que haja concentração de arrecadação de ICMS em algum dos setores estudados que possa aumentar o índice além da meta.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

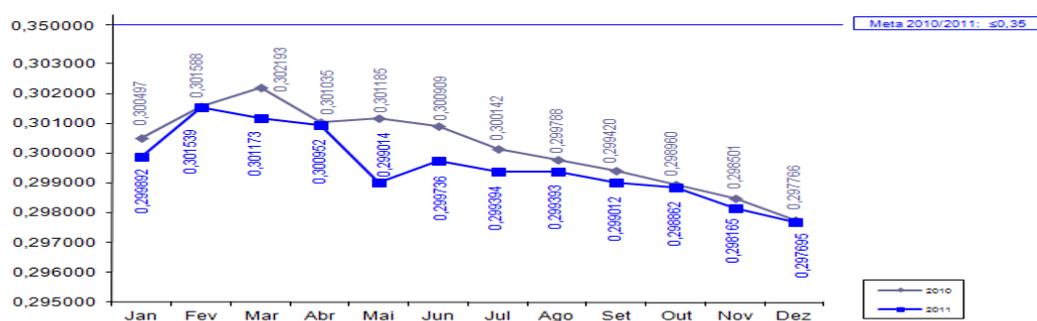


Sentido do indicador: ↓

Indicador 14: Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.

- Meta 2011: $\geq 35,00\%$
- Posição em 31/12: 80,00%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: Com a vigência da Lei Complementar nº. 128/2010, as empresas do MEI são cadastradas automaticamente na SEFAZ/CE a partir do registro informado pela

Receita Federal. Essas informações foram disponibilizadas por este órgão desde abril de 2010 e foram introduzidas no Estatístico do Cadastro da SEFAZ/CE nesta data.

- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

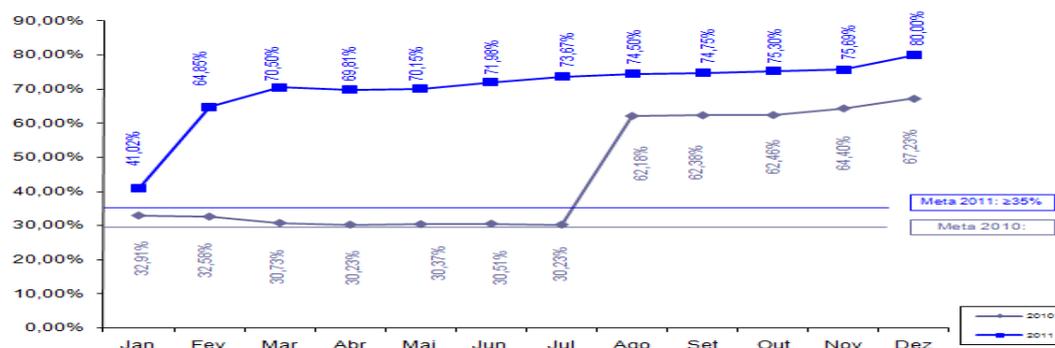


Sentido do indicador: ↑

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 1: Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário (% dos contribuintes ativos do regime de recolhimento normal que declaram saldo devedor na DIEF que a SEFAZ inscreve na Dívida Ativa).

- Meta 2011: ≤10,00%
- Posição em 31/12: 3,26% (valor referente ao período de março a julho 2011)
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Comentários: Acordado com o BM que o indicador seria medido três vezes em 2011, com informações quadrimestrais referente ao período de cinco meses. Informação fornecida após a missão (19/12/11).

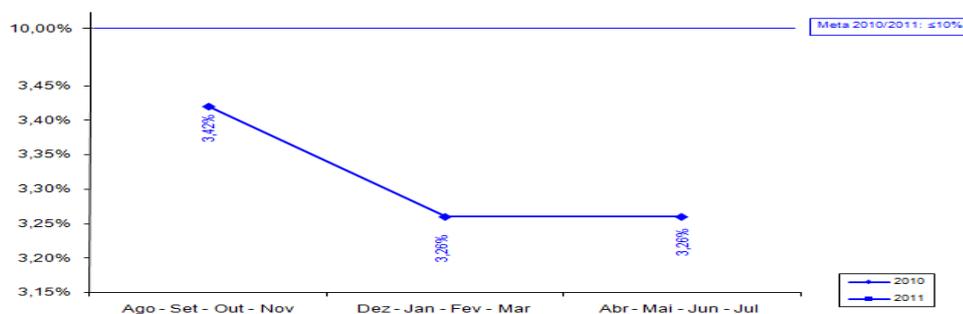

Sentido do indicador: ↓

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA¹

Projeto 21: Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto de Auditoria Eletrônica.

- Responsável: Rejane Muniz
- Categoria de Licitação: BENS
- Valor: US\$ 300,00 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2011 - Abril 2012

¹Legenda da Sinalização para cumprimento dos Projetos de Assistência Técnica:

Verde=Realização conforme o Plano de Licitações; Amarelo = Realização com atraso mais de um dia; Vermelho = Realização com atraso de mais de três meses.

- Estágio Previsto: Contrato assinado.
- Estágio Atual: Documentação da 11^a colocada em análise na SEFAZ.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

2. SEPLAG

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 3: *Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.*

- Meta 2011: 15
- Posição em 31/12: 15
- Posição em 31/12 em relação à meta:
- Perspectiva de Cumprimento: cumprido.
- Comentário: Relatórios publicados no site em 30/03/2012.

Indicador 4: *Número de "Relatórios de Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.*

- Meta 2011: 7
- Posição em 31/12: -
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de cumprimento: A perspectiva é de cumprimento da meta.
- Comentário: A meta será cumprida em março de 2012.

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 2: *Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no discurso anual do Governador na Assembleia.*

- Meta 2011: 2
- Posição em 31/12: 2
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de cumprimento: Cumprido
- Informações disponíveis nos links:
- ✓ http://www.seplag.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1911&Itemid=1702
- ✓ http://www.seplag.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1970&Itemid=1705

Indicador 3: *Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.*

- Meta 2011: ≤3 meses
- Posição em 31/12: 1,24 meses
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de cumprimento: Meta cumprida.
- Comentário: A média anual do indicador para 2011 foi de 1,99 meses.



Sentido do indicador: ↓

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 22: Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará – SEPLAG.

- Responsável: Sérgio Lage e Fernanda Salles
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 106,50 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2009 – Abril 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 23: Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras .

- Responsável: Soraya Quixadá
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2010 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Avaliando propostas.
- Estágio Atual: Avaliando propostas.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 24: Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo à sociedade em geral e as entidades representativas das empresas.

- Responsável: Soraya Quixadá
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 110,69 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2010 – Maio 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 25: Desenvolvimento de Solução Informatizada para monitoramento da Cooperação Técnico-financeira do Estado do Ceará – SEPLAG.

- Responsável: Mário Fracalossi
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria

- Valor: US\$ 102,36 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2009 – Maio 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

3. SEDUC


INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 5: Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas.

- Meta 2011: $\geq 90\%$
- Posição em 31/12: 100%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de cumprimento: Pelo Ofício N°.1023/12 de 30/03/2012, a SEDUC compromete-se em enviar até o dia 30/04/2012 o Relatório referente à divulgação e às estratégias de disseminação de boas práticas junto aos municípios e escolas das Redes Municipal e Estadual de ensino em substituição ao Relatório de Melhores Práticas, que só será concluído em setembro de 2012 como também a possibilidade de envio do rascunho do Relatório de Boas Práticas, para submissão ao BM após 30/06/2012.

Indicador 6a: Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: "Alfabetização na Idade Certa".


- Meta 2011: 80%
- Posição em 31/12: 100%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida

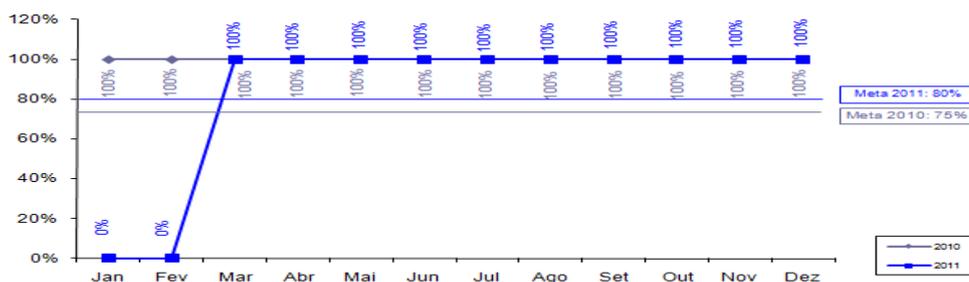

Sentido do indicador: ↑

Indicador 6b: Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização na Idade Certa" entregue às escolas.


- Meta 2011: $\geq 80\%$
- Posição em 31/12: 100%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida

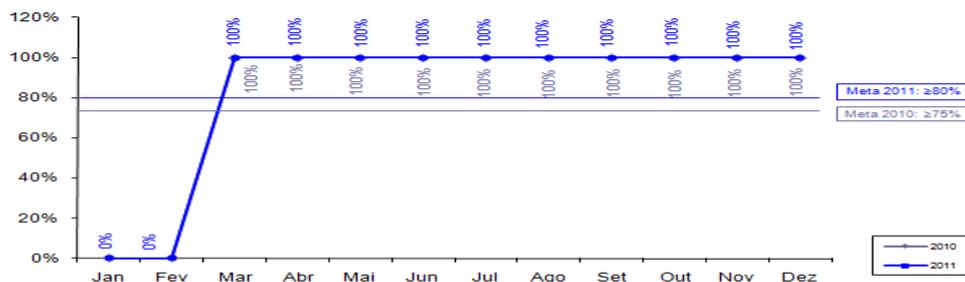

Sentido do indicador: ↑

Indicador 6c: Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.

- Meta 2011: 60%
- Posição em 31/12: 100%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida

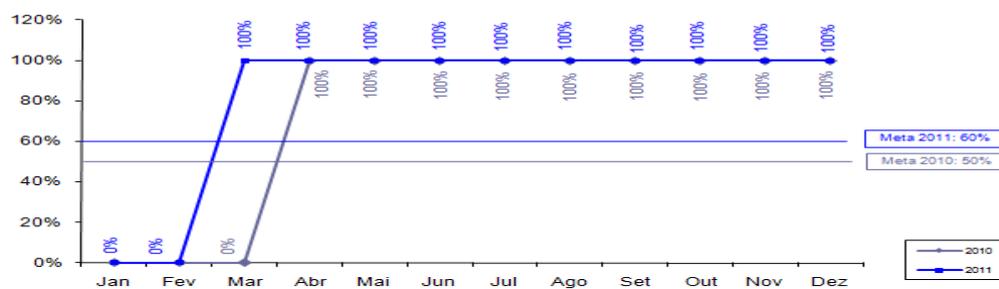

Sentido do indicador: ↑

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 5: Avaliação da Implementação municipal do programa “Alfabetização da Idade Certa” (uma em 2009 e uma em 2011).

- Meta 2011: 1
- Posição em 31/12: 1
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida em 08/12/2011.

Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- Meta 2011: 80%
- Posição em 31/12: -
- Posição em 31/12 em relação a meta: AMARELO
- Perspectiva de cumprimento: A perspectiva é de possibilidade média de cumprimento da meta até 30/04/12.
- Comentário: Pelo Ofício N°.1085/12 de 03/04/2012 a SEDUC compromete-se em enviar até 30/04/2012 os dados preliminares da evidência de cumprimento do indicador.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 16: Avaliação do Programa E- Jovem.

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 72,90 mil

- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2009 - Setembro 2010
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 17: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 1ª Etapa.

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 35,36 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2009 – Setembro 2010
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 17: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 2ª Etapa.

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 36,85 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2010 - Outubro 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Aguardando entrega do último produto. SEDUC e IPECE reuniram em 02/04/12 com Empresa IETS que prometeu Relatório revisado até 30/04/12.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 18: Serviço de consultoria para a Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico – Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará.

- Responsável: Eneida Machado e Kennedy
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 93,94 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2010 - Agosto 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 19: Serviço de consultoria para Fase 2 da Implantação de um Projeto Técnico-Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará.

- Responsável: Eneida Machado e Kennedy
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 180,47mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2011 – Abril 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 20: Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (3ª etapa).


- Responsável: Eneida Machado e Kennedy
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 146,95 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2011 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Contrato sendo assinado até 19/04/12.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4. SESA

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 7a: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.

- Meta 2011: 30,00%
- Posição em 31/12: 76,40%
- Posição em 31/12 em relação à meta:
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida
- Comentários: Relatório encaminhado em 12.03.2012.

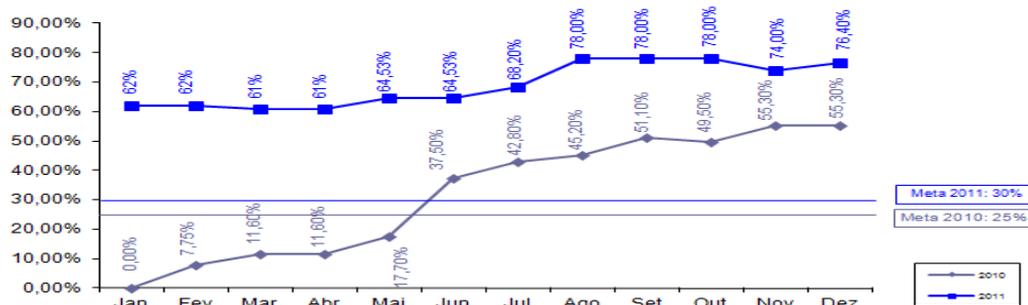


Sentido do indicador: ↑

Indicador 7b: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.

- Meta 2011: 30,0%
- Posição em 31/12: 30,7%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: cumprido
- Comentários: O relatório enviado em 14.03.2012.

Indicador 8a: Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.

- Meta 2011: 12
- Posição em 31/12: 13
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida

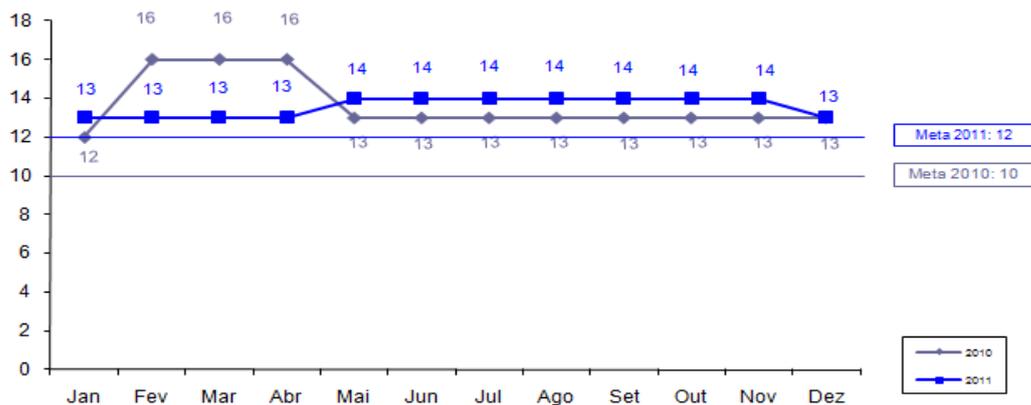


Sentido do indicador: ↑

Indicador 8b: Número de hospitais com certificação de qualidade da ONA.

- Meta 2011: 1
- Posição em 31/12: -
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: meta não será cumprida.
- Comentários: Relatório encaminhado em 14.03.2012.

Indicador 9: Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.

- Meta 2011: 15
- Posição em 31/12: 15
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

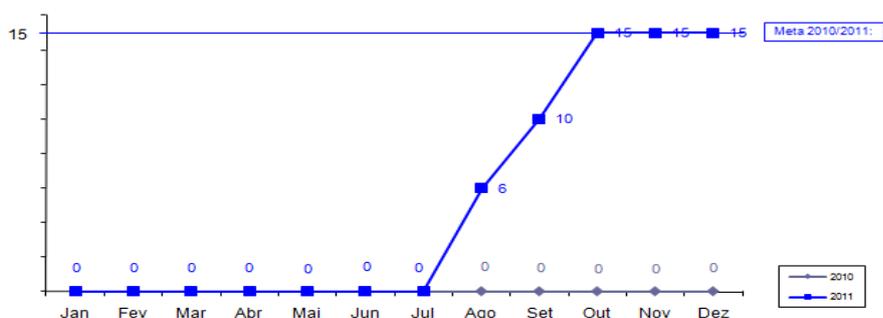


Sentido do indicador: ↑

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 7: População Atendida pelas Equipes do PSF.

- Meta 2011: 6.468.331
- Posição em 31/12: 7.028.280
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida. Dados de dezembro de 2011, enviados em 14.03.2012.

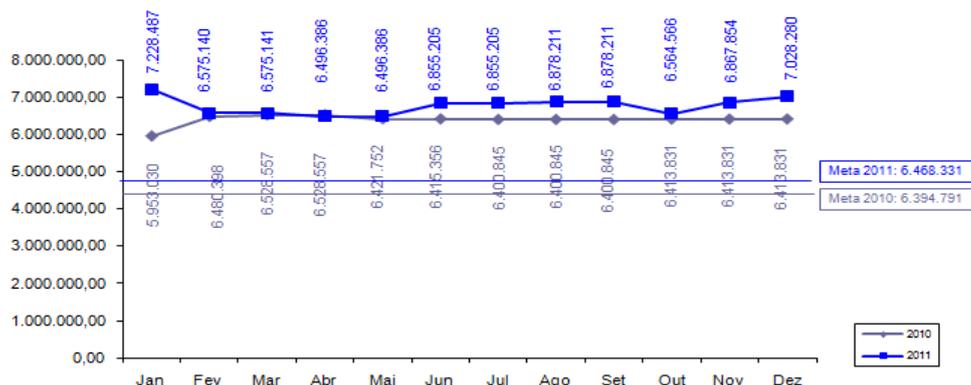


Sentido do indicador: ↑

Indicador 8: Relatórios semestrais do “Grupo da Água para combater a diarreia infantil que leva a internação”.

- Meta 2011: 2
- Posição em 31/12: 2
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta será cumprida.

Indicador 9: Coleta sistemática e relato peso/altura dos bebês.

- Meta 2011: 60,00%
- Posição em 31/12: 70,13% (*)
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.
- Comentários: Dados obtidos junto ao Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN. Valor alterado conforme a evidência enviada 15/02/12.

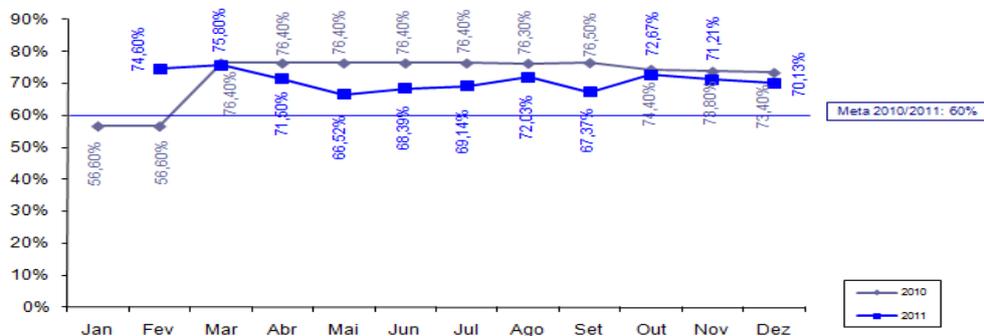

Sentido do indicador: ↑

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 26: Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 93,76 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2010 – Dezembro 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 27: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Validação da Metodologia.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 28,89 mil
- Método de Aquisição: Diretrizes Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2009 – Agosto 2010
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 28: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Definições e ajustes no modelo de absorção.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 56,05 mil
- Método de Aquisição: Diretrizes Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2010 – Outubro 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 29: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Compra de equipamentos de informática para habilitar as CRES.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 141,80 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2010 – Março 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 30(Parte A): Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informática.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 234,16 mil
- Método de Aquisição: Pregão (Ata de Registro de Preço)
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2010 – Março 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 30(Parte B): Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informática (Servidores e Switches).

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 148,03 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior

- Início/Término: Maio 2011 – Janeiro 2012
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído aguardando pagamento (restos a pagar).
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 30 (Parte C): Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação (no break e rádio).

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 28,86 mil
- Método de Aquisição: Pregão (Ata de Registro de Preço)
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2010 – Março 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

SALVAGUARDAS

Gestão de Resíduos Sólidos Hospitalares.


Relatório Quadrimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II, enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º trimestre de 2011).

5. COGERH

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador 10: Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.

- Meta 2011: $\geq 37\%$
- Posição em 31/12: 39%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: O indicador na posição de dezembro/2011 atingiu e até sobrepujou a meta estabelecida em dois pontos percentuais, pois no período do último trimestre do ano, o consumo de água aumentou consideravelmente por parte dos usuários em geral, mormente quanto a categoria dos irrigantes, devida a falta de chuvas, que teve substancial influência para o cumprimento da meta.
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.

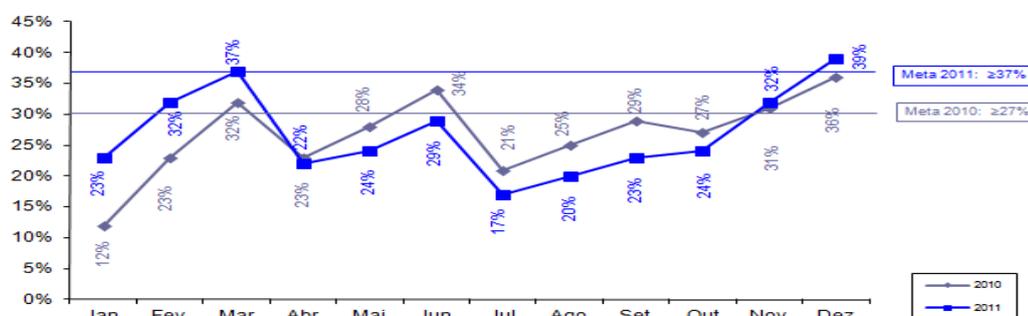


Sentido do indicador: ↑

6. CAGECE

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 11a: Número de ligações urbanas de água.


- Meta 2011: 275.122
- Posição em 31/12: 315.803
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: De 2006 a dezembro de 2011 foram executadas 315.803 ligações domiciliares de água.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta superada.
- Comentário: Valor modificado para 315.803 pela evidência encaminhada em 07/02/2012.

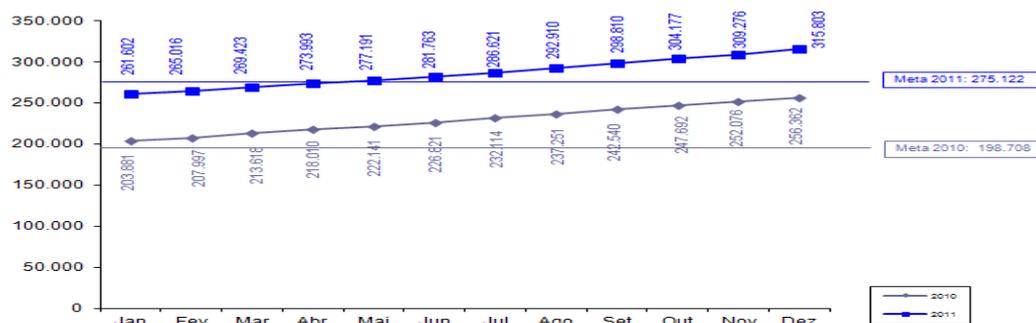

Sentido do indicador: ↑

Indicador 11b: Número de ligações de esgotos.


- Meta 2011: 124.775
- Posição em 31/12: 139.845
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: De 2006 a dezembro de 2011 foram executadas 139.845 ligações domiciliares de esgoto.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta superada.

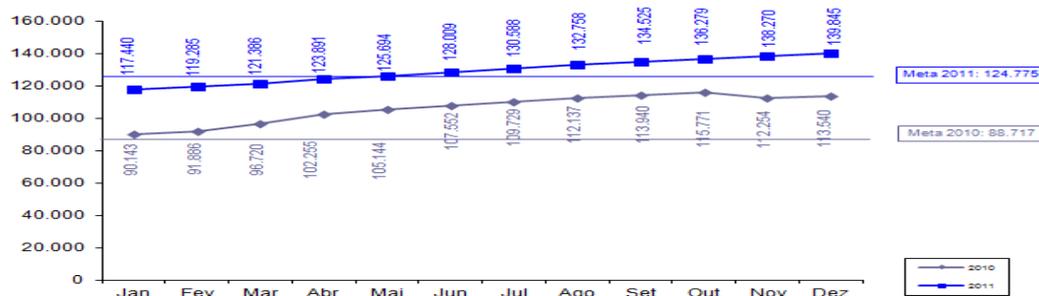

Sentido do indicador: ↑

Indicador 12: Percentual de Perda de Água.

- Meta 2011: ≤ 27% (*)
- Posição em 31/12: 26,08%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: De 2007 a novembro de 2011, o percentual de perda de água foi de 26,03%.
- Comentário: Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 28,20% para 27%.

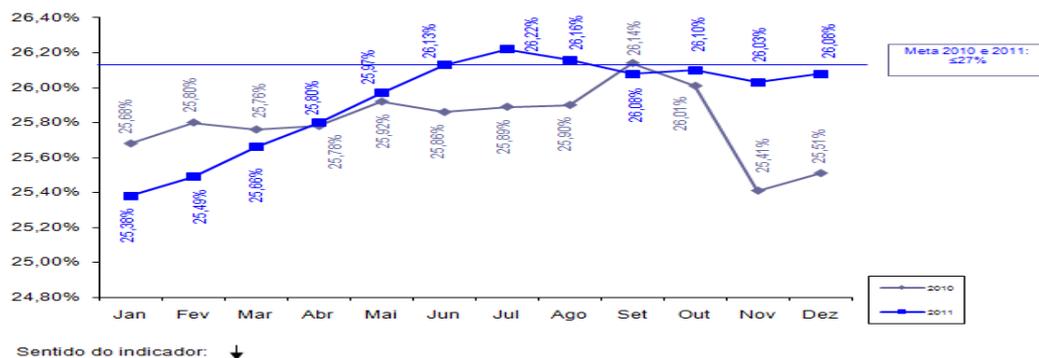


Sentido do indicador: ↓

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 10: Margem EBITDA da CAGECE.

- Meta 2011: 22,72%
- Posição em 31/12: 25,75%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida
- Comentário: Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 29,50% para 22,72%. Valor provisório, pois o encerramento de 2011 ocorrerá após as análises da Auditoria Externa, cujo prazo para publicação das Demonstrações financeiras de 2011 é 31/03/2012.

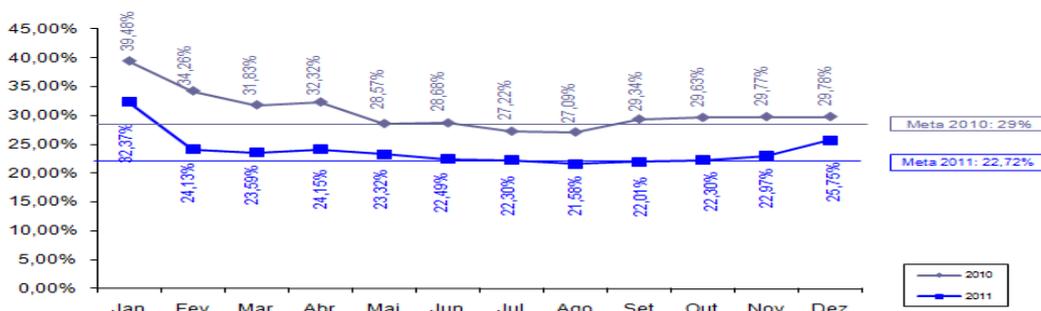

Sentido do indicador: ↑

SALVAGUARDAS

Reassentamento e Desapropriações

Relatório Quadrimestral de Acompanhamento da Salvaguarda de Reassentamento e Desapropriação enviada ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º Trimestre de 2011).

7. CIDADES

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 4: Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade.

- Responsável: Tércia Pinheiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 115,52 mil

- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2011 – Fevereiro 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

SALVAGUARDAS

Gestão de Resíduos Sólidos Hospitalares


Relatório Quadrimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II, enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º trimestre de 2011).

8. ETICE

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador 13: Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.

- Meta 2011: 4.365.700
- Posição em 31/12: 4.387.816
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: A partir do Cinturão Digital, o Governo do Estado do Ceará estenderá, por meios de ramificações de fibras óticas com uso da tecnologia Wimax, via rádio, a rede de banda larga aos municípios.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

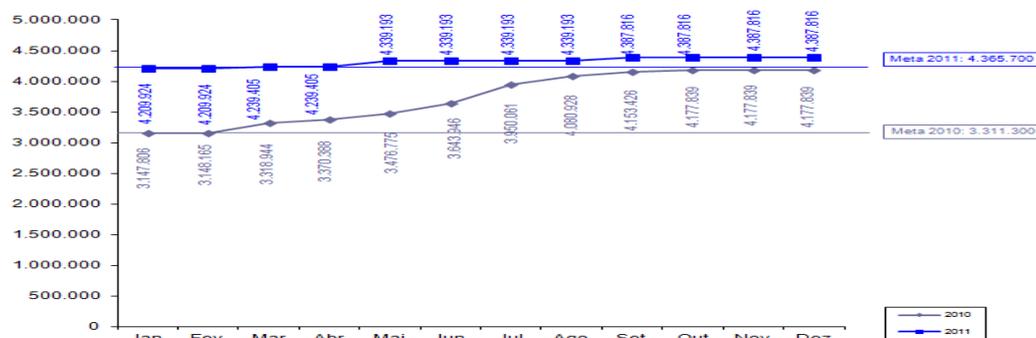

Sentido do indicador: ↑

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 12: Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com sistemas).

- Meta 2011: 3
- Posição em 31/12: 3
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: Os sistemas Ciclo Orçamentário, Middleware de Integração e Patrimônio, componentes do S2GPR, encontram-se implementados.
- Perspectiva de Cumprimento: A meta foi cumprida.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 7 *Realização de Workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de internet.*

- Responsável: Denise Olsen
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor: US\$ 32,72 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2009 – Setembro 2009
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 8: *Desenvolvimento de Sistema de Avaliação de Resultados do Cinturão Digital do Ceará.*


- Responsável: Denise Olsen
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 51,72 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2011 – Setembro 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

9. PGE

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 4: *Redução de processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato.*

- Meta 2011: $\leq 10,5\%$
- Posição em 31/12: 9,76%*
- Posição em 31/12 em relação à meta:
- Perspectiva de Cumprimento: Meta com perspectiva de cumprimento.
- Comentário: o percentual médio da meta no período de janeiro a dezembro de 2011 foi de 8,60%.

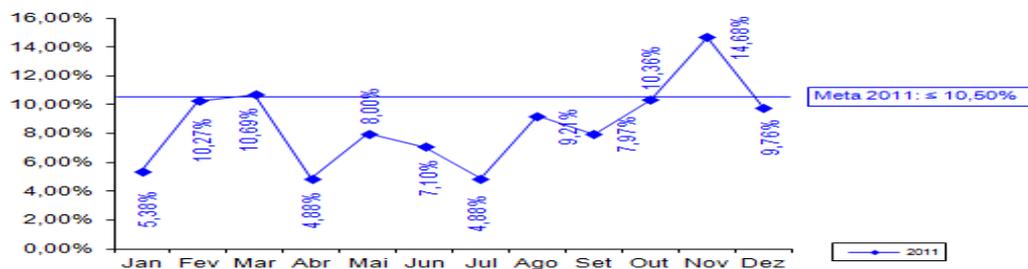

Sentido do indicador: ↓

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 14 *Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de empresa para capacitação nas áreas de licitação e administrativa.*

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 173,69
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2010 – Maio 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 15 Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Aquisição de Equipamentos.

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 26,31
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2012 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Publicando Edital.
- Estágio Atual: Elaborando edital.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

10. ARCE

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 11: Índice de Conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE

- Meta 2011: 58,00%
- Posição em 31/12: 20,34%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERMELHO
- Justificativa: 59 relatórios concluídos de janeiro a dezembro de 2011, dos quais 47 relataram não-conformidades na qualidade da água.
- Perspectiva de cumprimento: a melhoria observada no início do ano, de fevereiro a abril de 2011, não se manteve nos meses seguintes. A meta não foi atingida.



Sentido do indicador: ↑

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: *Elaboração do manual de indicadores de performance para o setor de saneamento ARCE.*


- Responsável: Mário Monteiro e Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 119,42 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2009 – Agosto 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

11. SECITECE

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 13: *Número de serviços tecnológicos realizados.*

- Meta 2011: 47.181
- Posição em 31/12: 43.655
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de cumprimento: Meta não alcançada.
- Comentários: Valor modificado para 43.655 pela evidência encaminhada em 10/02/2012.

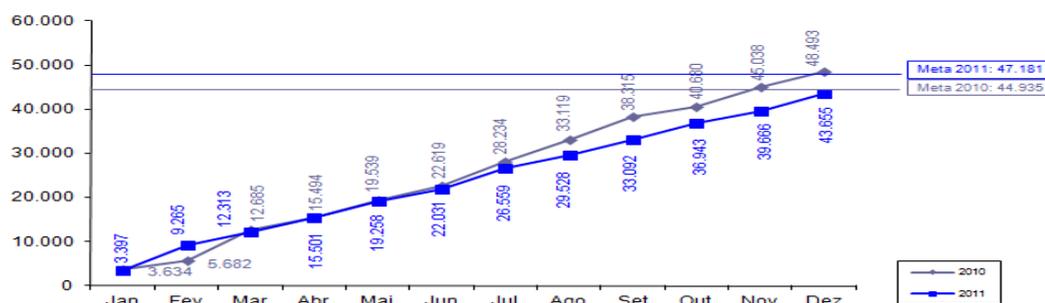


Sentido do indicador: ↑

12. CONPAM

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 14: *Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.*

- Meta 2011: 20,00%
- Posição em 31/12: 20,80%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de cumprimento: Meta cumprida
- Comentários: Informação referente a Dezembro de 2011.

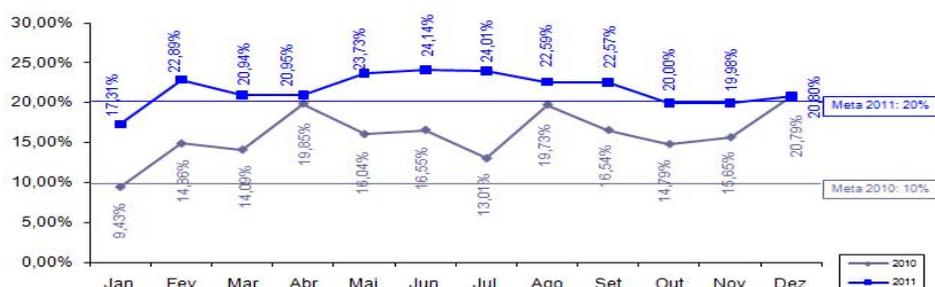

Sentido do indicador: ↑

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 5: Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente – CONPAM.

- Responsável: Maria Goretti de Castro e Maria Dias
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 39,68 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2009 – Novembro 2010
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 6: Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos Sólidos de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos – CONPAM.

- Responsável: Maria Dias
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 125,16mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2011 – Março 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

SALVAGUARDAS

Gestão de Resíduos Sólidos Hospitalares

Relatório Quadrimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II, enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º trimestre de 2011).

13. CGE

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 2: Capacitação em Mapeamento de Gestão e Auditoria de Processos com foco em Risco (no âmbito do Gov.Estadual).

- Responsável: Marconi Lemos

- Categoria de Licitação: Empresa de consultoria.
- Valor: US\$ 174,93 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2011 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Contrato assinado.
- Estágio Atual: Contrato publicado em 09.03.2012.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 3: *Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará.*

- Responsável: Marconi Lemos
- Categoria de Licitação: Empresas de consultoria
- Valor: US\$ 120,92 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro 2009 – Janeiro 2012
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Produto entregue em 06/01/2012. Já encaminhamos processo com a documentação pertinente para efetuarmos o último pagamento.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

14. IPECE

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 9: *Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Consultoria.*

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 31,34 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2009 – Março 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 10: *Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos resultado da consultoria.*

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 1,24 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2011 – Maio 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 11: *Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado aos indígenas.*

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria

- Valor: US\$ 1,24 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2010 – Março 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 12: Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAp II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo).

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 171,46 mil
- Método de Aquisição: Seção V- Diretrizes de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2009 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando Serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 13: Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado.

- Responsável: Leandro Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 17,95 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2009 – Maio 2010
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

SALVAGUARDAS

Povo Indígena

- No dia 15 de Abril de 2011, ocorreu um evento na Aldeia Indígena Jenipapo Kanindé para o lançamento das duas cartilhas (projetos AT 9,10 e 11), elaboradas dentro do escopo de Salvaguardas Social do Projeto SWAp II intituladas *Plantas Medicinais: Usos-saberes-sentidos; e Sentir-pensar-fazer: Artesanatos Indígenas no Ceará*);
- Ofício SEDUC nº 1268/2011 informou a entrega das cartilhas *Plantas Medicinais: Usos-saberes-sentidos; e Sentir-pensar-fazer: Artesanatos Indígenas no Ceará*) nas Escolas Indígenas do Ceará;
- No dia 25/01/2012 foram encaminhadas as cartilhas para José Mendes Fonteles Filho (Profº Babi) e para Professora da UFC Isabelle Bras Peixoto da Silva.

15. TCE

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 31: Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de soluções Integradas de Gerenciamento eletrônico de documento e informações do TCE (TCE 100% digital).

(Parte A) – Digitalização.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor: US\$ 72,4 mil
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2010 – Março 2012
- Estágio Previsto: Prestando Serviço.
- Estágio Atual: Prestando Serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 31: Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de soluções Integradas de Gerenciamento eletrônico de documento e informações do TCE (TCE 100% digital).

(Parte B) – Storage.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor: US\$ 196,8 mil
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2012/Junho 2012
- Estágio Previsto: Publicação Edital
- Estágio Atual: Edital publicado – Pregão 23/04/12
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 32: Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de Tecnologia da Informação. (Parte A) – Curso.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 65,72 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2009 – Setembro 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 32: Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de Tecnologia da Informação. (Parte B) – Inscrição CISA.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 7,54 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: -
- Estágio Previsto: -
- Estágio Atual: prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Anexo 4

OPERAÇÃO Swap II

ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO

PROJETO SWAp II

19 DE ABRIL DE 2012

OPERAÇÃO Swap II

PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

- 1 - Apresentação dos Participantes;**
- 2 - Informações sobre a Auditoria do Projeto;**
- 3 - Posição sobre status SWAp III;**
- 4 - Missões do Banco Mundial;**
- 5 - Relatórios Finais;**
- 6 - Evidências de comprovação das metas;**
- 7 - Acompanhamento da Execução dos Programas Elegíveis;**
- 8 - Sumário Execução dos Projetos de Assistência Técnica;**
- 9 - Sumário do Desempenho;**
- 10 - Acompanhamento por Setorial da Execução:**
 - Indicadores Primários e Secundários**
 - Assistência Técnica**

OPERAÇÃO Swap II

1 - APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

OPERAÇÃO Swap II

2 - INFORMAÇÕES SOBRE A AUDITORIA DO PROJETO

2 - Informações sobre Auditoria do Projeto

- ✓ As reuniões setoriais SESA, SEDUC, SECITECE, CIDADES e CAGECE com o TCE sobre os achados do Relatório de 2010 e apresentação do Plano de Ação aconteceram respectivamente nos dias 09, 11 e 13 de abril de 2012. A reunião com SEFAZ, SEPLAG, CGE e PGE aconteceu em 16/04/12. Ficou acordado que os Planos de Ação revisados seriam entregues em:
 - SEDUC: 30/04/12
 - SESA: 23/05/12
 - SECITECE: 30/04/12
 - CIDADES/CAGECE: 30/04/12
 - SEPLAG: 15/05/12
 - CGE: proposta por e-mail em 18/04/12 = 15/05/12
- ✓ Relatório da Auditoria 2011 sendo elaborado pelo TCE para entrega até 30/09/12.

OPERAÇÃO Swap II

3 - POSIÇÃO SOBRE STATUS SWAp III

3 - Posição sobre status do SWAp III

- ✓ Janeiro – Março: Preparação das Análises dos temas do SWAp III Social, Crescimento Econômico, Meio Ambiente e Gestão para apresentação nos Workshops;
- ✓ Abril (19-20/04/12): Missão de Avaliação Ambiental Estratégica com a Consultora Iara Verocai;
- ✓ Maio (21-25/05/12): Realização dos Workshops dos temas Social, Crescimento Econômico, Ambiental e Gestão Pública;
- ✓ Julho – Setembro: Discussão e Negociação da Proposta;
- ✓ Até final de 2012: Assinatura do Contrato.

OPERAÇÃO Swap II

4 - MISSÕES DO BANCO MUNDIAL

4 - Missões do Banco Mundial

- ✓ 20-21/03/12: Missão com a Especialista Anita Fiori sobre análise do Desenvolvimento Econômico;
- ✓ 26-27/03/12: Missão com o Especialista Roland Clarke sobre Análise da Evolução da Gestão Pública;
- ✓ 19-20/04/12: Missão de Avaliação ambiental Estratégica com a Consultora Iara Verocai;
- ✓ 21-25/05/12: Missão de Supervisão SWAp II e Workshops SWAp III

OPERAÇÃO Swap II

5 - RELATÓRIOS FINAIS

5 - Relatórios Finais: Lições e Desempenho

1. Relatório de Lições Aprendidas, Melhores Práticas e Impacto do SWAp II

- ✓ Solicita-se as setoriais que enviem até 15/05/12 sugestões das lições aprendidas, melhores práticas e impacto (já enviado);
- ✓ Envio do Relatório Lições Aprendidas e Melhores Práticas e Impacto ao Banco Mundial até 30/06/12;

2. Relatório de Desempenho do Projeto 2011

- ✓ Relatório de Desempenho do Projeto 2011 elaborado e aguardando as evidências de cumprimento das metas SEDUC até 30/04/12;
- ✓ Envio do Relatório ao Banco Mundial até 30/04/12.

OPERAÇÃO Swap II

6 - EVIDÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO DAS METAS

6 - Evidências de Comprovação das Metas Recebidas

➤ **PRIMÁRIOS: Recebidas comprovação de 18 dos 19 (95%)**

- SEFAZ: Indicadores 1, 2 e 14
- SEPLAG: Indicadores 3 e 4
- SEDUC: Indicadores 5, 6a, 6b, 6c
- SESA: Indicadores 7a, 7b, 8a, 8b, 9
- SRH: Indicador 10
- CAGECE: Indicadores 11a, 11b e 12
- ETICE: Indicador 13

SECUNDÁRIOS: Recebidas comprovação de 13 dos 14 (93%)

- SEFAZ: Indicador 1
- SEPLAG: Indicadores 2 e 3
- PGE: Indicador 4
- SEDUC: Indicador 5
- SESA: Indicadores 7, 8 e 9
- CAGECE: Indicador 10
- ARCE: Indicador 11
- ETICE: Indicador 12
- SECITECE: Indicador 13
- SEMACE: Indicador 14

OBS: Aguarda-se uma parte do indicador primário 5 (Relatório) e o secundário 6 da SEDUC

OPERAÇÃO Swap II

7 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ELEGÍVEIS

7 - Programas Elegíveis: Regra dos 70%

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2011 - **REGRA 70%**

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2011 Jan Dez (a)	Orçamento 2011 - Até 31/12 (b)	Realizado (até 31/03/12) (c)	Meta (até 31/03/12) (d)	Diferença (e) = (d) - (c)	Realizado/Previsto (%) (c)/(b)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	3.268.447	3.268.447	-	2.287.913	2.287.913	0,00%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	162.534.432	162.534.432	124.073.727	113.774.102	(10.299.625)	76,34%	76,34%
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	23.826.799	23.826.799	21.861.549	16.678.759	(5.182.789)	91,75%	91,75%
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	975.497.717	975.497.717	1.185.536.948	682.848.402	(502.688.546)	121,53%	121,53%
SECITECE	194 Formação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento	12.166.208	12.166.208	8.695.912	8.516.346	(179.566)	71,48%	71,48%
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.835.100	2.835.100	415.600	1.984.570	1.568.970	14,66%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	194.927.906	194.927.906	219.573.769	136.449.534	(83.124.235)	112,64%	112,64%
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	19.151.625	19.151.625	15.118.094	13.406.138	(1.711.957)	78,94%	78,94%
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.477.726	3.477.726	2.477.726	2.434.408	(43.318)	71,25%	71,25%
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	34.191.184	34.191.184	32.891.484	23.933.829	(8.957.655)	96,20%	96,20%
TOTAL		1.431.877.144,00	1.431.877.144	1.610.644.809,4	1.002.314.001			
Valor Limite do Desembolso [70% * TOTAL]		1.002.314.001	1.002.314.001					

Notas:

¹ O Programa 033 - Ceará Digital corresponde ao Programa 070 - Ciência, Tecnologia e Inovação em 2012.

² O Programa 048 - Qualidade da Educação Básica corresponde ao Programa 073 - Organização e Gestão da Educação Básica em 2012.

³ O Programa 196 - Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico corresponde ao Programa 070 - Ciência Tecnologia e Inovação em 2012.

Posição em: 31-mar-12


- ✓ Email enviado Tom Kenyon em 18/04/12 solicitando extensão de prazo para os programas 196 e 033;
- ✓ Valores ainda estão sendo revisados pela SEDUC e SESA para o elaboração do IFR na posição de 31/03.

OPERAÇÃO Swap II

8 - SUMÁRIO DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Cumprimento do Plano de Licitações

32 PROJETOS NO PLANO DE LICITAÇÃO

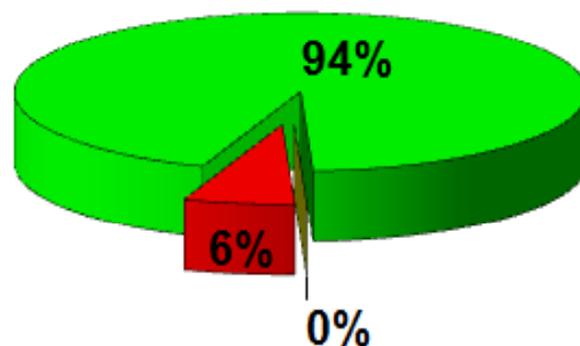

■ Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
■ Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia
■ Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses



Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações

30 PROJETOS:

ARCE (1), CGE (2,3), CIDADES(4), CONPAM (5,6), ETICE (7,8), IPECE (09,10,11,12,13), PGE(14,15), SEDUC (16,18,19,20), SEPLAG (22,23,24,25), SESA (26,27,28,29,30), TCE (31, 32).



Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia

-




Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses

2 PROJETOS:

SEDUC (17), SEFAZ (21).

Cumprimento do Plano de Licitações

16 PROJETOS EM EXECUÇÃO

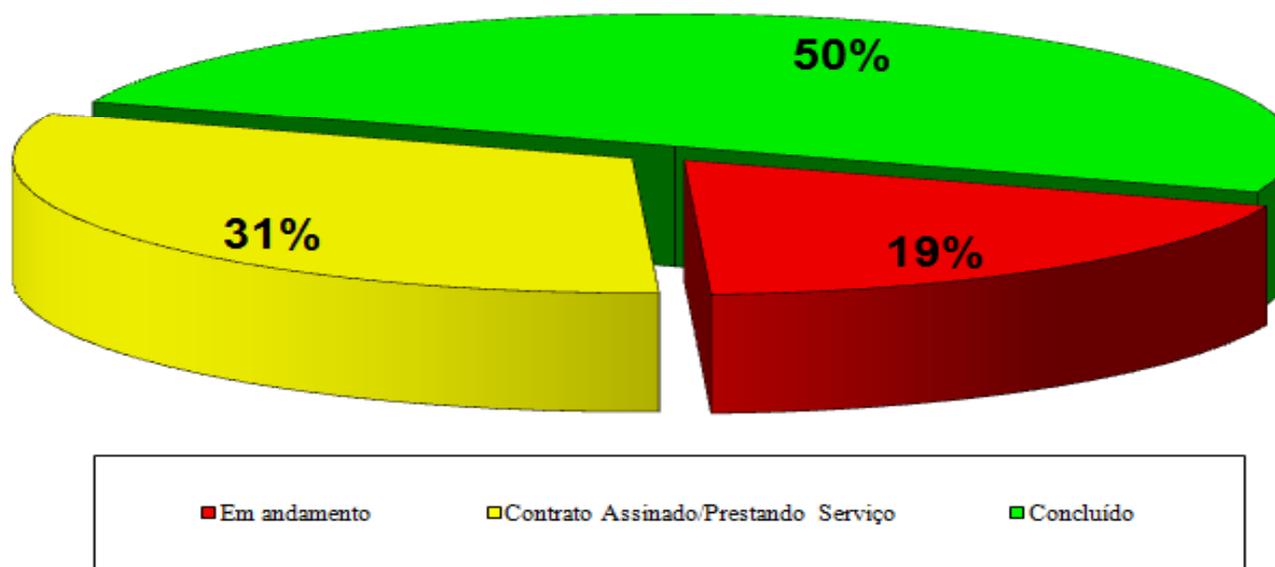

6 em andamento=

IPECE (12), PGE (15), SEDUC (20), SEFAZ (21), SEPLAG (23), TCE(31).


10 Contratos assinados =

CGE (2,3), CIDADES(4), CONPAM (6), ETICE (8), PGE (14), SEDUC (19), SEPLAG(22,24,25).

16 Concluídos = ARCE (1), COMPAM (5), ETICE (7), IPECE (09, 10, 11, 13), SEDUC (16,17, 18), SESA (26, 27, 28, 29, 30), TCE(32).

Cumprimento do Plano de Licitações

6 PROJETOS EM ANDAMENTO:

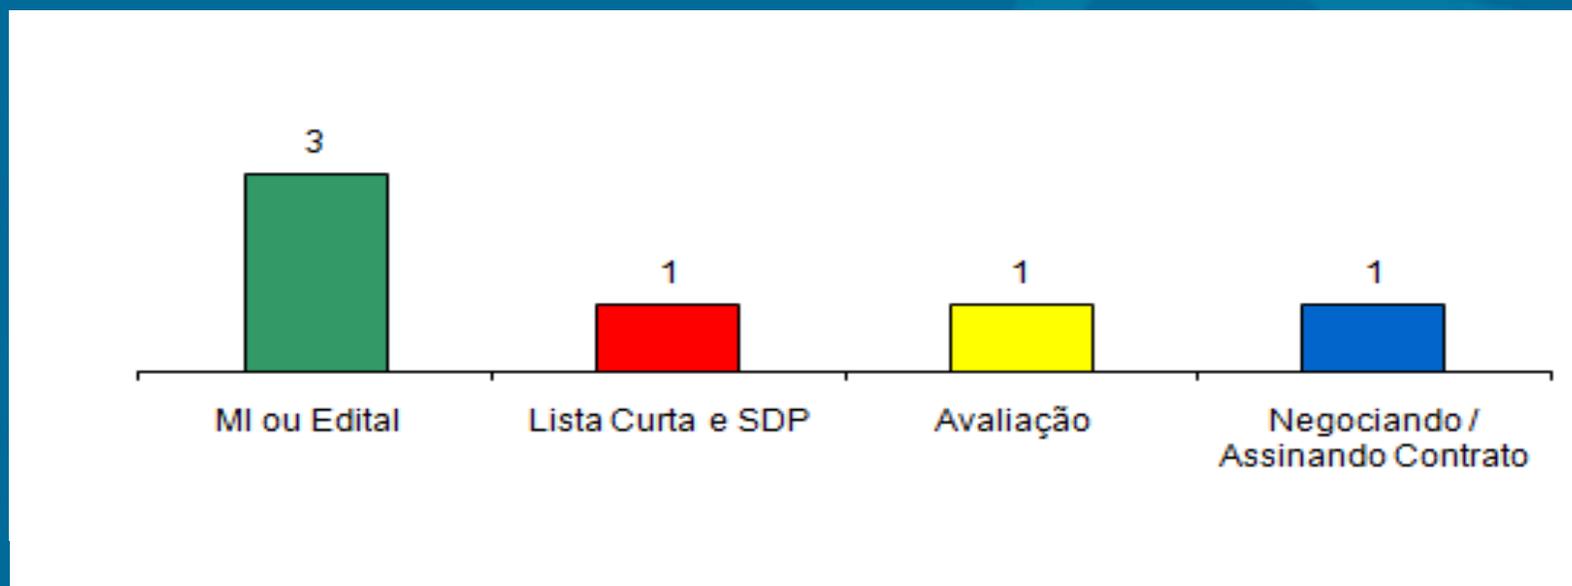

MI ou Edital = 3

Lista Curta e SDP = 1

Avaliação = 1

Negociação Contrato = 1

IPECE (12), PGE (15), TCE (31).

SEPLAG (23).

SEFAZ (21).

SEDUC (20).

OPERAÇÃO Swap II

9 - SUMÁRIO DO DESEMPENHO

9 - Sumário do Desempenho 2011: Indicadores Primários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011						
Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento	Entrega de Evidências
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).	1.293,0 milhões	1.882,2 milhões	cumprido	03/02/2012
		2. Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).	≤0,35	0,297695	cumprido	03/02/2012
	SEPLAG	3. Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG. ¹	15	15	cumprido	30/03/2012
		4. Número de "Relatórios Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG. ¹	7	7	cumprido	11/04/2012
Educação	SEDUC	5. Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas. ¹	≥90%	100%	cumprido	30/03/2012
		6.a Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: "Alfabetização na Idade Certa".	≥80%	100%	cumprido	16/03/2012
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização na Idade Certa" entregue às escolas.	≥80%	100%	cumprido	16/03/2012
		6.c Percentual de gerentes do programa "Alfabetização na Idade Certa" remunerados pelo Estado.	60%	100%	cumprido	16/03/2012
Saúde	SESA	7a. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	30%	76,40%	cumprido	15/02/2012
		7b. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	30%	30,70%	cumprido	14/03/2012
		8a. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.	12	13	cumprido	15/02/2012
		8b. Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.	1	-	Não será cumprido (1)	14/03/2012
		9. Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.	15	15	cumprido	15/12/2011
Água & Saneamento	SRH	10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥37%	39%	cumprido	10/02/2012
		11.a Número de ligações urbanas de água.	275.122	315.803	cumprido	07/02/2012
	CAGECE	11.b Número de ligações de esgotos.	124.775	139.845	cumprido	07/02/2012
		12. Percentual de perda de água.	≤27%	26,03% ⁵	cumprido	07/02/2012
Negócios & Inovação	SEFAZ ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	4.365.700	4.387.816	cumprido	09/02/2012
		14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥35%	80,00%	cumprido	06/03/2012

(1) Banco Mundial irá considerar um *Waiver* mas solicitou plano de ação à SESA para a realização da certificação.

9 - Sumário do Desempenho 2011: Indicadores Secundários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011						
Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento	Entrega de Evidências
Setor Público	SEFAZ	1. Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário.	≤ 10%	3,26%	cumprido	08/03/2012
	SEPLAG	2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.	2	2	cumprido	25/01/12 e 02/02/12
		3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	≤ 3 meses	1,24*	cumprido	01/02/2012
	PGE	4. Percentual processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato reduzidos	≤ 10,5%	8,60%	cumprido	14/02/2012
Educação	SEDUC	5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa" (uma em 2009 e uma em 2011).	1	1	cumprido	01/12/2011
		6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.º	80%	81,40%	cumprido	27/04/2012
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.468.331	7.028.280	cumprido	14/03/2012
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva à internação.	2	2	cumprido	01/02/2012
		9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	60%	70,13%	cumprido	15/02/2012
Água & Saneamento	ARCE CAGECE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	22,72%*	25,75%	cumprido	07/02/2012
		11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).	58%	20,34%	Não será cumprido	24/01/2012
Negócios & Inovação	ETICE SECITECE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).	3	3	cumprido	09/02/2012
		13. Número de serviços tecnológicos realizados.	47.181	43.655	Não será cumprido	10/02/2012
Meio Ambiente	CONPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	≥ 20%	20,80%	cumprido	12/03/2012

(*) O valor da média anual é foi de 1,99

OPERAÇÃO Swap II

10 – ACOMPANHAMENTO POR SETORIAL

OPERAÇÃO Swap II

SEFAZ

Projeto 21: Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.

- **Responsável:** Rejane Muniz
- **Categoria de Licitação:** BENS
- **Valor:** US\$ 300,00 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2011 - Abril 2012
- **Estágio Previsto:** Contrato assinado.
- **Estágio Atual:** Documentação da 11^a colocada em análise na SEFAZ.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

OPERAÇÃO Swap II

SEPLAG

Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Indicador 3: Número de Secretarias Setoriais com Relatórios Anuais de Desempenho Validados pela SEPLAG e pelo COGERF e Colocados na Página Eletrônica da SEPLAG.

- **Meta 2011: 15**
- **Posição em 31/12: 15**
- **Posição em 31/12 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento: cumprido.**
- **Comentário: Relatórios publicados no site em 30/03/2012.**

Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Indicador 4: Número de “Relatórios Produto-Resultado” (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- **Meta 2011:** 7
- **Posição em 31/12:** 7
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento:** Cumprido.
- **Comentário:** Relatórios publicados no site em 13/04/2012.

Projeto 23: Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras.

- **Responsável:** Soraya Quixadá
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 100 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2010 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Avaliando propostas.
- **Estágio Atual:** Avaliando propostas.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 


OPERAÇÃO Swap II

SEDUC

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

Indicador 5: Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com o relatório de melhores práticas.

- **Meta 2011:** $\geq 90\%$
- **Posição em 31/12:** 100%
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento:** Pelo Ofício Nº.1023/12 de 30/03/2012, a SEDUC compromete-se em enviar até o dia 30/04/2012 o Relatório referente à divulgação e às estratégias de disseminação de boas práticas junto aos municípios e escolas das Redes Municipal e Estadual de ensino em substituição ao Relatório de Melhores Práticas, que só será concluído em setembro de 2012 como também a possibilidade de envio do rascunho do Relatório de Boas Práticas, para submissão ao BM após 30/06/2012.

Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- **Meta 2011:** 80%
- **Posição em 31/12:** -
- **Posição em 31/12 em relação a meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento:** A perspectiva é de possibilidade média de cumprimento da meta até 30/04/12.
- **Comentário:** Pelo Ofício N°.1085/12 de 03/04/2012 a SEDUC compromete-se em enviar até 30/04/2012 os dados preliminares da evidência de cumprimento do indicador.

Projeto 17: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 2ª Etapa.

- **Responsável:** Eneida Machado
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 36,85 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2010 - Outubro 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Aguardando entrega do último produto. SEDUC e IPECE reuniram em 02/04/12 com Empresa IETS que prometeu Relatório revisado até 30/04/12.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** [REDACTED]

Projeto 20: Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (3ª etapa).

- **Responsável:** Eneida Machado e Kennedy
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 146,95 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2011 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Contrato sendo assinado até 19/04/12.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

ETICE

Projeto 8: Desenvolvimento de Sistema de Avaliação de Resultados do Cinturão Digital do Ceará.

- **Responsável:** Denise Olsen
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 51,72 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2011 – Setembro 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ████████████████████

OPERAÇÃO Swap II

PGE

Projeto 14: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Treinamentos e Seminários na área de Licitações

- **Responsável:** Tarso e Fernando Grangeiro
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 173,69
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2010 – Maio 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 15: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Compra de Equipamento.

- **Responsável:** Tarso e Fernando Grangeiro
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 26,31
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2012 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Publicando Edital.
- **Estágio Atual:** Elaborando edital.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

TCE

Projeto 31: Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de soluções integradas de Gerenciamento eletrônico de documento e informações do TCE (TCE 100% digital). (Parte A) – Digitalização.

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor:** US\$ 72,4 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2010 – Março 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando Serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando Serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

**Projeto 31: Fortalecimento Institucional do TCE -
Contratação de soluções integradas de Gerenciamento
eletrônico de documento e informações do TCE (TCE
100% digital). (Parte B) – Storage**

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor:** US\$ 196,8 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2012/Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Publicação Edital
- **Estágio Atual:** Edital publicado – Pregão 23/04/12
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 32: Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação. (Parte B) – Inscrição CISA.

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US 6,9 mil
- **Método de Aquisição:** Contratação Direta
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** novembro 2011- junho 2012
- **Estágio Previsto:** prestando serviço.
- **Estágio Atual:** prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OBRIGADA!

OPERAÇÃO
Swap II

The background of the slide is a solid blue color. On the right side, there is a faint, light blue graphic of a globe with latitude and longitude lines. On the left side, there are several vertical bars of varying heights and shades of blue, creating a stylized bar chart or data visualization effect.

OPERAÇÃO Swap II

**ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO
DAS SETORIAIS - COMPLETA**

OPERAÇÃO Swap II

SEFAZ

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ


Indicador 1: Saldo Fiscal Corrente do Estado (Receita Correntes menos Despesas Correntes).

- **Meta 2011:** R\$ 1.293,00 milhões
- **Posição em 31/12:** R\$ 1.882,18 milhões
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** As receitas e as despesas correntes se comportam conforme o esperado.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta superada.

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Saldo Fiscal Corrente do Estado

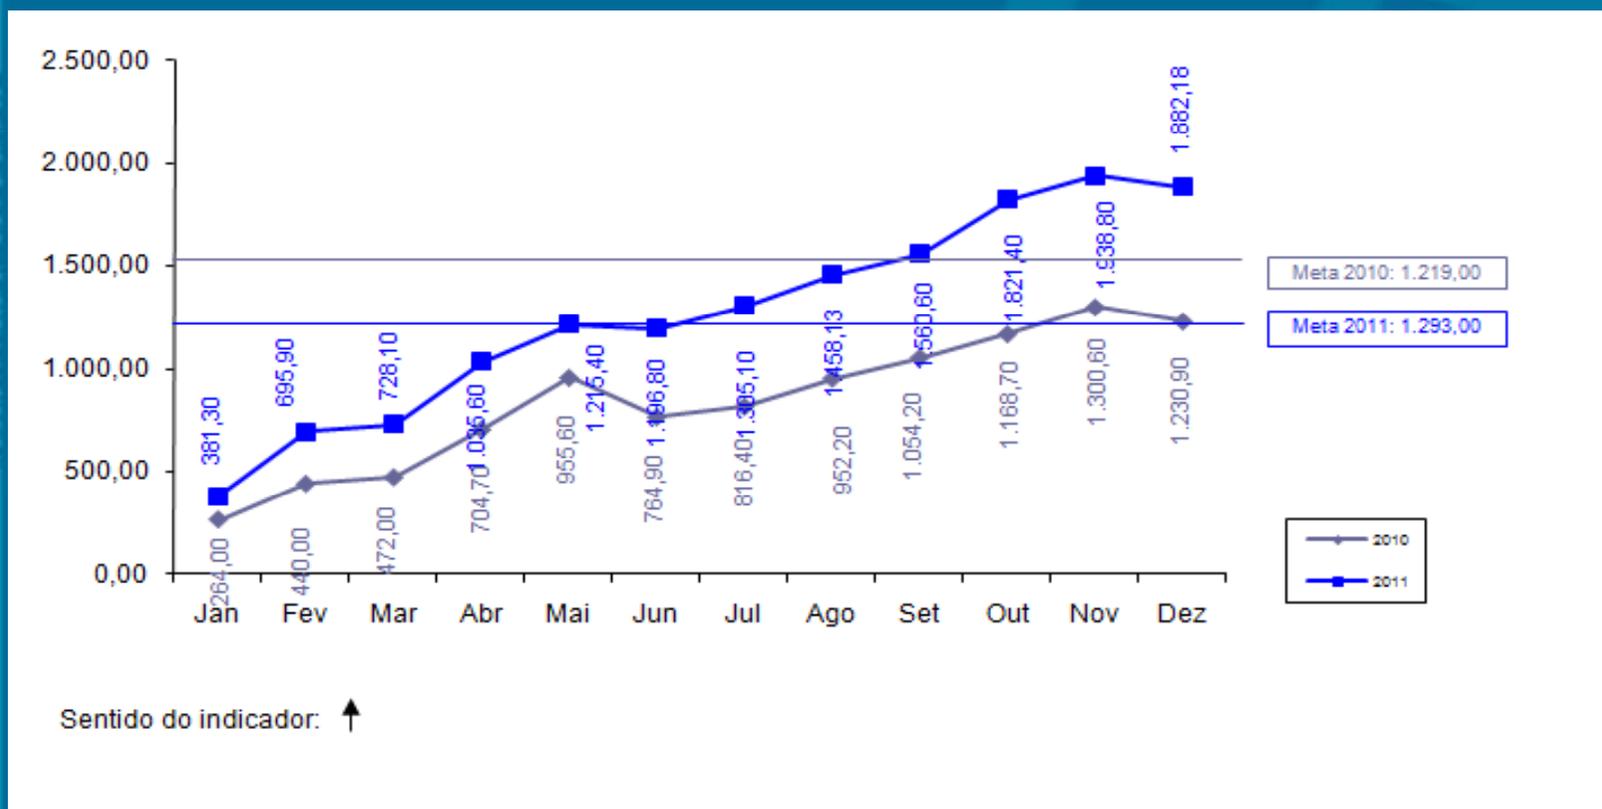

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Indicador 2: Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).

- **Meta 2011:** $\leq 0,35$
- **Posição em 31/12:** 0,297695
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Não há nenhuma indicação de que haja concentração de arrecadação de ICMS em algum dos setores estudados que possa aumentar o índice além da meta.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores



Negócios e Inovação

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Indicador 14: Percentual de registros empresariais no CGF concluídos em 72 horas.

- **Meta 2011:** $\geq 35,00\%$
- **Posição em 31/12:** 80%
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Com a vigência da Lei Complementar nº. 128/2010, as empresas do MEI são cadastradas automaticamente na SEFAZ/CE a partir do registro informado pela Receita Federal. Essas informações foram disponibilizadas por este órgão desde abril de 2010 e foram introduzidas no Estatístico do Cadastro da SEFAZ/CE nesta data.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Negócios e Inovação

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Percentual de registros empresariais no CGF concluídos em 72 horas



OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ


Indicador 1: Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário (% dos contribuintes ativos do regime de recolhimento normal que declararam saldo devedor na DÍEF que a SEFAZ inscreve na Dívida Ativa).

- **Meta 2011: $\leq 10,00\%$**
- **Posição em 31/12: 3,26% (valor referente ao período de março a julho 2011)**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Comentários: Acordado com o BM que o indicador seria medido três vezes em 2011, com informações quadrimestrais referente ao período de cinco meses. Informação fornecida após a missão (19/12/11).**

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário

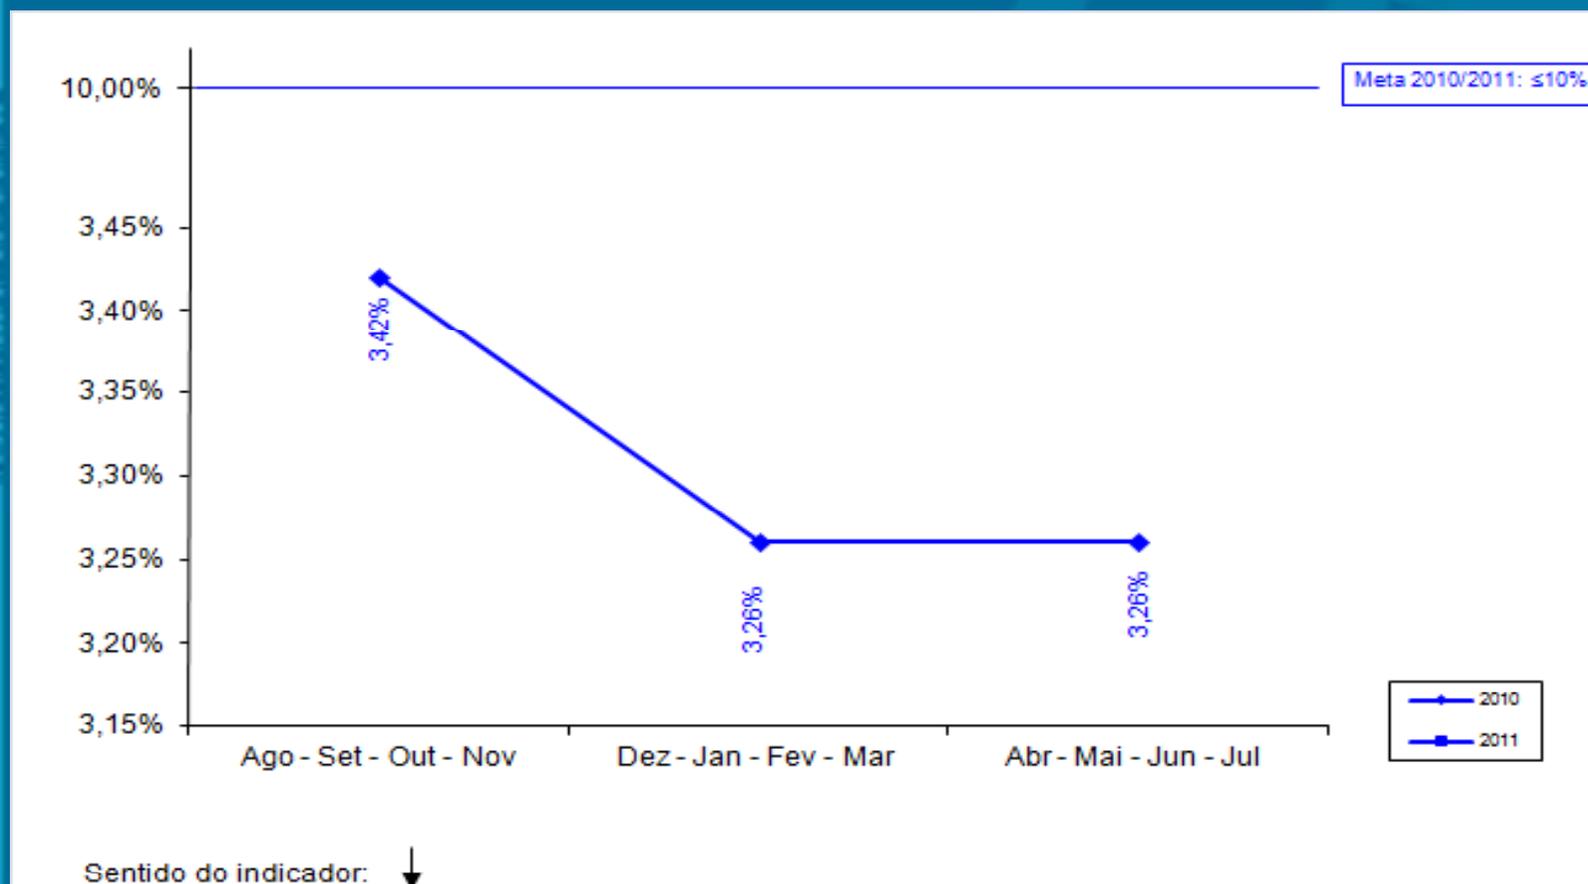

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Projeto 21: Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.

- **Responsável:** Rejane Muniz
- **Categoria de Licitação:** BENS
- **Valor:** US\$ 300,00 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2011 - Abril 2012
- **Estágio Previsto:** Contrato assinado.
- **Estágio Atual:** Fase de Habilitação, aguardando documentação da 11ª licitante.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████
-

OPERAÇÃO Swap II

SEPLAG

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Indicador 3: Número de Secretarias Setoriais com Relatórios Anuais de Desempenho Validados pela SEPLAG e pelo COGERF e Colocados na Página Eletrônica da SEPLAG.

- **Meta 2011: 15**
- **Posição em 31/12: 15**
- **Posição em 31/12 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento: cumprido.**
- **Comentário: Relatórios publicados no site em 30/03/2012.**

Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Indicador 4: Número de “Relatórios Produto-Resultado” (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- **Meta 2011: 7**
- **Posição em 31/12: 7**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de cumprimento: Cumprido.**
- **Comentário: Relatórios publicados no site em 13/04/2012.**

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

Indicador 2: Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembleia.

- **Meta 2011: 2**
- **Posição em 31/12: 2**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de cumprimento: Cumprido**
- **Informações disponíveis nos links:**
- [www.seplag.ce.gov.br/Planejamento/Lei Orçamentária Anual 2012](http://www.seplag.ce.gov.br/Planejamento/Lei%20Orçamentária%20Anual%202012)
- [www.seplag.ce.gov.br/Planejamento/Mensagem à AL/2012](http://www.seplag.ce.gov.br/Planejamento/Mensagem%20à%20AL/2012)

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

Indicador 3: Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.


- **Meta 2011: ≤ 3 meses**
- **Posição em 31/12: 1,24 meses***
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de cumprimento: Meta cumprida.**

***A média anual do indicador para 2011 foi de 1,99 meses.**

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades

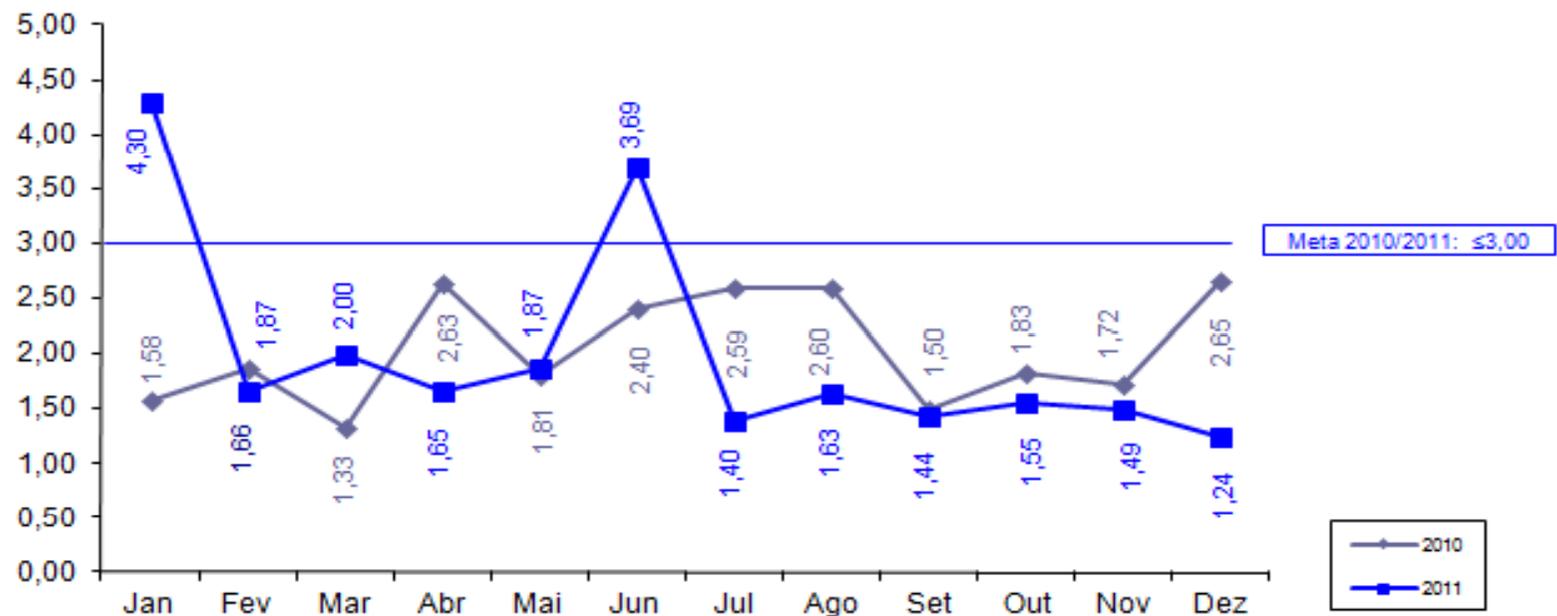

Sentido do indicador: ↓

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**


Projeto 22: Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Sérgio Lage e Fernanda Salles
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 106,50 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2009 – Abril 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 23: Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras.

- **Responsável:** Soraya Quixadá
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 100 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2010 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Avaliando propostas.
- **Estágio Atual:** Avaliando propostas.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 24: Realização de ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do Governo à sociedade em geral e às entidades representativas das empresas.

- **Responsável:** Soraya Quixadá
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 107,60 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2010 – Maio 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 25: Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Mário Fracalossi
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 102,36 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Outubro 2009 – Maio 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

SEDUC


OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

Indicador 5: Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com o relatório de melhores práticas.

- **Meta 2011:** $\geq 90\%$
- **Posição em 31/12:** 100%
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento:** Pelo Ofício N.º.1023/12 de 30/03/2012, a SEDUC compromete-se em enviar até o dia 30/04/2012 o Relatório referente à divulgação e às estratégias de disseminação de boas práticas junto aos municípios e escolas das Redes Municipal e Estadual de ensino em substituição ao Relatório de Melhores Práticas, que só será concluído em setembro de 2012 como também a possibilidade de envio do rascunho do Relatório de Boas Práticas, para submissão ao BM após 30/06/2012.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


Indicador 6a: Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças “Alfabetização na Idade Certa”.

- **Meta 2011:** 80%
- **Posição em 31/12:** 100%
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** meta cumprida

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças “Alfabetização na Idade Certa”

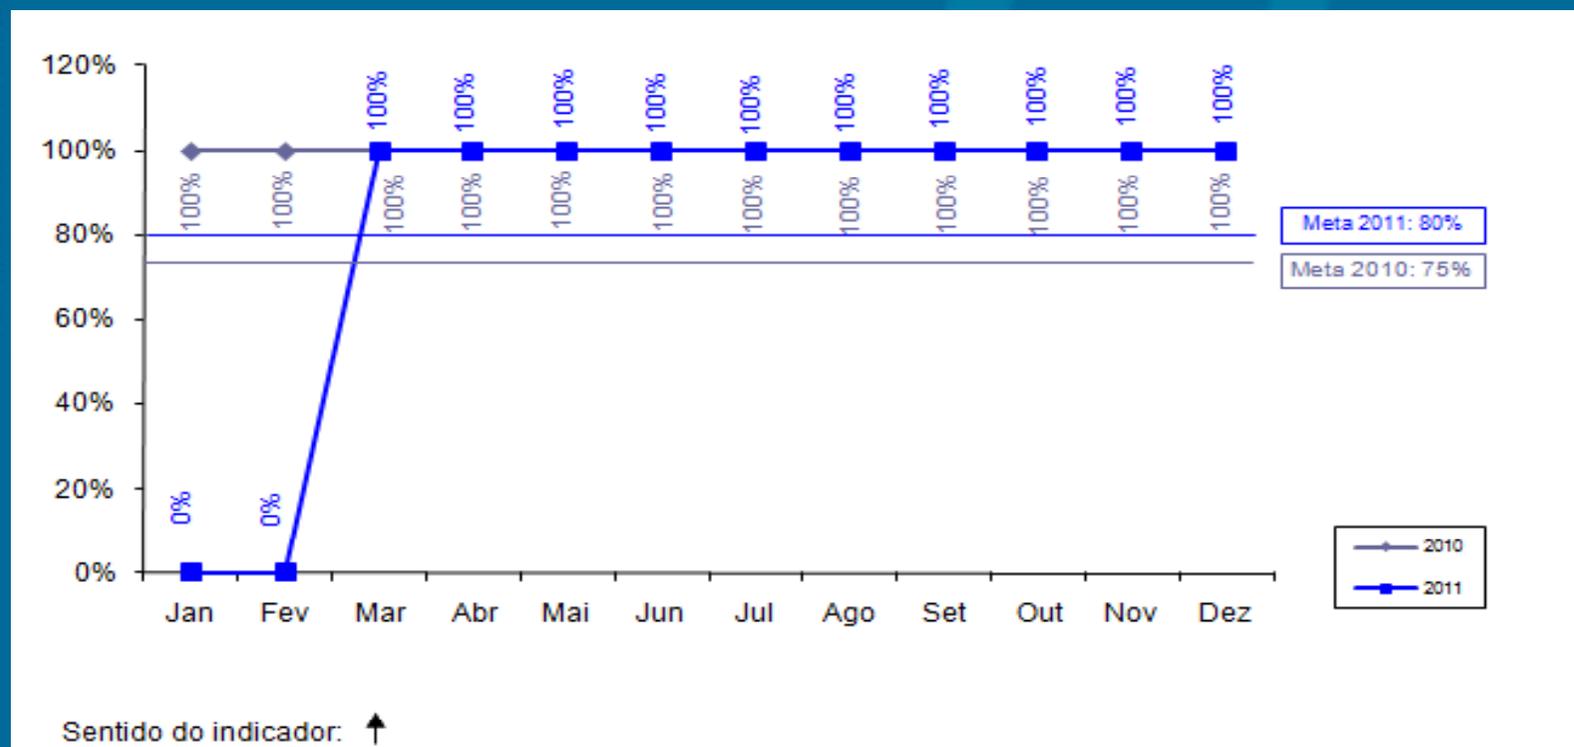

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


Indicador 6b: Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático p/ o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.

- **Meta 2011:** $\geq 80\%$
- **Posição em 31/12:** 100%
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** meta cumprida

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas

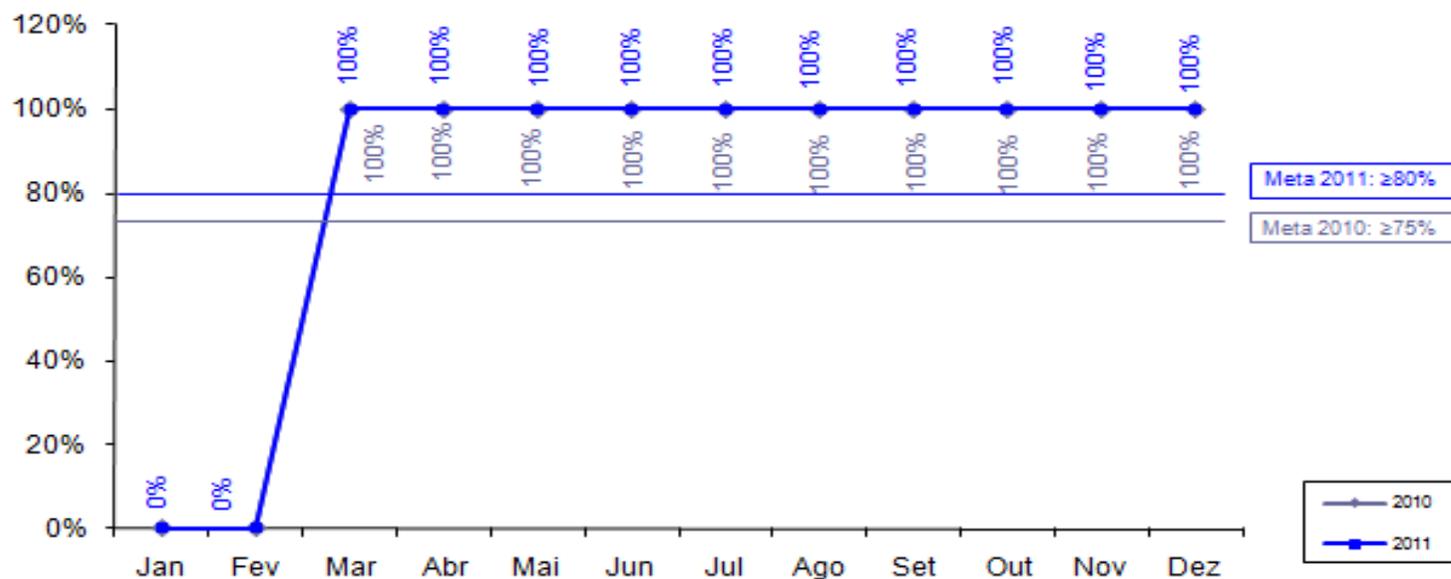

Sentido do indicador: ↑

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


Indicador 6c: Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.

- **Meta 2011: 60%**
- **Posição em 31/12: 100%**
- **Posição em 31/12 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida**

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado

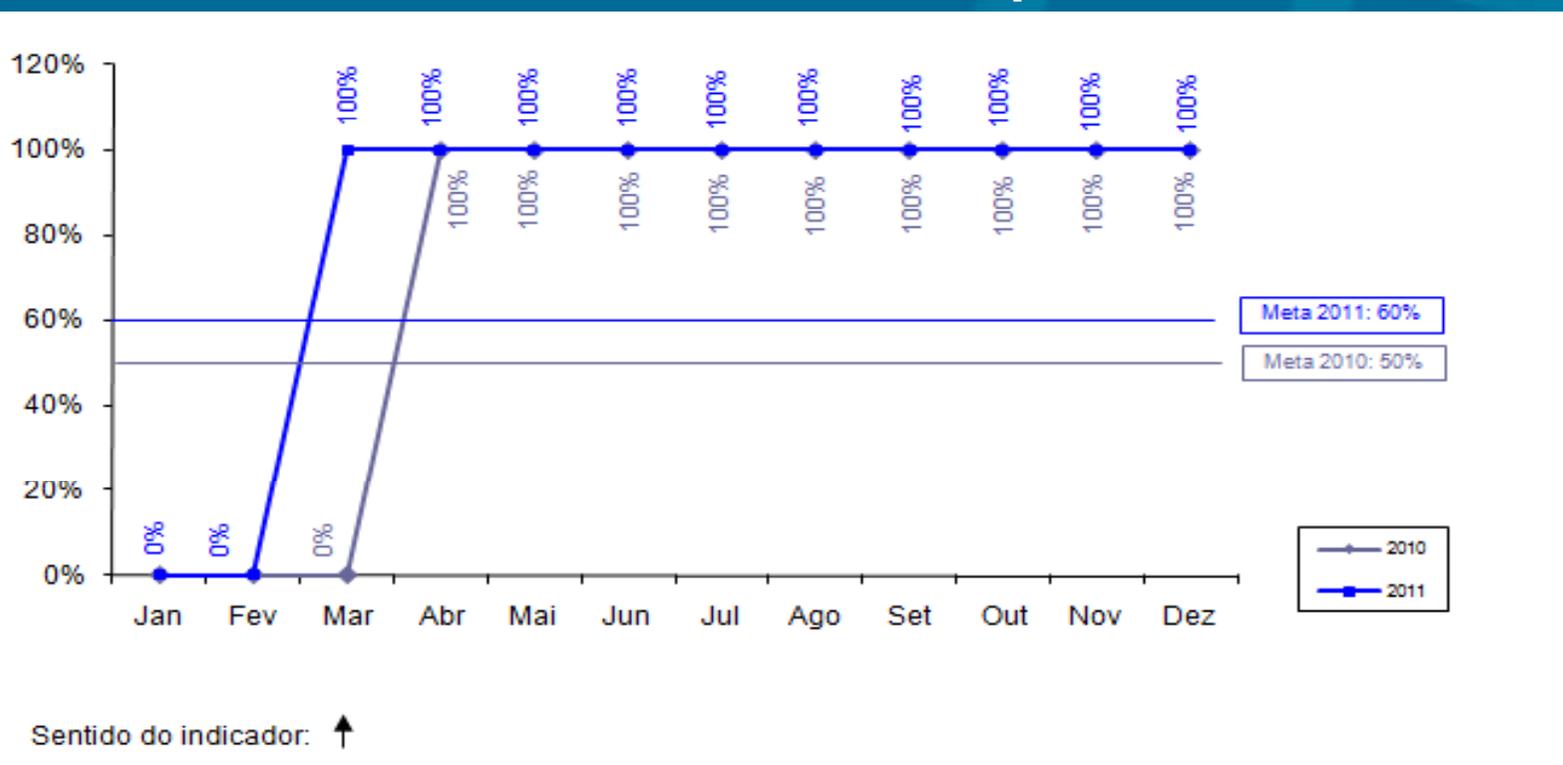


OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Educação

Secretaria de Educação - SEDUC

Indicador 5: Avaliação da implementação municipal do programa “Alfabetização da Idade Certa” (uma em 2009 e uma em 2011).

- **Meta 2011:** 1
- **Posição em 31/12:** 1
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida em 08/12/2011.**

Educação

Secretaria de Educação - SEDUC

Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- **Meta 2011:** 80%
- **Posição em 31/12:** -
- **Posição em 31/12 em relação a meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento:** A perspectiva é de possibilidade média de cumprimento da meta até 30/04/12.
- **Comentário:** Pelo Ofício N°.1085/12 de 03/04/2012 a SEDUC compromete-se em enviar até 30/04/2012 os dados preliminares da evidência de cumprimento do indicador.


OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Projeto 16: Avaliação do Programa E-Jovem.

- **Responsável:** Eneida Machado
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 72,90 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2009 - Setembro 2010
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 


Projeto 17: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 1ª Etapa.

- **Responsável:** Eneida Machado
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 35,36 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2009 – Setembro 2010
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 17: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 2ª Etapa.

- **Responsável:** Eneida Machado
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 36,85 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2010 - Outubro 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Aguardando entrega do último produto. SEDUC e IPECE reuniram em 02/04/12 com Empresa IETS que prometeu Relatório revisado até 30/04/12.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Projeto 18: Serviço de consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Eneida Machado e Kennedy
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 93,94 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2010 - Agosto 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 19: Serviço de consultoria para Fase 2 da Implantação de um Projeto Técnico-Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Eneida Machado e Kennedy
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 180,47mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2011 – Abril 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 20: Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (3ª etapa).

- **Responsável:** Eneida Machado e Kennedy
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 146,95 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2011 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Contrato sendo assinado até 19/04/12.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

SESA

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA


Indicador 7a: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.

- **Meta 2011: 30,0%**
- **Posição em 31/12: 76,40%**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida**
- **Comentários: Relatório encaminhado em 12.03.2012.**

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ

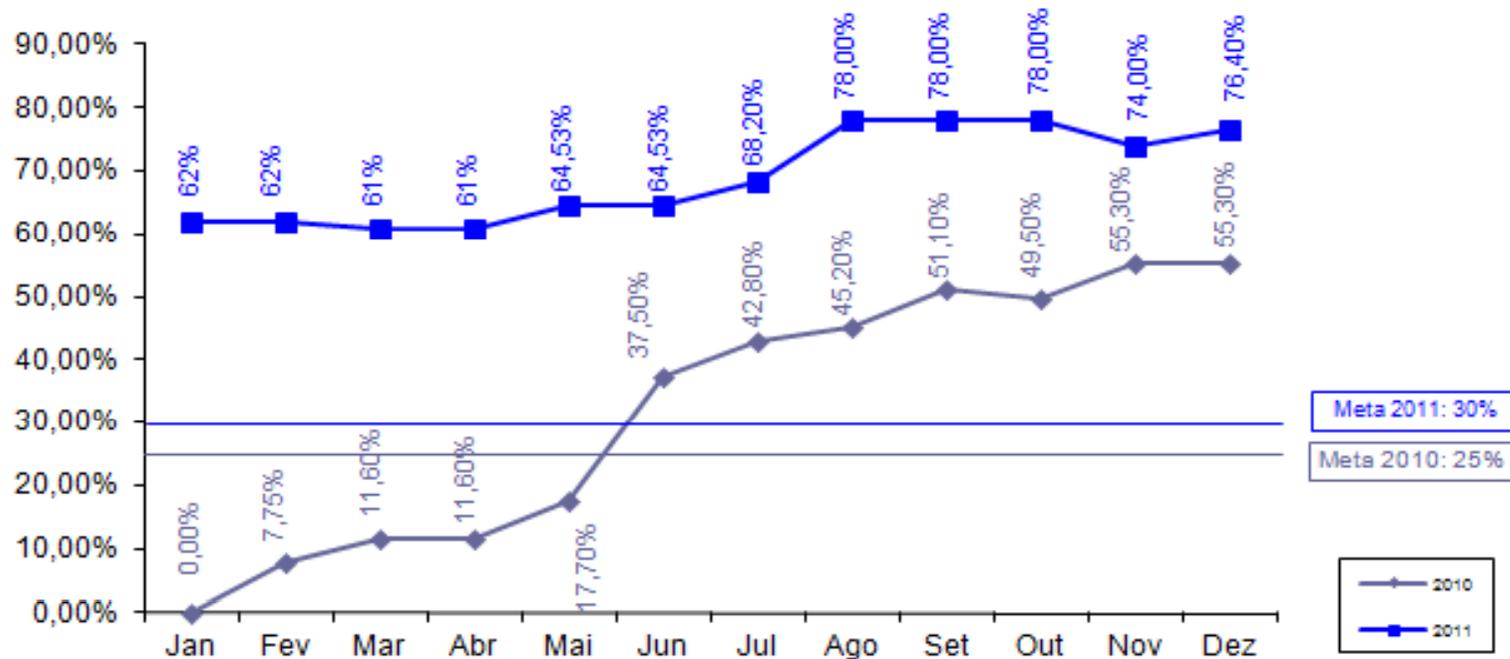

Sentido do indicador: ↑

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Indicador 7b: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.

- **Meta 2011: 30%**
- **Posição em 31/12: 30,7%**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: cumprido**
- **Comentários: O relatório enviado em 14.03.2012.**

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA


Indicador 8a: Número de hospitais públicos e particulares no Estado (Hospital Polo) licenciados de acordo com a Lei nº.6.437/1977.

- **Meta 2011: 12**
- **Posição em 31/12: 13**
- **Posição em 31/12 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida**

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei nº. 6.437/1977

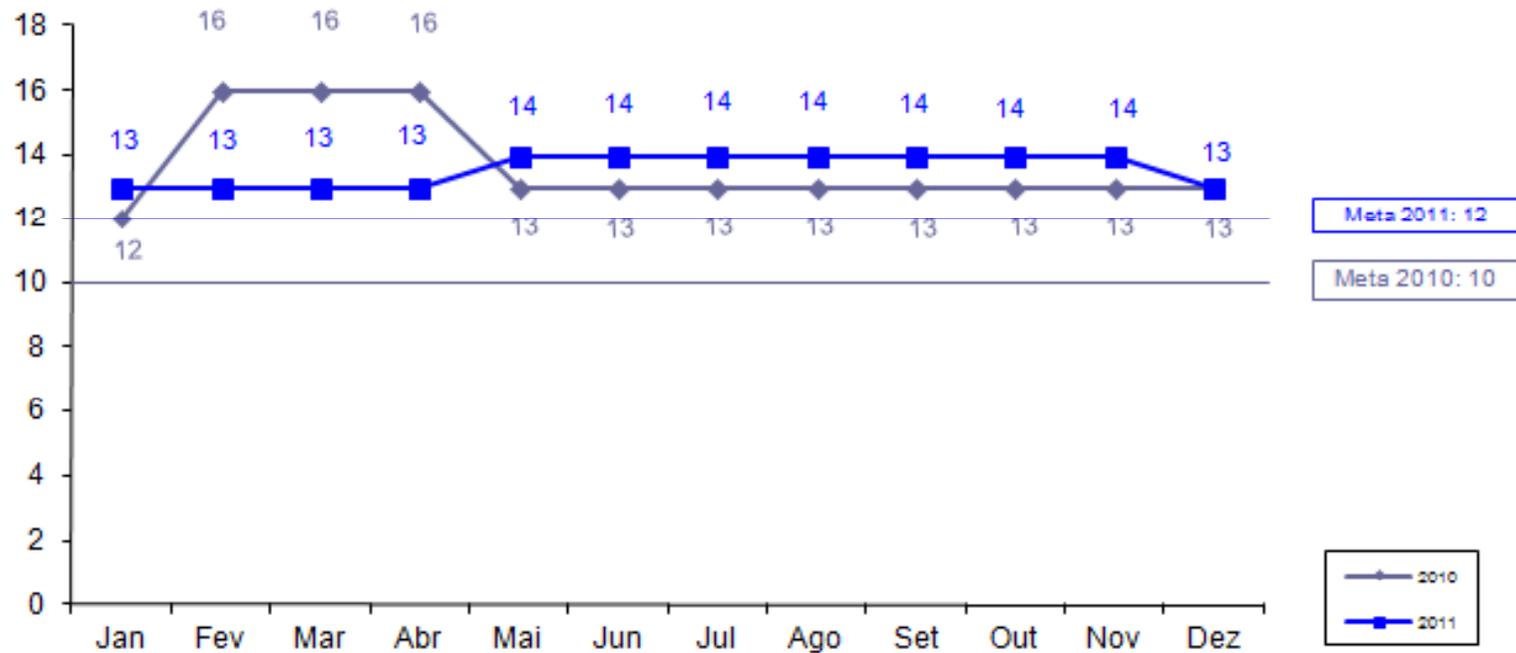

Sentido do indicador: ↑

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Indicador 8b: Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.

- **Meta 2011:** 1
- **Posição em 31/12:** -
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** [REDACTED]
- **Perspectiva de Cumprimento:** meta não será cumprida.
- **Comentários:** Encaminhada nota técnica solicitando considerar indicador como cumprido.

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA


Indicador 9: Número de hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.

- **Meta 2011: 15**
- **Posição em 31/12: 15**
- **Posição em 31/12 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.**

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Nº. de hospitais públicos e particulares no Estado com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos à SESA

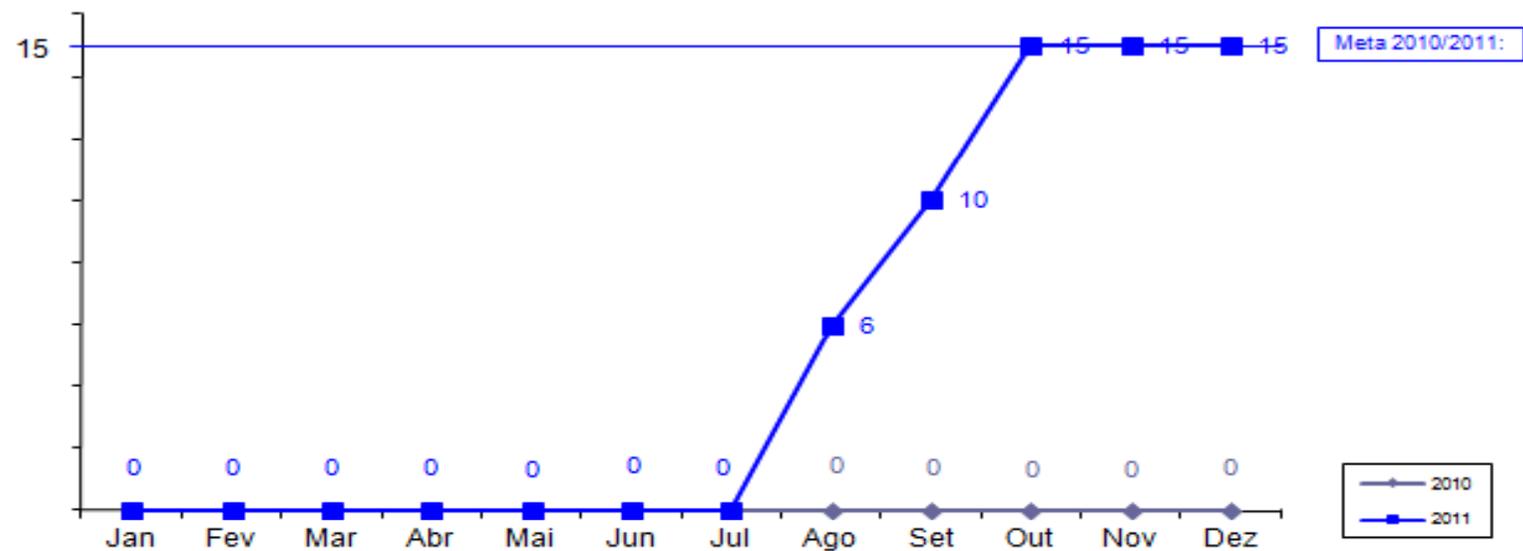

Sentido do indicador: ↑

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA


Indicador 7: População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.

- **Meta 2011:** 6.468.331
- **Posição em 31/12:** 7.028.280
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida. Dados de dezembro de 2011, enviados em 14.03.2012.

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família

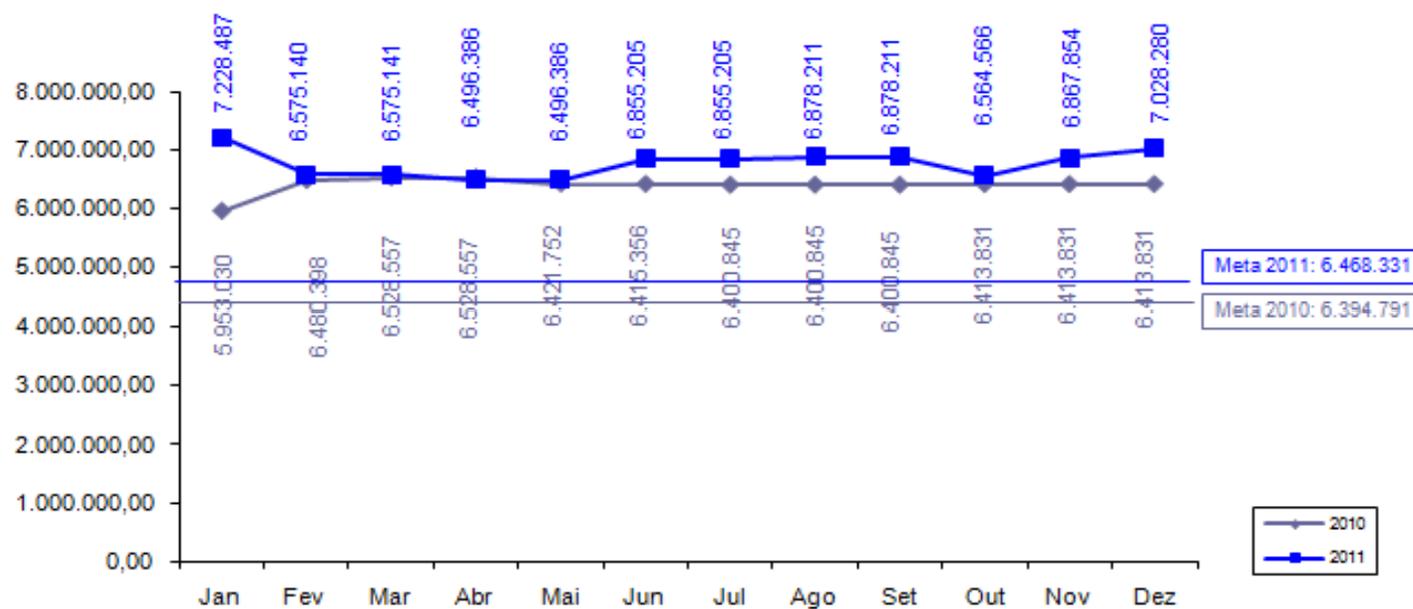

Sentido do indicador: ↑

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Indicador 8: Relatórios semestrais do “Grupo da Água” para combater a diarreia infantil que leva à internação.

- **Meta 2011: 2**
- **Posição em 31/12: 2**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta será cumprida.**


Indicador 9: Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.

- **Meta 2011: 60 %**
- **Posição em 31/12: 70,13% (*)**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.**
- **Comentários: Dados obtidos junto ao Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN. Valor alterado conforme a evidência enviada 15/02/12.**

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês

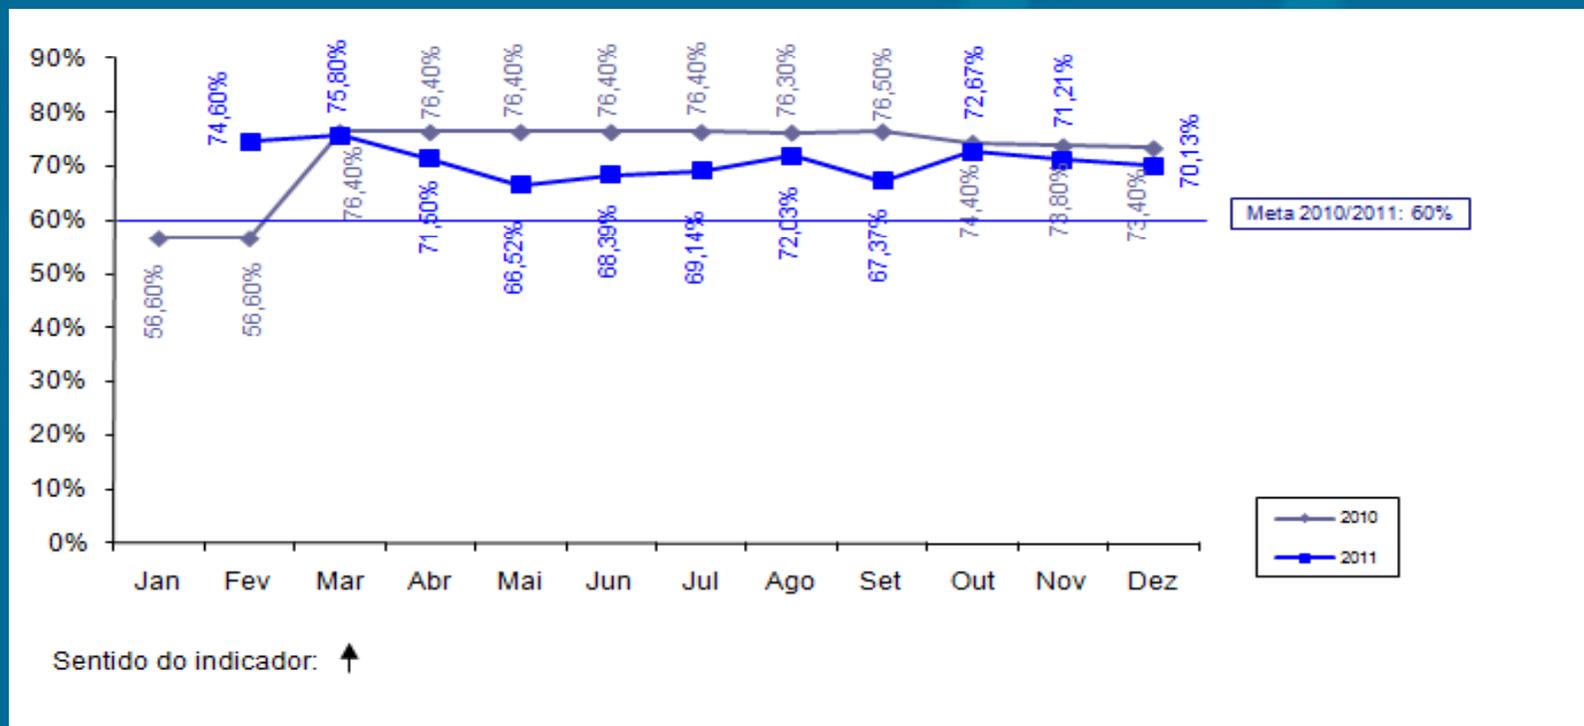

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Projeto 26: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Estratégia de capacitação e disseminação do uso do software.

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 93,76 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2010 – Dezembro 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 27: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Validação da Metodologia.

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 28,89 mil
- **Método de Aquisição:** Diretrizes Consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2009 – Agosto 2010
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**


Projeto 28: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Definições e ajustes no modelo de absorção.

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 56,05 mil
- **Método de Aquisição:** Diretrizes Consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2010 – Outubro 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 29: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Compra de equipamentos de informática para habilitar as CRES.

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 141,80 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2010 – Março 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 30 (Parte A): Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação.

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 234,16 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão (Ata de Registro de Preço)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2010 – Março 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 30 (Parte B): Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação (Servidores e switches).

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 148,03 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2011 – Janeiro 2012
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído aguardando pagamento (restos a pagar).
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Projeto 30 (Parte C): Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais - pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação (No-break e Rádio).

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 28,86 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão (Ata de Registro de Preço)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2010 – Março 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Relatório Quadrimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II, enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º trimestre de 2011).

OPERAÇÃO Swap II

COGERH

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR PRIMÁRIO

Água e Saneamento

Secretaria de Recursos Hídricos - SRH


Indicador 10: Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de Aquicultura.

- **Meta 2011:** $\geq 37\%$
- **Posição em 31/12:** 39%
- **Posição em 31/12 em relação à meta:**
- **Justificativa:** O indicador na posição de dezembro/2011 atingiu e até sobrepujou a meta estabelecida em dois pontos percentuais pois, no período do último trimestre do ano, o consumo de água aumentou consideravelmente por parte dos usuários em geral, mormente quanto a categoria dos irrigantes, devida a falta de chuvas, que teve substancial influência para o cumprimento da meta.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta foi cumprida.

Água e Saneamento

Secretaria de Recursos Hídricos - SRH

Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura

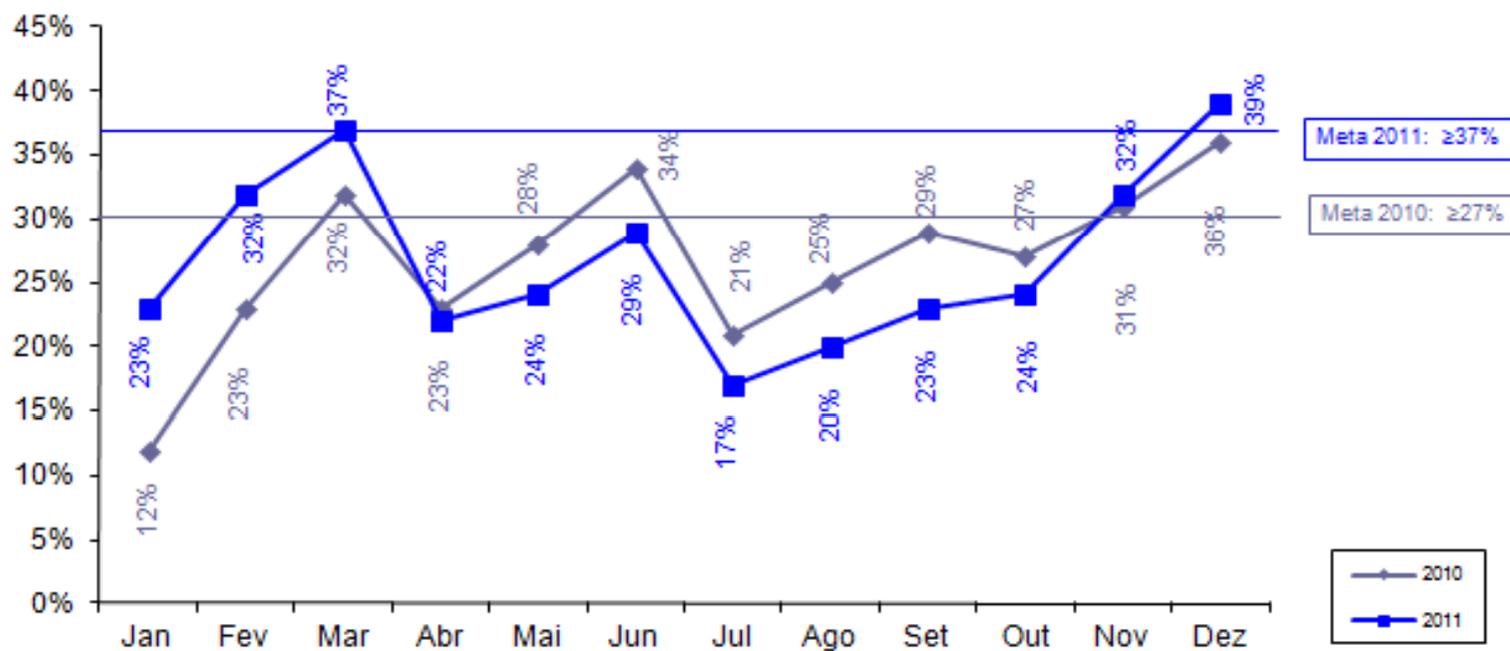

Sentido do indicador: ↑

OPERAÇÃO Swap II

CAGECE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Indicador 11a: Número de ligações urbanas de água.


- **Meta 2011:** 275.122
- **Posição em 31/12:** 315.803 (*)
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2006 a dezembro de 2011 foram executadas 315.803 ligações domiciliares de água.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta superada.

(*) Valor modificado pela evidência encaminhada no dia 07/02/2012.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Número de ligações urbanas de água

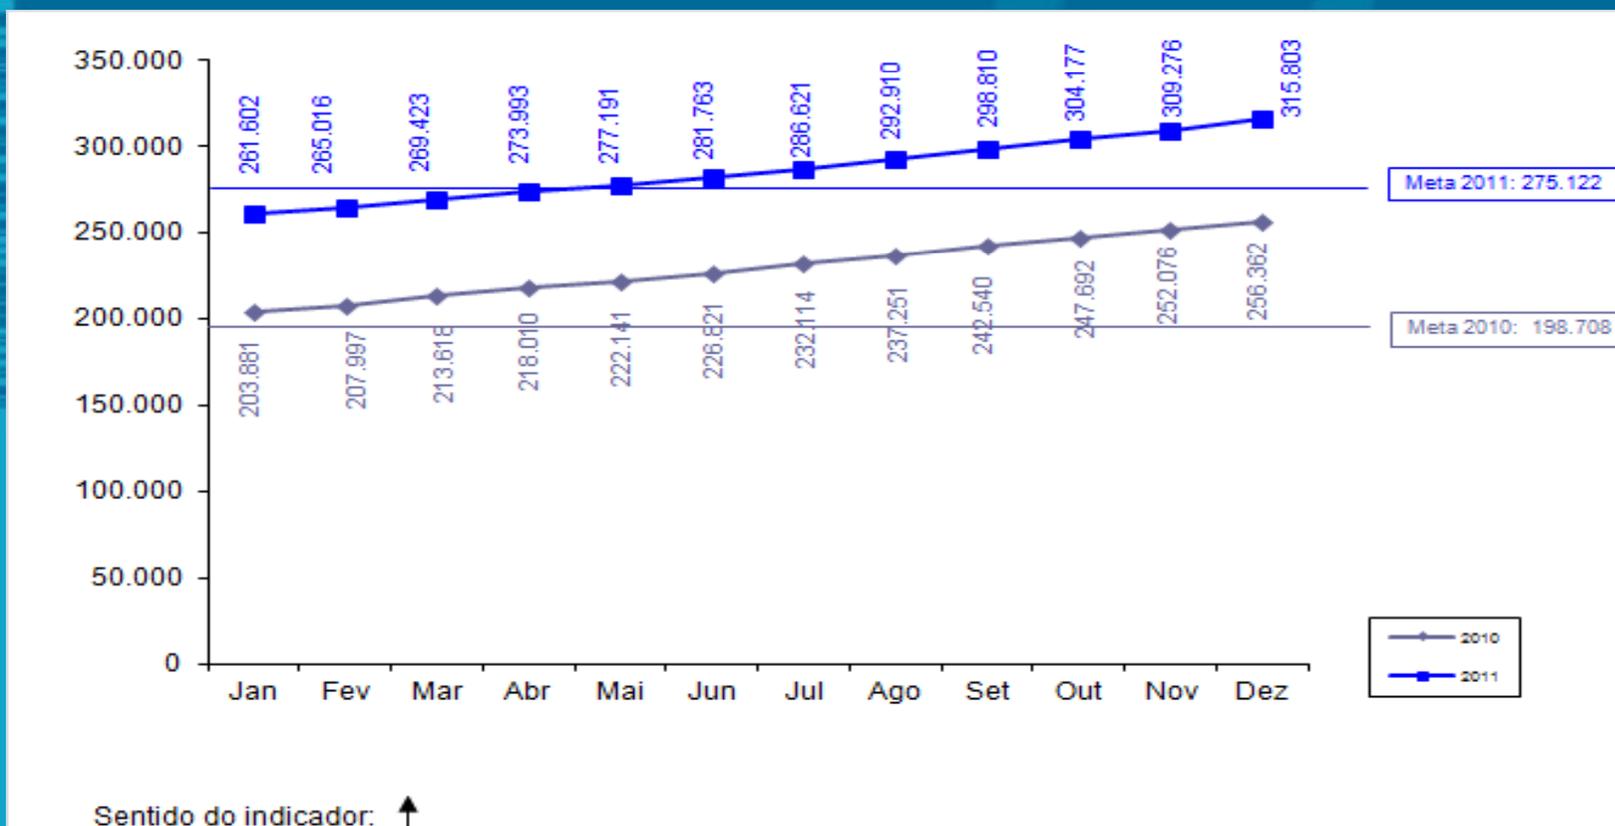

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE


Indicador 11b: Número de ligações de esgotos.

- **Meta 2011:** 124.775
- **Posição em 31/12:** 139.845
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2006 a dezembro de 2011 foram executadas 139.845 ligações domiciliares de esgoto.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta superada.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE


Número de ligações de esgoto

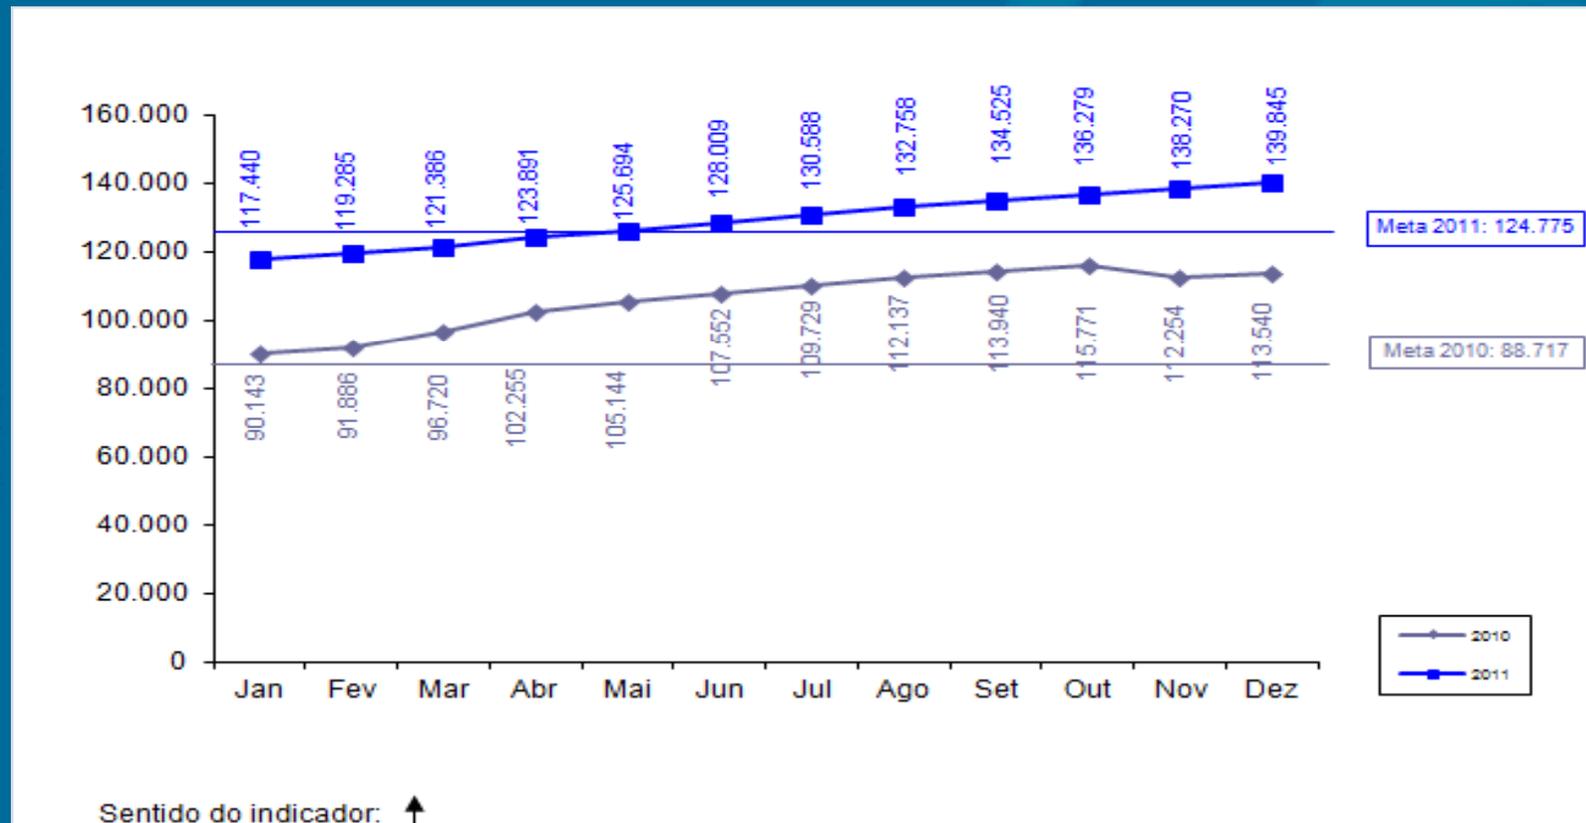

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Indicador 12: Percentual de Perda de Água.


- **Meta 2011:** $\leq 27\%$ (*)
- **Posição em 31/12:** 26,08%
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a novembro de 2011, o percentual de perda de água foi de 26,08%.

(*) Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 28,20% para 27%.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Percentual de Perda de Água

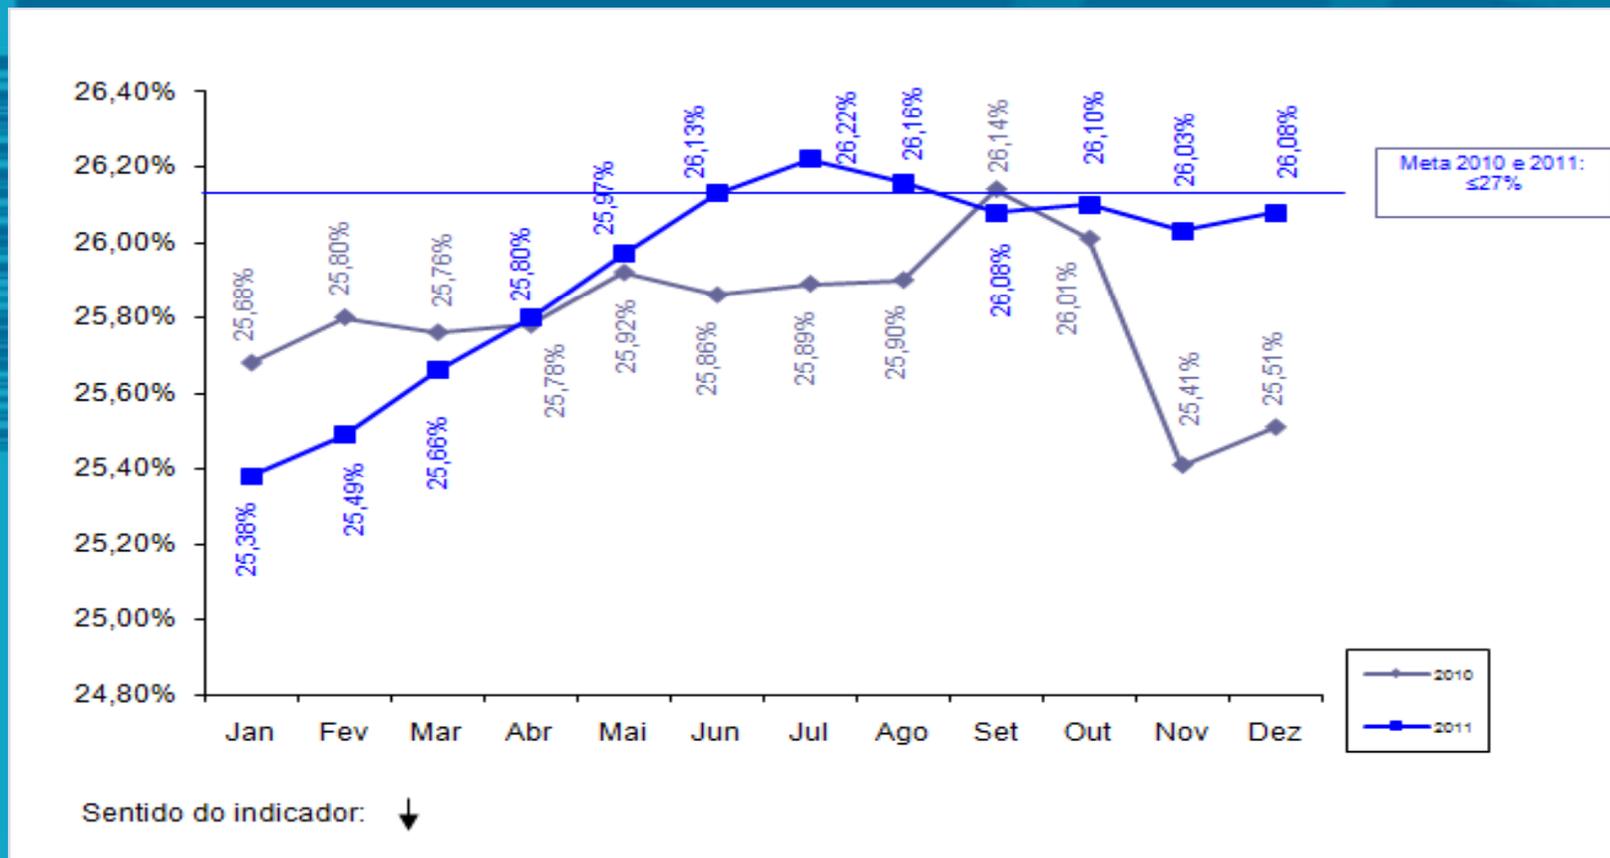

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE


Indicador 10: Margem EBITDA da CAGECE.

- **Meta 2011: 22,72%**
- **Posição em 31/12: 25,75%**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida**
- **Comentário: Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 29,50% para 22,72%. Valor provisório, pois o encerramento de 2011 ocorrerá após as análises da Auditoria Externa, cujo prazo para publicação das Demonstrações financeiras de 2011 é 31/03/2012**

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

Margem EBITDA da CAGECE

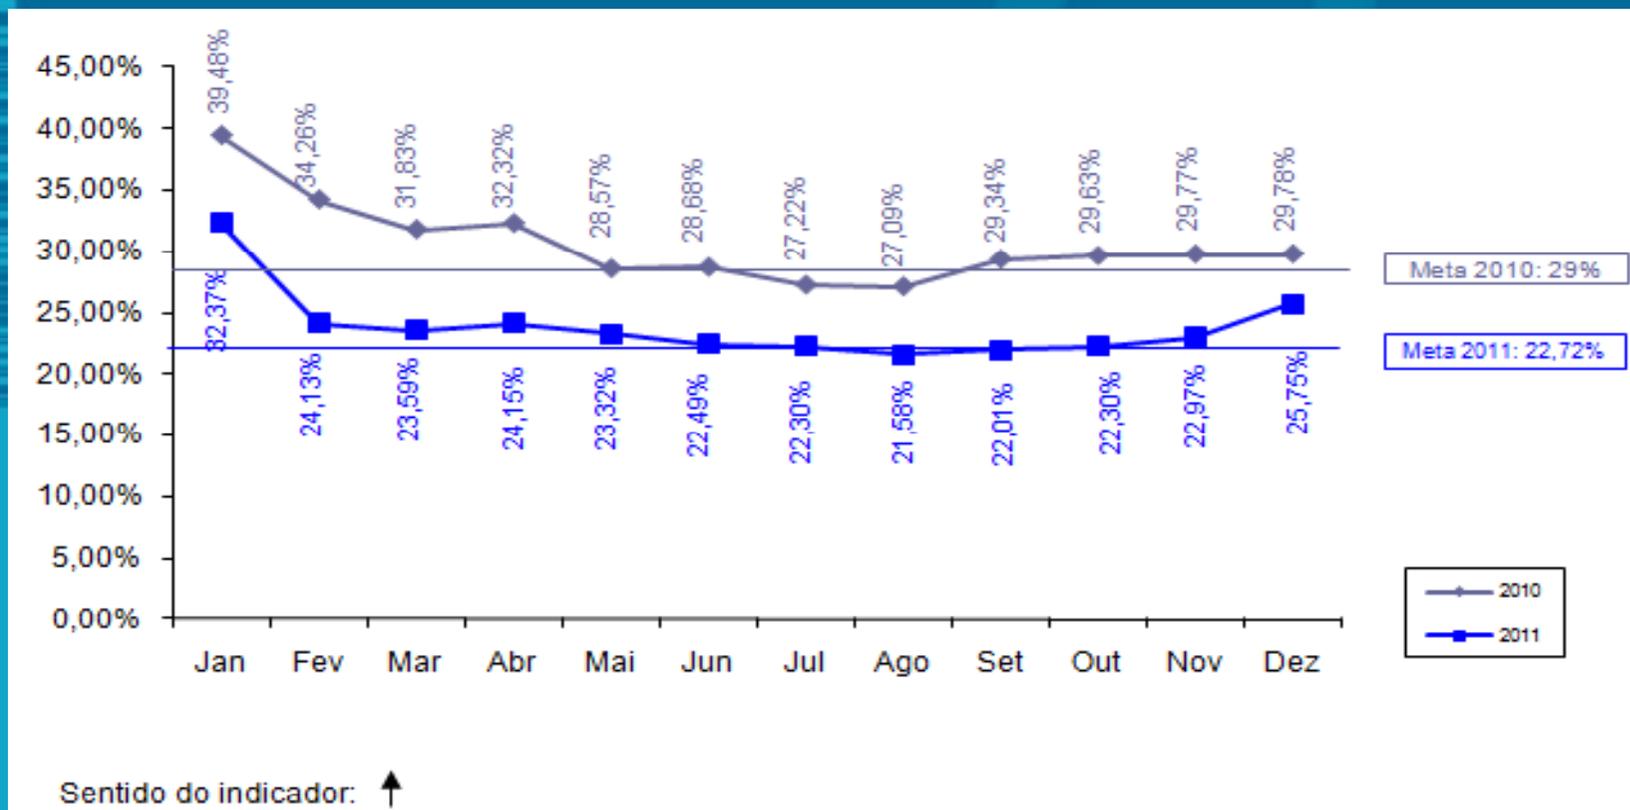

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

Relatório Quadrimestral de Acompanhamento da Salvaguarda de Reassentamento e Desapropriação enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º Trimestre de 2011).

OPERAÇÃO Swap II

CIDADES

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 4: Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade.

- **Responsável:** Tércia Pinheiro
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 106,43 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2011 – Fevereiro 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Relatório Quadrimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II, enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º trimestre de 2011).

OPERAÇÃO Swap II

ETICE


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR PRIMÁRIO

Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE


Indicador 13: Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.

- **Meta 2011: 4.365.700**
- **Posição em 31/12: 4.387.816**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Justificativa: A partir do Cinturão Digital, o Governo do Estado do Ceará estenderá, por meios de ramificações de fibras óticas com uso da tecnologia Wimax, via rádio, a rede de banda larga aos municípios.**
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.**

Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE

Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga

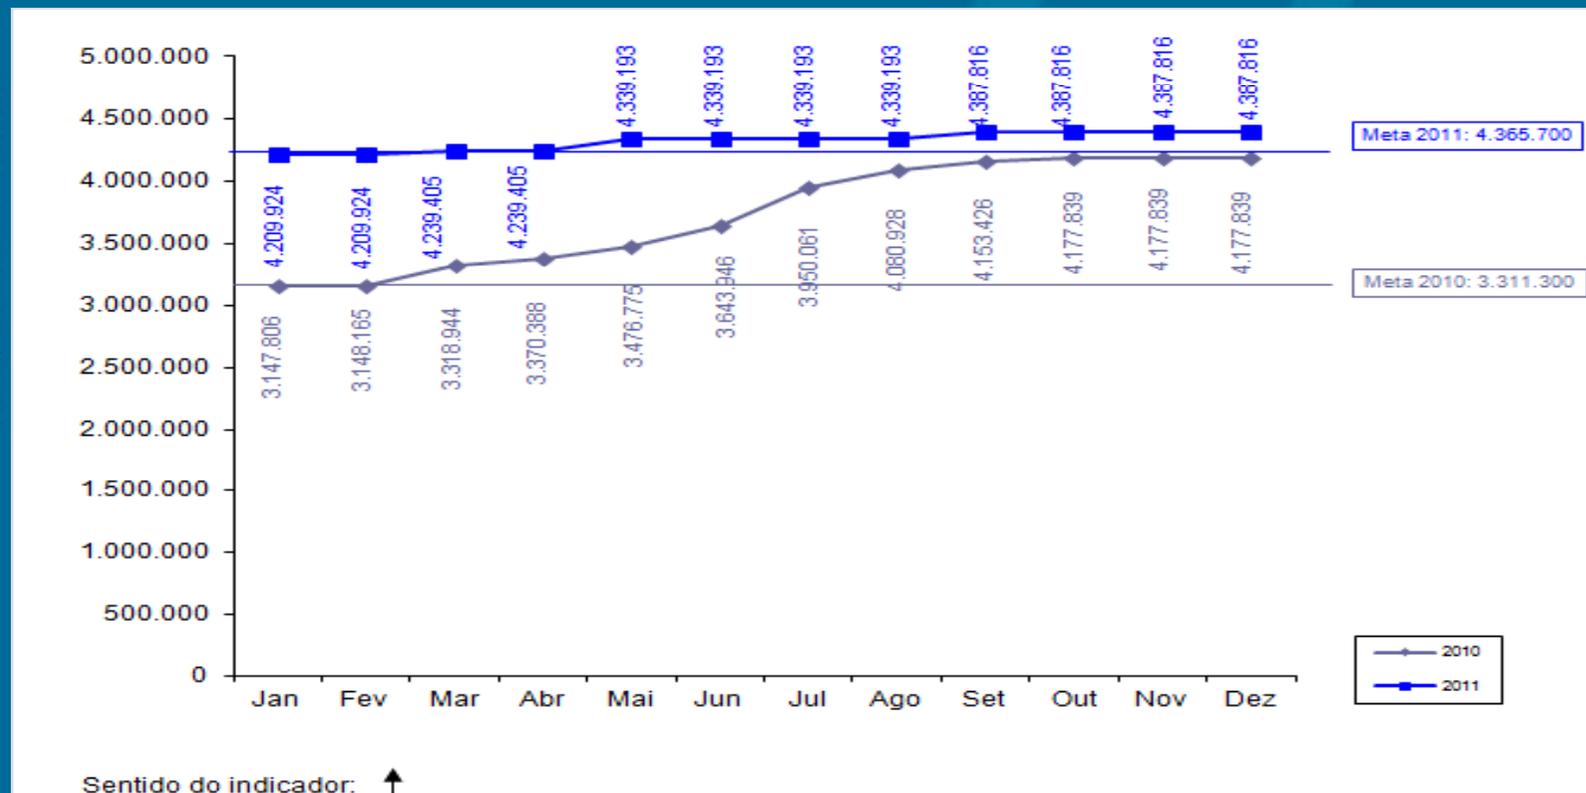

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Negócios & Inovação

Empresa de Tecnologia do Ceará - ETICE

Indicador 12: Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).

- **Meta 2011:** 3
- **Posição em 31/12:** 3
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Os sistemas Ciclo Orçamentário, Middleware de Integração e Patrimônio, componentes do S2GPR, encontram-se implementados.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta foi cumprida.

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Negócios & Inovação

Empresa de Tecnologia do Ceará - ETICE

Projeto 7: Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de internet.

- **Responsável:** Denise Olsen
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor:** US\$ 32,72 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2009 – Setembro 2009
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Negócios & Inovação

Empresa de Tecnologia do Ceará - ETICE

Projeto 8: Desenvolvimento de Sistema de Avaliação de Resultados do Cinturão Digital do Ceará.

- **Responsável:** Denise Olsen
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 51,72 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2011 – Setembro 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

PGE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Gestão do Setor Público

Procuradoria Geral do Estado - PGE


Indicador 4: Redução de processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato.

- **Meta 2011:** $\leq 10,5\%$
- **Posição em 31/12:** 9,76%*
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta com perspectiva de cumprimento.
- **Comentário:** o percentual médio da meta no período de janeiro a dezembro de 2011 foi de 8,60%.

Gestão do Setor Público

Procuradoria Geral do Estado - PGE

Redução de processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato

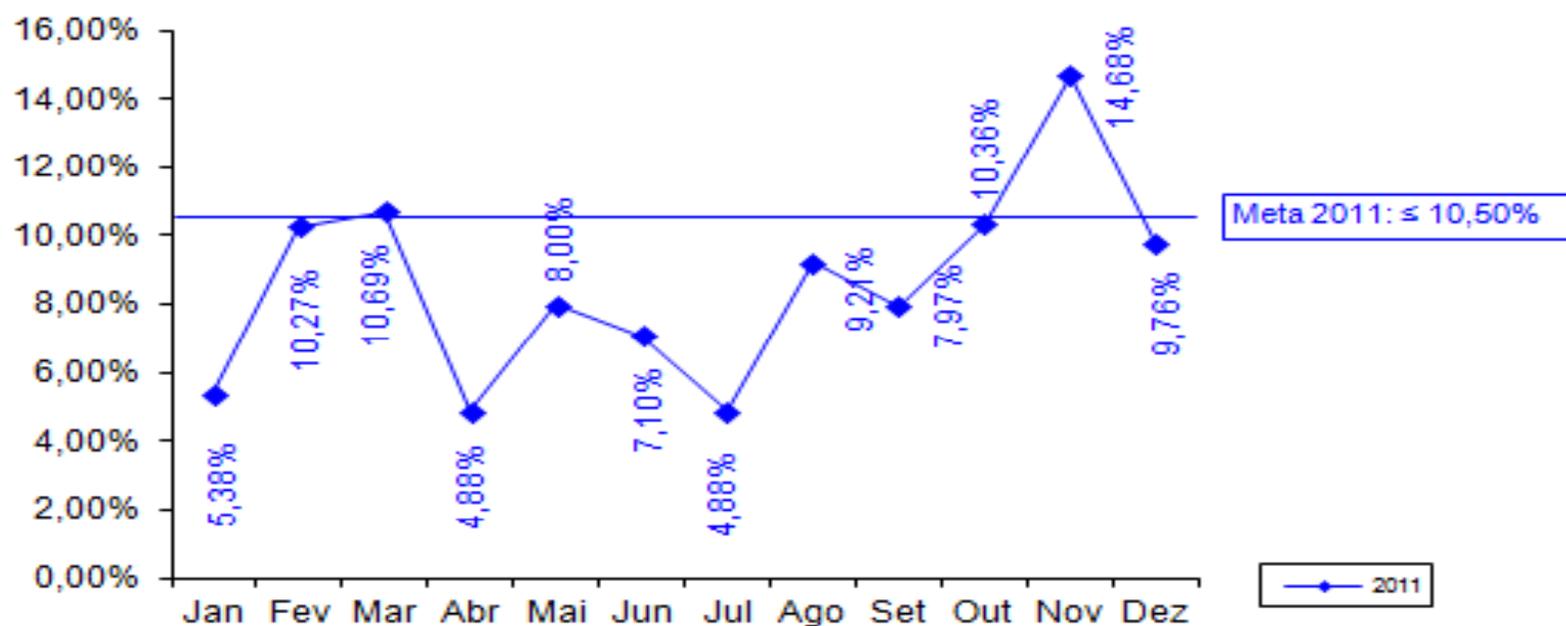

Sentido do indicador: ↓

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 14: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Treinamentos e Seminários na área de Licitações

- **Responsável:** Tarso e Fernando Grangeiro
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 173,69
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2010 – Maio 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Projeto 15: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Compra de Equipamento.

- **Responsável:** Tarso e Fernando Grangeiro
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 26,31
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2012 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Publicando Edital.
- **Estágio Atual:** Elaborando edital.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

ARCE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Água & Saneamento

Agência Reguladora do Ceará - ARCE


Indicador 11: Índice de conformidade da qualidade da Água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).

- **Meta 2011: 58,00%**
- **Posição em 31/12: 20,34%**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Justificativa: 59 relatórios concluídos de janeiro a dezembro de 2011, dos quais 47 relataram não-conformidades na qualidade da água.**
- **Perspectiva de cumprimento: a melhoria observada no início do ano, de fevereiro a abril de 2011, não se manteve nos meses seguintes. A meta não foi atingida.**

Água & Saneamento

Agência Reguladora do Ceará - ARCE

Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE

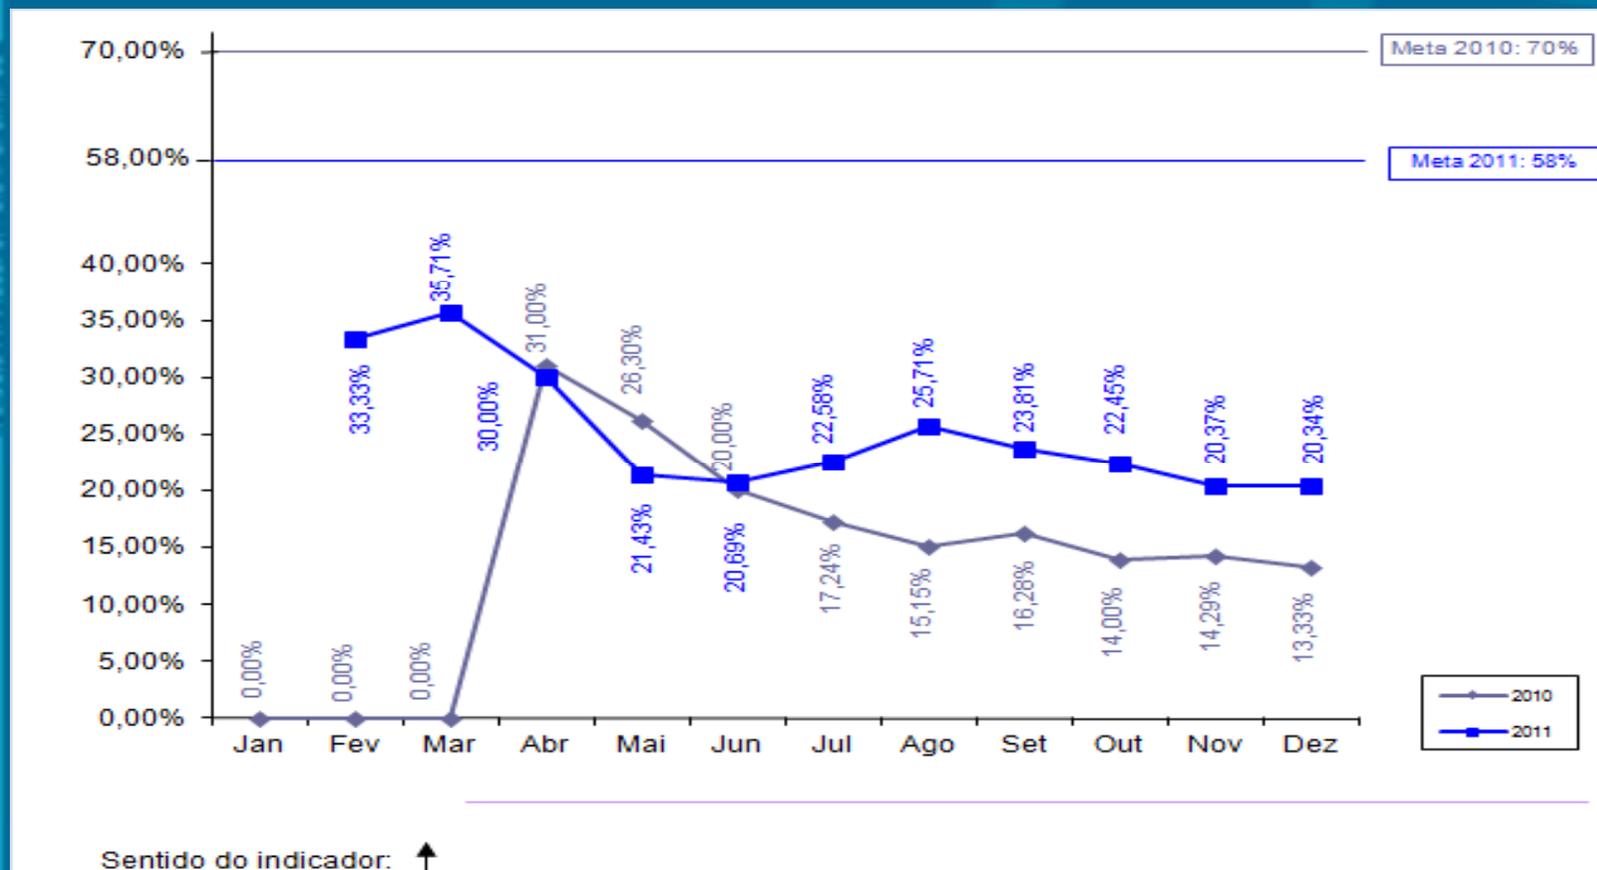

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento.

- **Responsável:** Mário Monteiro e Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 119,42 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2009 – Agosto 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

SECITECE

OPERAÇÃO Swap II

SECITECE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE

Indicador 13: Número de serviços tecnológicos realizados.

- **Meta 2011: 47.181**
- **Posição em 31/12: 43.655**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de cumprimento: Meta não alcançada.**

Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE


Indicador 13: Número de serviços tecnológicos realizados.

- **Meta 2011:** 47.181
- **Posição em 31/12:** 43.655
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento:** Meta não alcançada.

Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE

Número de serviços tecnológicos realizados

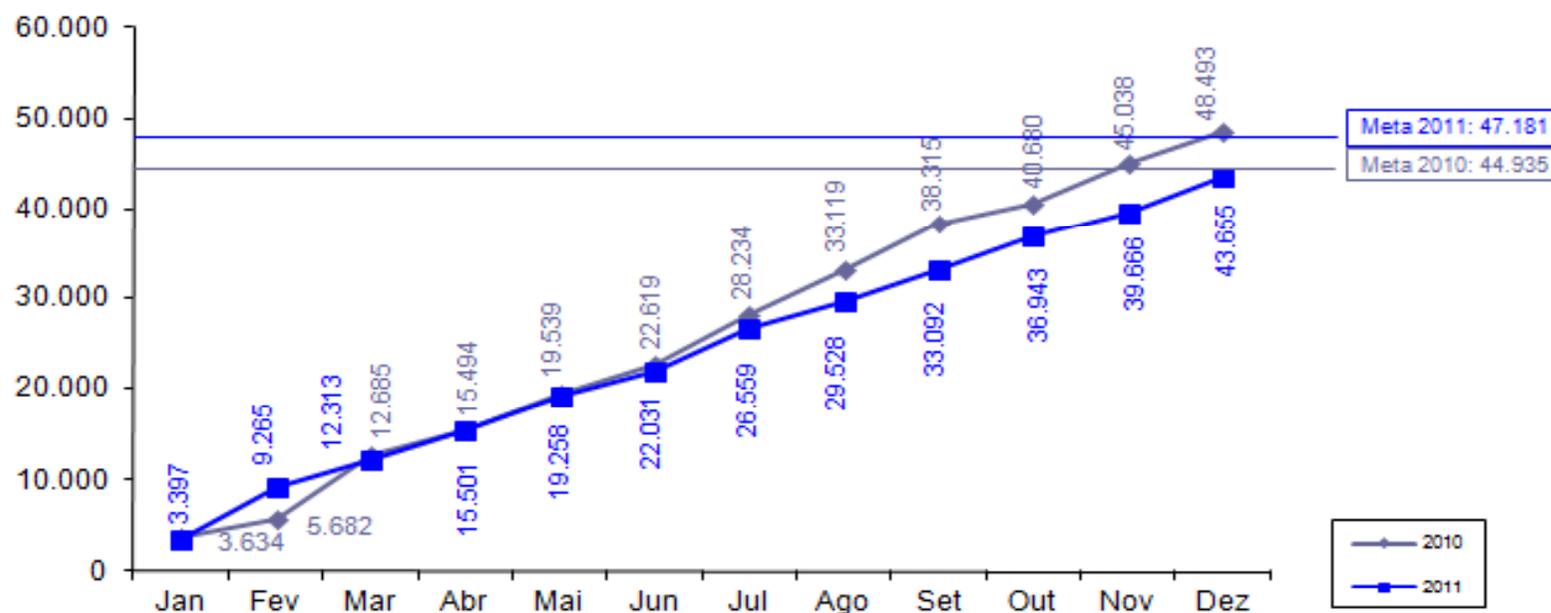

Sentido do indicador: ↑

OPERAÇÃO Swap II

CONPAM

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM


Indicador 14: Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado (percentual de licenças protocoladas na SEMACE no prazo de 60 dias).

- **Meta 2011: 20,00%**
- **Posição em 31/12: 20,80%**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de cumprimento: meta será cumprida**
- **Comentários: Informação referente a Dezembro de 2011**

Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM

Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado (percentual de licenças protocoladas na SEMACE no prazo de 60 dias)

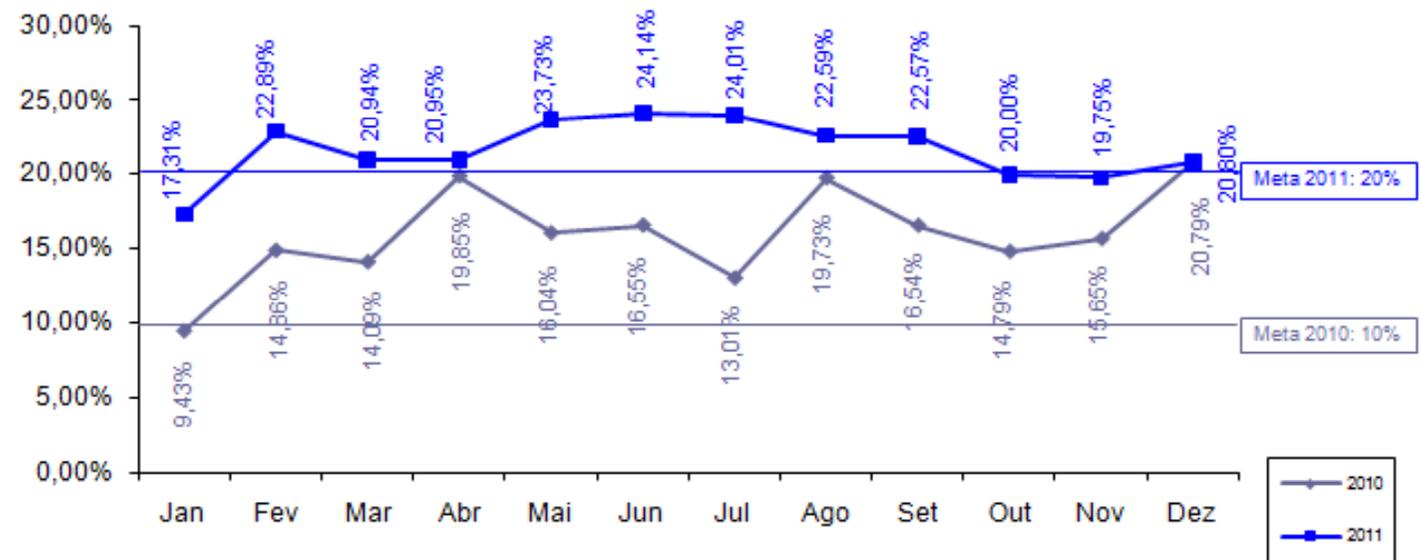

Sentido do indicador: ↑

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 5: Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente.

- **Responsável:** Maria Goretti de Castro e Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 39,68 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2009 – Novembro 2010
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 6: Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos.

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 125,16mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2011 – Março 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Secretaria das CONPAM

Relatório Quadrimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II, enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º trimestre de 2011).

OPERAÇÃO Swap II

CGE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Projeto 2: Capacitação em Mapeamento, Gestão e Auditoria de Processos com foco em Risco (no âmbito do Governo Estadual).

- **Responsável:** Marconi Lemos
- **Categoria de Licitação:** Empresa de consultoria.
- **Valor:** US\$ 174,93 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2011 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 3: Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Marconi Lemos
- **Categoria de Licitação:** Empresas de consultoria
- **Valor:** US\$ 120,92 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Novembro 2009 – Janeiro 2012
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

IPECE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Projeto 9: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Consultoria.

- **Responsável:** Eveline Barbosa
- **Categoria de Licitação:** Consultores Individuais
- **Valor:** US\$ 31,34 mil
- **Método de Aquisição:** Seção V – Guidelines de consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2009 – Março 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Projeto 10: Contratação de serviços para realização de evento c/ lideranças indígenas p/ apresentação dos livros didáticos/resultados da consultoria.

- **Responsável:** Eveline Barbosa
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 1,24 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2011 – Maio 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 11: Contratação de serviços gráficos para impressão e publicação dos livros didático-pedagógicos para as escolas indígenas do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Eveline Barbosa
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 1,24 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2010 – Março 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

**Projeto 12: Suporte p/ funcionamento da UGP do Projeto
SWAP II - Contratação de Consultores Individuais.**

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultores Individuais
- **Valor:** US\$ 169,16 mil
- **Método de Aquisição:** Seção V- Diretrizes de consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2009 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando Serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 13: Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado.

- **Responsável:** Leandro Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultores Individuais
- **Valor:** US\$ 17,95 mil
- **Método de Aquisição:** Seção V – Diretrizes de consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2009 – Maio 2010
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE

- No dia 15 de Abril de 2011, ocorreu um evento na Aldeia Indígena Jenipapo Kanindé para o lançamento das duas cartilhas (projetos AT 9,10 e 11), elaboradas dentro do escopo de Salvaguardas Social do Projeto SWAp II intituladas *Plantas Medicinais: Usos-saberes-sentidos; e Sentir-pensar-fazer: Artesanatos Indígenas no Ceará*);
- Ofício SEDUC nº 1268/2011 informou a entrega das cartilhas *Plantas Medicinais: Usos-saberes-sentidos; e Sentir-pensar-fazer: Artesanatos Indígenas no Ceará*) nas Escolas Indígenas do Ceará;
- No dia 25/01/2012 foram encaminhadas as cartilhas para José Mendes Fonteles Filho (Profº Babi) e para Professora da UFC Isabelle Bras Peixoto da Silva.

OPERAÇÃO Swap II

TCE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Projeto 31: Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de soluções integradas de Gerenciamento eletrônico de documento e informações do TCE (TCE 100% digital). (Parte A) – Digitalização.

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor:** US\$ 72,4 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2010 – Março 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando Serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando Serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação**

**Projeto 31: Fortalecimento Institucional do TCE -
Contratação de soluções integradas de Gerenciamento
eletrônico de documento e informações do TCE (TCE
100% digital). (Parte B) – Storage**

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor:** US\$ 196,8 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2012/Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Publicação Edital
- **Estágio Atual:** Edital publicado – Pregão 23/04/12
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 32: Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação. (Parte A) – Inscrição.

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 7,54 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2009 – Setembro 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 32: Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação. (Parte B) – Inscrição CISA.

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US 6,9 mil
- **Método de Aquisição:** Contratação Direta
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** novembro 2011- junho 2012
- **Estágio Previsto:** prestando serviço.
- **Estágio Atual:** prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OBRIGADA!

OPERAÇÃO
Swap II

Anexo 5



Governo do

Estado do Ceará

Sekretaria do Planejamento e Gestio

Instituto de Pesquisas e Estatística do Estado do Ceara - IPECE

SUMARIO DA PARTICIPAO DOS MEMBROS E REPRESENTANTES DO COMITE SWAP II NAS REUNIOES DO ANO DE 2009

Table with columns: Orgao, Reuniao, Funcao, and 30 columns of dates (from 19.04.12 to 30.04.09). Rows include ARCE, CAGECE, COE, CIDADES, CONPAM, EMACE, ETICE, IPECE, POE, SECTEC, SEDUC, SEFAZ, SEPLAG, SRH/COGERM, SESA, and TCE. Each cell contains 'Presente' or 'Ausente'.

*A partir da 6ª reuniao o Titular mudou de Abreu da Castro Galvao Junior para Alexandre Caetano

*A partir da 3ª reuniao o Titular mudou de Francisco C. Coelho para Ricardo Costa e Silva

*A partir da 11ª reuniao o Titular mudou de Luiz Jarbas de Mesquita para Fabiano Ramos

*A partir da 11ª reuniao o Titular mudou de Paulo Sérgio Rocha para Fabricio Santos

*A partir da 15ª reuniao o Titular mudou de Fernando Antonio C. de Oliveira para Fernando Grangiero

*A partir da 15ª reuniao o Suplente mudou de Fco. Antônio N. Bezerra para Tasso Pinheiro Borges

*A partir da 16ª reuniao o Suplente mudou de Luiz Fernando G Viana para Maria do Céu R. Colares

*A partir da 19ª reuniao o Titular mudou de Emiliana L. Figueiras para Márcio Normando B. Coelho

*A partir da 19ª reuniao Emiliana L. Figueiras deixou de ser Titular e passou a ser Suplente

*A partir da 20ª reuniao o Suplente mudou de Vanda Murta para Edilson Uchoa Lopes

*A partir da 22ª reuniao o Coordenador da Operação SWAP II mudou de Eveline Barbosa para Flávia Ataliba

*A partir da 24ª reuniao o Titular Mudou de Carlos Eduardo Sobrinho para Naiana Lima

*A partir da 29ª reuniao o Titular Mudou de Marcelo de Sousa Monteiro para Silvia Helena Correia

*A partir da 29ª reuniao o Suplente mudou de Kelly Cristina de O. Barbosa para Paulo Roberto de C. Nunes

*A partir da 30ª reuniao o Suplente mudou de Maria do Céu Ramos Colares para Denilson Marcellino Fidalis

*A partir da 31ª reuniao José Maurício Giffoni passou a ser Suplente pela SEMACE

*A partir da 33ª reuniao o Suplente mudou de Mário Augusto Parente Monteiro para Daniela Carvalho Cambrani Dantas

Anexo 6

Gráfico da Participação por Setorial

