



GOVERNO DO

ESTADO DO CEARÁ

Secretaria do Planejamento e Gestão

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

ATA 37ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ SWAp II

Data: 21/05/2012 Início: 09:40 Duração: 1:20 Término: 11:00 Local: Auditório Inhamuns - SEPLAG

Quadro de Presença			
ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
COORDENAÇÃO SWAP II	Flávio Ataliba	Coordenador SWAp II	OK
	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	Alice Helena da Silva Pinto	Consultora SWAP II	OK
	Fabiana Silva de Castro	Consultora SWAP II	OK
BANCO MUNDIAL	Alexandre Borges Oliveira	Senior Procurement Specialist	OK
	Anita Fiori	Especialista do Setor Privado	OK
	Etel Bereslawski	Especialista Sênior em Licitações	OK
	José Guilherme Reis	Economista Principal do Dpto. do Comércio	OK
	Joseph Mubiru Kizito	Especialista Sênior de Gestão Financeira	OK
	Lisa Bhansali	Especialista em Governança e Anticorrupção	OK
	Thomas Kenyon	Task Manager SWAp II	OK
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	OK
	Daniela Carvalho C. Dantas	Suplente	X
CAGECE	José Ricardo Meira	Titular	OK
	Raimunda Aurineide Lemos Caldas	Suplente	X
	Emiliana Leite Filgueiras	Suplente	OK
CGE	Silvia Helena Correia	Titular	X
	Paulo Roberto de Carvalho Nunes	Suplente	X
	Ítalo Brígido	Representante	OK
CIDADES	Tércia Maria Pinheiro Martins	Titular	OK
	Edílson Uchoa Lopes	Suplente	X
CONPAM /SEMACE	José Iraguassú T. Filho	Titular	X
	Maria Dias Cavalcante	Suplente	OK
	José Maurício Mendes Giffoni	Suplente	OK
ETICE	Denise Maria Norões	Titular	X
	Sérgio Vicente de Matos Brito	Suplente	X
	João Carlos Lima	Suplente	OK
PGE	Fernando Grangeiro	Titular	OK
	Tarso Pinheiro	Suplente	OK
SECITECE/NUTEC	Almir Bittencourt da Silva	Titular	OK
	Ricardo Costa e Silva	Suplente	OK
	Vera Lúcia Salgado	Representante NUTEC	OK
	Luiz Carlos	Representante FUNECE	OK
SEDUC	Maria Eneida Machado Maia	Titular	OK
	Maria Ângela leão Hitzshky Madeira	Suplente	X
	José Iran da Silva	Suplente	OK
SEFAZ	Fabiano Moreira Ramos	Titular	X
	Fabrizio Gomes Santos	Suplente	OK
	Luiza Ondina	Representante	OK
	Olavo Pereira Júnior	Representante	OK
SEPLAG	Naiana Corrêa Lima	Titular	X
	Fátima Coelho Benevides Falcão	Suplente	OK
	Antônio Eduardo Diogo S. Filho	Secretário da SEPLAG	OK
	Philipe Nottingham	Secretário Adjunto da SEPLAG	OK
	Flávia Roberta Bruno Teixeira	Representante	OK
	Ana Lúcia Lima	Representante	OK
	Fernanda Salles de Oliveira	Representante	OK
	Francisco Ailson Filho	Representante	OK
	Mário Fracalossi Júnior	Representante	OK
	Soraya Quixadá	Representante	OK
SRH /COGERH	Francisca Isabel V. de Carvalho	Titular	X
	Denilson Marcelino Fidelis	Suplente	OK
SESA	Vera Maria Câmara Coelho	Titular	OK
	Ana Márcia Rodrigues	Suplente	OK
	Ana Angélica	Suplente	X
TCE	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	OK
	José Teni Cordeiro Júnior	Suplente	X
	José Alexandre da Silva	Auditor do Projeto	OK
	Manuel Salgueiro	Representante	OK

INTRODUÇÃO

Às 09h40m, no Auditório Inhamuns da SEPLAG deu-se início a reunião do Comitê SWAp II que seguiu a apresentação em *Power Point* (**Anexo V**) cuja pauta está apresentada abaixo:

- 1 - Palavra do Secretário e Apresentação dos Participantes;
- 2 - Acompanhamento do Desempenho das Setoriais;
- 3 - Sumário do Desempenho;
- 4 - Auditoria do Projeto;
- 5 - Desembolso;
- 6 - SWAp III X PforR.

I. PALAVRA DO SECRETÁRIO E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Todos que estavam presentes se apresentaram, conforme quadro de presença.

Eduardo Diogo – Secretário da SEPLAG iniciou a reunião saudando a todos e dando as boas vindas aos representantes do Banco Mundial que encontram-se em Missão de Supervisão ao Projeto. Destacou a importância da semana de trabalho do Estado com a comitiva, bastante representativa do Banco Mundial. Saliou ainda que essa parceria é da mais alta relevância para o Estado, que se beneficia com o apoio e o conhecimento que a instituição proporciona ao Governo. Informou também que nos três primeiros dias da semana o foco da Missão será a avaliação do Projeto SWAp II. Adiantou que na quarta-feira haverá um momento com a SEPLAG e IPECE para o Banco Mundial apresentar as características do Program-for-Results (PforR). Destacou ainda que na quinta-feira será realizado no Palácio da Abolição um workshop focado nos quatro grandes eixos que nortearão o próximo Projeto, sendo eles gestão pública, desenvolvimento econômico, redução das desigualdades sociais e sustentabilidade ambiental.

II. ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DS SETORIAIS

Cristina Medeiros – IPECE informou que passaria a palavra para os representantes das setoriais envolvidas no projeto. Lembrou que a última reunião do Comitê SWAp II será realizada em Junho e em seguida a reunião do Comitê iniciar-se-ia as reuniões setoriais com os representantes do Banco Mundial, conforme Agenda da Missão do Banco (**Anexo I**)


1. SEFAZ

INDICADORES PRIMÁRIOS

Fabrizio Gomes – SEFAZ informou que, sobre a responsabilidade da SEFAZ, em relação ao setor financeiro, existem dois indicadores. Contextualizou sobre o Indicador do Saldo Fiscal, explicando que a apresentação faz referência ao final de 2011, alcançando, portanto, a meta. Sua metodologia é calcular as Receitas Correntes e subtrair as Despesas Correntes para identificar quanto, realmente, o Governo tem disponível em caixa, sem considerar os recursos de capital.

Indicador 1: Saldo Fiscal Corrente do Estado (Receitas Correntes menos Despesas Correntes).


- Meta 2011: R\$ 1.293,00 milhões
- Posição em 31/12: R\$ 1.882,18 milhões
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: As receitas e as despesas correntes se comportam conforme o esperado.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta superada.

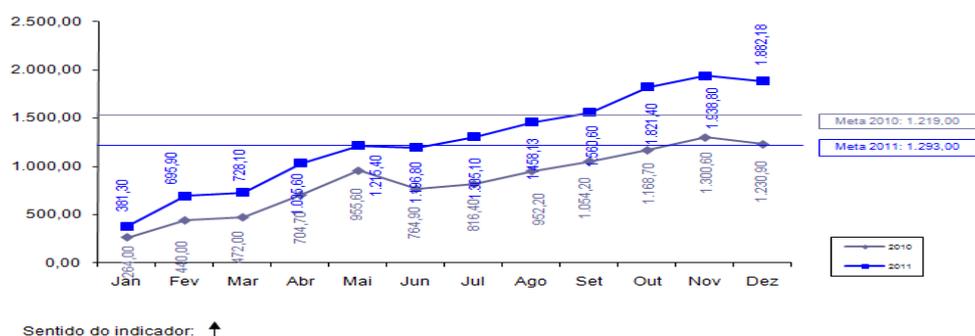

Fabrício Gomes – SEFAZ contextualizou sobre o segundo indicador do setor financeiro, informando que ele mede se há concentração de determinados setores na arrecadação de ICMS. Informou que, em 2011, o resultado foi alcançado, ficando, portanto, abaixo da meta, indicando baixa concentração.


Indicador 2: Índice Hefirndahl de arrecadação de ICMS usando quatro setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).

- Meta 2011: $\leq 0,35$
- Posição em 31/12: 0,297695
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: Não há nenhuma indicação de que haja concentração de arrecadação de ICMS em algum dos setores estudados que possa aumentar o índice além da meta.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

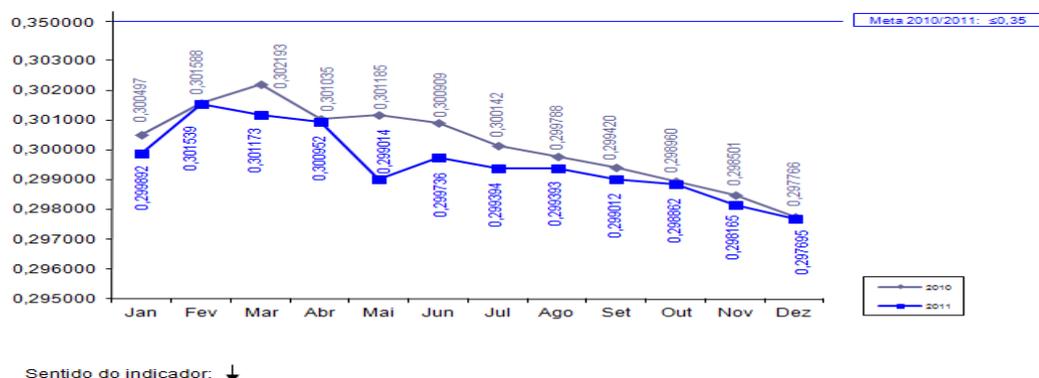

Indicador 14: Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.

- Meta 2011: $\geq 35,00\%$
- Posição em 31/12: 80,00%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: Com a vigência da Lei Complementar nº. 128/2010, as empresas do MEI são cadastradas automaticamente na SEFAZ/CE a partir do registro informado pela Receita Federal. Essas informações foram disponibilizadas por este órgão desde abril de 2010 e foram introduzidas no Estatístico do Cadastro da SEFAZ/CE nesta data.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

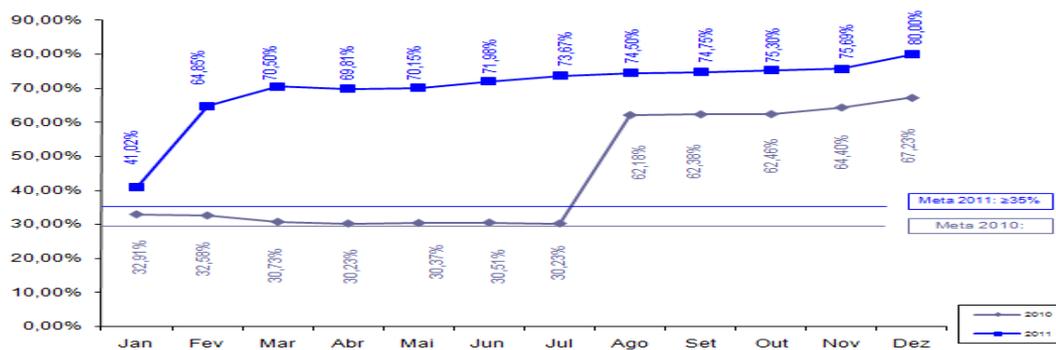


Sentido do indicador: ↑

Fabrício Gomes – SEFAZ explicou que a meta desse indicador foi cumprida e é referente à área de tributação.

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 1: Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário (% dos contribuintes ativos do regime de recolhimento normal que declaram saldo devedor na DIEF que a SEFAZ inscreve na Dívida Ativa).

- Meta 2011: ≤10,00%
- Posição em 31/12: 3,26% (valor referente ao período de março a julho 2011)
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Comentários: Acordado com o BM que o indicador seria medido três vezes em 2011, com informações quadrimestrais referente ao período de cinco meses. Informação fornecida após a missão (19/12/11).



Sentido do indicador: ↓

Olavo Júnior – SEFAZ informou que este indicador mede o saldo devedor da DIEF e demonstra a eficiência da cobrança administrativa do Estado em que, quando o contribuinte declara o saldo devedor, ou seja, um tributo a recolher, o estado adota algumas medidas para fazer uma cobrança administrativa. Quando essa cobrança não tem nenhum efeito, esse contribuinte é escrito no débito da dívida ativa.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA¹

Cristina Medeiros – IPECE informou que já existe uma empresa vencedora para a licitação desse projeto de assistência técnica da SEFAZ e que a proposta técnica e financeira já foi encaminhada ao Banco Mundial no dia 15/06/2012 para a não-objeção.

¹ Legenda da Sinalização para cumprimento dos Projetos de Assistência Técnica:

Verde=Realização conforme o Plano de Licitações; Amarelo = Realização com atraso mais de um dia; Vermelho = Realização com atraso de mais de três meses.

Projeto 21: Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.

- Responsável: Rejane Muniz
- Categoria de Licitação: BENS
- Valor: US\$ 254,90 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2011 - Junho 2012
- Estágio Previsto: Contrato assinado.
- Estágio Atual: Encaminhada documentação do vencedor do Pregão Eletrônico para NO do BM.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

2. SEPLAG

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 3: Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- Meta 2011: 15
- Posição em 31/12: 15
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.
- Comentário: Relatórios publicados no site em 30/03/2012.

Fátima Falcão – SEPLAG informou que o relatório analisa anualmente o desempenho da Matriz de Gestão Pública por Resultados. A SEPLAG disponibilizou a metodologia, a análise e, se fosse necessário, revisão dos relatórios apresentados junto às Secretarias. Informou também que a meta foi cumprida e os relatórios foram aprovados pelo COGERF, conforme estabelecido pela própria meta.

Indicador 4: Número de "Relatórios de Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- Meta 2011: 7
- Posição em 31/12: 7
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de cumprimento: meta cumprida.
- Comentário: Relatórios publicados no site em 13/04/2012.

Fátima Falcão – SEPLAG informou que este indicador é um trabalho que o IPECE tem coordenado, pois se trata de estudos. A SEPLAG indica os temas mais preocupantes para o Estado, de acordo com o desempenho dos indicadores, para serem analisados nos Relatório de Produtos-Resultados e esses são então selecionados pelo COGERF.

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Fátima Falcão – SEPLAG informou que o Governo envia Mensagem à assembléia na abertura dos trabalhos legislativos. Em relação ao ano de 2012, na elaboração do novo PPA, os indicadores da GPR constituíram a sua base estratégica.

Indicador 2: Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no discurso anual do Governador na Assembleia.

- Meta 2011: 2
- Posição em 31/12: 2
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de cumprimento: meta cumprida.
- Informações disponíveis nos links:
 - ✓ http://www.seplag.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1911&Itemid=1702
 - ✓ http://www.seplag.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1970&Itemid=1705

Indicador 3: Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.

- Meta 2011: ≤3 meses
 - Posição em 31/12: 1,24 meses*
 - Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
 - Perspectiva de cumprimento: meta cumprida.
- (*) Comentário: A média anual do indicador para 2011 foi de 1,99 meses.



Sentido do indicador: ↓

Fernanda Salles – SEPLAG informou que o cruzamento dos dados é feito mensalmente entre o sistema de cadastro de óbitos, disponibilizado pelo Ministério da Previdência, e o sistema da folha de pagamentos para identificar os pensionistas que faleceram e ainda recebem o benefício.

Cristina Medeiros – IPECE informou que, no final da apresentação, há um momento para a discussão dos Projetos de Assistência Técnica.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 22: Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará – SEPLAG.

- Responsável: Sérgio Lage e Fernanda Salles
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 105,94 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2009 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 23: Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras.

- Responsável: Soraya Quixadá
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2010 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Homologação.
- Estágio Atual: Homologação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 24: Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo à sociedade em geral e as entidades representativas das empresas.

- Responsável: Soraya Quixadá
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 107,60 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2010 – Maio 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 25: Desenvolvimento de Solução Informatizada para monitoramento da Cooperação Técnico-financeira do Estado do Ceará – SEPLAG.

- Responsável: Mário Fracalossi
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 101,76 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2009 – Maio 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

3. SEDUC

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Eneida Maria – SEDUC informou que todos os programas Elegíveis sob responsabilidade da SEDUC foram cumpridos. Enfatizou o projeto 48, que teve grandes dificuldades no ano de 2011, mas atingiu a meta no prazo estendido pelo Banco Mundial, ou seja 31/03/12.

Código e Descrição do Programa	Orçamento - 2011	Realizado até março de 2012	Realizado/Previsto	Sinalização
041 - Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino.	162.534.432,00	124.073.727,49	76,34%	
048 - Qualidade da Educação Básica/ 073 - Organização e Gestão da Educação Básica.	23.826.799,00	21.861.549,00	91,75%	
058 - Cooperação entre Estados e Municípios.	975.497.717,00	1.185.536.947,56	121,53%	
Total	1.161.858.948,00	1.321.444.537,65	113,74%	

INDICADORES PRIMÁRIOS

Eneida Maria – SEDUC informou que avaliar o 2º ano do ensino fundamental significa avaliar o nível de proficiência da leitura das crianças com sete anos de idade. Adiantou que, pelo sucesso, existe a possibilidade do Governo Federal tornar esse projeto que a SEDUC está desenvolvendo como um Programa Nacional. Acrescentou que, haverá uma solenidade na qual o Governo premiará as escolas que obtiveram o melhor resultado, como também as 150 escolas que tiveram os piores resultados, destacando que, a grande vantagem de homenagear as 150 escolas piores é que elas serão apoiadas pelas escolas de melhor desempenho. Informou também que o resultado já está disponível no site, conforme acordado com o Banco Mundial desde o dia 30/04/2012, juntamente com o relatório de melhores práticas.


Indicador 5: Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas.

- Meta 2011: ≥90 %
- Posição em 31/12: 100%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de cumprimento: meta cumprida.
- Comentários: Relatórios entregues no dia 30/04/2012

Eneida Maria – SEDUC informou que para esse indicador tenha uma maior eficiência, foi designado, para os 184 municípios que aderiram ao programa, um gerente que é responsável em agilizar o programa, para que obtenha, portanto, os melhores resultados.

Indicador 6a: Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.

- Meta 2011: 80%
- Posição em 31/12: 100%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida

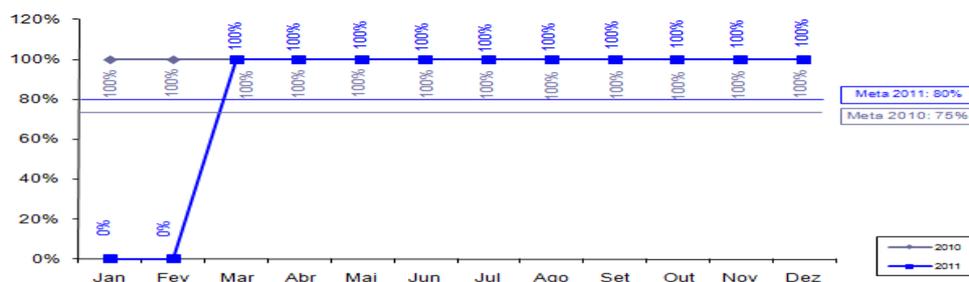


Sentido do indicador: ↑

Eneida Maria – SEDUC informou que esse indicador sempre é cumprido, pois a licitação ocorre no ano anterior e no início do ano letivo é feita a entrega de todo o material para todas as escolas, dos 184 municípios que aderiram ao programa.

Indicador 6b: Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.


- Meta 2011: ≥ 80%
- Posição em 31/12: 100%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida

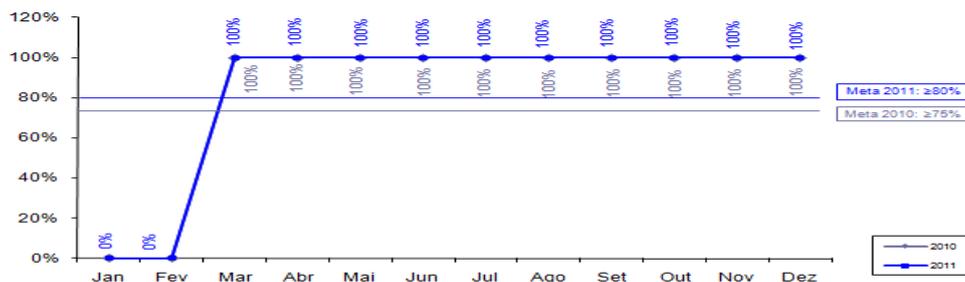

Sentido do indicador: ↑

Indicador 6c: Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.

- Meta 2011: 60%
- Posição em 31/12: 100%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida

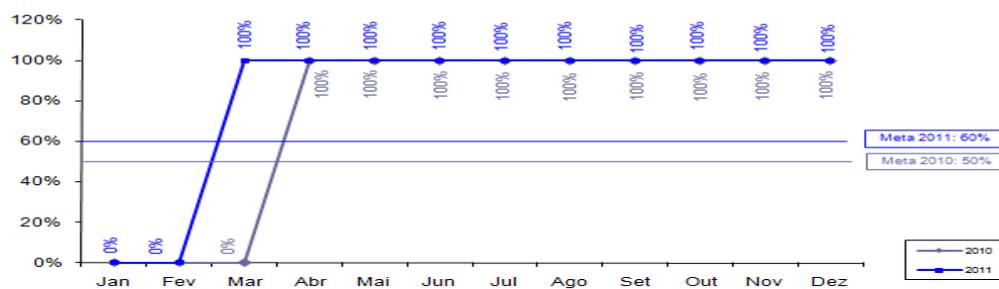

Sentido do indicador: ↑

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 5: Avaliação da Implementação municipal do programa “Alfabetização da Idade Certa” (uma em 2009 e uma em 2011).

- Meta 2011: 1
- Posição em 31/12: 1
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.

Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- Meta 2011: 80%
- Posição em 31/12: 81,40%
- Posição em 31/12 em relação a meta: VERDE
- Perspectiva de cumprimento: meta cumprida.

Eneida Maria – SEDUC informou que este indicador foi uma grande surpresa, pois no ano de 2011 houve greve no Estado e a dificuldade da prova aumentou. Afirmou que, na última Missão em dezembro, havia a possibilidade do não cumprimento desta meta.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 16: Avaliação do Programa E- Jovem.

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 72,90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2009 - Setembro 2010
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 17: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 1ª Etapa.

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 35,36 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2009 – Setembro 2010
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 17: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 2ª Etapa.

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 36,85 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2010 - Outubro 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Último produto entregue aguardando retorno da setorial quanto ao aceite para efetivação do pagamento.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 18: Serviço de consultoria para a Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico – Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará.

- Responsável: Eneida Machado e Kennedy
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 86,90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2010 - Agosto 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 19: Serviço de consultoria para Fase 2 da Implantação de um Projeto Técnico-Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará.

- Responsável: Eneida Machado e Kennedy
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 180,47mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2011 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 20: Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (3ª etapa).

- Responsável: Eneida Machado e Kennedy
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 146,95 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2011 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4. SESA

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Vera Coelho – SESA informou sobre o cumprimento de todas as metas dos Programas Elegíveis.


Código e Descrição do Programa	Orçamento - 2011	Realizado até dezembro de 2011	Realizado/Previsto	Sinalização
535 - Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	194.927.906,00	219.573.769,14	112,64%	
536 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	19.151.625,00	15.118.094,45	78,94%	
554 - Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.477.726,00	2.477.726,00	71,25%	
Total	217.557.257,00	237.169.589,59	109,01%	

INDICADORES PRIMÁRIOS

Vera Coelho – SESA informou que o alcance da meta foi em função de estratégia de identificação de articuladores regionais, trabalhando diretamente com municípios de suporte para o sistema de monitoramento.

Indicador 7a: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.

- Meta 2011: 30,00%
- Posição em 31/12: 76,40%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida
- Comentários: Relatório encaminhado em 12.03.2012.

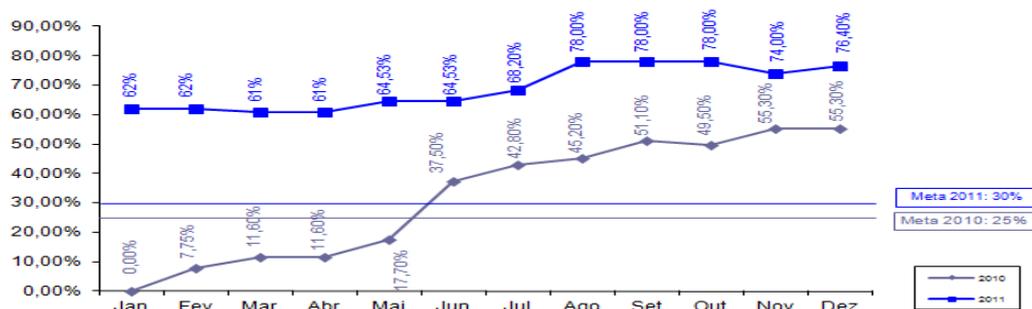


Sentido do indicador: ↑

Indicador 7b: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.

- Meta 2011: 30,0%
- Posição em 31/12: 30,7%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida
- Comentários: O relatório enviado em 14.03.2012.

Indicador 8a: Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.

- Meta 2011: 12
- Posição em 31/12: 13
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida

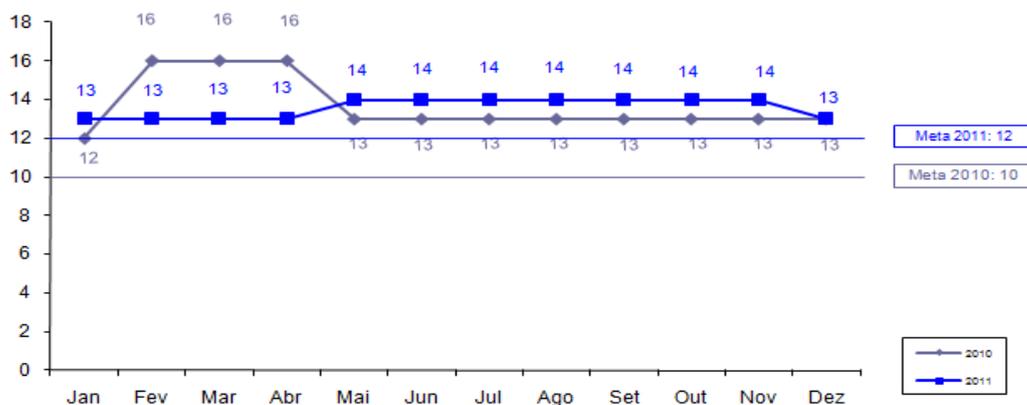

Sentido do indicador: ↑


Indicador 8b: Número de hospitais com certificação de qualidade da ONA.

- Meta 2011: 1
- Posição em 31/12: -
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: meta não será cumprida.
- Comentários: Banco Mundial informou que irá considerar o pedido de Waiver e SESA está elaborando Plano de Ação junto com a equipe do Hospital Waldemar de Alcântara e do Hospital São Vicente de Paulo - Itapipoca para dar prosseguimento aos esforços na obtenção da certificação.

Vera Coelho – SESA informou que foi selecionado um hospital que, dentro da avaliação da ANVISA, se apresentava em melhores condições para a obtenção da certificação. Foi selecionado, portanto, o Hospital São Vicente de Paulo. É um hospital filantrópico, gerenciado pela São Camilo localizado no município de Itapipoca. Destacou que a meta não foi cumprida, mas foi realizada uma Nota Técnica, apresentada ao Banco Mundial, identificando os avanços obtidos no gerenciamento e na estrutura física dessa unidade. Afirmou que a SEDUC está negociando junto à direção do São Camilo e a direção do Hospital São Vicente de Paulo, a possibilidade de continuidade desse processo de apoio à certificação através de um Plano de Ação.

Indicador 9: Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.

- Meta 2011: 15
- Posição em 31/12: 15
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.

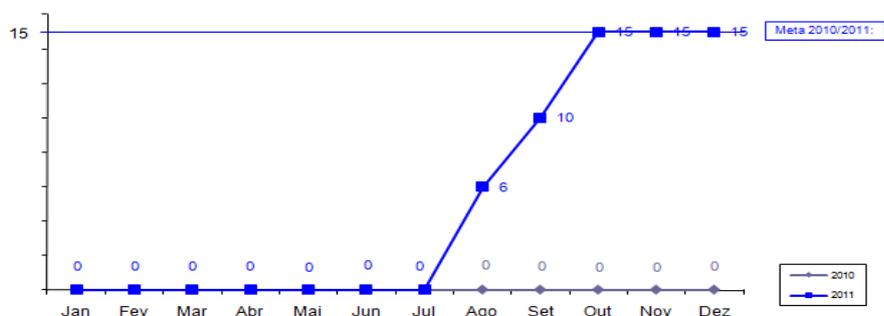


Sentido do indicador: ↑

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 7: População Atendida pelas Equipes do PSF.

- Meta 2011: 6.468.331
- Posição em 31/12: 7.028.280
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.

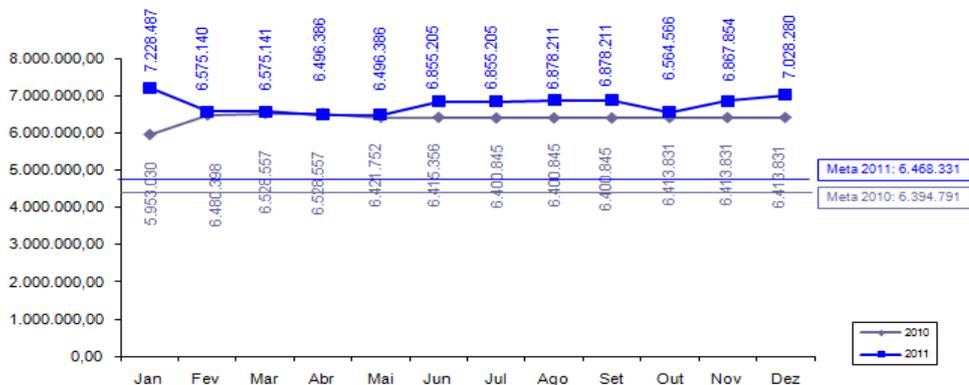


Sentido do indicador: ↑

Indicador 8: Relatórios semestrais do “Grupo da Água para combater a diarreia infantil que leva a internação”.

- Meta 2011: 2
- Posição em 31/12: 2
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.

Indicador 9: Coleta sistemática e relato peso/altura dos bebês.

- Meta 2011: 60,00%
- Posição em 31/12: 70,13% (*)
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.



Sentido do indicador: ↑

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 26: Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 93,76 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2010 – Dezembro 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 27: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Validação da Metodologia.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 28,89 mil
- Método de Aquisição: Diretrizes Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2009 – Agosto 2010
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 28: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-
Definições e ajustes no modelo de absorção.**

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 56,05 mil
- Método de Aquisição: Diretrizes Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2010 – Outubro 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 29: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Compra de equipamentos de informática para habilitar as CRES.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 141,80 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2010 – Março 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 30(Parte A): Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo –
Aquisição de equipamentos de computação e informática.**

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 234,16 mil
- Método de Aquisição: Pregão (Ata de Registro de Preço)
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2010 – Março 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

**Projeto 30(Parte B): Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo –
Aquisição de equipamentos de computação e informática (Servidores e Switches).**

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 148,03 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2011 – Janeiro 2012
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Aguardando posicionamento do fornecedor quanto à entrega dos últimos equipamentos.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 30 (Parte C): Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação (no break e rádio).

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 28,86 mil
- Método de Aquisição: Pregão (Ata de Registro de Preço)
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2010 – Março 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

SALVAGUARDAS

Gestão de Resíduos Sólidos Hospitalares.


Relatório Trimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II, entregues ao Banco Mundial até a posição do 1º trimestre de 2012.

5. COGERH

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador 10: *Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.*

- Meta 2011: $\geq 37\%$
- Posição em 31/12: 39%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.

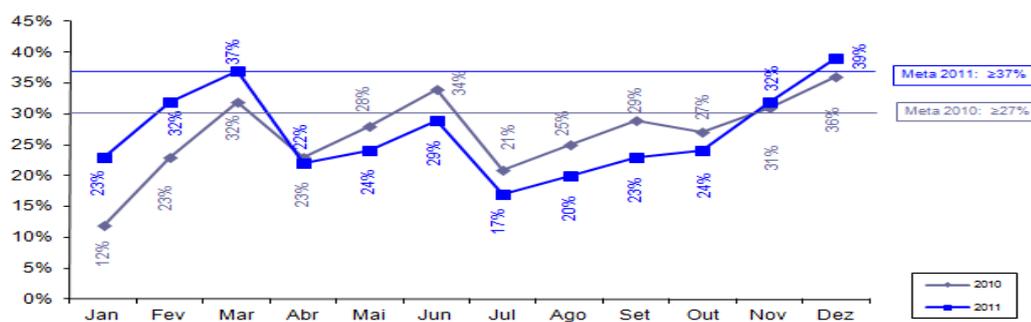

Sentido do indicador: ↑


Denilson Fidelis – COGERH informou que este indicador visa garantir a universalização no instrumento de gestão, no caso da cobrança pelo uso da água. O alcance da meta ocorreu no final de 2011 com a estiagem, gerando um aumento no consumo, possibilitando o faturamento da água.

6. CAGECE

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 11a: *Número de ligações urbanas de água.*


- Meta 2011: 275.122
- Posição em 31/12: 315.803
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: De 2006 a dezembro de 2011 foram executadas 315.803 ligações domiciliares de água.
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.

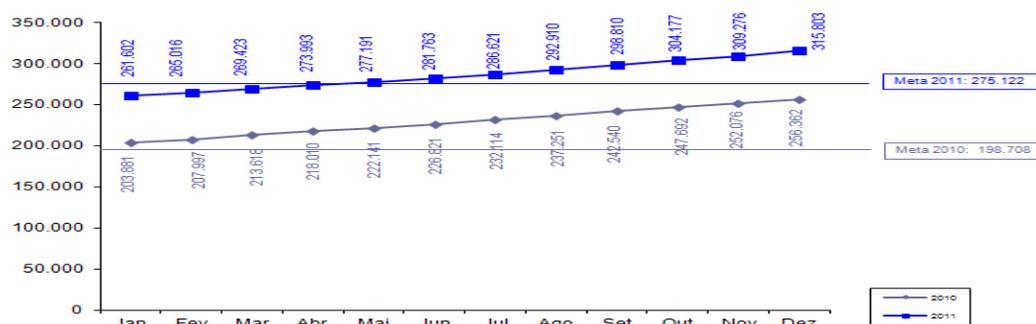

Sentido do indicador: ↑

Indicador 11b: *Número de ligações de esgotos.*


- Meta 2011: 124.775
- Posição em 31/12: 139.845
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: De 2006 a dezembro de 2011 foram executadas 139.845 ligações domiciliares de esgoto.
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.

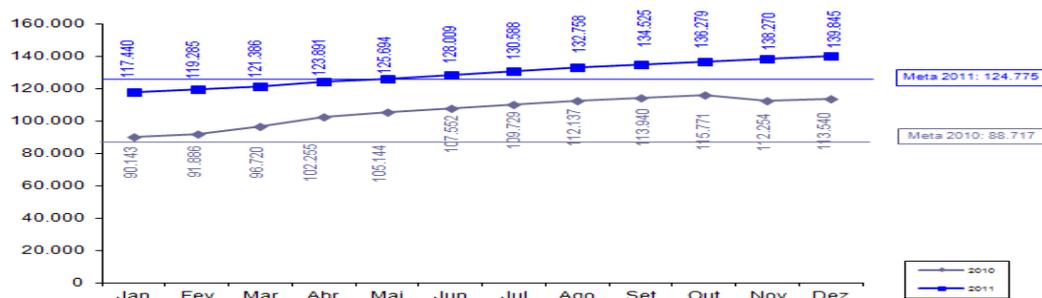

Sentido do indicador: ↑

Indicador 12: *Percentual de Perda de Água.*

- Meta 2011: ≤ 27% (*)
 - Posição em 31/12: 26,08%
 - Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
 - Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.
 - Justificativa: De 2007 a novembro de 2011, o percentual de perda de água foi de 26,03%.
- (*)Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 28,20% para 27%.

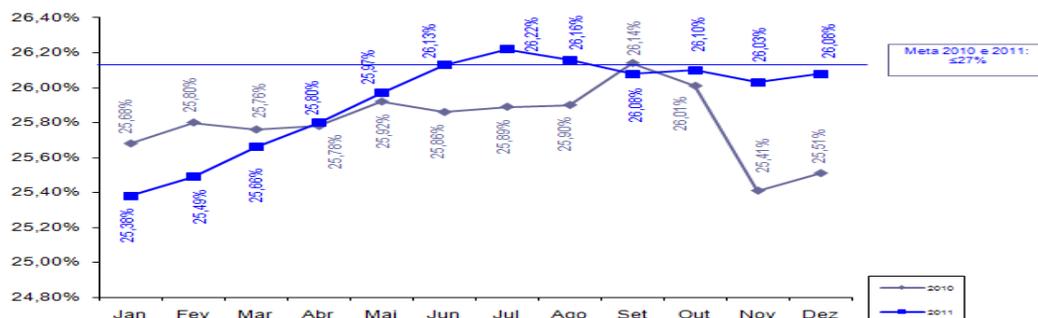

Sentido do indicador: ↓


Ricardo Meira – CAGECE informou que este indicador mede o que se perde da água produzida, como fraudes e vazamentos e destacou que a CAGECE está muito bem no indicador, um dos primeiros no Brasil.

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 10: Margem EBITDA da CAGECE.

- Meta 2011: 22,72% (*)
- Posição em 31/12: 25,75%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida

(*)Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 29,50% para 22,72%.

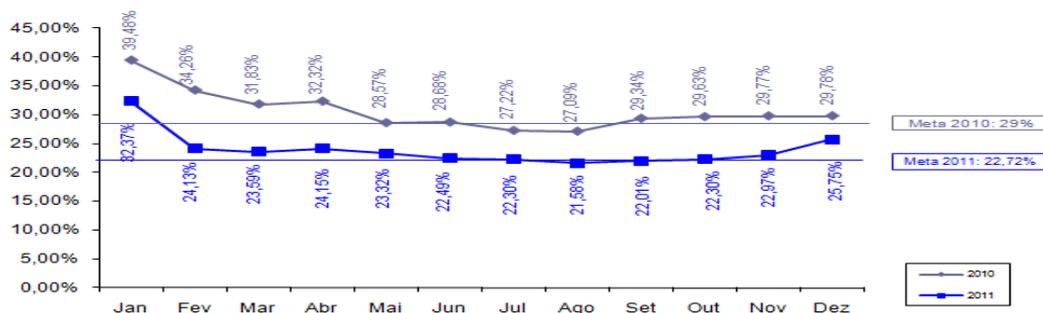

Sentido do indicador: ↑

SALVAGUARDAS

Reassentamento e Desapropriações

Relatório Trimestral de Acompanhamento da Salvaguarda de Reassentamento e Desapropriação entregue ao Banco Mundial até a posição do 1º trimestre de 2012.

7. CIDADES

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Tércia Pinheiro – SCIDADES informou que, baseado no orçamento de 2011, a meta dos programas de ações de águas urbanas, esgoto urbano e água rural foi atingida.

Código e Descrição do Programa	Orçamento - 2011	Realizado até dezembro de 2011	Realizado/Previsto	Sinalização
711 - Saneamento Ambiental do Ceará	34.191.184,00	32.891.484,22	96,20%	
Total	34.191.184,00	32.891.484,22	96,20%	

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 4: Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade.

- Responsável: Tércia Pinheiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 106,43 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2011 – Maio 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

SALVAGUARDAS

Gestão de Resíduos Sólidos Hospitalares


Relatório Trimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II, entregues ao Banco Mundial até a posição do 1º trimestre de 2012.

8. ETICE

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador 13: Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.

- Meta 2011: 4.365.700
- Posição em 31/12: 4.387.816
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.

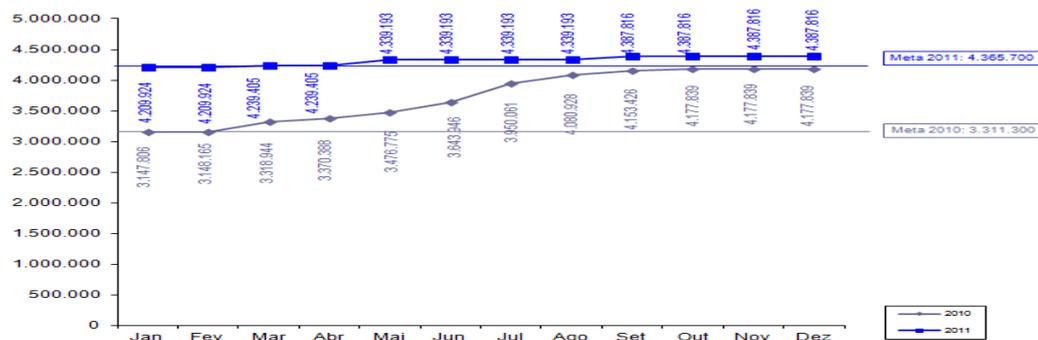

Sentido do indicador: ↑

João Carlos – ETICE informou que foi lançada a fibra com anel óptico contemplando aproximadamente 72 municípios.

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 12: *Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com sistemas).*

- Meta 2011: 3
- Posição em 31/12: 3
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: Os sistemas Ciclo Orçamentário, Middleware de Integração e Patrimônio, componentes do S2GPR, encontram-se implementados.
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 7 *Realização de Workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de internet.*

- Responsável: Denise Olsen
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor: US\$ 32,72 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2009 – Setembro 2009
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 8: *Desenvolvimento de Sistema de Avaliação de Resultados do Cinturão Digital do Ceará.*

- Responsável: Denise Olsen
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 51,72 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2011 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE


9. PGE

INDICADOR SECUNDÁRIO

Fernando Grangeiro – PGE informou que em 2011 a meta foi alcançada e que para conhecimento em março de 2012 atingiu-se 7,69% dos processos de licitação fracassados.

Indicador 4: *Redução de processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato.*

- Meta 2011: ≤10,5%
- Posição em 31/12: 9,76%*
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.
- Comentário: o percentual médio da meta no período de janeiro a dezembro de 2011 foi de 8,60%.

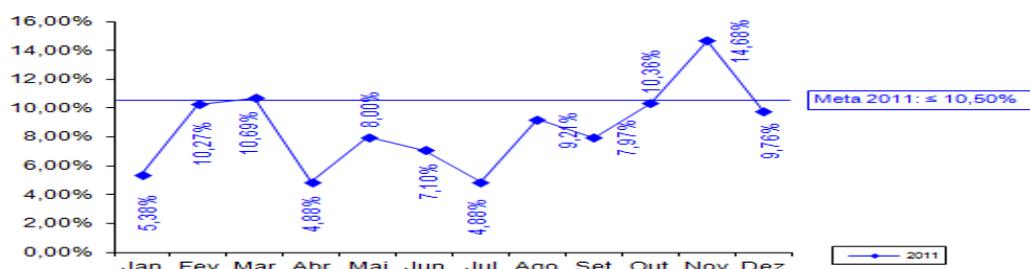

Sentido do indicador: ↓

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 14 Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Treinamentos e Seminários na área de Licitações

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 173,69
- Método de Aquisição: Contratação Direta
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2010 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 15 Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Compra de Equipamentos.

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 26,31
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2012 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Elaborando contrato.
- Estágio Atual: Aguardando parecer técnico da COETI/SEPLAG.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

10. ARCE

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 11: Índice de Conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE

- Meta 2011: 58,00%
- Posição em 31/12: 20,34%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERMELHO
- Justificativa: 59 relatórios concluídos de janeiro a dezembro de 2011, dos quais 47 relataram não-conformidades na qualidade da água.
- Perspectiva de cumprimento: a melhoria observada no início do ano, de fevereiro a abril de 2011, não se manteve nos meses seguintes. A meta não foi atingida.



Sentido do indicador: ↑

Alexandre Caetano – ARCE informou que este indicador serviu de alerta para um problema importante. No final do projeto apenas 20,34% do sistema fiscalizado seriam certificados no ponto de vista da qualidade da água. Acrescentou que esse problema já foi identificado em um trabalho junto com o Governo, Secretaria de Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Saúde e foi criado grupos de trabalhos para um trabalho de ação intensiva nos mananciais.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: *Elaboração do manual de indicadores de performance para o setor de saneamento ARCE.*

- Responsável: Mário Monteiro e Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 119,42 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2009 – Agosto 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

11. SECITECE

PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Almir Bittencourt – SECITECE iniciou com uma contextualização sobre os problemas da Secretaria na execução das metas dos Programas Elegíveis. Informou que, no início de 2011 houve uma reorientação da Secretaria, ou seja, as ações dispersas deveriam ser organizadas em uma única ação. Isso ocorreu após uma decisão do Governador de centralizar a atuação da Secretaria no combate à extrema pobreza, exigindo, portanto, uma reformulação no planejamento. Com isso, houve uma mudança nos termos de referências, elaboração de novos termos, foi identificado que o Estado tinha um registro de preço, mas estava vencendo, não dando tempo para a adesão do mesmo. Por fim, a Secretaria realizou uma nova licitação, utilizando pregão eletrônico, exigindo mais tempo.

Informou também que em relação ao Programa 033 a licitação está em fase final, será executado com recursos do Tesouro Estadual, já está programado e acredita no cumprimento da meta. O gargalo maior é que a Secretaria está aguardando os prazos que não podem ser descumpridos, exigidos até o final de maio.

Já em relação ao Programa 196, as licitações foram realizadas, os processos estão implantados, mas foi identificada na fibra óptica uma atecnia que a ETICE pediu para ser reformulada e o pagamento não poderia ser efetuado sem essa reformulação, levando, portanto, a esse atraso no cumprimento da meta.

Código e Descrição do Programa	Orçamento - 2011	Realizado até março de 2012	Realizado/Previsto	Sinalização
033 - Ceará Digital/70 -Ciência, Tecnologia e Inovação	3.268.447,00	0	0%	
194 - Fortalecimento da Educação Superior e da	12.166.208,00	8.695.911,97	71,48%	
196 - Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico/70 -Ciência, Tecnologia e Inovação	2.835.100,00	415.600,00	14,66%	
Total	18.269.755,00	9.111.511,97	49,87%	

- ✓ Coordenação informou BM em 19/04/12 sobre os Programas 033 e 196. BM solicitou elaboração pedido de Waiver para 033 e estendeu prazo para 196. SECITECE encaminhou Nota Técnica em 18/05/12 justificando o não cumprimento do Programa Elegível 033.
- ✓ Coordenação irá submeter pedido de Waiver ao Banco Mundial na Missão.


INDICADOR SECUNDÁRIO

Almir Bittencourt – SECITECE explicou que este indicador cumpriu 92% da meta. Informou que fatores internos e externos podem explicar o não cumprimento. No que tange aos problemas internos, a Secretaria contava que o laboratório de inspeção entrasse em funcionamento, entretanto o processo burocrático de certificação com as entidades federais levou muito tempo e não foi possível o funcionamento desse laboratório dentro do prazo. Outro problema que agravou o não cumprimento foi a falta de pessoal técnico do NUTEC, pois houve um elevado número de aposentadorias e até o momento esse quadro ainda não foi recuperado.

Em relação a fatores externos, ocorreu um fato interessante nas quais muitas outras entidades começaram a prestar o mesmo serviço similar a que a NUTEC vinha executando e a concorrência levou com que gerasse uma diminuição na procura dos serviços.

Indicador 13: *Número de serviços tecnológicos realizados.*

- Meta 2011: 47.181
- Posição em 31/12: 43.655
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de cumprimento: Meta não alcançada.
- Comentários: Meta não cumprida. Encaminhada Nota Técnica justificando o não cumprimento meta.

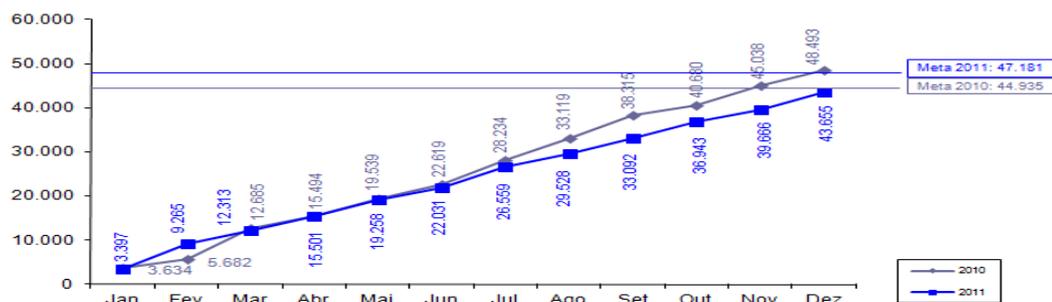

Sentido do indicador: ↑


12. CONPAM

INDICADOR SECUNDÁRIO

Maria Dias – CONPAM informou que esse indicador refere-se ao tempo que a Secretaria levaria para analisar e emitir as licenças ambientais no Estado do Ceará.

Indicador 14: *Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.*

- Meta 2011: 20,00%
- Posição em 31/12: 20,80%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de cumprimento: meta cumprida

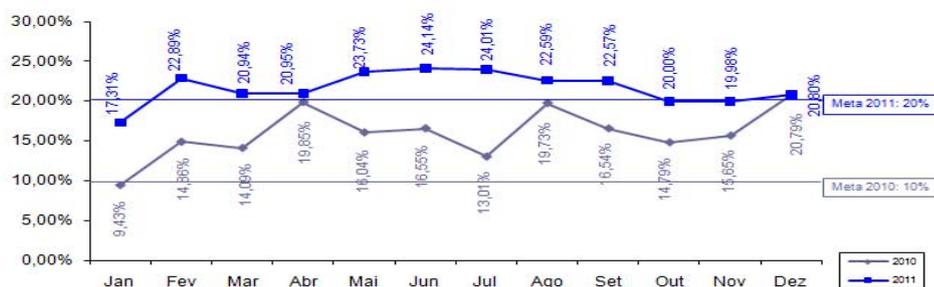

Sentido do indicador: ↑

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 5: *Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente – CONPAM.*

- Responsável: Maria Goretti de Castro e Maria Dias
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 39,68 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2009 – Novembro 2010
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 6: *Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos Sólidos de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos – CONPAM.*

- Responsável: Maria Dias
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 125,16mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2011 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

SALVAGUARDAS

Gestão de Resíduos Sólidos Hospitalares

Relatório Trimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II, entregues ao Banco Mundial até a posição do 1º trimestre de 2012.

13. CGE

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 2: *Capacitação em Mapeamento de Gestão e Auditoria de Processos com foco em Risco (no âmbito do Governo Estadual).*

- Responsável: Marconi Lemos
- Categoria de Licitação: Empresa de consultoria.
- Valor: US\$ 174,93 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2011 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 3: *Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará.*

- Responsável: Marconi Lemos
- Categoria de Licitação: Empresas de consultoria
- Valor: US\$ 119,52 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro 2009 – Janeiro 2012
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

14. IPECE

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 9: *Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Consultoria.*

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 31,34 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2009 – Março 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 10: Contratação de serviços para realização de evento c/ lideranças indígenas p/ apresentação dos livros didáticos/resultados da consultoria.

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 1,24 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2011 – Maio 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 11: Contratação de serviços gráficos para impressão e publicação dos livros didático-pedagógicos para as escolas indígenas do Estado do Ceará.

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 1,24 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2010 – Março 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 12: Suporte p/ funcionamento da UGP do Projeto SWAp II – PARTE A: Contratação de Consultores Individuais.

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 169,94 mil
- Método de Aquisição: Seção V- Diretrizes de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2009 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando Serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 12: Suporte p/ funcionamento da UGP do Projeto SWAp II – PARTE B: Aquisição de equipamentos de TI.

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: BENS
- Valor: US\$ 30,85 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2009 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Elaborando contrato.
- Estágio Atual: Shopping lançado aguardando recebimento das propostas até 25/05 às 16:30.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 12 Suporte p/ funcionamento da UGP do Projeto SWAp II - PARTE B: Aquisição de mobiliário.

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: BENS
- Valor: US\$ 79,00 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2009 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Elaborando contrato.
- Estágio Atual: Shopping lançado aguardando recebimento das propostas até 25/05 às 16:00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 13: *Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado.*

- Responsável: Leandro Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 17,95 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2009 – Maio 2010
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

SALVAGUARDAS

Povo Indígena

- No dia 15 de Abril de 2011, ocorreu um evento na Aldeia Indígena Jenipapo Kanindé para o lançamento das duas cartilhas (projetos AT 9,10 e 11), elaboradas dentro do escopo de Salvaguardas Social do Projeto SWAp II intituladas *Plantas Medicinais: Usos-saberes-sentidos; e Sentir-pensar-fazer: Artesanatos Indígenas no Ceará*;
- Ofício SEDUC nº 1268/2011 informou a entrega das cartilhas *Plantas Medicinais: Usos-saberes-sentidos; e Sentir-pensar-fazer: Artesanatos Indígenas no Ceará*) nas Escolas Indígenas do Ceará;
- No dia 25/01/2012 foram encaminhadas as cartilhas para José Mendes Fonteles Filho (Profº Babi) e para Professora da UFC Isabelle Bras Peixoto da Silva.

15. TCE

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 31: Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de soluções Integradas de Gerenciamento eletrônico de documento e informações do TCE (TCE 100% digital).

(Parte A) – Digitalização.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor: US\$ 72,4 mil
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2010 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando Serviço.
- Estágio Atual: Prestando Serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 31: Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de soluções Integradas de Gerenciamento eletrônico de documento e informações do TCE (TCE 100% digital).

(Parte B) – Aquisição Equipamento Storage.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor: US\$ 229,36 mil
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2012 - Junho 2012
- Estágio Previsto: Negociando Contrato.
- Estágio Atual: Negociando Contrato.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 32: Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação. (Parte A) – Capacitação.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 65,72 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2009 – Setembro 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 32: Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de Tecnologia da Informação. (Parte B) – Inscrição CISA.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US 6,98 mil
- Método de Aquisição: Contratação Direta
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2011- Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

III. SUMÁRIO DE DESEMPENHO

Cristina Medeiros – IPECE informou que todas a Tabela 1 faz referência, de uma forma global, a posição de todos os Indicadores do Projeto e que, dos dezenove indicadores, apenas um primário não foi cumprido e será submetido um pedido formal de *Waiver* ao Banco Mundial. No âmbito dos Indicadores Secundários, apresentados na Tabela 2, dos catorze, dois não atingiram a meta.

1. SUMÁRIO DOS INDICADORES PRIMÁRIOS

Tabela 1: Acompanhamento mensal dos Indicadores Primários da Operação SWAp II – 2011

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAp II - 2011				
Sétor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).	1.293,0 milhões	1.882,18 milhões
	SEPLAG	2. Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).	≤0,35	0,297695
Educação	SEDUC	3. Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	15	15
		4. Número de "Relatórios Produtos – Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.	7	7
		5. Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas.	≥90%	100%
Saúde	SESA	6.a Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: "Alfabetização na Idade Certa".	≥80%	100%
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização na Idade Certa" entregue às escolas.	≥80%	100%
		6.c Percentual de gerentes do programa "Alfabetização na Idade Certa" remunerados pelo Estado.	60%	100%
Água & Saneamento	CAGECE SRH	7a. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	30%	76,40%
		7b. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	30%	30,70%
		8a. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.	12	13
Negócios & Inovação	SEFAZ ETICE	8b. Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.	1	-
		9. Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.	15	15
		10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥37%	39%
Água & Saneamento	CAGECE SRH	11.a Número de ligações urbanas de água.	275.122	315.803
		11.b Número de ligações de esgotos.	124.775	139.845
		12. Percentual de perda de água.	≤27%	26,08%
Negócios & Inovação	SEFAZ ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	4.365.700	4.387.816
		14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥35%	80,00%

Legenda: ■ Probabilidade alta de atingir a meta ■ Probabilidade intermediária de atingir a meta ■ Probabilidade baixa de atingir a meta

2. SUMÁRIO DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS

Tabela 2: Acompanhamento mensal dos Indicadores Secundários da Operação SWAp II – 2011

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAp II - 2011				
Sétor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado
Setor Público	SEFAZ	1. Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário.	≤ 10%	3,26%
	SEPLAG	2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembleia.	2	2
	POE	3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	≤ 3 meses	1,24
Educação	SEDUC	4. Percentual processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato reduzidos.	≤ 10,5%	9,76%
		5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa" (uma em 2009 e uma em 2011).	1	1
Saúde	SESA	6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.	80%	81,40%
		7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.468.331	7.028.280
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva à internação.	2	2
Água & Saneamento	CAGECE	9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	60%	70,13%
		ARCE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	22,72%
Negócios & Inovação	ETICE	11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).	58%	20,34%
		SECTECE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).	3
Meio Ambiente	CONPAM	13. Número de serviços tecnológicos realizados.	47.181	43.655
		ETICE	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	≥ 20%

Probabilidade alta de atingir a meta ■
 Probabilidade intermediária de atingir a meta ■
 Probabilidade intermediária de atingir a meta ■

3. PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Francisco Ailson – SEPLAG explicou a Tabela 3. Na terceira e quarta coluna, tem-se o valor do orçamento de 2011 que foi aprovado, um valor de lei. Na quinta coluna, para alguns Programas, têm-se os valores pagos até março de 2012. Já a sexta coluna refere-se à meta dos 70% em relação aos valores orçados e a sétima coluna é a diferença entre a meta e o que foi realizado. De acordo com a Tabela 3, percebe-se que dentre os dez programas, dois não conseguiram, ao final desse período, atingir os 70%. Explicou que a prorrogação do prazo até março de 2012 foi aprovado pelo Banco Mundial para que se tentasse executar os 70% dos Programas 033, 196 e 048. No que tange ao Programa 048, percebe-se que foi executado acima da meta. Lembrou também que os valores do realizado estão com os valores de deduções informados pelas Secretarias.

Ailson informou também que a posição do Programa 196 é até a data 21/05/2012 e o valor pago até esta data foi cerca de \$ 96.000,00. Destacou também que na Tabela 3 foi incluída uma nota relacional que mostra a correlação dos Programas de 2011 com os Programas de 2012 que, por conta do novo PPA, os programas anteriores não existem mais.

Tabela 3: Acompanhamento dos Programas Elegíveis

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2011. **REGRA 70%**

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2011 Jan-Dez (a)	Orçamento 2011 - Até 31/12 (b)	Realizado (até 31/03/12) (c)	Meta (até 31/03/12) (d)	Diferença (e) = (d) - (c)	Realizado/Previsão (%) (c)/(b)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	3.268.447	3.268.447	-	2.287.913	2.287.913	0,00%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	162.534.432	162.534.432	124.073.727	113.774.102	(10.299.625)	76,34%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	23.826.799	23.826.799	21.861.549	16.678.759	(5.182.789)	91,75%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	975.497.717	975.497.717	1.185.536.948	682.848.402	(502.688.546)	121,53%	
SECITECE	194 Formação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento	12.166.208	12.166.208	8.695.912	8.516.346	(179.566)	71,48%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.835.100	2.835.100	415.600	1.984.570	1.568.970	14,66%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	194.927.906	194.927.906	219.573.769	136.449.534	(83.124.235)	112,64%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	19.151.625	19.151.625	15.118.094	13.406.138	(1.711.957)	78,94%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.477.726	3.477.726	2.477.726	2.434.408	(43.318)	71,25%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	34.191.184	34.191.184	32.891.484	23.933.829	(8.957.655)	96,20%	
TOTAL		1.431.877.144,00	1.431.877.144	1.610.644.809,4	1.002.314.001			
Valor Limite do Desembolso [70% * TOTAL]		1.002.314.001	1.002.314.001					

Notas:

¹ O Programa 033 - Ceará Digital corresponde ao Programa 070 - Ciência, Tecnologia e Inovação em 2012.

² O Programa 048 - Qualidade da Educação Básica corresponde ao Programa 073 - Organização e Gestão da Educação Básica em 2012.


³ O Programa 196 - Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico corresponde ao Programa 070 - Ciência Tecnologia e Inovação em 2012.

Posição em: 31-mar-12

4. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Cristina Medeiros – IPECE passou a apresentar a posição de 17/05/2012 dos Projetos de Assistência Técnica, explicando que dos 32 projetos 27 estão com a execução conforme o Plano de Licitação, 2 estão com atraso de um dia e 3 estão com atraso de mais de três meses, conforme apresentado no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Acompanhamento da Sinalização da Execução do Plano de Licitação dos Projetos

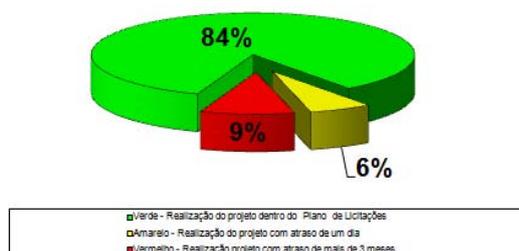


Sinalização	Setorial com o número do Projeto
Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações	27 PROJETOS: ARCE (1), CGE (2,3), CIDADES(4), COMPAM (5,6), ETICE (7,8), IPECE (09,10,11,13), PGE(14), SEDUC (16,18,19,20), SEPLAG (22,23,24,25), SESA (26,27,28,29), TCE (31, 32).
Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia	2 PROJETOS: IPECE (12 B, C); PGE (15).
Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses	3 PROJETOS: SEDUC(17), SEFAZ (21), SESA (30).

OBS: O número ao lado do nome da setorial se refere à identificação do número do Projeto cuja descrição encontra-se no Acompanhamento no site do IPECE:

http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/assistencia/Acompanhamento_Projetos_2011.htm

Cristina Medeiros – IPECE passou a explicar que em relação aos estágios dos processos licitatórios, dos 32 Projetos de Assistência Técnica (posição de 17/05/2012), 16 estão concluídos e 16 estão sendo executados, sendo que desses, 5 estão com seu processo licitatório em andamento e 11 estão com seus contratos assinados e os serviços estão sendo prestados, conforme apresentado no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Estágio dos Processos Licitatórios



5 em andamento=	IPECE (12 B,C); PGE (15), SEFAZ (21), SEPLAG (23), TCE(31).
11 Contratos assinados =	CGE (2), CIDADES(4), COMPAM (6), ETICE (8), PGE (14), SEDUC (19,20), SEPLAG(22,24,25), TCE (32).
16 Concluídos =	ARCE (1) CGE (3), COMPAM (5), ETICE (7), IPECE (09, 10, 11, 13), SEDUC (16, 17, 18), SESA (26, 27, 28, 29, 30).

Cristina Medeiros – IPECE informou também que dos 5 projetos em andamento, 1 está com estágio de preparação do Edital, 1 no estágio da Lista Curta e SDP, 1 no estágio de preparação do Relatório de Avaliação e 2 estão Negociando Contrato, de acordo com o gráfico 3.

Gráfico 3 – Projetos em Andamento



MI ou Edital = 1	PGE (15).
Lista Curta e SDP = 1	IPECE (12 B e C).
Avaliação = 1	SEFAZ (21).
Negociação Contrato = 2	SEPLAG (23), TCE (31)

i) PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTANDO SERVIÇO

Cristina Medeiros – IPECE explicou que a Tabela 4 mostra o acompanhamento dos Projetos de Assistência Técnica que estão prestando serviço. De acordo com a tabela, dos 92 produtos que deveriam ser entregues, faltam 48 e adiantou que esses produtos deverão ser entregues até o dia 30/06/2012, porém, o pagamento pode ser estendido até outubro de 2012.

Tabela 4: Acompanhamento dos Projetos de Assistência Técnica que estão prestando serviço

Nº Projeto	Nº	Órgão	Nome do Projeto	Cumprimento até 30/06/12	Responsável	Qde de produtos	Qde de produtos a serem entregues	Valor total do contrato R\$	Valor a ser pago até 30/06 R\$
2	1	CGE	Capacitação em Mapeamento, Gestão e Auditoria de Processos com foco em Risco (no âmbito do Gov Est).		Marconi Lemos	3	3	301.895,00	301.895,00
4	2	CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade.		Tércia Pinheiro	4	3	183.673,47	146.938,78
6	3	CONPAM	Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos		Maria Dias	5	4	216.000,00	194.400,00
8	4	ETICE	Desenvolvimento de Sistema de Avaliação de Resultados do Cinturão Digital do Ceará (*)		Denise Olsen	5	5	89.250,00	89.250,00
12	5	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo).		Cristina Medeiros	8	2	298.620,00	12.900,00
14	6	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de Empresa para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva		Fernando Grangeiro	7	7	299.750,00	299.750,00
17	7	SEDUC	Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (2ª etapa)		Betânia e Ana Garcia	3	1	59.000,00	29.500,00
19	8	SEDUC	Serviço de Consultoria para Fase 2 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará		Betânia e Ana Garcia	3	1	311.460,00	155.730,00
20	9	SEDUC	Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (2012 - 3ª etapa)		Betânia e Ana Garcia	3	3	253.608,72	253.608,73
22	10	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará		Sergio Lage e Fernanda Salles	24	5	178.200,00	53.064,00
24	11	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas		Ana Portela e Soraya Quixadá	7	3	176.000,00	72.160,00
25	12	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.		Mario Fracalossi	11	4	161.580,26	64.632,10
30	13	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação (servidor e switch)		Vera Coelho	2	1	233.669,90	118.493,95
31	14	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de Soluções Integradas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Informações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. (Programa TCE 100% Digital). Parte A - Digitalização		Giovanna Adjafre	2	2	114.357,77	114.357,77
32	15	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação - Parte B - Inscrição		Giovanna Adjafre	5	4	10.398,77	9.284,27
TOTAL						92	48	2.887.463,89	1.915.964,60

Ítalo Brígido – CGE informou que, em relação ao Projeto nº 2, houve a contratação da empresa Ernst & Young Terco Assessoria Empresarial Ltda. O curso foi dividido em três módulos. As últimas turmas estão programadas para a primeira quinzena de junho e até o dia 15, todo o contrato será executado e pago.

Tércia Pinheiro – CIDADES informou que, em relação ao Projeto nº 04, o projeto consiste na avaliação de quatro sistemas de abastecimentos de água não operados pela CAGECE. A vencedora da licitação foi a quinta colocada. São quatro produtos divididos em dois diagnósticos e dois planos de ação. Acrescentou que já foram entregues dois produtos e o terceiro voltou para a correção.

Maria Dias – CONPAM informou que, em relação ao Projeto nº 6, o andamento do processo está satisfatório, já receberam o primeiro produto, o segundo e o terceiro já estão elaborados faltando apenas à análise.

Cristina Medeiros – IPECE informou que, no caso Projeto nº 7 da SEDUC com sinalização vermelha, houve a entrega do último produto pela IETS, mas a qualidade estava inferior daquela esperada pelo Estado. Com isso, foi solicitada uma reunião com o Instituto, a direção da SEDUC e a Coordenação do Projeto, resultando na revisão e entrega do novo produto. Agora ele está no processo de pagamento.

Ana Márcia – SESA informou que, em relação ao Projeto nº 30, o produto é a entrega de dois servidores, um na SESA e outro nos hospitais. No final de 2011, foi empenhado, mas em duas licitações. Os servidores da SESA foram entregues em abril só que, em relação aos servidores dos hospitais, outra empresa ganhou a licitação e esta está com dificuldades de entregar o produto porque depende de outro fornecedor. No último contato na sexta, a empresa solicitou um prazo de 45 dias para a entrega, ou seja, no dia 05/07/2012.

ii) PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LICITANDO

Cristina Medeiros – IPECE explicou que a Tabela 5 mostra o acompanhamento dos Projetos de Assistência Técnica que estão em licitação.

Tabela 5: Acompanhamento dos Projetos de Assistência Técnica que estão licitando

nº Projeto	IIº	Órgão	Descrição Projeto	Cumprimento até 30/06/12	Responsável	Estágio Licitação	Valor estimado US\$ mil	Valor estimado R\$ mil
12	1	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II. Parte B - Aquisição de material de TI para as novas instalações do projeto SWAp.		Cristina Medeiros	Envio solicitação Proposta para Lista Curta	30,85	53,24
	2		Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II. Parte C - Aquisição de material de mobiliário para as novas instalações do projeto SWAp.		Cristina Medeiros	Envio solicitação Proposta para Lista Curta	79,00	136,34
15	3	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Aquisição de equipamentos.		Tarso / Fernando Grangeiro	Elaboração Edital Shopping	26,31	45,41
21	4	SEFAZ	Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.		Rejane Muniz de Oliveira	Avaliação	254,90	439,91
23	5	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras		Carmen Silva	Negociação Contrato	100,00	172,58
31	6	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Programa TCE 100% Digital - Parte B - Aquisição Storage		Giovanna Adjafre	Negociação Contrato	229,36	395,83
Total							720,42	1.243,30
Total Previsto (Taxa do último desembolso 1,7258) (R\$ mil)							720,42	1.243,30
Total Solicitado Desembolso de 15 de Maio 2012 (Taxa prevista desembolso 1,8) (R\$ mil)							806,71	1.452,08

Cristina Medeiros – IPECE informou que, em relação ao Projeto nº 12, houve um saldo do Projeto de Apoio à UGP e, com a aprovação do Banco Mundial, o IPECE iniciou licitação para adquirir equipamentos de TI e Mobiliário para a modernização do Instituto. No entanto, a licitação está demorando um pouco além do esperado, gerando a sinalização amarela.

Fernando Grangeiro – PGE informou que, em relação ao Projeto nº 15, é um shopping para a compra de telas e monitores, mas a grande dificuldade no processo licitatório foi em relação ao preço. As empresas não queriam preços para fazer o orçamento estimado, mas essa fase foi superada e nessa semana será lançado o shopping.

Soraya Quixadá – SEPLAG informou que, em relação ao Projeto nº 23, foi necessário refazer o termo de referência, modificando a quantidade de cursos. Acrescentou que o projeto já foi licitado, hoje o fornecedor assinará o contrato e nos dias 31/05 e 01/06 haverá um curso de compras sustentáveis e nos dias 04 e 05 de junho haverá um curso de registros de preço e conhecimento das boas práticas.

Giovanna Adjafre – TCE fez uma contextualização sobre os projetos do TCE. Informou que, em relação ao Projeto nº 31, foi feito um pregão eletrônico para adquirir um equipamento - *storage*

e não houve impugnação e o contrato foi assinado e o prazo da entrega é dia 15/06/2012. Em relação à digitalização, o produto já foi entregue e está em análise e será pago no início de junho. O projeto nº 32 de consultoria e auditoria de TI já foi encerrado desde o ano passado, mas no que tange a certificação CISA de cinco servidores do TCE, promovida pela ISACA, informou que 4 auditores farão a prova no dia 09/06/2012 e o projeto está financiando a inscrição, as diárias e as passagens.

IV. AUDITORIA DO PROJETO

José Alexandre – TCE informou que, em relação à auditoria de 2010, os relatórios foram entregues ao Banco Mundial em fevereiro e após o envio a UGP disponibilizou para todas as Secretarias envolvidas com o Projeto. Em 2012 o relatório foi entregue às Setoriais e já foi solicitado o Plano de Ação. Percebeu-se um grande desenvolvimento no que se refere ao entendimento do Projeto como também as regras do Banco Mundial. Alex informou também que estão desenvolvendo a última auditoria. O relatório financeiro de 2011 já foi concluído e deram início ao relatório de aquisições. Relatório está sendo elaborado pelo TCE para entrega até 30/09/12. Agradeceu o recebimento de todos os planos de ações, com exceção da SESA que deve entregá-lo até o dia 23/05, e informou que eles serão utilizados no último relatório. Por fim, sugeriu que no próximo projeto, sendo SWAp III ou PforR, fosse dado uma ênfase no fortalecimento institucional, pois de acordo com as reuniões setoriais, percebeu-se que problemas de determinadas setoriais dependem de outras setoriais para serem solucionados.

V. DESEMBOLSOS

Cristina Medeiros – IPECE passou a apresentar o Sumário dos Desembolsos do SWAp II, conforme demonstrado na Tabela 6.

Tabela 6: Acompanhamento dos Desembolsos

Sumário dos Desembolsos SWAp II											
Ano	Descrição	Data	Valor Desembolso							% Valor Desembolsado/ Total Previsto	Valor Disponível US\$
			Previsto US (A)	Realizado US\$ (B)	Realizado BRL\$ (C)	Diferença US\$ (B) - (A)	Relação cambial (C)/(B)	Acumulado R\$	Acumulado US\$		
	Assinatura Contrato	19/3/09									\$240.000.000,00
	Taxa Inicial	14/5/09	\$600.000,00	\$600.000,00		\$0,00			\$600.000,00	0,25%	\$239.400.000,00
2009	1º Desembolso	18/6/09	\$47.150.000,00	\$47.150.000,00	\$91.725.610,00	\$0,00	1,9454	\$91.725.610,00	\$47.750.000,00	19,90%	\$192.250.000,00
	2º Desembolso	18/6/09	\$26.940.000,00	\$26.999.546,62	\$52.524.918,00	\$59.546,62	1,9454	\$144.250.528,00	\$74.749.546,62	31,15%	\$165.250.453,38
	3 AT - 1º Desembolso	19/8/09	\$3.670.000,00	\$500.625,65	\$920.200,00	-\$3.169.374,35	1,8381	\$145.170.728,00	\$75.250.172,27	31,35%	\$164.749.827,73
	5º Desembolso	16/11/09	\$26.940.000,00	\$27.695.856,91	\$47.382.072,00	\$755.856,91	1,7108	\$192.552.800,00	\$102.946.029,18	42,89%	\$137.053.970,82
2010	6º Desembolso	26/5/10	\$26.940.000,00	\$17.398.686,57	\$32.545.983,09	-\$9.541.313,43	1,8706	\$225.098.783,09	\$120.344.715,75	50,14%	\$119.655.284,25
	7º Desembolso	16/11/10	\$26.940.000,00	\$26.864.228,29	\$45.846.492,00	-\$75.771,71	1,7066	\$270.945.275,09	\$147.208.944,04	61,34%	\$92.791.055,96
2011	8 AT - 2º Desembolso	09/02/11	\$0,00	\$582.938,73	\$975.489,67	\$582.938,73	1,6734	\$271.920.764,76	\$147.791.882,77	61,58%	\$92.208.117,23
	9º Desembolso	10/5/11	\$26.940.000,00	\$28.914.820,03	\$46.885.380,68	\$1.974.820,03	1,6215	\$318.806.145,44	\$176.706.702,80	73,63%	\$63.293.297,20
	10 AT - 3º Desembolso	18/7/11	\$0,00	\$917.363,08	\$1.448.057,62	\$917.363,08	1,5785	\$320.254.203,06	\$177.624.065,88	74,01%	\$62.375.934,12
	11º Desembolso (*)	4/11/11	\$26.940.000,00	\$27.180.886,15	\$47.573.346,00	\$240.886,15	1,7503	\$367.827.549,06	\$204.804.952,03	85,34%	\$35.195.047,97
2012	12 AT - 4º Desembolso	10/2/12	\$0,00	\$143.216,40	\$247.162,88	\$143.216,40	1,7258	\$368.074.711,94	\$204.948.168,43	85,40%	\$35.051.831,57
	13º Desembolso	abril-12	\$26.940.000,00								
	Termino	30/6/12									
Total			\$240.000.000,00	\$204.948.168,43	\$368.074.711,94	-\$8.111.831,57		\$368.074.711,94	\$204.948.168,43	85,40%	\$35.051.831,57

i) SUMÁRIO DO DESEMBOLSO – SALDO DISPONÍVEL

Tabela 7: Acompanhamento dos Desembolsos – valores previstos e desembolsados

TOTAIS VALORES PREVISTOS E DESEMBOLSADOS US\$ (A) + (B)					
	Previsto	Realizado		Saldo	
CATEGORIA I	\$235.730.000,00	\$202.204.024,57	85,78%	\$33.525.975,43	14,22%
CATEGORIA II	\$3.670.000,00	\$2.144.143,86	58,42%	\$1.525.856,14	41,58%
FRONT END FEE	\$600.000,00	\$600.000,00	100,00%	\$0,00	0,00%
Sub total	\$ 240.000.000,00	\$204.948.168,43	85,40%	\$35.051.831,57	14,60%
Saldo		\$35.051.831,57	14,60%		
Total	\$ 240.000.000,00	\$240.000.000,00	100,00%		

Tabela 8: Acompanhamento dos Desembolsos – sumário do saldo disponível

Sumário Saldo Disponível US\$	
Desembolso Previsto inicialmente	\$26.940.000,00
Total retido	\$5.816.840,79
Variação cambial	\$769.134,64
Desembolso previsto*confirmado BM 21/02/12	\$33.525.975,43
Saldo Categoria II AT	\$1.525.856,14
Total	\$35.051.831,57

VI. SWAp III x PforR

✓ WORKSHOP

Cristina Medeiros – IPECE finalizou a apresentação lembrando a todos sobre o Workshop que será realizado nos dias 24 e 25 de maio envolvendo os temas de gestão pública, crescimento econômico, redução das desigualdades sociais e sustentabilidade ambiental, conforme Programação do Workshop (**Anexo II**) e figura 1.

Figura 1- Banner do Workshop



✓ PforR

Thomas Kenyon – Banco Mundial informou que a Missão tem dois objetivos. Primeiro o de acompanhar o progresso do SWAp II e preparar para o fechamento no final de junho e segundo discutir com o Estado sobre a forma da nova operação, sendo o PforR, representada pela figura 2 uma opção e não uma obrigação imposta pelo Banco.

Figura 2- PforR



Adiantou que o objetivo e a filosofia do PforR são parecidos com o SWAp no sentido de apoiar um programa para o Governo e contribuir para o fortalecimento institucional. Sua principal diferença está no modo de executá-lo.

VII. CONTATOS COM A UGP

A comunicação deve ser feita através dos seguintes e-mails:

- ugpswap@ipece.ce.gov.br e cristina.medeiros@ipece.ce.gov.br

VIII. ENCERRAMENTO

Às 11h Philipe Nottingham - SEPLAG encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

IX. PARTICIPAÇÃO

O acompanhamento das participações das setoriais nas reuniões do Comitê SWAp II é realizado mensalmente conforme tabela (**Anexo III**) e gráfico (**Anexo IV**).

X. ANEXOS

Anexo I – Agenda da Missão do Banco;
Anexo II – Programação do Workshop;
Anexo III - Tabela – Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais;
Anexo IV- Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais;
Anexo V - Apresentação em *Power Point* – SWAp II.

Anexo 1

AGENDA DA MISSÃO BANCO MUNDIAL NO CEARÁ - PROJETO SWAp II E SWAp III - 21 a 25 De Maio de 2012

Nº	HORÁRIO	ÓRGÃO	ATIVIDADE: REUNIÕES E WORKSHOPS	PARTICIPANTES			LOCAL	
				BANCO MUNDIAL	SETORIAIS	Coordenação IPECE		
Segunda-Feira (21/05/12) MANHÃ								
1	9h30m - 11h	COMITÊ SWAp II	<ul style="list-style-type: none"> Reunião COMITÊ SWAp II: Desempenho SWAp II 2011. 	Thomas Kenyon, José Guilherme, Joseph Kizito, Gunars Platais, Anita Fiori, Francis Fragano, Lisa Bhansali; Etel Bereslawski.	Philippe Nottingham Mário Fracalossi Naiana Lima Francisco Ailson Representantes Comitê	SEPLAG SEPLAG SEPLAG SEPLAG TODOS	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros, Consultores UGP.	SEPLAG AUDITÓRIO INHAMUNS
2	11h - 12h	SEFAZ	<ul style="list-style-type: none"> SWAp II: Indicadores Primário, Secundário e Projetos de Assistência Técnica. 	Thomas Kenyon, José Guilherme, Joseph Kizito, Gunars Platais, Ricardo Silveira, Anita Fiori, Francis Fragano, Lisa Bhansali, Etel Bereslawski.	Sandra Machado Fabrizio Santos Fabiano Ramos Najja e Olavo Junior Rejane Muniz	SEFAZ SEFAZ SEFAZ SEFAZ SEFAZ	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros.	
Segunda-Feira (21/05/12) TARDE								
3	15h - 16h30m	TCE	<ul style="list-style-type: none"> SWAp II: Projetos de Assistência Técnica. 	Thomas Kenyon, José Guilherme, Joseph Kizito, Francis Fragano, Lisa Bhansali; Etel Bereslawski.	Presidente TCE (confirmar) Giovanna Adjafre Alexandre da Silva Auditores SWAp	TCE TCE TCE TCE	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros, Consultores UGP.	TCE
Terça-Feira (22/05/12) MANHÃ								
4	9h - 10h	CGE	<ul style="list-style-type: none"> SWAp II: Projetos de Assistência Técnica e Apresentação do Portal da Transparência 	Thomas Kenyon, Joseph Kizito, José Guilherme, Anita Fiori, Francis Fragano, Lisa Bhansali, Etel Bereslawski.	Paulo Roberto Sílvia Correia Marconi Lemos	CGE CGE CGE	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros, Consultores	SEPLAG AUDITÓRIO INHAMUNS
5	10h30m - 11h	SEPLAG	<ul style="list-style-type: none"> SWAp II: Apresentação do Portal de Compras 	Thomas Kenyon, Joseph Kizito, José Guilherme, Anita Fiori, Francis Fragano, Lisa Bhansali; Etel Bereslawski.	Carmen Sílvia Valdir Augusto	SEPLAG SEPLAG	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros.	
6	11h - 12h	ETICE	<ul style="list-style-type: none"> SWAp II: Indicadores Primário, Secundário e Projetos de Assistência Técnica. 	Thomas Kenyon, Joseph Kizito, José Guilherme, Anita Fiori, Francis Fragano, Lisa Bhansali; Etel Bereslawski.	Fernando Carvalho Denise Olsen	ETICE ETICE		
Terça-Feira (22/05/12) TARDE								
7	14h - 15h30m	SEPLAG	<ul style="list-style-type: none"> SWAp II: Indicadores Primário, Secundário e Projetos de Assistência Técnica. 	Thomas Kenyon, Joseph Kizito, José Guilherme, Anita Fiori, Francis Fragano, Lisa Bhansali; Etel Bereslawski.	Mário Fracalossi Naiana Lima Ana Lúcia / Fátima Falcão Sérgio Lage Carmen Silva / Soraya / Ana Francisco Ailson	SEPLAG SEPLAG SEPLAG SEPLAG SEPLAG SEPLAG	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros, Consultores UGP.	SEPLAG AUDITÓRIO INHAMUNS
8	16h - 17h	PGE	<ul style="list-style-type: none"> SWAp II: Indicador Secundário e Projetos de Assistência Técnica 	Thomas Kenyon, Joseph Kizito, José Guilherme, Anita Fiori, Francis Fragano, Lisa Bhansali; Etel Bereslawski.	Fernando Grangeiro Tarso Pinheiro	PGE PGE	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros, Consultores UGP.	PGE
9	16h30m - 17h	SECITECE/ NUTEC	<ul style="list-style-type: none"> SWAp II: Indicador Secundário e Programas Elegíveis. 	Thomas Kenyon, Joseph Kizito, José Guilherme, Anita Fiori, Francis Fragano, Lisa Bhansali; Etel Bereslawski.	Almir Bittencourt Ricardo C. Silva Vera Salgado	SECITECE SECITECE NUTEC	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros, Consultores UGP.	SECITECE
Quarta-Feira (23/05/12) MANHÃ								
10	9h - 10h	SESA	<ul style="list-style-type: none"> SWAp II: Indicadores Primário, Secundário, Programas Elegíveis e Projetos de Assistência Técnica. 	Thomas Kenyon, José Guilherme, Ricardo Silveira, Anita Fiori, Francis Fragano, Lisa Bhansali; Etel Bereslawski.	Vera Coelho Ana Márcia Ana Angélica	SESA SESA SESA	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros e Consultores UGP.	SEPLAG AUDITÓRIO INHAMUNS
11	10h-11h	SEPLAG	<ul style="list-style-type: none"> P4R Apresentação para Secretário SEPLAG e Secretário Adjunto e Coordenação 	Thomas Kenyon, José Guilherme, Ricardo Silveira, Anita Fiori, Francis Fragano, Lisa Bhansali; Etel Bereslawski.	Eduardo Diogo Philippe Nottingham	SEPLAG SEPLAG	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros.	
12	11h-12h30min	SEDUC	<ul style="list-style-type: none"> SWAp II: Indicadores Primário, Secundário, Programas Elegíveis e Projetos de Assistência Técnica. 	Thomas Kenyon, José Guilherme, Ricardo Silveira, Anita Fiori, Francis Fragano, Lisa Bhansali; Etel Bereslawski.	Eneida Maia José Iran Noemi Cordeiro	SEDUC SEDUC SEDUC	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros e Consultores UGP.	
Quarta-Feira (23/05/12) TARDE								
13	14h - 16h30m	CIDADES CAGECE SESA CONPAM/ SEMACE ARCE SRH/ COGERH	<ul style="list-style-type: none"> SWAp II: Salvaguardas do Projeto - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde e Reassentamentos; SWAp II: Indicadores Primário, Secundário, Programas Elegíveis e Projeto de Assistência Técnica: ARCE, COGERH /SRH, CAGECE, CIDADES, CONPAM, SEMACE. 	Thomas Kenyon, José Guilherme, Gunars Platais, Anita Fiori, Marcos Thadeu, Francis Fragano, Lisa Bhansali; Etel Bereslawski.	Tércia Martins Paulo Abreu Alves Ricardo Meira Marta Regia Vera Coelho Tereza Rosane Paulo Lustosa Maria Dias Maurício Giffoni Alexandre Caetano Daniela Dantas João Lúcio Denilson Fidelis Mônica Holanda	CIDADES CIDADES CAGECE CAGECE SESA SESA CONPAM CONPAM SEMACE ARCE ARCE COGERH COGERH SRH	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros e Consultores UGP.	SEPLAG AUDITÓRIO INHAMUNS

Quinta-Feira (24/05/12) MANHÃ									
14	8h30m-12h30m	ESTADO	<ul style="list-style-type: none"> • WORKSHOP TEMA: GESTÃO PÚBLICA (José Guilherme Reis) • WORKSHOP TEMA: CRESCIMENTO ECONÔMICO (Anita Fiori, José Guilherme) 	Thomas Kenyon, José Guilherme Reis, Ricardo Silveira, Gunars Platais, Anita Fiori, Marcos Thadeu, Francis Fragano	Participantes Convidados	Estado	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros e Consultores UGP.	Auditório Palácio da Abolição	
Quinta-Feira (24/05/12) TARDE									
15	13h30m-18h	ESTADO	<ul style="list-style-type: none"> • WORKSHOP TEMA: COMBATE AS DESIGUALDADES SOCIAIS (Armando Castelar) • WORKSHOP TEMA: SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (Gunars Platais) 	Thomas Kenyon, José Guilherme, Ricardo Silveira, Gunars Platais, Anita Fiori, Marcos Thadeu, Francis Fragano; Etel Bereslawski	Participantes Convidados	Estado	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros e Consultores UGP.	Auditório Palácio da Abolição	
Sexta-Feira (25/05/12) MANHÃ									
16	8h30m-12h30m	ESTADO	<ul style="list-style-type: none"> • Fechamento do Workshop e da Missão do Banco Mundial com a presença do Governador. 	Thomas Kenyon, José Guilherme, Ricardo Silveira, Gunars Platais, Anita Fiori, Marcos Thadeu, Francis Fragano; Etel Bereslawski	Participantes Convidados	Estado	Flávio Ataliba, Adriano Sarquis, Cristina Medeiros e Consultores UGP.	Auditório Palácio da Abolição	

Anexo 2



Programação do Workshop Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades Sociais e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará SWAp III

Dia 24 de Maio de 2012

08h **CREENCIAMENTO**

08h45min **ABERTURA**

Eduardo Diogo – Secretário de Planejamento e Gestão do Ceará

Tom Kenyon – Gerente do Projeto SWAp III – Banco Mundial

09hmin **PAINEL I – GESTÃO PÚBLICA**

Expositor: José Guilherme Reis / Roland Clarke - Banco Mundial
(20minutos)

Moderador: Carlos Eduardo Pires Sobreira - Casa Civil

Comentários dos Secretários de Governo:

- Secretário da SEPLAG (10 minutos)
- Secretário Adjunto da SEFAZ (10 minutos)
- Controlador e Ouvidor Geral (10 minutos)
- Procurador Geral do Estado (10 minutos)
- Observações dos participantes (10 minutos)

Plenária (20 minutos)

10h30min- 10h45min - Intervalo



10h45min

PAINEL II: CRESCIMENTO ECONÔMICO

Expositores: Anita Fiori – Banco Mundial (15 minutos)

José Guilherme Reis - Banco Mundial (15 minutos)

Moderador: Adriano Sarquis – IPECE

Comentários dos Secretários de Governo:

- Secretário da SEPLAG (10 minutos)
- Secretário da SEINFRA (10 minutos)
- Secretário da SECITECE (10 minutos)
- Secretário da SEFAZ (10 minutos)
- Presidente da ADECE (10 minutos)

Plenária (20 minutos)

Almoço 12h35min - 13h35min

13h35min

Painel III: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Expositor: Armando Castelar - Consultor Banco Mundial (20 Minutos)

Moderador: Flávio Ataliba – IPECE

Comentários dos Secretários de Governo:

- Secretário da STDS (10 minutos)
- Secretário da SDA (10 minutos)
- Secretário da SEDUC (10 minutos)
- Secretário da SESA (10 minutos)
- Secretário das CIDADES (10 minutos)

Plenária (20 minutos)

15h05min – 15h20min – Intervalo



15h20min PAINEL IV: SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Expositor: Gunars Platais - Banco Mundial (20 minutos)

Moderador: Philipe Nottingham – SEPLAG

Comentários dos Secretários de Governo:

- Presidente do CONPAM (10 minutos)
- Secretário da SRH (10 minutos)
- Secretário das CIDADES (10 minutos)
- Secretário da SESA (10 minutos)

Plenária (20 minutos)

Dia 25 de Maio de 2012

09h CONTEXTUALIZAÇÃO: Secretário da SEPLAG

Eduardo Diogo (05min)

09h10min EXPOSIÇÃO DA SÍNTESE WORKSHOP AO GOVERNADOR:

Diretor Geral do IPECE - Flávio Ataliba (20min)

09h40min EXPOSIÇÃO: Representante do Banco Mundial

Tom Kenyon (20min)


10h CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

Governador - Banco Mundial - SEPLAG - IPECE

Anexo 3

Anexo 4

Gráfico da Participação por Setorial

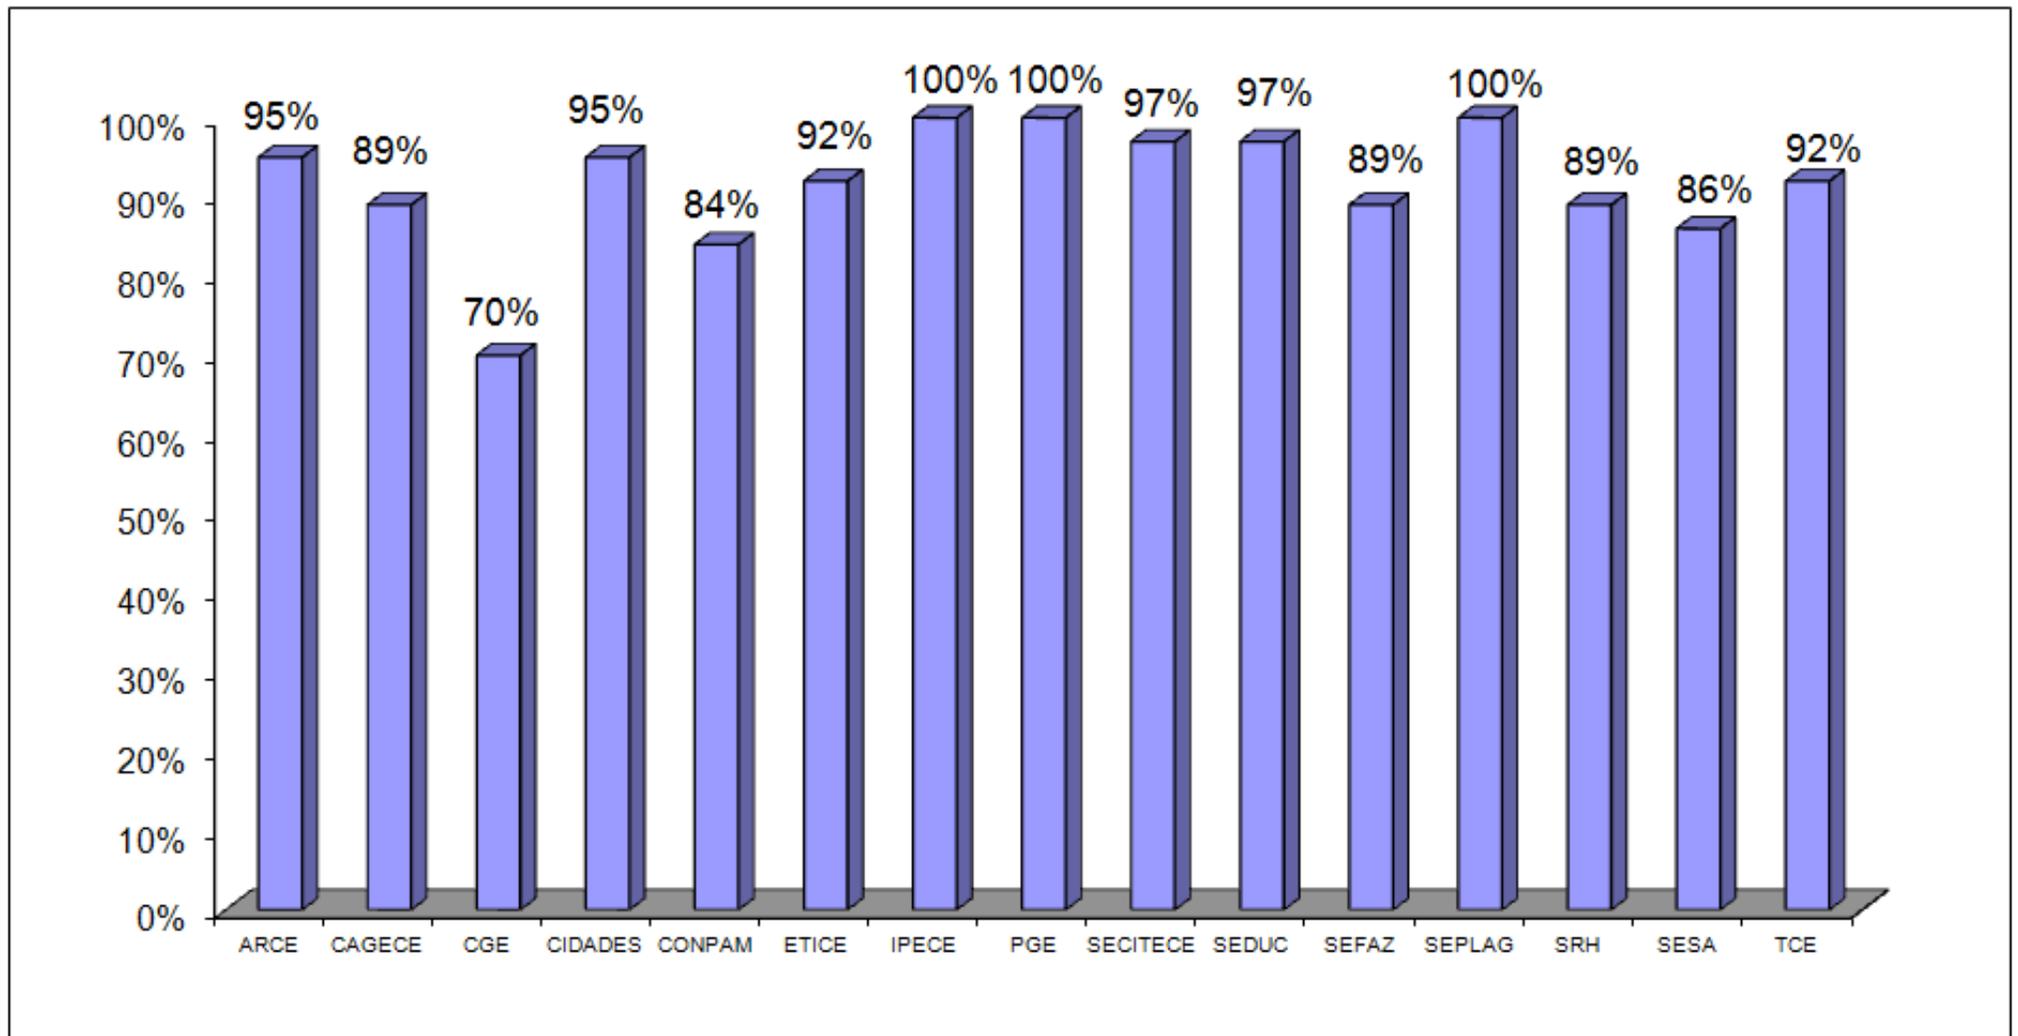

Anexo 5

OPERAÇÃO Swap II

ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO

PROJETO SWAp II

19 DE ABRIL DE 2012

OPERAÇÃO Swap II

PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

- 1 - Apresentação dos Participantes;**
- 2 - Informações sobre a Auditoria do Projeto;**
- 3 - Posição sobre status SWAp III;**
- 4 - Missões do Banco Mundial;**
- 5 - Relatórios Finais;**
- 6 - Evidências de comprovação das metas;**
- 7 - Acompanhamento da Execução dos Programas Elegíveis;**
- 8 - Sumário Execução dos Projetos de Assistência Técnica;**
- 9 - Sumário do Desempenho;**
- 10 - Acompanhamento por Setorial da Execução:**
 - Indicadores Primários e Secundários**
 - Assistência Técnica**

OPERAÇÃO Swap II

1 - APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

OPERAÇÃO Swap II

2 - INFORMAÇÕES SOBRE A AUDITORIA DO PROJETO

2 - Informações sobre Auditoria do Projeto

- ✓ As reuniões setoriais SESA, SEDUC, SECITECE, CIDADES e CAGECE com o TCE sobre os achados do Relatório de 2010 e apresentação do Plano de Ação aconteceram respectivamente nos dias 09, 11 e 13 de abril de 2012. A reunião com SEFAZ, SEPLAG, CGE e PGE aconteceu em 16/04/12. Ficou acordado que os Planos de Ação revisados seriam entregues em:
 - SEDUC: 30/04/12
 - SESA: 23/05/12
 - SECITECE: 30/04/12
 - CIDADES/CAGECE: 30/04/12
 - SEPLAG: 15/05/12
 - CGE: proposta por e-mail em 18/04/12 = 15/05/12
- ✓ Relatório da Auditoria 2011 sendo elaborado pelo TCE para entrega até 30/09/12.

OPERAÇÃO Swap II

3 - POSIÇÃO SOBRE STATUS SWAp III

3 - Posição sobre status do SWAp III

- ✓ Janeiro – Março: Preparação das Análises dos temas do SWAp III Social, Crescimento Econômico, Meio Ambiente e Gestão para apresentação nos Workshops;
- ✓ Abril (19-20/04/12): Missão de Avaliação Ambiental Estratégica com a Consultora Iara Verocai;
- ✓ Maio (21-25/05/12): Realização dos Workshops dos temas Social, Crescimento Econômico, Ambiental e Gestão Pública;
- ✓ Julho – Setembro: Discussão e Negociação da Proposta;
- ✓ Até final de 2012: Assinatura do Contrato.

OPERAÇÃO Swap II

4 - MISSÕES DO BANCO MUNDIAL

4 - Missões do Banco Mundial

- ✓ 20-21/03/12: Missão com a Especialista Anita Fiori sobre análise do Desenvolvimento Econômico;
- ✓ 26-27/03/12: Missão com o Especialista Roland Clarke sobre Análise da Evolução da Gestão Pública;
- ✓ 19-20/04/12: Missão de Avaliação ambiental Estratégica com a Consultora Iara Verocai;
- ✓ 21-25/05/12: Missão de Supervisão SWAp II e Workshops SWAp III

OPERAÇÃO Swap II

5 - RELATÓRIOS FINAIS

5 - Relatórios Finais: Lições e Desempenho

1. Relatório de Lições Aprendidas, Melhores Práticas e Impacto do SWAp II

- ✓ Solicita-se as setoriais que enviem até 15/05/12 sugestões das lições aprendidas, melhores práticas e impacto (já enviado);
- ✓ Envio do Relatório Lições Aprendidas e Melhores Práticas e Impacto ao Banco Mundial até 30/06/12;

2. Relatório de Desempenho do Projeto 2011

- ✓ Relatório de Desempenho do Projeto 2011 elaborado e aguardando as evidências de cumprimento das metas SEDUC até 30/04/12;
- ✓ Envio do Relatório ao Banco Mundial até 30/04/12.

OPERAÇÃO Swap II

6 - EVIDÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO DAS METAS

6 - Evidências de Comprovação das Metas Recebidas

➤ **PRIMÁRIOS: Recebidas comprovação de 18 dos 19 (95%)**

- SEFAZ: Indicadores 1, 2 e 14
- SEPLAG: Indicadores 3 e 4
- SEDUC: Indicadores 5, 6a, 6b, 6c
- SESA: Indicadores 7a, 7b, 8a, 8b, 9
- SRH: Indicador 10
- CAGECE: Indicadores 11a, 11b e 12
- ETICE: Indicador 13

SECUNDÁRIOS: Recebidas comprovação de 13 dos 14 (93%)

- SEFAZ: Indicador 1
- SEPLAG: Indicadores 2 e 3
- PGE: Indicador 4
- SEDUC: Indicador 5
- SESA: Indicadores 7, 8 e 9
- CAGECE: Indicador 10
- ARCE: Indicador 11
- ETICE: Indicador 12
- SECITECE: Indicador 13
- SEMACE: Indicador 14

OBS: Aguarda-se uma parte do indicador primário 5 (Relatório) e o secundário 6 da SEDUC

OPERAÇÃO Swap II

7 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ELEGÍVEIS

7 - Programas Elegíveis: Regra dos 70%

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2011 - **REGRA 70%**

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2011 Jan Dez (a)	Orçamento 2011 - Até 31/12 (b)	Realizado (até 31/03/12) (c)	Meta (até 31/03/12) (d)	Diferença (e) = (d) - (c)	Realizado/Previsto (%) (c)/(b)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	3.268.447	3.268.447	-	2.287.913	2.287.913	0,00%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	162.534.432	162.534.432	124.073.727	113.774.102	(10.299.625)	76,34%	76,34%
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	23.826.799	23.826.799	21.861.549	16.678.759	(5.182.789)	91,75%	91,75%
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	975.497.717	975.497.717	1.185.536.948	682.848.402	(502.688.546)	121,53%	121,53%
SECITECE	194 Formação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento	12.166.208	12.166.208	8.695.912	8.516.346	(179.566)	71,48%	71,48%
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.835.100	2.835.100	415.600	1.984.570	1.568.970	14,66%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	194.927.906	194.927.906	219.573.769	136.449.534	(83.124.235)	112,64%	112,64%
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	19.151.625	19.151.625	15.118.094	13.406.138	(1.711.957)	78,94%	78,94%
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.477.726	3.477.726	2.477.726	2.434.408	(43.318)	71,25%	71,25%
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	34.191.184	34.191.184	32.891.484	23.933.829	(8.957.655)	96,20%	96,20%
TOTAL		1.431.877.144,00	1.431.877.144	1.610.644.809,4	1.002.314.001			
Valor Limite do Desembolso [70% * TOTAL]		1.002.314.001	1.002.314.001					

Notas:

¹ O Programa 033 - Ceará Digital corresponde ao Programa 070 - Ciência, Tecnologia e Inovação em 2012.

² O Programa 048 - Qualidade da Educação Básica corresponde ao Programa 073 - Organização e Gestão da Educação Básica em 2012.

³ O Programa 196 - Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico corresponde ao Programa 070 - Ciência Tecnologia e Inovação em 2012.

Posição em: 31-mar-12


- ✓ Email enviado Tom Kenyon em 18/04/12 solicitando extensão de prazo para os programas 196 e 033;
- ✓ Valores ainda estão sendo revisados pela SEDUC e SESA para o elaboração do IFR na posição de 31/03.

OPERAÇÃO Swap II

8 - SUMÁRIO DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Cumprimento do Plano de Licitações

32 PROJETOS NO PLANO DE LICITAÇÃO

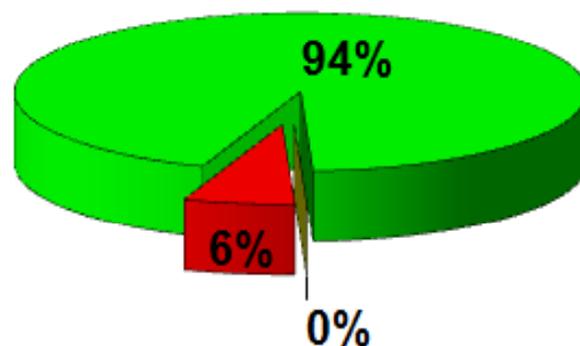

■ Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
■ Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia
■ Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses



Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações



Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia



Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses

30 PROJETOS:

ARCE (1), CGE (2,3), CIDADES(4), CONPAM (5,6), ETICE (7,8), IPECE (09,10,11,12,13), PGE(14,15), SEDUC (16,18,19,20), SEPLAG (22,23,24,25), SESA (26,27,28,29,30), TCE (31, 32).


-

2 PROJETOS:

SEDUC (17), SEFAZ (21).

Cumprimento do Plano de Licitações

16 PROJETOS EM EXECUÇÃO

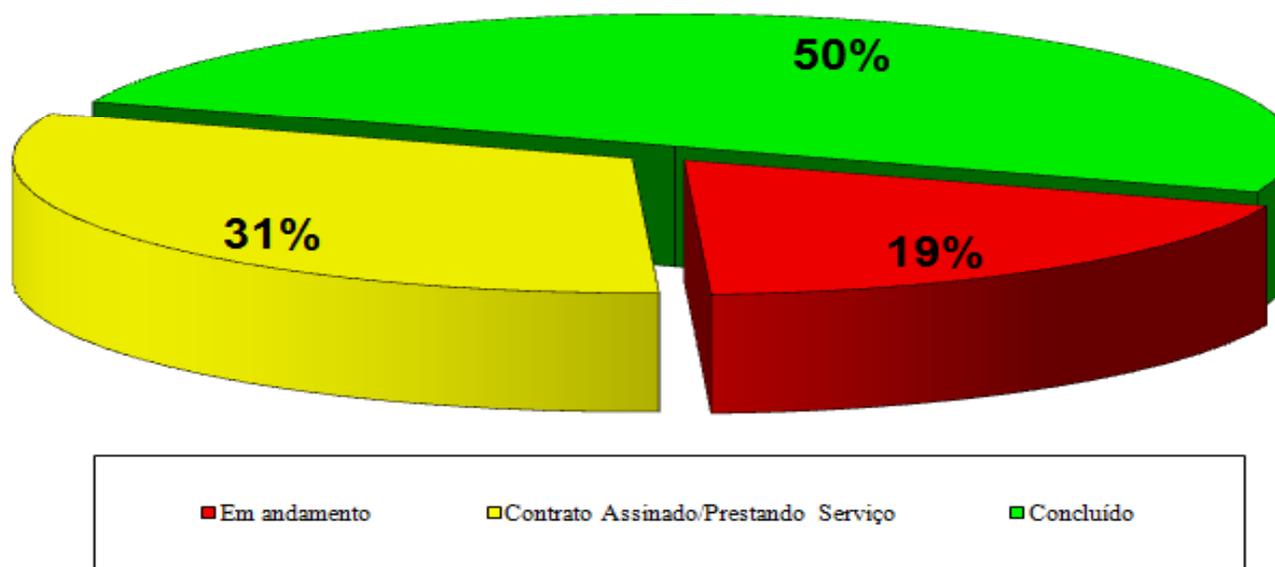

6 em andamento=

IPECE (12), PGE (15), SEDUC (20), SEFAZ (21), SEPLAG (23), TCE(31).


10 Contratos assinados =

CGE (2,3), CIDADES(4), CONPAM (6), ETICE (8), PGE (14), SEDUC (19), SEPLAG(22,24,25).

16 Concluídos = ARCE (1), COMPAM (5), ETICE (7), IPECE (09, 10, 11, 13), SEDUC (16,17, 18), SESA (26, 27, 28, 29, 30), TCE(32).

Cumprimento do Plano de Licitações

6 PROJETOS EM ANDAMENTO:

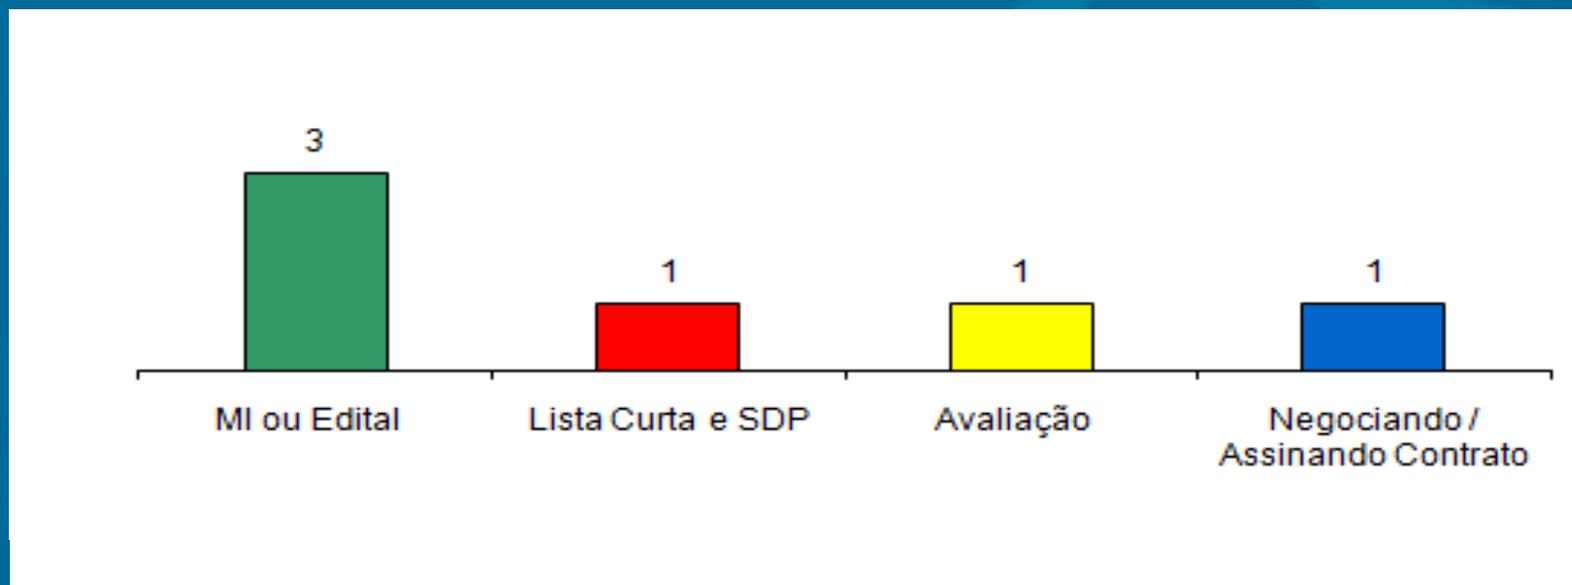

MI ou Edital = 3

Lista Curta e SDP = 1

Avaliação = 1

Negociação Contrato = 1

IPECE (12), PGE (15), TCE (31).

SEPLAG (23).

SEFAZ (21).

SEDUC (20).

OPERAÇÃO Swap II

9 - SUMÁRIO DO DESEMPENHO

9 - Sumário do Desempenho 2011: Indicadores Primários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011						
Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento	Entrega de Evidências
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).	1.293,0 milhões	1.882,2 milhões	cumprido	03/02/2012
		2. Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).	≤0,35	0,297695	cumprido	03/02/2012
	SEPLAG	3. Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG. ¹	15	15	cumprido	30/03/2012
		4. Número de "Relatórios Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG. ¹	7	7	cumprido	11/04/2012
Educação	SEDUC	5. Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas. ¹	≥90%	100%	cumprido	30/03/2012
		6.a Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: "Alfabetização na Idade Certa".	≥80%	100%	cumprido	16/03/2012
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização na Idade Certa" entregue às escolas.	≥80%	100%	cumprido	16/03/2012
		6.c Percentual de gerentes do programa "Alfabetização na Idade Certa" remunerados pelo Estado.	60%	100%	cumprido	16/03/2012
Saúde	SESA	7a. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	30%	76,40%	cumprido	15/02/2012
		7b. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	30%	30,70%	cumprido	14/03/2012
		8a. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.	12	13	cumprido	15/02/2012
		8b. Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.	1	-	Não será cumprido (1)	14/03/2012
		9. Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.	15	15	cumprido	15/12/2011
Água & Saneamento	SRH	10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥37%	39%	cumprido	10/02/2012
		11.a Número de ligações urbanas de água.	275.122	315.803	cumprido	07/02/2012
	CAGECE	11.b Número de ligações de esgotos.	124.775	139.845	cumprido	07/02/2012
		12. Percentual de perda de água.	≤27%	26,03% ⁵	cumprido	07/02/2012
Negócios & Inovação	SEFAZ ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	4.365.700	4.387.816	cumprido	09/02/2012
		14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥35%	80,00%	cumprido	06/03/2012

(1) Banco Mundial irá considerar um *Waiver* mas solicitou plano de ação à SESA para a realização da certificação.

9 - Sumário do Desempenho 2011: Indicadores Secundários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011						
Sector	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento	Entrega de Evidências
Setor Público	SEFAZ	1. Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário.	≤ 10%	3,26%	cumprido	08/03/2012
	SEPLAG	2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.	2	2	cumprido	25/01/12 e 02/02/12
		3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	≤ 3 meses	1,24	cumprido	01/02/2012
	PGE	4. Percentual processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato reduzidos	≤ 10,5%	9,76%	cumprido	14/02/2012
Educação	SEDUC	5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa" (uma em 2009 e uma em 2011).	1	1	cumprido	01/12/2011
		6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.	80%	-	30/04/2012	
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.468.331	7.028.280	cumprido	14/03/2012
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva à internação.	2	2	cumprido	01/02/2012
		9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	60%	70,13%	cumprido	15/02/2012
Água & Saneamento	ARCE CAGECE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	22,72%*	25,75%	cumprido	07/02/2012
		11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).	58%	20,34%	Não será cumprido	24/01/2012
Negócios & Inovação	ETICE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).	3	3	cumprido	09/02/2012
	SECITECE	13. Número de serviços tecnológicos realizados.	47.181	43.655	Não será cumprido	10/02/2012
Meio Ambiente	CONPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	≥ 20%	20,80%	cumprido	12/03/2012

OPERAÇÃO Swap II

10 – ACOMPANHAMENTO POR SETORIAL

OPERAÇÃO Swap II

SEFAZ

Projeto 21: Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.

- **Responsável:** Rejane Muniz
- **Categoria de Licitação:** BENS
- **Valor:** US\$ 300,00 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2011 - Abril 2012
- **Estágio Previsto:** Contrato assinado.
- **Estágio Atual:** Documentação da 11^a colocada em análise na SEFAZ.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

OPERAÇÃO Swap II

SEPLAG

Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Indicador 3: Número de Secretarias Setoriais com Relatórios Anuais de Desempenho Validados pela SEPLAG e pelo COGERF e Colocados na Página Eletrônica da SEPLAG.

- **Meta 2011: 15**
- **Posição em 31/12: 15**
- **Posição em 31/12 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento: cumprido.**
- **Comentário: Relatórios publicados no site em 30/03/2012.**

Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Indicador 4: Número de “Relatórios Produto-Resultado” (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- **Meta 2011: 7**
- **Posição em 31/12: 7**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de cumprimento: Cumprido.**
- **Comentário: Relatórios publicados no site em 13/04/2012.**

Projeto 23: Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras.

- **Responsável:** Soraya Quixadá
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 100 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2010 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Avaliando propostas.
- **Estágio Atual:** Avaliando propostas.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 


OPERAÇÃO Swap II

SEDUC

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

Indicador 5: Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com o relatório de melhores práticas.

- **Meta 2011:** $\geq 90\%$
- **Posição em 31/12:** 100%
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento:** Pelo Ofício Nº.1023/12 de 30/03/2012, a SEDUC compromete-se em enviar até o dia 30/04/2012 o Relatório referente à divulgação e às estratégias de disseminação de boas práticas junto aos municípios e escolas das Redes Municipal e Estadual de ensino em substituição ao Relatório de Melhores Práticas, que só será concluído em setembro de 2012 como também a possibilidade de envio do rascunho do Relatório de Boas Práticas, para submissão ao BM após 30/06/2012.

Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- **Meta 2011:** 80%
- **Posição em 31/12:** -
- **Posição em 31/12 em relação a meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento:** A perspectiva é de possibilidade média de cumprimento da meta até 30/04/12.
- **Comentário:** Pelo Ofício N°.1085/12 de 03/04/2012 a SEDUC compromete-se em enviar até 30/04/2012 os dados preliminares da evidência de cumprimento do indicador.

Projeto 17: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 2ª Etapa.

- **Responsável:** Eneida Machado
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 36,85 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2010 - Outubro 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Aguardando entrega do último produto. SEDUC e IPECE reuniram em 02/04/12 com Empresa IETS que prometeu Relatório revisado até 30/04/12.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Projeto 20: Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (3ª etapa).

- **Responsável:** Eneida Machado e Kennedy
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 146,95 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2011 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Contrato sendo assinado até 19/04/12.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

ETICE

Negócios & Inovação

Empresa de Tecnologia do Ceará - ETICE

Projeto 8: Desenvolvimento de Sistema de Avaliação de Resultados do Cinturão Digital do Ceará.

- **Responsável:** Denise Olsen
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 51,72 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2011 – Setembro 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ████████████████████

OPERAÇÃO Swap II

PGE

Projeto 14: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Treinamentos e Seminários na área de Licitações

- **Responsável:** Tarso e Fernando Grangeiro
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 173,69
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2010 – Maio 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 15: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Compra de Equipamento.

- **Responsável:** Tarso e Fernando Grangeiro
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 26,31
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2012 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Publicando Edital.
- **Estágio Atual:** Elaborando edital.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

TCE

Projeto 31: Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de soluções integradas de Gerenciamento eletrônico de documento e informações do TCE (TCE 100% digital). (Parte A) – Digitalização.

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor:** US\$ 72,4 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2010 – Março 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando Serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando Serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

**Projeto 31: Fortalecimento Institucional do TCE -
Contratação de soluções integradas de Gerenciamento
eletrônico de documento e informações do TCE (TCE
100% digital). (Parte B) – Storage**

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor:** US\$ 196,8 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2012/Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Publicação Edital
- **Estágio Atual:** Edital publicado – Pregão 23/04/12
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 32: Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação. (Parte B) – Inscrição CISA.

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US 6,9 mil
- **Método de Aquisição:** Contratação Direta
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** novembro 2011- junho 2012
- **Estágio Previsto:** prestando serviço.
- **Estágio Atual:** prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OBRIGADA!

OPERAÇÃO
Swap II

The background of the slide is a solid blue color. On the right side, there is a faint, light blue graphic of a globe with latitude and longitude lines. On the left side, there are several vertical bars of varying shades of blue and white, some with horizontal lines, creating a modern, abstract design.

OPERAÇÃO Swap II

**ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO
DAS SETORIAIS - COMPLETA**

OPERAÇÃO Swap II

SEFAZ

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ


Indicador 1: Saldo Fiscal Corrente do Estado (Receita Correntes menos Despesas Correntes).

- **Meta 2011:** R\$ 1.293,00 milhões
- **Posição em 31/12:** R\$ 1.882,18 milhões
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** As receitas e as despesas correntes se comportam conforme o esperado.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta superada.

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Saldo Fiscal Corrente do Estado

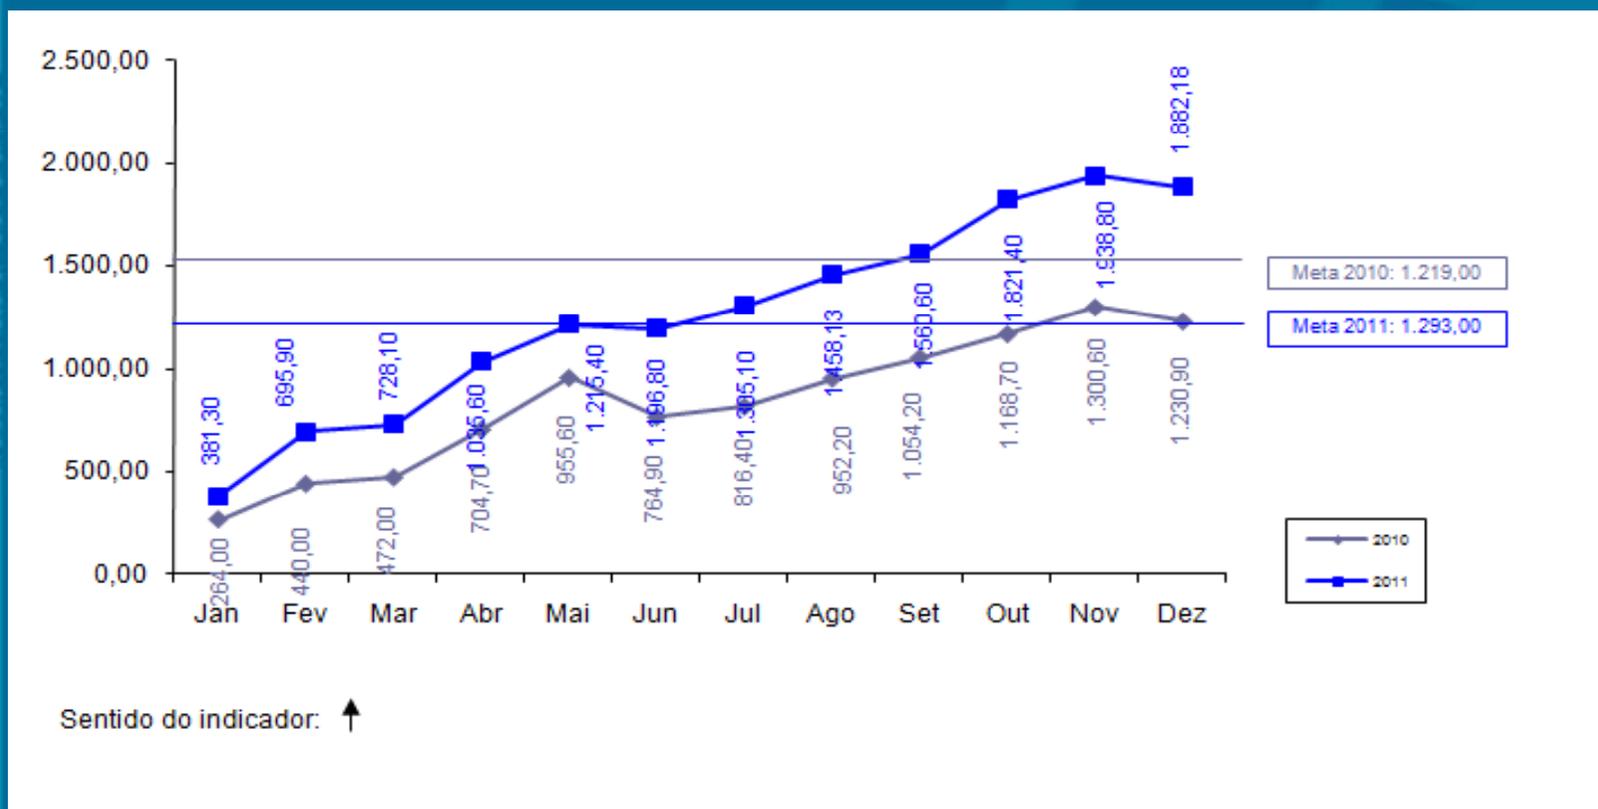

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ


Indicador 2: Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).

- **Meta 2011:** $\leq 0,35$
- **Posição em 31/12:** 0,297695
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Não há nenhuma indicação de que haja concentração de arrecadação de ICMS em algum dos setores estudados que possa aumentar o índice além da meta.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores

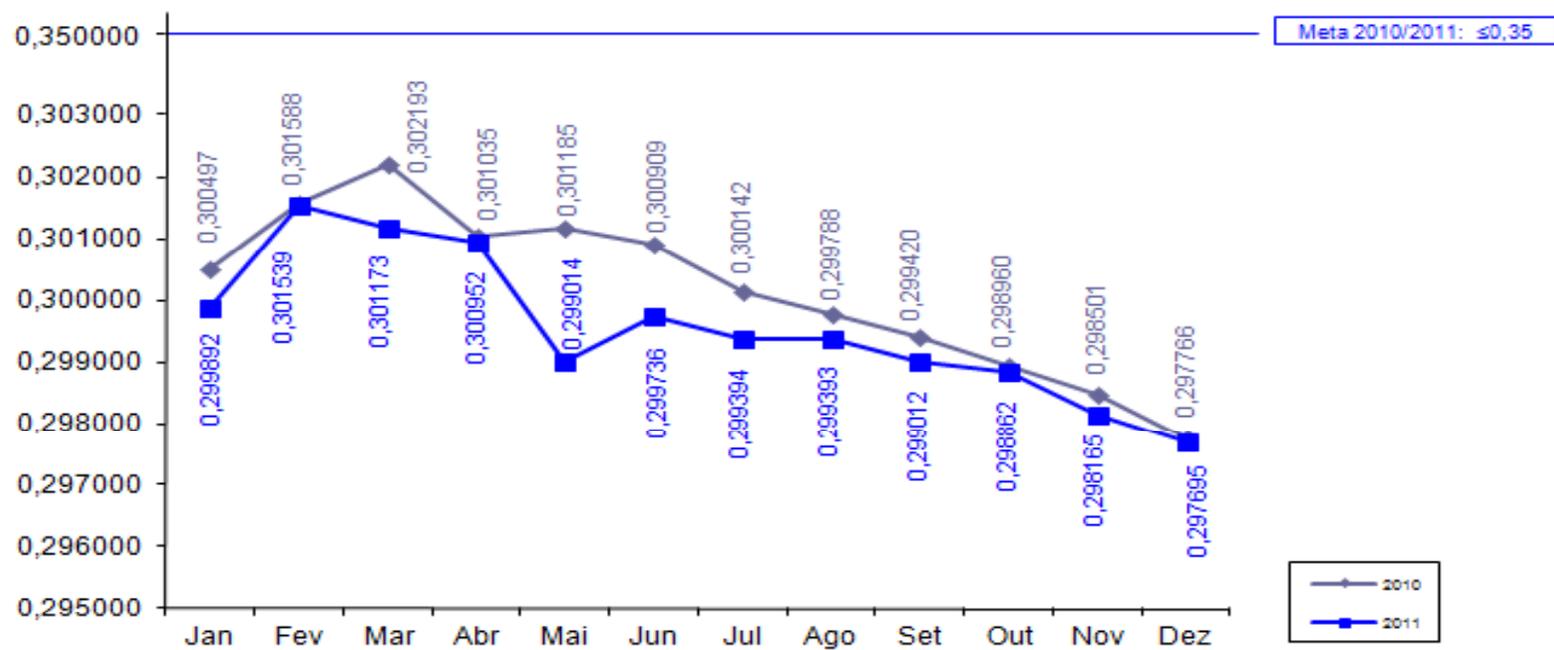

Sentido do indicador: ↓

Negócios e Inovação

Secretaria da Fazenda - SEFAZ


Indicador 14: Percentual de registros empresariais no CGF concluídos em 72 horas.

- **Meta 2011:** $\geq 35,00\%$
- **Posição em 31/12:** 80%
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Com a vigência da Lei Complementar nº. 128/2010, as empresas do MEI são cadastradas automaticamente na SEFAZ/CE a partir do registro informado pela Receita Federal. Essas informações foram disponibilizadas por este órgão desde abril de 2010 e foram introduzidas no Estatístico do Cadastro da SEFAZ/CE nesta data.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Negócios e Inovação

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Percentual de registros empresariais no CGF concluídos em 72 horas

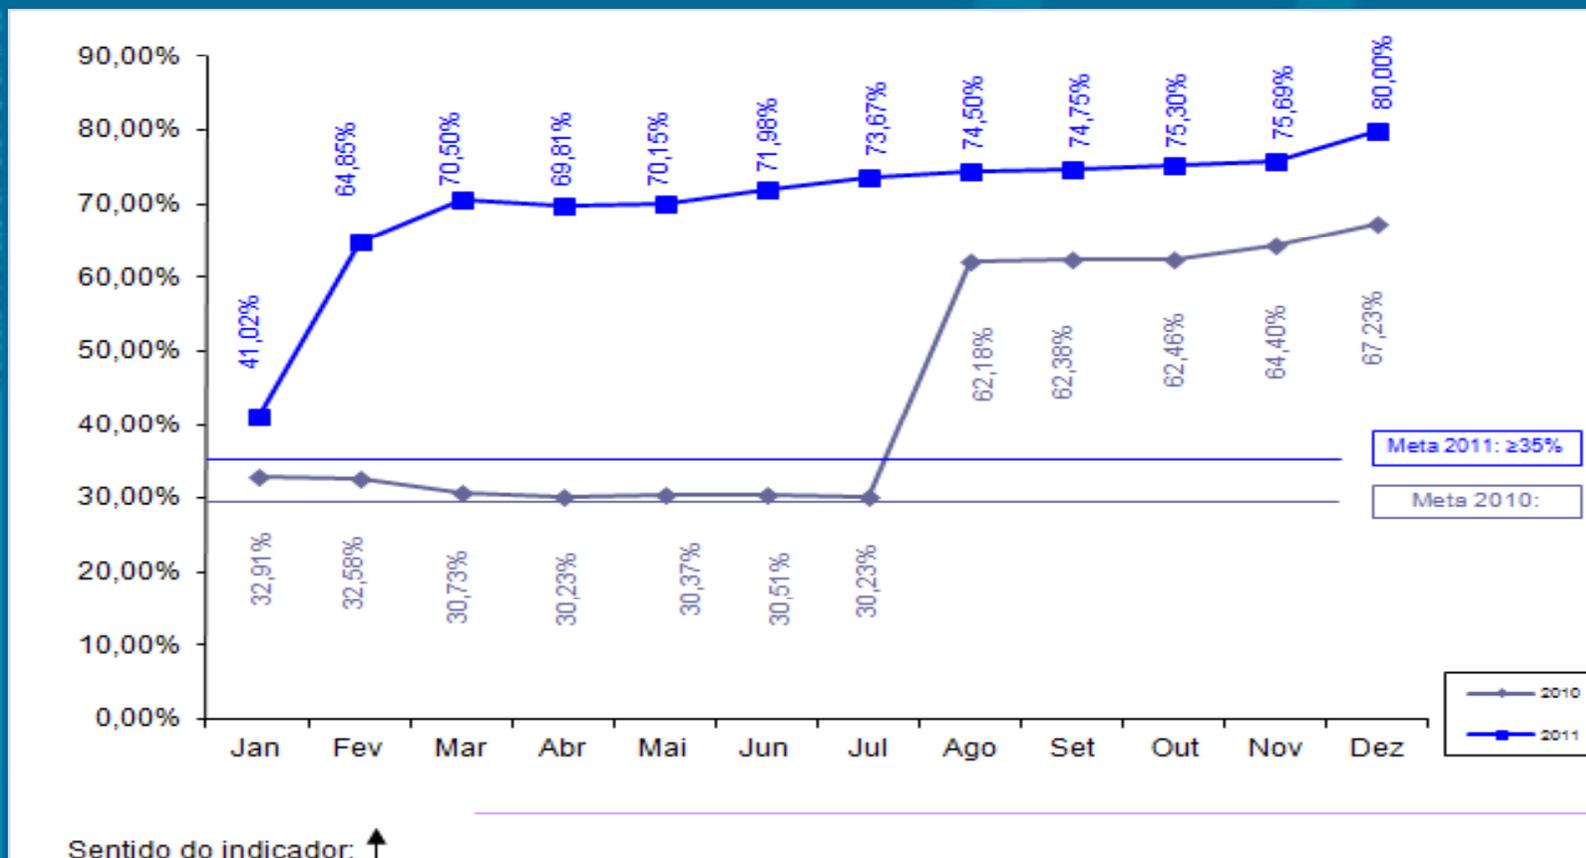

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ


Indicador 1: Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário (% dos contribuintes ativos do regime de recolhimento normal que declararam saldo devedor na DÍEF que a SEFAZ inscreve na Dívida Ativa).

- **Meta 2011: $\leq 10,00\%$**
- **Posição em 31/12: 3,26% (valor referente ao período de março a julho 2011)**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Comentários: Acordado com o BM que o indicador seria medido três vezes em 2011, com informações quadrimestrais referente ao período de cinco meses. Informação fornecida após a missão (19/12/11).**

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário

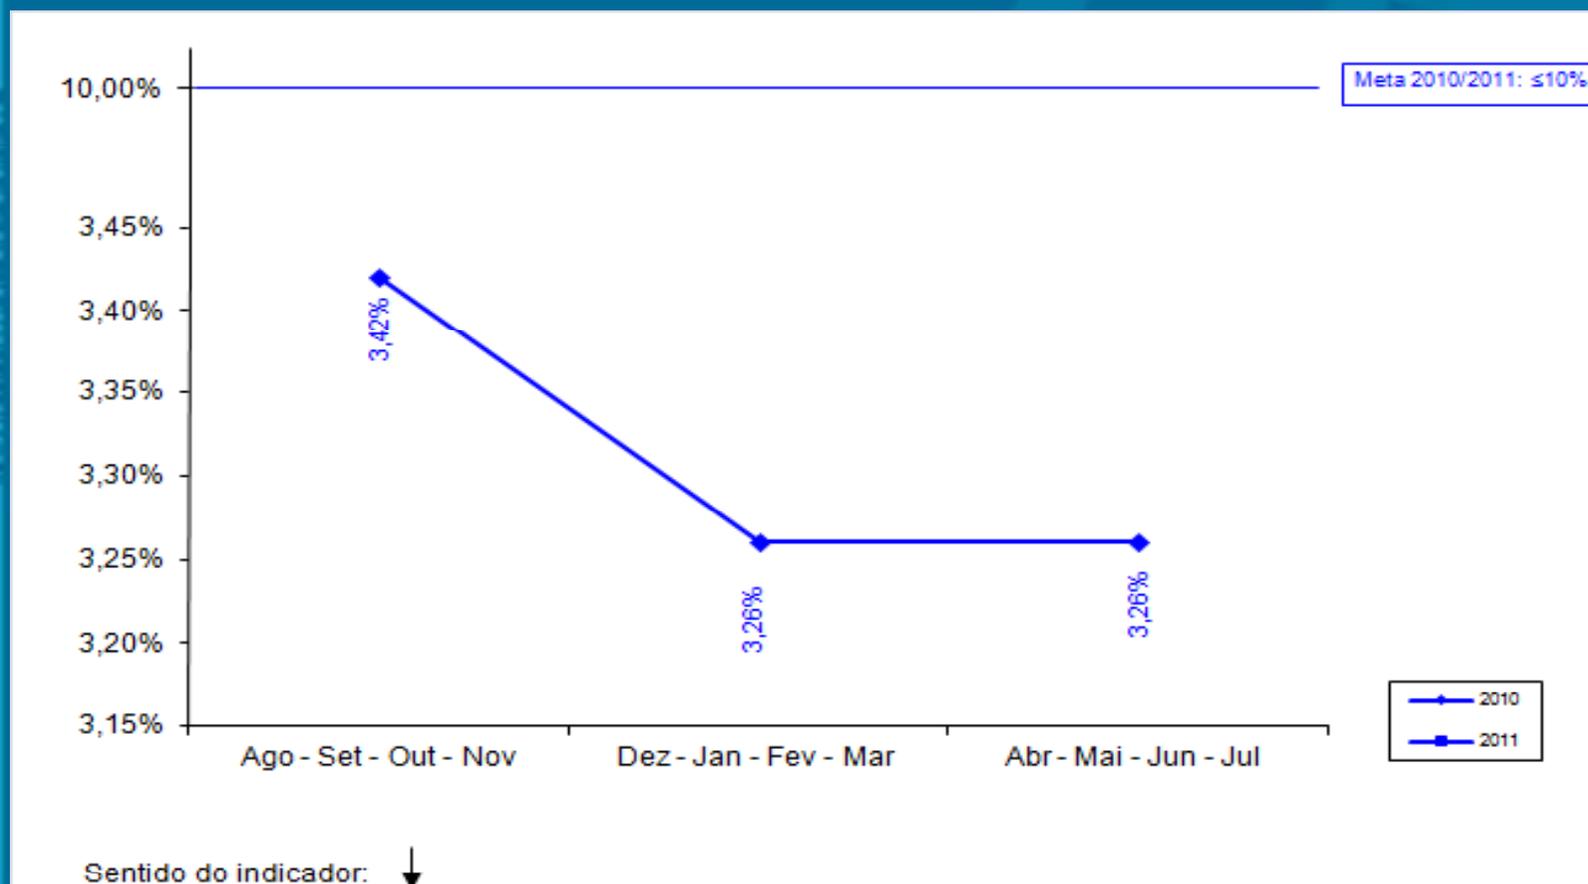

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Projeto 21: Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.

- **Responsável:** Rejane Muniz
- **Categoria de Licitação:** BENS
- **Valor:** US\$ 300,00 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2011 - Abril 2012
- **Estágio Previsto:** Contrato assinado.
- **Estágio Atual:** Fase de Habilitação, aguardando documentação da 11ª licitante.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████
-

OPERAÇÃO Swap II

SEPLAG

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Indicador 3: Número de Secretarias Setoriais com Relatórios Anuais de Desempenho Validados pela SEPLAG e pelo COGERF e Colocados na Página Eletrônica da SEPLAG.

- **Meta 2011: 15**
- **Posição em 31/12: 15**
- **Posição em 31/12 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento: cumprido.**
- **Comentário: Relatórios publicados no site em 30/03/2012.**

Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Indicador 4: Número de “Relatórios Produto-Resultado” (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- **Meta 2011: 7**
- **Posição em 31/12: 7**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de cumprimento: Cumprido.**
- **Comentário: Relatórios publicados no site em 13/04/2012.**

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

Indicador 2: Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembleia.

- **Meta 2011: 2**
- **Posição em 31/12: 2**
- **Posição em 31/12 em relação à meta:**
- **Perspectiva de cumprimento: Cumprido**
- **Informações disponíveis nos links:**
- [www.seplag.ce.gov.br/Planejamento/Lei Orçamentária Anual 2012](http://www.seplag.ce.gov.br/Planejamento/Lei%20Orçamentária%20Anual%202012)
- [www.seplag.ce.gov.br/Planejamento/Mensagem à AL/2012](http://www.seplag.ce.gov.br/Planejamento/Mensagem%20à%20AL/2012)

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

Indicador 3: Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.


- **Meta 2011:** ≤ 3 meses
- **Posição em 31/12:** 1,24 meses*
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento:** Meta cumprida.

***A média anual do indicador para 2011 foi de 1,99 meses.**

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades

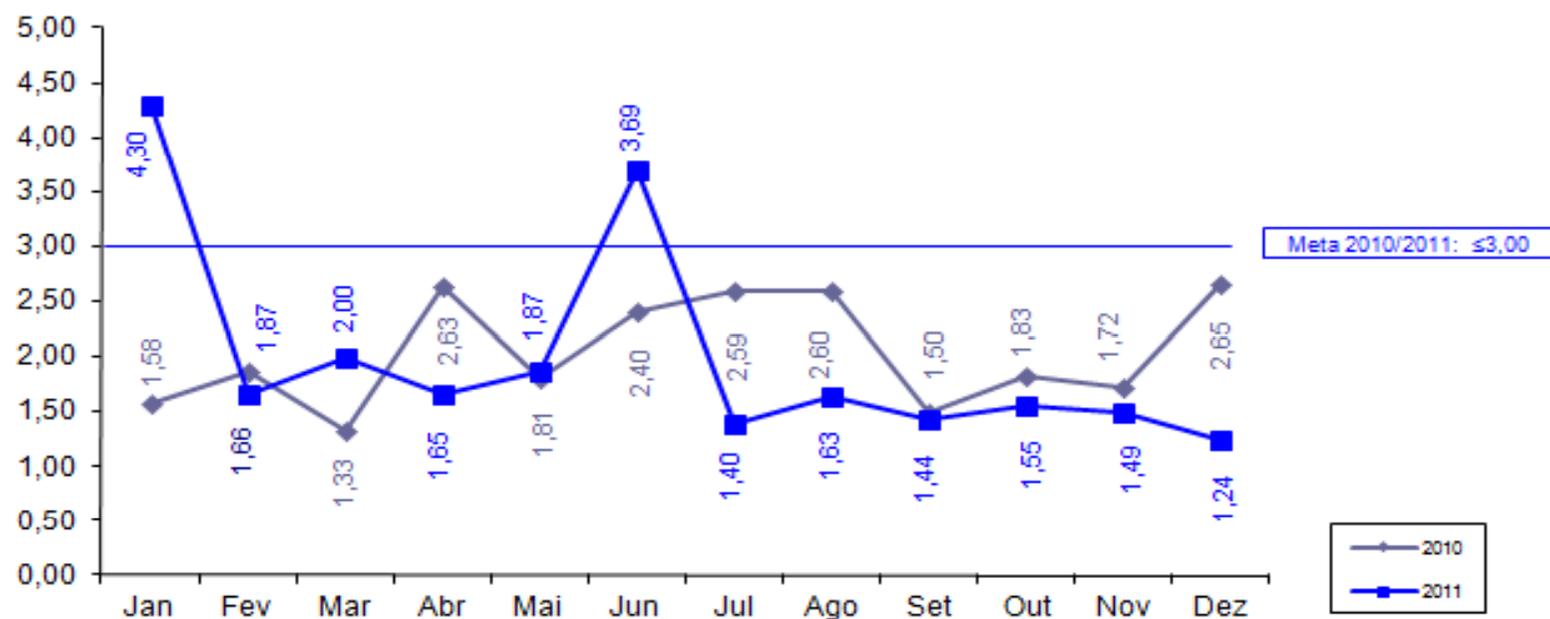

Sentido do indicador: ↓

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Projeto 22: Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Sérgio Lage e Fernanda Salles
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 106,50 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2009 – Abril 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 23: Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras.

- **Responsável:** Soraya Quixadá
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 100 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2010 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Avaliando propostas.
- **Estágio Atual:** Avaliando propostas.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 24: Realização de ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do Governo à sociedade em geral e às entidades representativas das empresas.

- **Responsável:** Soraya Quixadá
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 107,60 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2010 – Maio 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 25: Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Mário Fracalossi
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 102,36 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Outubro 2009 – Maio 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

SEDUC


OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

Indicador 5: Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com o relatório de melhores práticas.

- **Meta 2011:** $\geq 90 \%$
- **Posição em 31/12:** 100%
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento:** Pelo Ofício N.º.1023/12 de 30/03/2012, a SEDUC compromete-se em enviar até o dia 30/04/2012 o Relatório referente à divulgação e às estratégias de disseminação de boas práticas junto aos municípios e escolas das Redes Municipal e Estadual de ensino em substituição ao Relatório de Melhores Práticas, que só será concluído em setembro de 2012 como também a possibilidade de envio do rascunho do Relatório de Boas Práticas, para submissão ao BM após 30/06/2012.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


Indicador 6a: Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças “Alfabetização na Idade Certa”.

- **Meta 2011: 80%**
- **Posição em 31/12: 100%**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida**

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças “Alfabetização na Idade Certa”

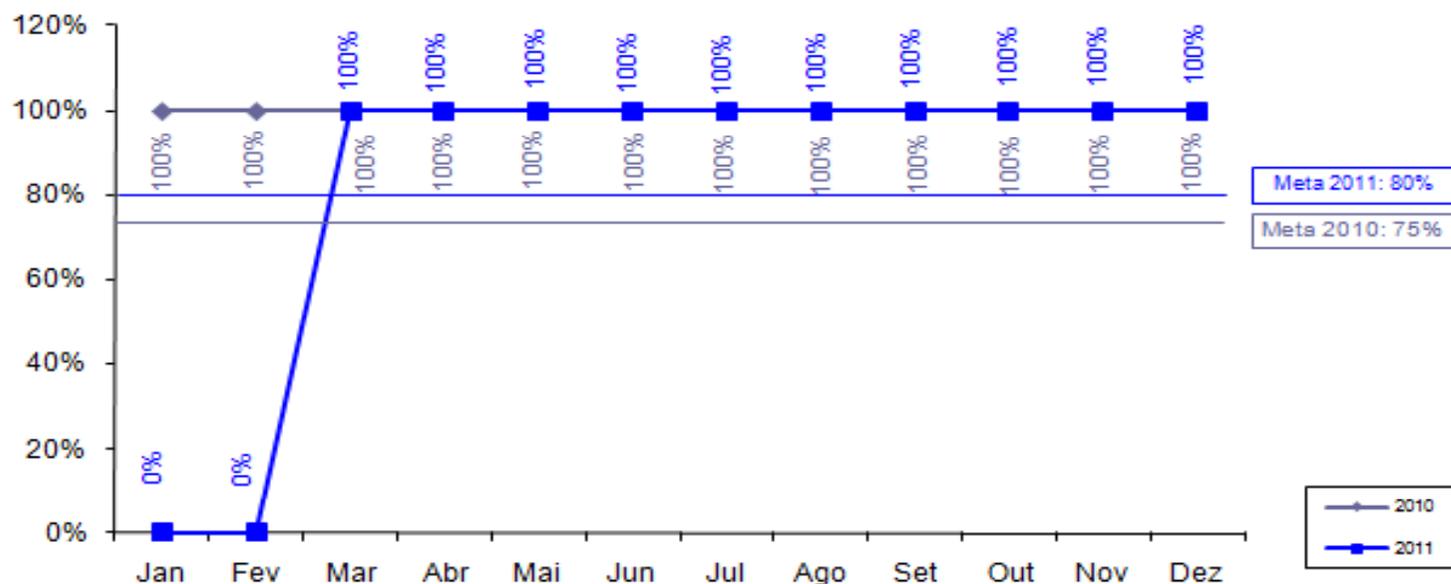


Sentido do indicador: ↑

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


Indicador 6b: Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático p/ o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.

- **Meta 2011:** $\geq 80\%$
- **Posição em 31/12:** 100%
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** meta cumprida

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas

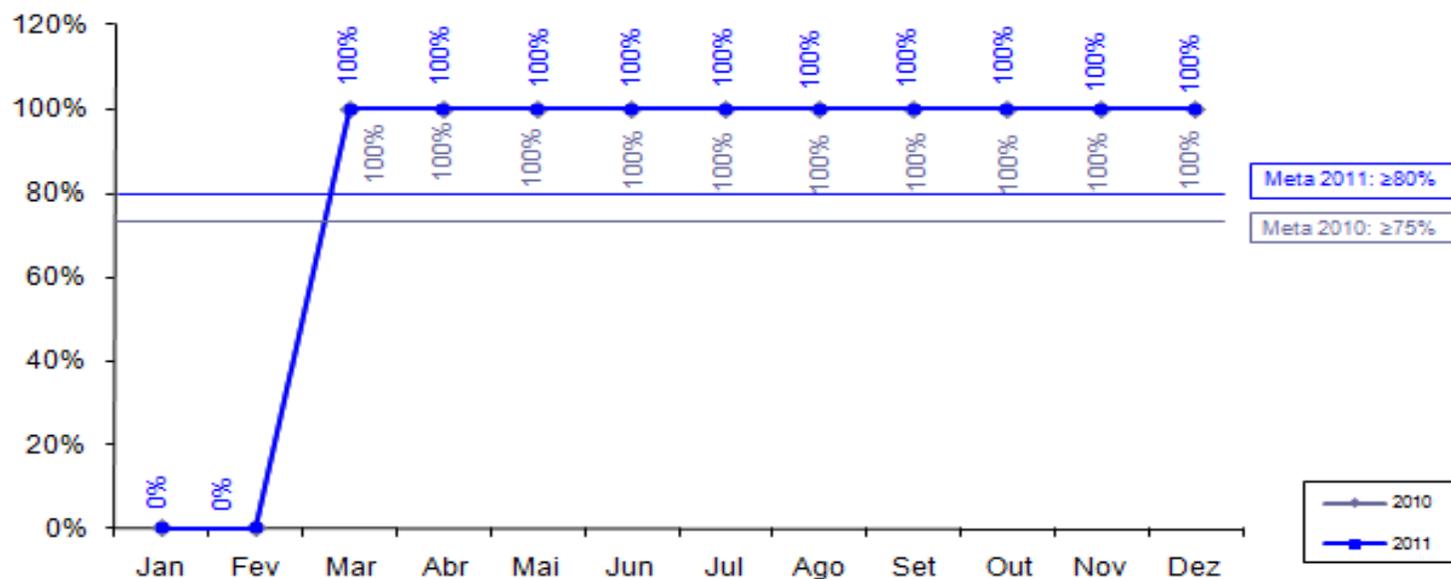

Sentido do indicador: ↑

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


Indicador 6c: Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.

- **Meta 2011: 60%**
- **Posição em 31/12: 100%**
- **Posição em 31/12 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida**

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado

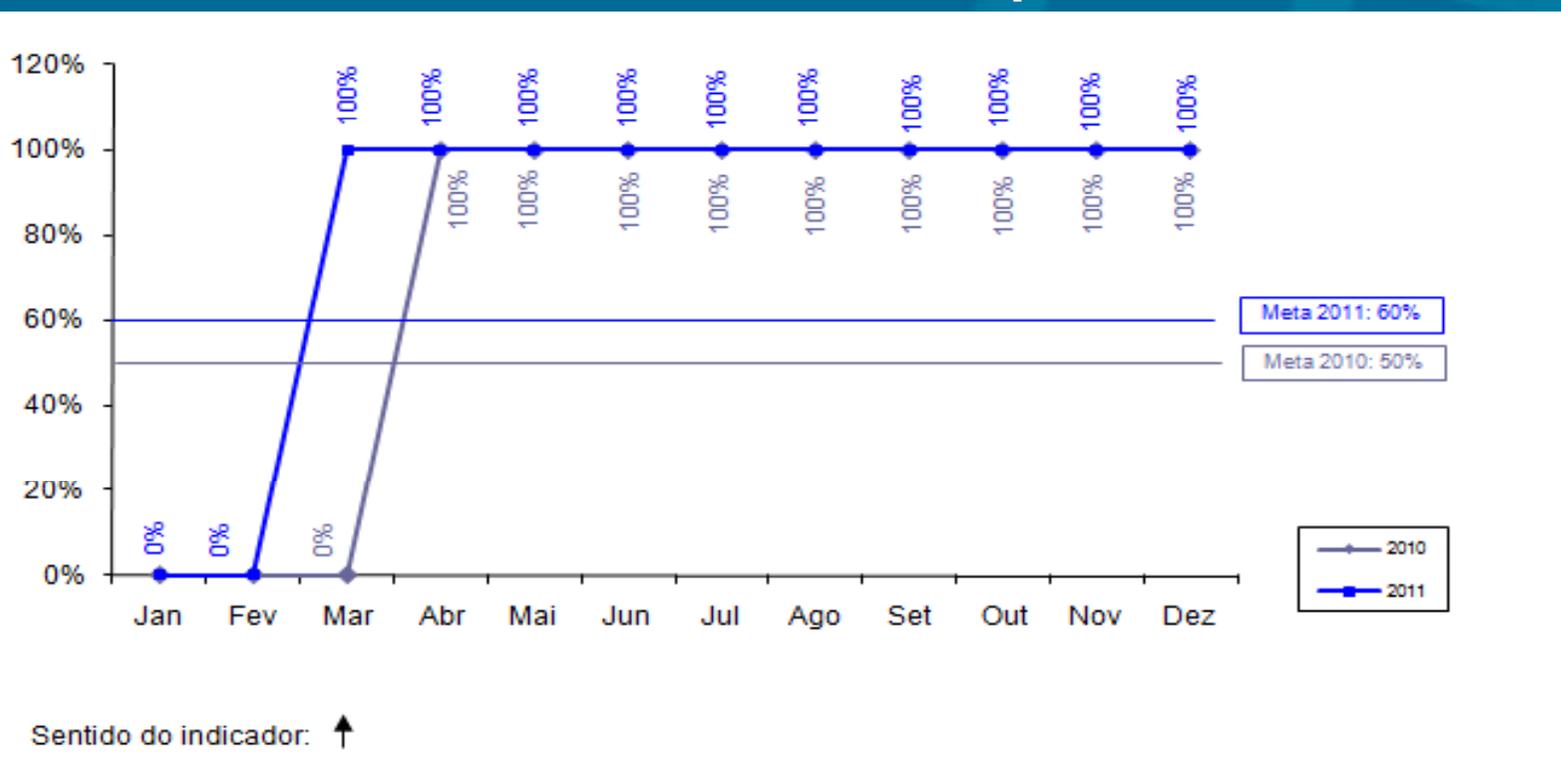


OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Educação

Secretaria de Educação - SEDUC

Indicador 5: Avaliação da implementação municipal do programa “Alfabetização da Idade Certa” (uma em 2009 e uma em 2011).

- **Meta 2011: 1**
- **Posição em 31/12: 1**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida em 08/12/2011.**

Educação

Secretaria de Educação - SEDUC

Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- **Meta 2011:** 80%
- **Posição em 31/12:** -
- **Posição em 31/12 em relação a meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento:** A perspectiva é de possibilidade média de cumprimento da meta até 30/04/12.
- **Comentário:** Pelo Ofício N°.1085/12 de 03/04/2012 a SEDUC compromete-se em enviar até 30/04/2012 os dados preliminares da evidência de cumprimento do indicador.


OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Projeto 16: Avaliação do Programa E-Jovem.

- **Responsável:** Eneida Machado
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 72,90 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2009 - Setembro 2010
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 


Projeto 17: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 1ª Etapa.

- **Responsável:** Eneida Machado
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 35,36 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2009 – Setembro 2010
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 17: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 2ª Etapa.

- **Responsável:** Eneida Machado
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 36,85 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2010 - Outubro 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Aguardando entrega do último produto. SEDUC e IPECE reuniram em 02/04/12 com Empresa IETS que prometeu Relatório revisado até 30/04/12.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Projeto 18: Serviço de consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Eneida Machado e Kennedy
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 93,94 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2010 - Agosto 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 19: Serviço de consultoria para Fase 2 da Implantação de um Projeto Técnico-Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Eneida Machado e Kennedy
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 180,47mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2011 – Abril 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 20: Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (3ª etapa).

- **Responsável:** Eneida Machado e Kennedy
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 146,95 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2011 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Contrato sendo assinado até 19/04/12.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

SESA

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA


Indicador 7a: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.

- **Meta 2011: 30,0%**
- **Posição em 31/12: 76,40%**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida**
- **Comentários: Relatório encaminhado em 12.03.2012.**

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ

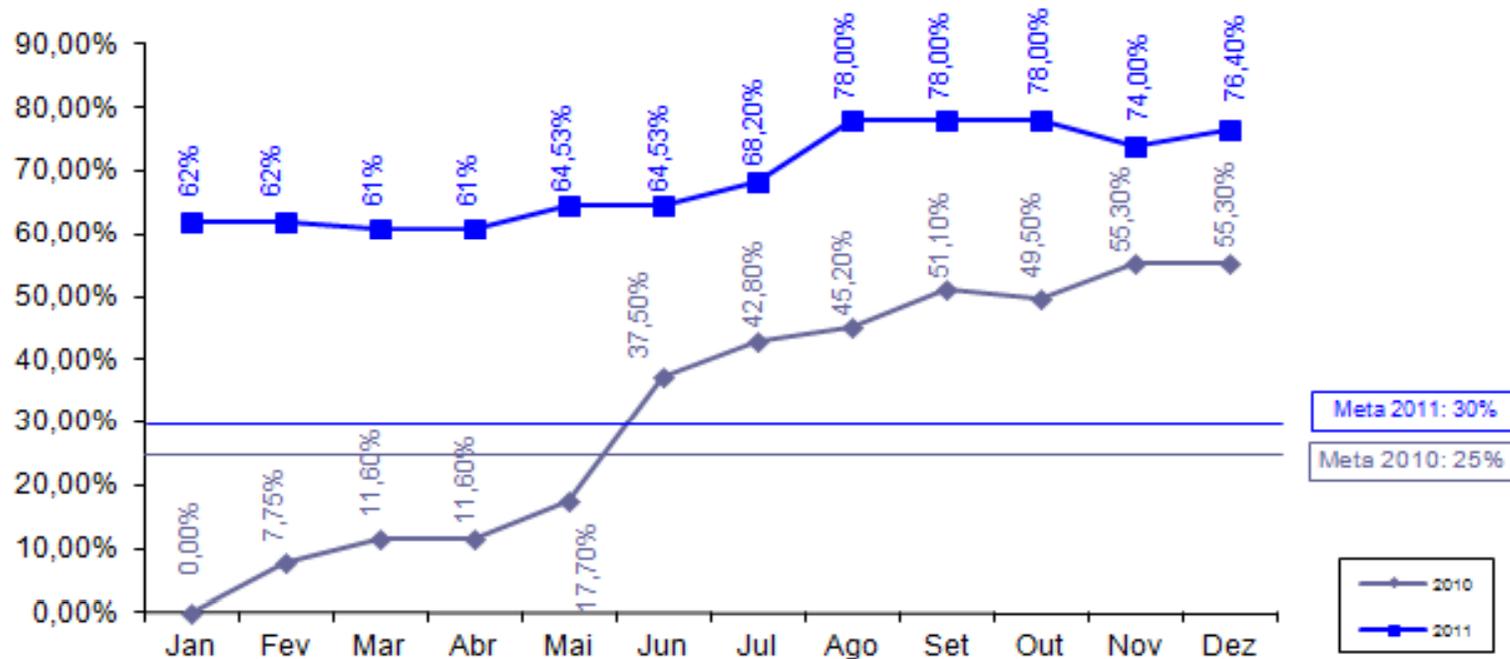

Sentido do indicador: ↑

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Indicador 7b: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.

- **Meta 2011: 30%**
- **Posição em 31/12: 30,7%**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: cumprido**
- **Comentários: O relatório enviado em 14.03.2012.**

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA


Indicador 8a: Número de hospitais públicos e particulares no Estado (Hospital Polo) licenciados de acordo com a Lei nº.6.437/1977.

- **Meta 2011: 12**
- **Posição em 31/12: 13**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: ██████████**
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida**

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei nº. 6.437/1977

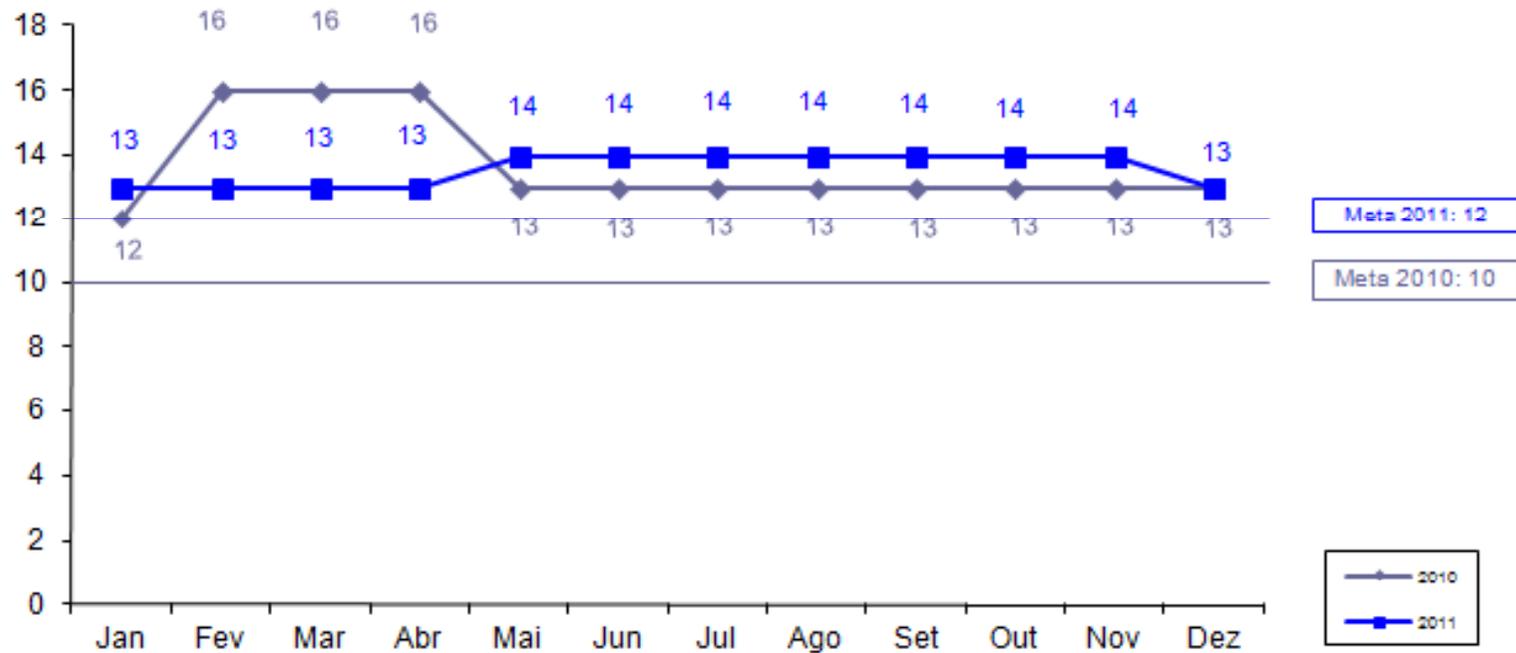

Sentido do indicador: ↑

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Indicador 8b: Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.

- **Meta 2011:** 1
- **Posição em 31/12:** -
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** ██████████
- **Perspectiva de Cumprimento:** meta não será cumprida.
- **Comentários:** Encaminhada nota técnica solicitando considerar indicador como cumprido.

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA


Indicador 9: Número de hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.

- **Meta 2011: 15**
- **Posição em 31/12: 15**
- **Posição em 31/12 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.**

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Nº. de hospitais públicos e particulares no Estado com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos à SESA

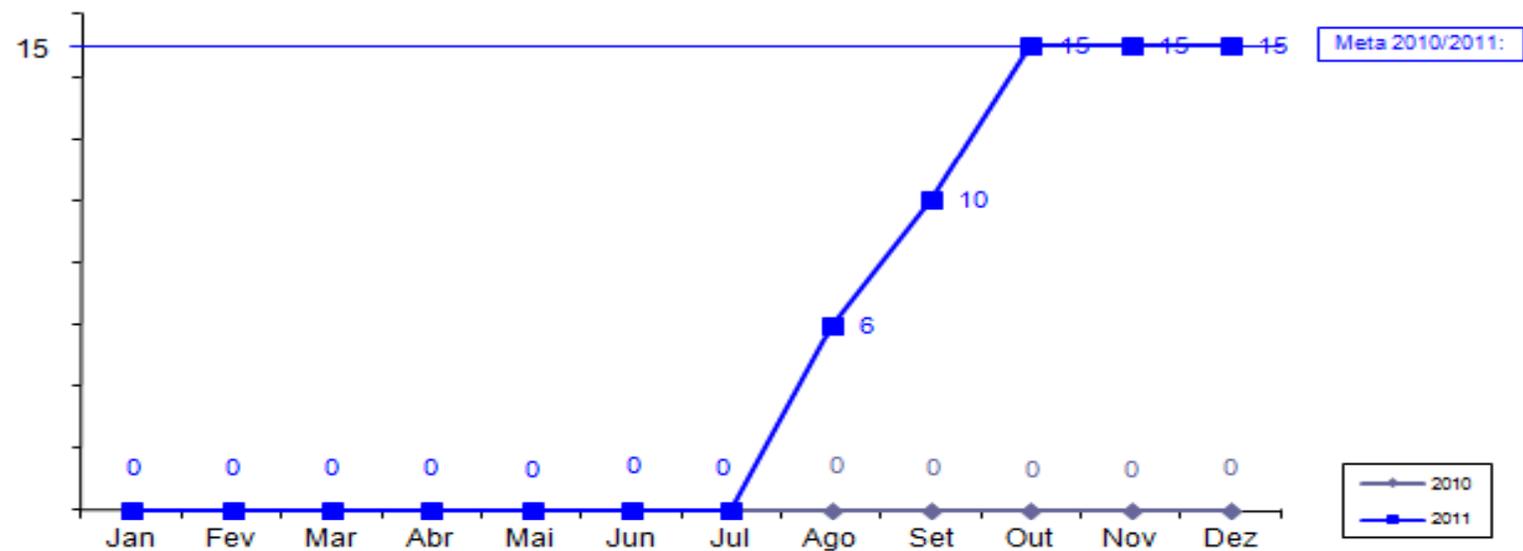

Sentido do indicador: ↑

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA


Indicador 7: População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.

- **Meta 2011:** 6.468.331
- **Posição em 31/12:** 7.028.280
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida. Dados de dezembro de 2011, enviados em 14.03.2012.

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família

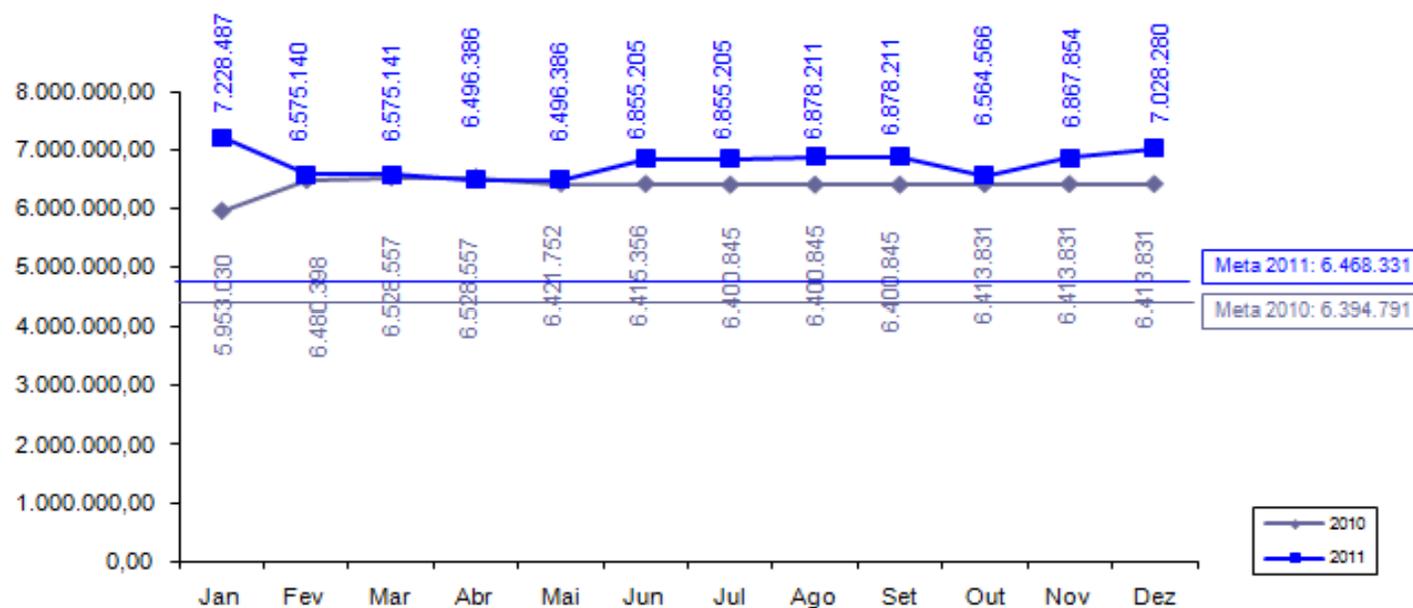

Sentido do indicador: ↑

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Indicador 8: Relatórios semestrais do “Grupo da Água” para combater a diarreia infantil que leva à internação.

- Meta 2011: 2
- Posição em 31/12: 2
- Posição em 31/12 em relação à meta: 
- Perspectiva de Cumprimento: Meta será cumprida.

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA


Indicador 9: Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.

- **Meta 2011:** 60 %
- **Posição em 31/12:** 70,13% (*)
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.
- **Comentários:** Dados obtidos junto ao Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN. Valor alterado conforme a evidência enviada 15/02/12.

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês

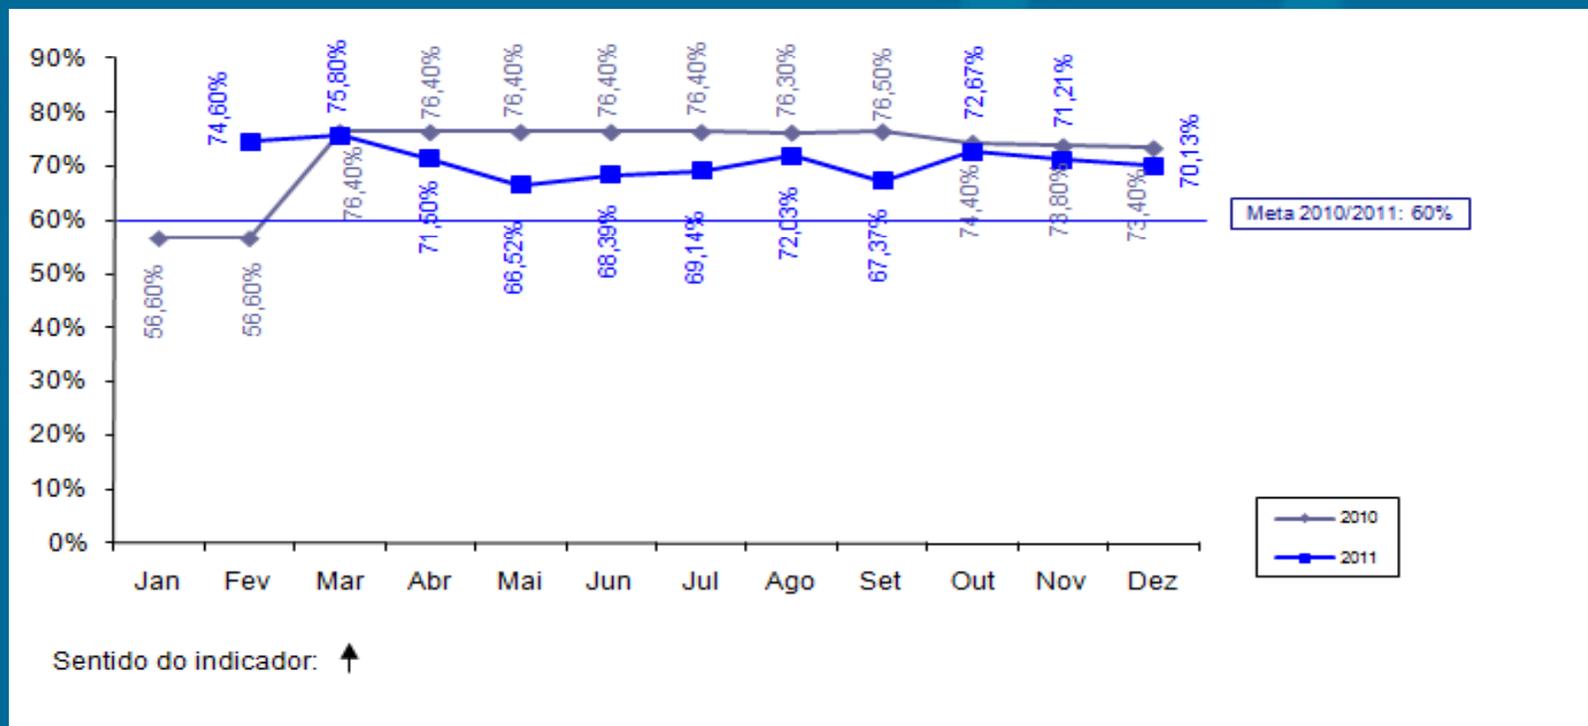

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Projeto 26: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Estratégia de capacitação e disseminação do uso do software.

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 93,76 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2010 – Dezembro 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 27: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Validação da Metodologia.

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 28,89 mil
- **Método de Aquisição:** Diretrizes Consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2009 – Agosto 2010
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 


Projeto 28: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Definições e ajustes no modelo de absorção.

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 56,05 mil
- **Método de Aquisição:** Diretrizes Consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2010 – Outubro 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 29: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Compra de equipamentos de informática para habilitar as CRES.

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 141,80 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2010 – Março 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Projeto 30 (Parte A): Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação.

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 234,16 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão (Ata de Registro de Preço)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2010 – Março 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 30 (Parte B): Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação (Servidores e switches).

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 148,03 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2011 – Janeiro 2012
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído aguardando pagamento (restos a pagar).
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Projeto 30 (Parte C): Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais - pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação (No-break e Rádio).

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 28,86 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão (Ata de Registro de Preço)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2010 – Março 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Relatório Quadrimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II, enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º trimestre de 2011).

OPERAÇÃO Swap II

COGERH

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR PRIMÁRIO

Água e Saneamento

Secretaria de Recursos Hídricos - SRH


Indicador 10: Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de Aqüicultura.

- **Meta 2011:** $\geq 37\%$
- **Posição em 31/12:** 39%
- **Posição em 31/12 em relação à meta:**
- **Justificativa:** O indicador na posição de dezembro/2011 atingiu e até sobrepujou a meta estabelecida em dois pontos percentuais pois, no período do último trimestre do ano, o consumo de água aumentou consideravelmente por parte dos usuários em geral, mormente quanto a categoria dos irrigantes, devida a falta de chuvas, que teve substancial influência para o cumprimento da meta.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta foi cumprida.

Água e Saneamento

Secretaria de Recursos Hídricos - SRH

Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura

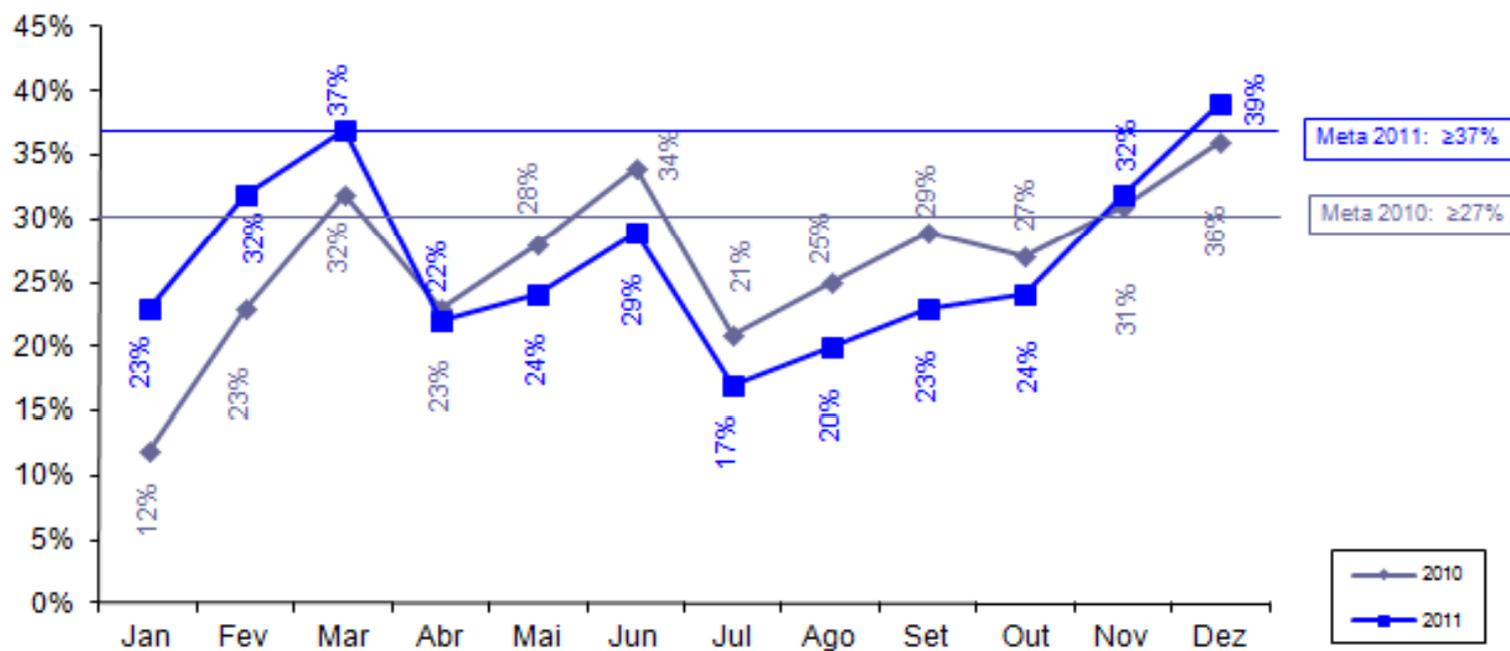

Sentido do indicador: ↑

OPERAÇÃO Swap II

CAGECE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Indicador 11a: Número de ligações urbanas de água.


- **Meta 2011:** 275.122
- **Posição em 31/12:** 315.803 (*)
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2006 a dezembro de 2011 foram executadas 315.803 ligações domiciliares de água.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta superada.

(*) Valor modificado pela evidência encaminhada no dia 07/02/2012.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Número de ligações urbanas de água

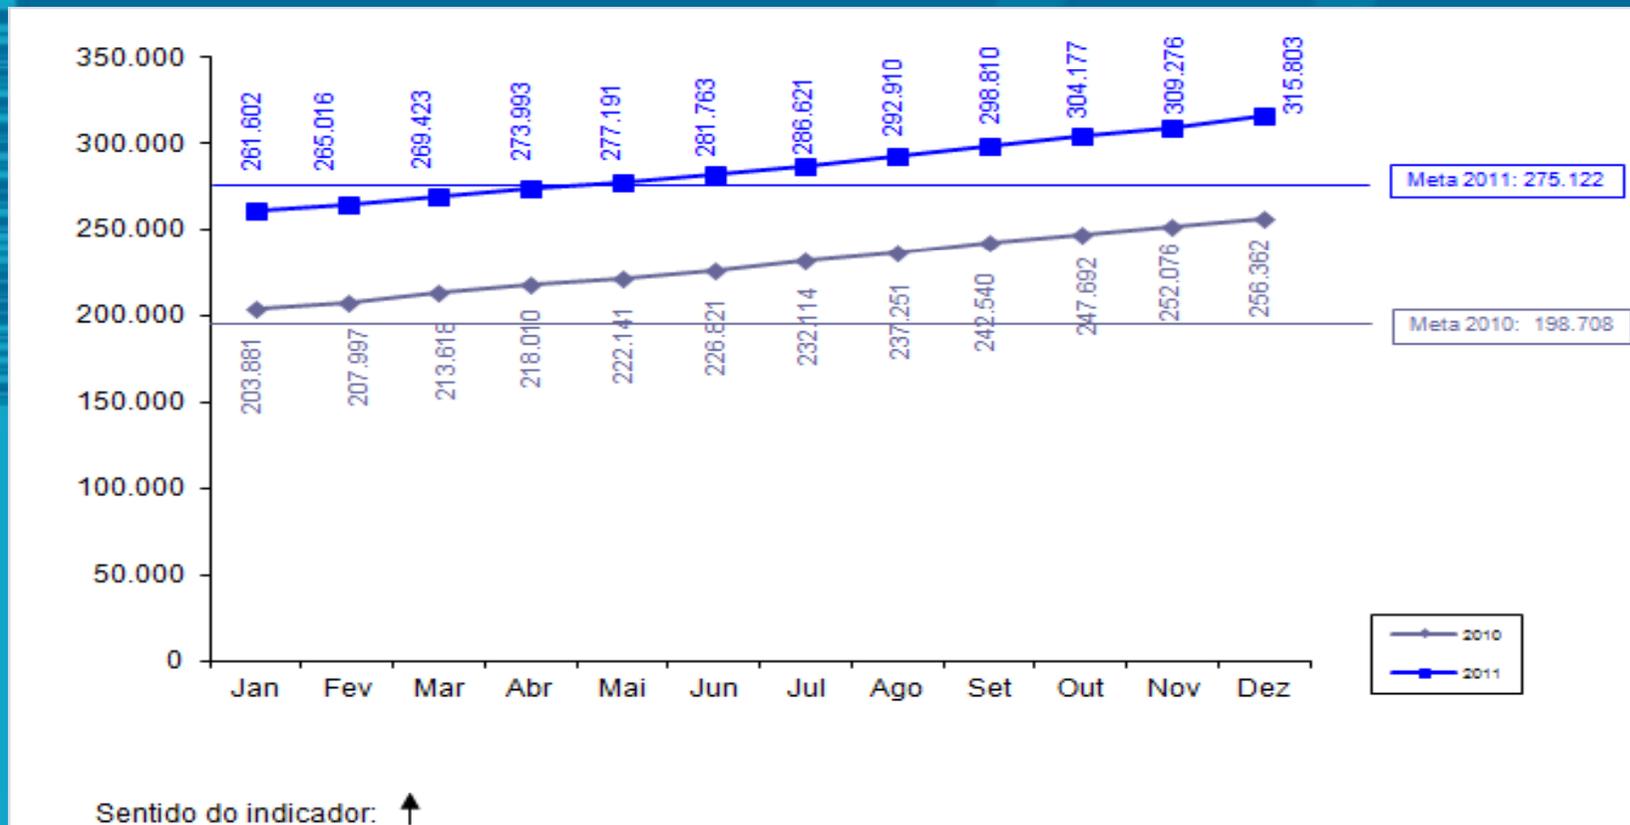

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE


Indicador 11b: Número de ligações de esgotos.

- **Meta 2011:** 124.775
- **Posição em 31/12:** 139.845
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2006 a dezembro de 2011 foram executadas 139.845 ligações domiciliares de esgoto.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta superada.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE


Número de ligações de esgoto

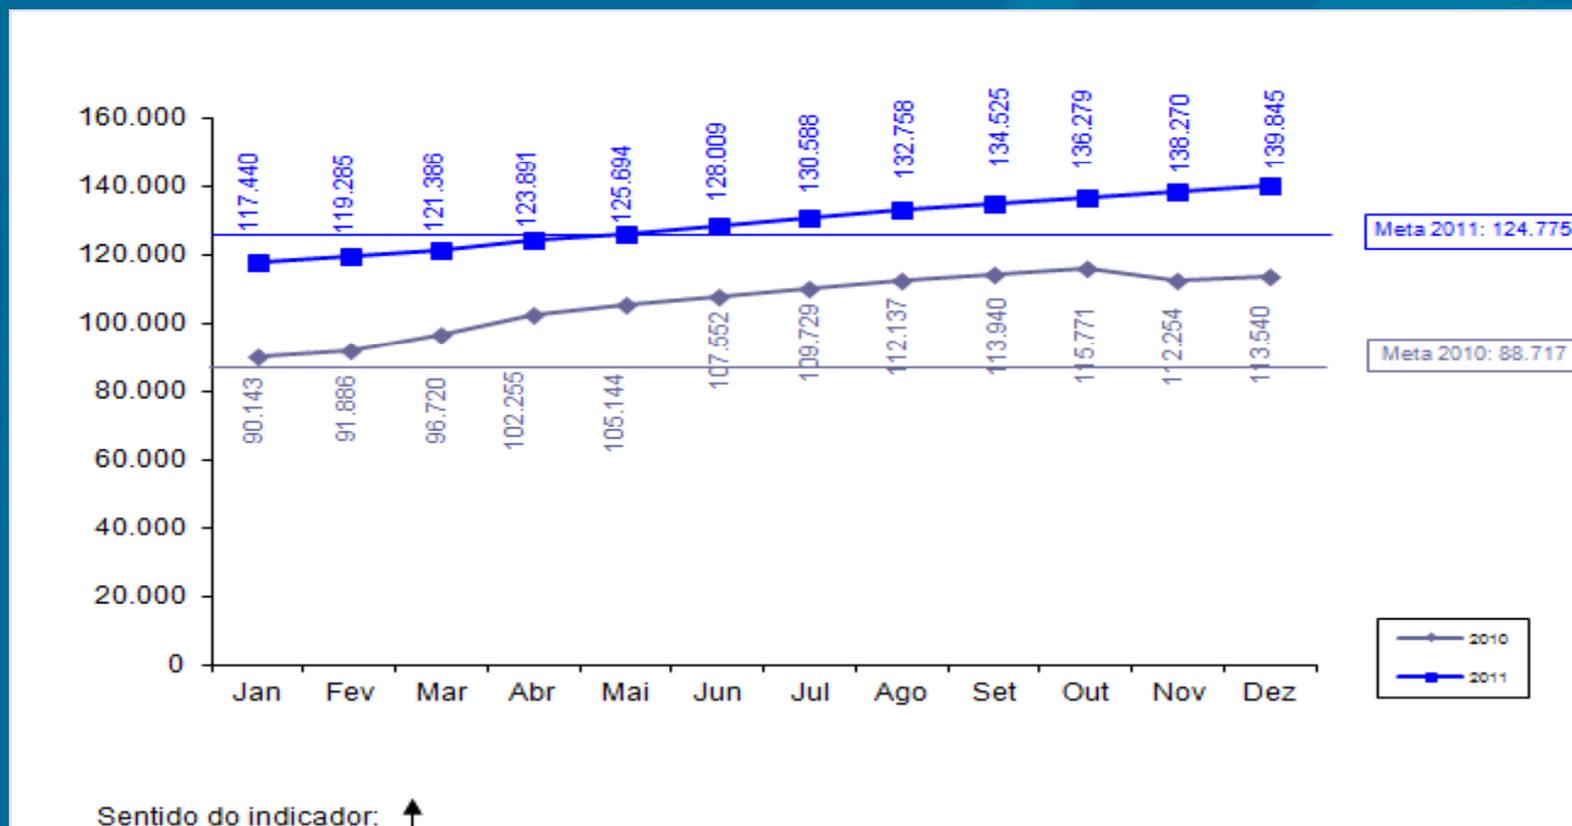

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Indicador 12: Percentual de Perda de Água.


- **Meta 2011:** $\leq 27\%$ (*)
- **Posição em 31/12:** 26,08%
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a novembro de 2011, o percentual de perda de água foi de 26,08%.

(*) Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 28,20% para 27%.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Percentual de Perda de Água

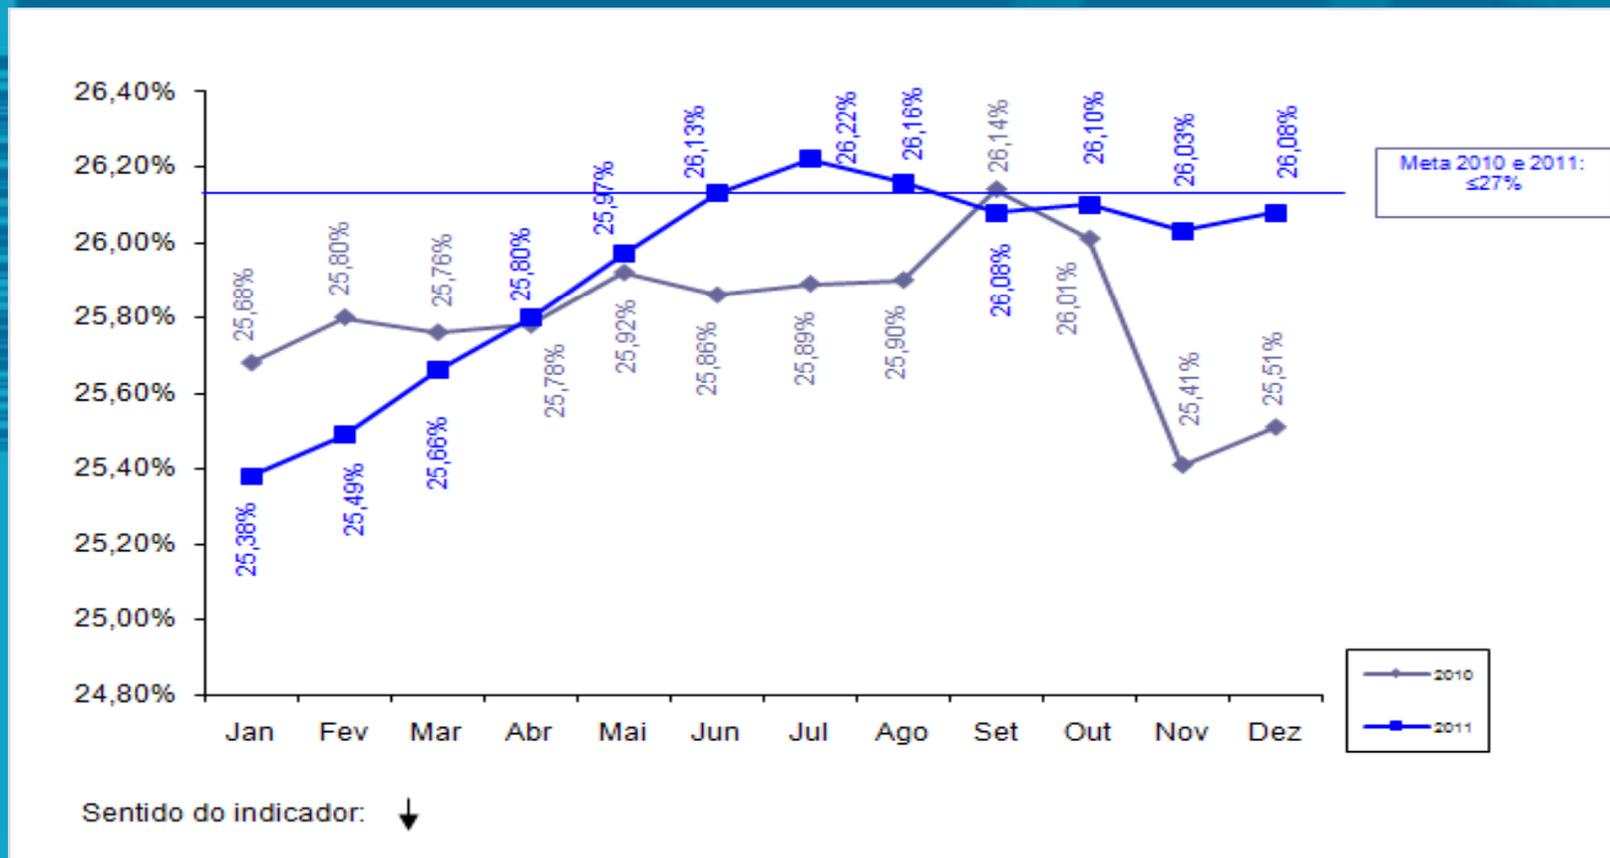

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE


Indicador 10: Margem EBITDA da CAGECE.

- **Meta 2011:** 22,72%
- **Posição em 31/12:** 25,75%
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida
- **Comentário:** Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 29,50% para 22,72%. Valor provisório, pois o encerramento de 2011 ocorrerá após as análises da Auditoria Externa, cujo prazo para publicação das Demonstrações financeiras de 2011 é 31/03/2012

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

Margem EBITDA da CAGECE

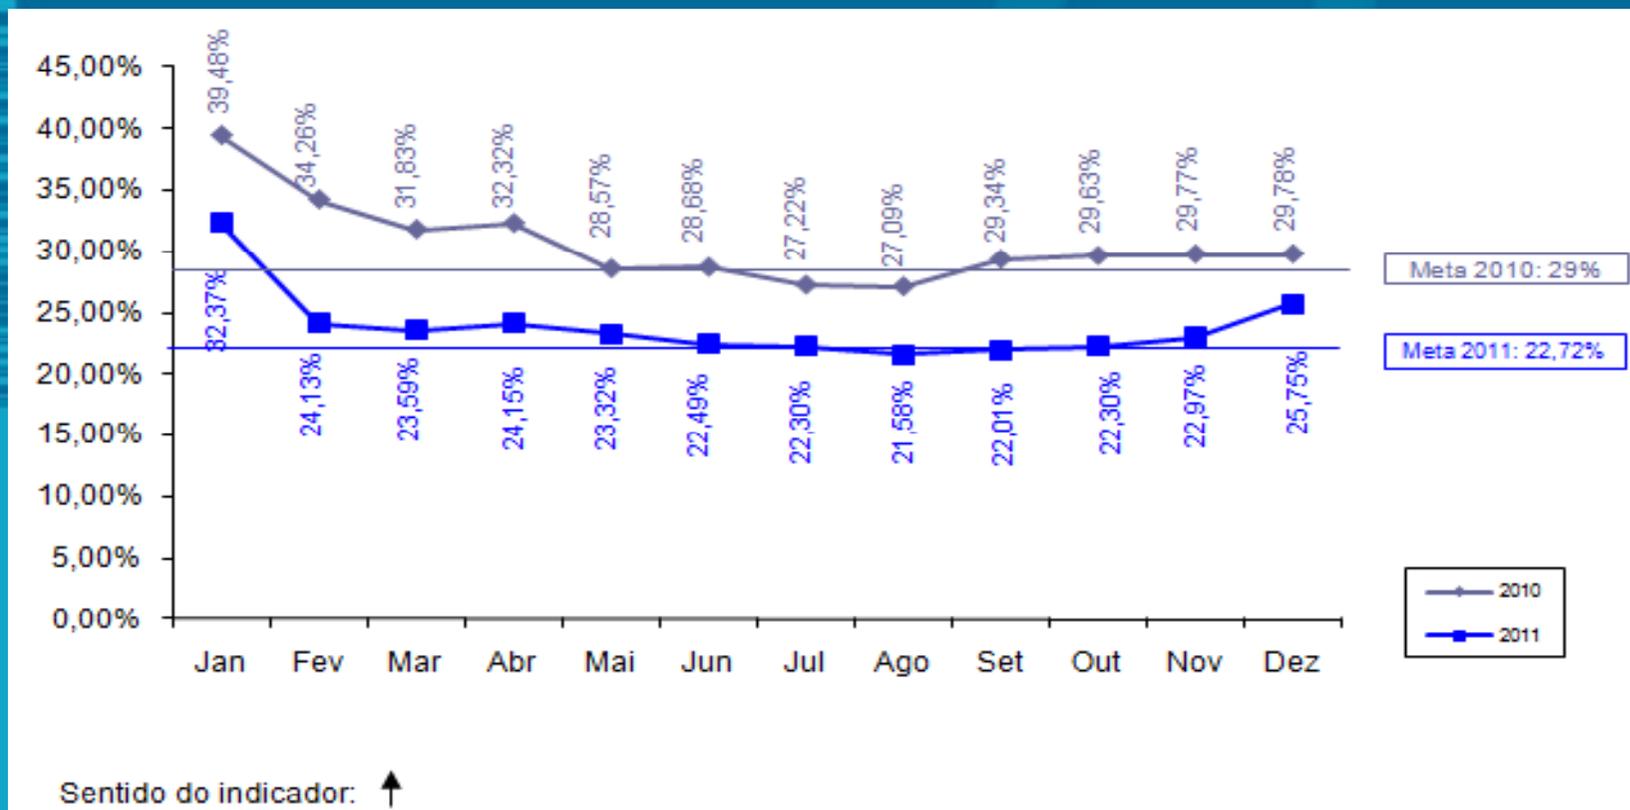

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

Relatório Quadrimestral de Acompanhamento da Salvaguarda de Reassentamento e Desapropriação enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º Trimestre de 2011).

OPERAÇÃO Swap II

CIDADES

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 4: Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade.

- **Responsável:** Tércia Pinheiro
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 106,43 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2011 – Fevereiro 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Relatório Quadrimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II, enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º trimestre de 2011).

OPERAÇÃO Swap II

ETICE


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR PRIMÁRIO

Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE


Indicador 13: Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.

- **Meta 2011: 4.365.700**
- **Posição em 31/12: 4.387.816**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Justificativa: A partir do Cinturão Digital, o Governo do Estado do Ceará estenderá, por meios de ramificações de fibras óticas com uso da tecnologia Wimax, via rádio, a rede de banda larga aos municípios.**
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.**

Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE

Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga

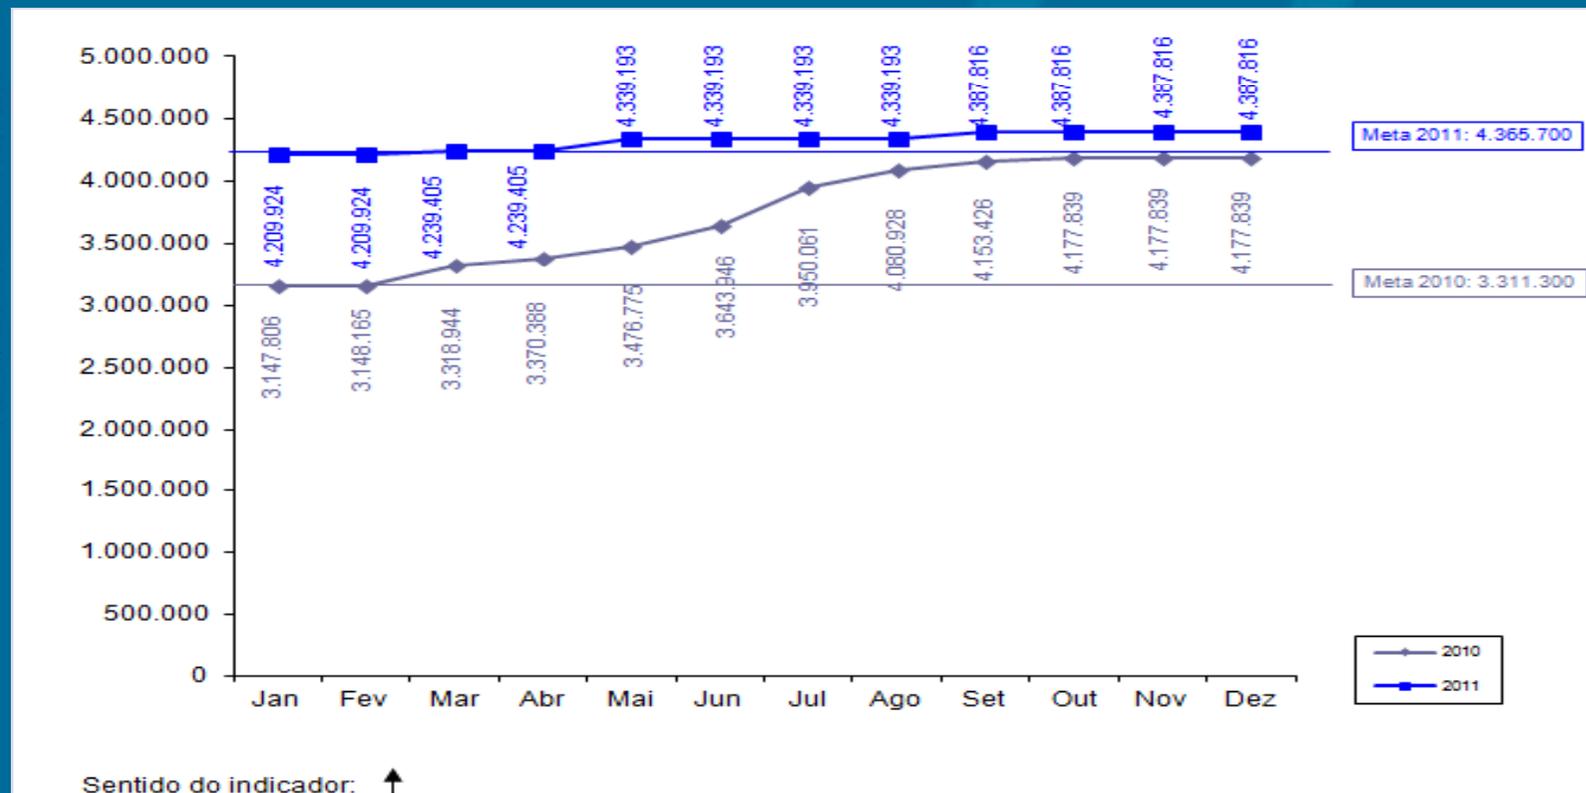

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Negócios & Inovação

Empresa de Tecnologia do Ceará - ETICE

Indicador 12: Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).

- **Meta 2011:** 3
- **Posição em 31/12:** 3
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Os sistemas Ciclo Orçamentário, Middleware de Integração e Patrimônio, componentes do S2GPR, encontram-se implementados.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta foi cumprida.

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Negócios & Inovação

Empresa de Tecnologia do Ceará - ETICE

Projeto 7: Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de internet.

- **Responsável:** Denise Olsen
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor:** US\$ 32,72 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2009 – Setembro 2009
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Negócios & Inovação

Empresa de Tecnologia do Ceará - ETICE

Projeto 8: Desenvolvimento de Sistema de Avaliação de Resultados do Cinturão Digital do Ceará.

- **Responsável:** Denise Olsen
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 51,72 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2011 – Setembro 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

PGE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Gestão do Setor Público

Procuradoria Geral do Estado - PGE


Indicador 4: Redução de processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato.

- **Meta 2011:** $\leq 10,5\%$
- **Posição em 31/12:** 9,76%*
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta com perspectiva de cumprimento.
- **Comentário:** o percentual médio da meta no período de janeiro a dezembro de 2011 foi de 8,60%.

Gestão do Setor Público

Procuradoria Geral do Estado - PGE

Redução de processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato

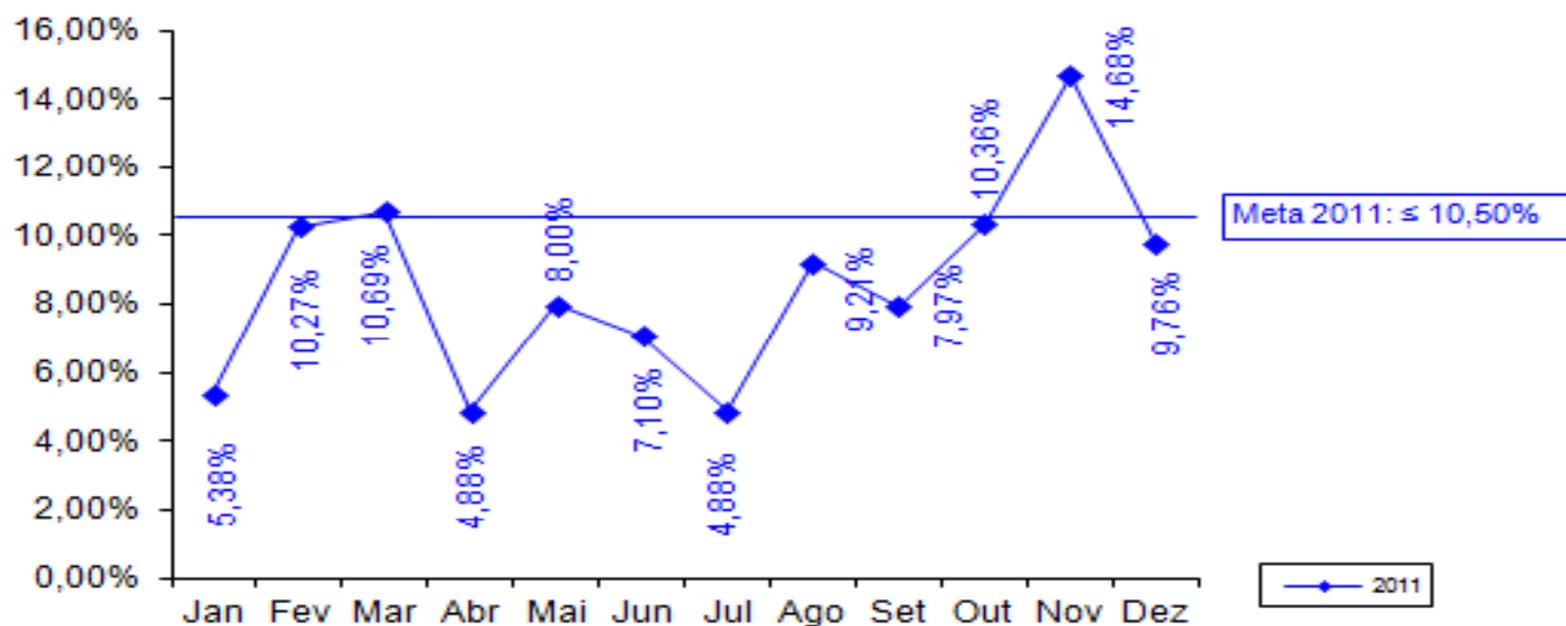

Sentido do indicador: ↓

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 14: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Treinamentos e Seminários na área de Licitações

- **Responsável:** Tarso e Fernando Grangeiro
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 173,69
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2010 – Maio 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 15: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Compra de Equipamento.

- **Responsável:** Tarso e Fernando Grangeiro
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 26,31
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2012 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Publicando Edital.
- **Estágio Atual:** Elaborando edital.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

ARCE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Água & Saneamento

Agência Reguladora do Ceará - ARCE


Indicador 11: Índice de conformidade da qualidade da Água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).

- **Meta 2011:** 58,00%
- **Posição em 31/12:** 20,34%
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** 59 relatórios concluídos de janeiro a dezembro de 2011, dos quais 47 relataram não-conformidades na qualidade da água.
- **Perspectiva de cumprimento:** a melhoria observada no início do ano, de fevereiro a abril de 2011, não se manteve nos meses seguintes. A meta não foi atingida.

Água & Saneamento

Agência Reguladora do Ceará - ARCE

Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE

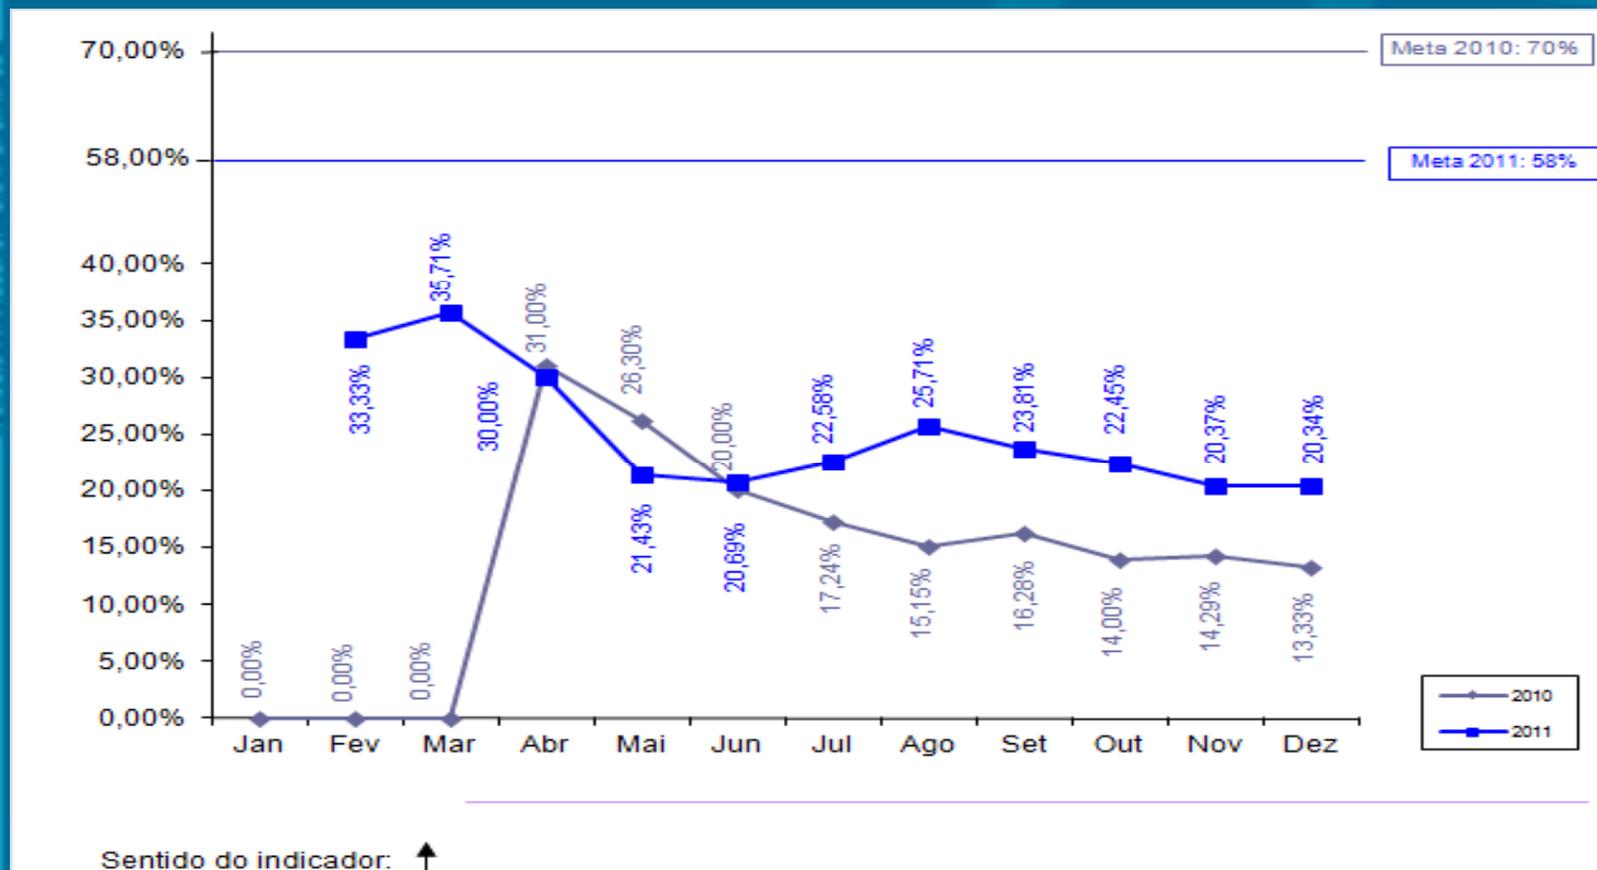

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento.

- **Responsável:** Mário Monteiro e Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 119,42 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2009 – Agosto 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

SECITECE

OPERAÇÃO Swap II

SECITECE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE

Indicador 13: Número de serviços tecnológicos realizados.

- **Meta 2011:** 47.181
- **Posição em 31/12:** 43.655
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento:** Meta não alcançada.

Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE


Indicador 13: Número de serviços tecnológicos realizados.

- **Meta 2011:** 47.181
- **Posição em 31/12:** 43.655
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento:** Meta não alcançada.

Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE

Número de serviços tecnológicos realizados

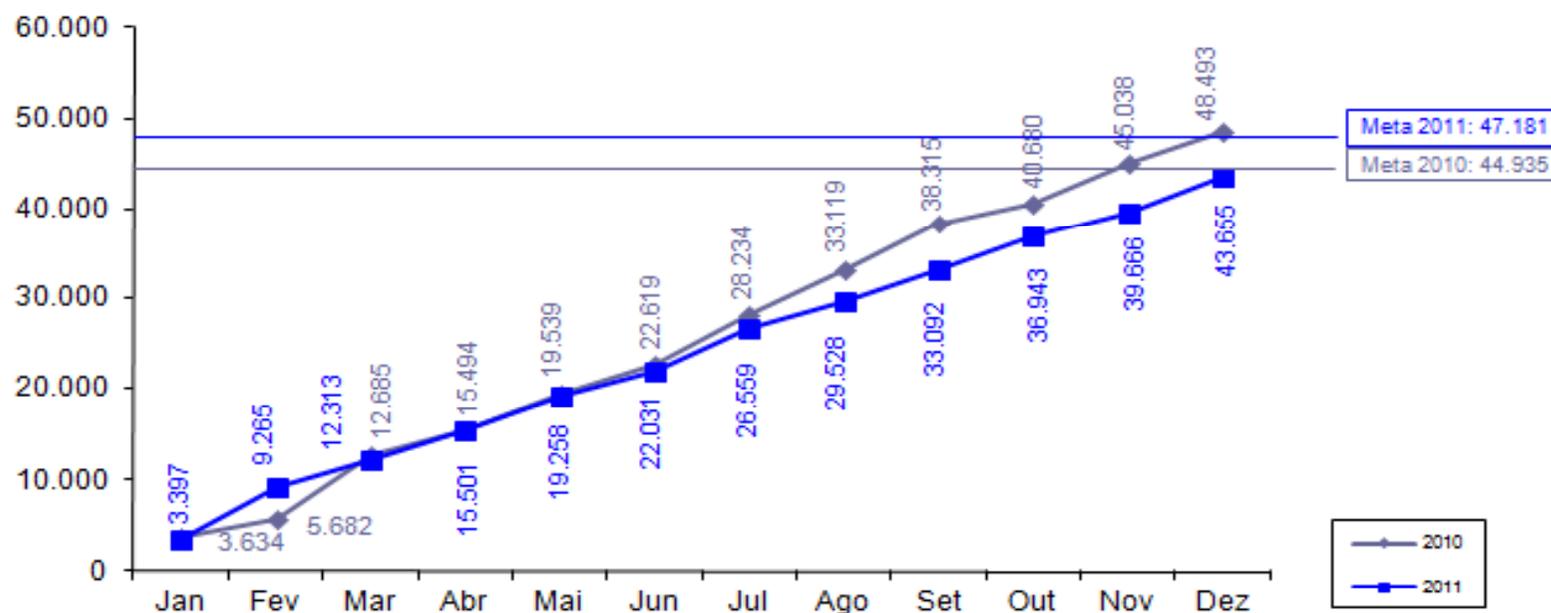

Sentido do indicador: ↑

OPERAÇÃO Swap II

CONPAM

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM


Indicador 14: Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado (percentual de licenças protocoladas na SEMACE no prazo de 60 dias).

- **Meta 2011: 20,00%**
- **Posição em 31/12: 20,80%**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de cumprimento: meta será cumprida**
- **Comentários: Informação referente a Dezembro de 2011**

Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM

Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado (percentual de licenças protocoladas na SEMACE no prazo de 60 dias)

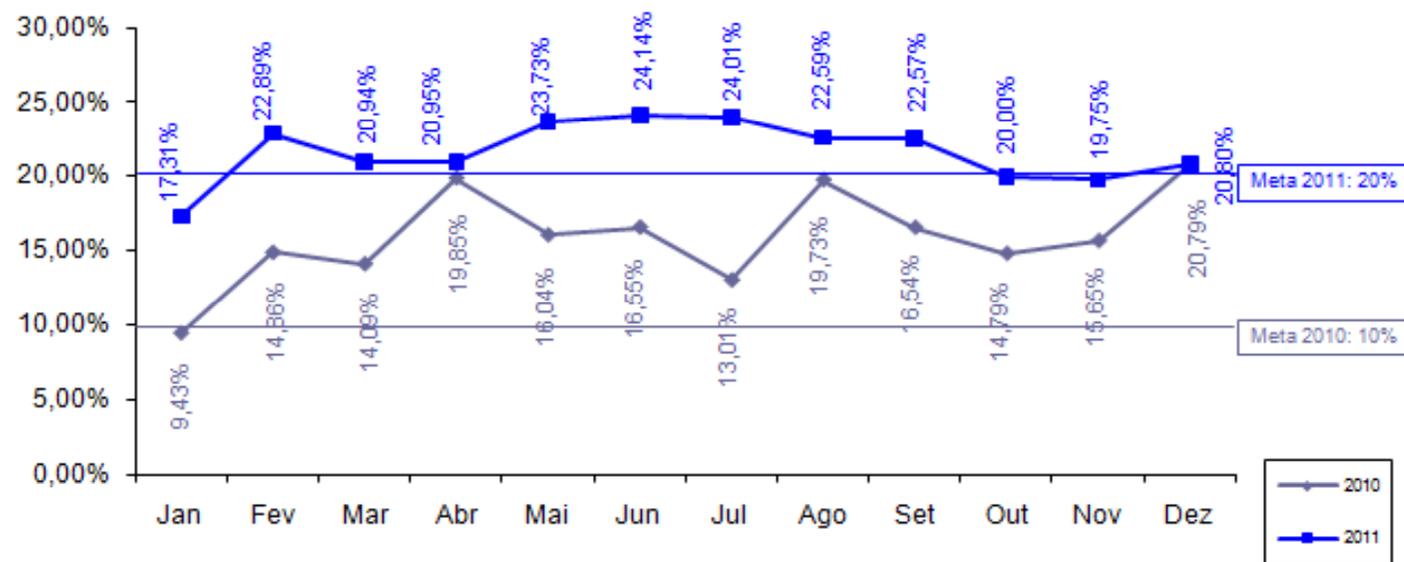

Sentido do indicador: ↑

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 5: Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente.

- **Responsável:** Maria Goretti de Castro e Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 39,68 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2009 – Novembro 2010
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 6: Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos.

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 125,16mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2011 – Março 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Secretaria das CONPAM

Relatório Quadrimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II, enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º trimestre de 2011).

OPERAÇÃO Swap II

CGE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Projeto 2: Capacitação em Mapeamento, Gestão e Auditoria de Processos com foco em Risco (no âmbito do Governo Estadual).

- **Responsável:** Marconi Lemos
- **Categoria de Licitação:** Empresa de consultoria.
- **Valor:** US\$ 174,93 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2011 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 3: Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Marconi Lemos
- **Categoria de Licitação:** Empresas de consultoria
- **Valor:** US\$ 120,92 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Novembro 2009 – Janeiro 2012
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

IPECE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Projeto 9: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Consultoria.

- **Responsável:** Eveline Barbosa
- **Categoria de Licitação:** Consultores Individuais
- **Valor:** US\$ 31,34 mil
- **Método de Aquisição:** Seção V – Guidelines de consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2009 – Março 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Projeto 10: Contratação de serviços para realização de evento c/ lideranças indígenas p/ apresentação dos livros didáticos/resultados da consultoria.

- **Responsável:** Eveline Barbosa
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 1,24 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2011 – Maio 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 11: Contratação de serviços gráficos para impressão e publicação dos livros didático-pedagógicos para as escolas indígenas do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Eveline Barbosa
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 1,24 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2010 – Março 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

**Projeto 12: Suporte p/ funcionamento da UGP do Projeto
SWAP II - Contratação de Consultores Individuais.**

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultores Individuais
- **Valor:** US\$ 169,16 mil
- **Método de Aquisição:** Seção V- Diretrizes de consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2009 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando Serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 13: Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado.

- **Responsável:** Leandro Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultores Individuais
- **Valor:** US\$ 17,95 mil
- **Método de Aquisição:** Seção V – Diretrizes de consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2009 – Maio 2010
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE

- No dia 15 de Abril de 2011, ocorreu um evento na Aldeia Indígena Jenipapo Kanindé para o lançamento das duas cartilhas (projetos AT 9,10 e 11), elaboradas dentro do escopo de Salvaguardas Social do Projeto SWAp II intituladas *Plantas Medicinais: Usos-saberes-sentidos; e Sentir-pensar-fazer: Artesanatos Indígenas no Ceará*);
- Ofício SEDUC nº 1268/2011 informou a entrega das cartilhas *Plantas Medicinais: Usos-saberes-sentidos; e Sentir-pensar-fazer: Artesanatos Indígenas no Ceará*) nas Escolas Indígenas do Ceará;
- No dia 25/01/2012 foram encaminhadas as cartilhas para José Mendes Fonteles Filho (Profº Babi) e para Professora da UFC Isabelle Bras Peixoto da Silva.

OPERAÇÃO Swap II

TCE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Projeto 31: Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de soluções integradas de Gerenciamento eletrônico de documento e informações do TCE (TCE 100% digital). (Parte A) – Digitalização.

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor:** US\$ 72,4 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2010 – Março 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando Serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando Serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação**

**Projeto 31: Fortalecimento Institucional do TCE -
Contratação de soluções integradas de Gerenciamento
eletrônico de documento e informações do TCE (TCE
100% digital). (Parte B) – Storage**

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor:** US\$ 196,8 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2012/Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Publicação Edital
- **Estágio Atual:** Edital publicado – Pregão 23/04/12
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 32: Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação. (Parte A) – Inscrição.

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 7,54 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2009 – Setembro 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 32: Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação. (Parte B) – Inscrição CISA.

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US 6,9 mil
- **Método de Aquisição:** Contratação Direta
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** novembro 2011- junho 2012
- **Estágio Previsto:** prestando serviço.
- **Estágio Atual:** prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OBRIGADA!

OPERAÇÃO
Swap II

The background of the slide is a solid blue color. On the right side, there is a faint, light blue graphic of a globe with latitude and longitude lines. On the left side, there are several vertical bars of varying shades of blue and white, some with horizontal lines, creating a decorative pattern.
