



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

ATA 38ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ SWAp II

Data: 29/06/2012 Início: 09:40 Duração: 1:40 Término: 11:20 Local: Sala do Diretor Geral do IPECE

Quadro de Presença			
ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
COORDENAÇÃO SWAP II	Flávio Ataliba	Coordenador SWAp II	OK
	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	Alice Helena da Silva Pinto	Consultora SWAP II	X
	Fabiana Silva de Castro	Consultora SWAP II	OK
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	OK
	Daniela Carvalho C. Dantas	Suplente	X
CAGECE	José Ricardo Meira	Titular	OK
	Raimunda Aurineide Lemos Caldas	Suplente	X
	Emiliana Leite Filgueiras	Suplente	X
CGE	Silvia Helena Correia	Titular	X
	Paulo Roberto de Carvalho Nunes	Suplente	X
	Ítalo Brígido	Representante	X
CIDADES	Tércia Maria Pinheiro Martins	Titular	OK
	Edílson Uchoa Lopes	Suplente	X
CONPAM /SEMACE	José Iraguassú T. Filho	Titular	X
	Maria Dias Cavalcante	Suplente	X
	José Maurício Mendes Giffoni	Suplente	OK
ETICE	Denise Maria Norões	Titular	X
	Sérgio Vicente de Matos Brito	Suplente	X
	João Carlos Lima	Suplente	OK
PGE	Fernando Grangeiro	Titular	OK
	Tarso Pinheiro	Suplente	X
SECITECE/NUTEC	Almir Bittencourt da Silva	Titular	X
	Ricardo Costa e Silva	Suplente	OK
	Vera Lúcia Salgado	Representante NUTEC	X
SEDUC	Maria Eneida Machado Maia	Titular	OK
	Maria Ângela Ieão Hitzshky Madeira	Suplente	X
	José Iran da Silva	Suplente	OK
	Ana Maria Garcia Ferreira	Representante	OK
SEFAZ	Fabiano Moreira Ramos	Titular	X
	Fabrizio Gomes Santos	Suplente	OK
	Rejane Muniz Frutuoso	Representante	OK
SEPLAG	Naiana Corrêa Lima	Titular	X
	Fátima Coelho Benevides Falcão	Suplente	OK
	Fernanda Salles de Oliveira	Representante	OK
	Francisco Ailson Filho	Representante	OK
SRH /COGERH	Francisca Isabel V. de Carvalhedo	Titular	X
	Denilson Marcelino Fidelis	Suplente	X
	Lorena Girão	Representante	OK
SESA	Vera Maria Câmara Coelho	Titular	X
	Ana Márcia Rodrigues	Suplente	OK
	Ana Angélica de Morais S. Aquino	Suplente	X
	Ana Lorena Braga Fernandes	Representante	OK
TCE	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	OK
	José Teni Cordeiro Júnior	Suplente	X
	José Alexandre da Silva	Auditor do Projeto	X

INTRODUÇÃO

Às 09h40m, Na sala do Diretor Geral do IPECE e Coordenador do Projeto SWAp II Flávio Ataliba deu-se início a reunião do Comitê SWAp II que seguiu a apresentação em *Power Point* (**Anexo II**) cuja pauta está apresentada abaixo:

- 1 - Apresentação dos Participantes;
- 2 - Posição sobre status SWAp III – PforR;
- 3 - Missões do Banco Mundial;
- 4 - Relatórios Finais;
- 5 - Acompanhamento da Execução dos Programas Elegíveis;
- 6 – Sumário da Execução dos Projetos de Assistência Técnica;
- 7 - Informações sobre a Auditoria do Projeto;
- 8 - Sumário do Desempenho;
- 9 - Acompanhamento por Setorial da Execução;
- 10- Sumário dos Desembolsos e Recursos Transferidos.

I. APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Todos que estavam presentes se apresentaram, conforme quadro de presença.

Cristina Medeiros – IPECE informou que essa é a última reunião do Projeto SWAp II. Pediu para que, no final da apresentação, cada um fizesse uma colocação sobre SWAp, que contassem a experiência, o que poderia ser melhorado e o que foi bom para o Projeto.

Ricardo Costa – SECITECE solicitou para iniciar a reunião, pois precisava sair em seguida para participar de uma reunião de emergência com uma empresa vencedora da licitação das impressoras – gasto elegível do Programa 033. Informou que a licitação de todos os gastos foi realizada, os contratos foram publicados, todos estão empenhados, e os fornecedores asseguraram que entregariam os bens no prazo. Infelizmente, a empresa que ficou de entregar as impressoras alegou hoje que, quando fez a proposta, o dólar custava R\$ 1,88 e com o aumento para o dólar de R\$ 2,10, não haveria como cumprir o contrato. Informou que a reunião buscará uma solução do problema já que não há mais tempo para chamar o 2º colocado e cumprir a meta do Programa Elegível 033.

Cristina Medeiros – IPECE nivelou a informação repassada por Ricardo informando que o Banco Mundial prorrogou o prazo para a execução dos Programas Elegíveis da SEDUC (48) e SECITECE (033 e 196) até o final de março. No entanto, com a justificativa apresentada, durante a Missão de Supervisão de Maio, pelo Secretário Adjunto da SECITECE das dificuldades para o cumprimento das metas dos Programas 033 e 196, o BIRD concordou em estender o prazo até o dia 31 de maio. O programa 196 conseguiu cumprir a meta mas o programa 033 não foi cumprido e uma solicitação de *Waiver* (perdão) foi submetida ao Task Manager do Projeto que, em reunião por telefone no dia 13/06/12 com a UGP e o Secretário Adjunto da SECITECE, concordou em aguardar até final de julho.

II. POSIÇÃO SOBRE STATUS SWAP III – PforR

Cristina Medeiros – IPECE passou a dar uma atualização sobre o status do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará, descritos a seguir:

- ✓ Março: Preparação das Análises dos temas do SWAp III Social, Crescimento Econômico, Meio Ambiente e Gestão para apresentação nos Workshops;
- ✓ Abril (19-20/04/12): Missão de Avaliação Ambiental Estratégica com a Consultora Iara Verocai;
- ✓ Maio (24-25/05/12): Realização dos Workshops dos temas Social, Crescimento Econômico, Ambiental e Gestão Pública;
- ✓ Maio (25/05/12): Definição pelo Governador Cid Gomes de que instrumento do próximo Acordo de Empréstimo para financiar o Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará seria o novo produto do Banco Mundial: Programa para Resultados (PforR);
- ✓ Julho/2012 – Maio/2013: Discussão e Negociação da Proposta;
- ✓ Junho/2013: Assinatura do Contrato.

Cristina Medeiros – IPECE informou que o Banco Mundial já está trabalhando internamente elaborando um documento conhecido como Nota Conceitual. Eles estarão no Ceará no mês de agosto para a avaliação institucional do Estado para implementação do Projeto, nos meses seguintes ocorrerá a discussão dos indicadores e a assinatura do Acordo de Empréstimo está prevista para junho de 2013.

III. MISSÕES DO BANCO MUNDIAL

Cristina Medeiros – IPECE informou sobre o status das Missões do Banco Mundial que se encontram descritas abaixo:

- ✓ **11-12/06/12:** Missão de Revisão Posterior de Aquisições de Assistência Técnica;
- ✓ **Agosto 2012:** Missão de avaliação institucional do Estado para implementação do Projeto;
- ✓ **Início de Setembro/12:** Missão de discussão da proposta do Projeto dentro do escopo do PforR.

IV. RELATÓRIOS FINAIS

Cristina Medeiros – IPECE informou que quanto ao Relatório Lições Aprendidas, Melhores Práticas e Impacto do SWAp II solicita-se que as setoriais enviem até 15/07/12 sugestões das lições aprendidas, melhores práticas para elaboração do mesmo submissão ao Banco Mundial. A proposta é que o material enviado anteriormente sobre o impacto do SWAp II será incorporado nesse relatório.

V. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Cristina Medeiros – IPECE passou a apresentar a posição de 31/05/2012 dos Programas Elegíveis, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Acompanhamento da Sinalização da Execução dos Programas Elegíveis

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2011 - **REGRA 70%**

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2011 Jan-Dez (a)	Orçamento 2011 - Até 31/12 (b)	Realizado (até 31/03/12) (c)	Meta (até 31/03/12) (d)	Diferença (e) = (d) - (c)	Realizado/Previsto (%) (c)/(b)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	3.268.447	3.268.447	-	2.287.913	2.287.913	0,00%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	162.534.432	162.534.432	124.073.727	113.774.102	(10.299.625)	76,34%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	23.826.799	23.826.799	23.642.022	16.678.759	(6.963.263)	99,22%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	975.497.717	975.497.717	1.185.536.948	682.848.402	(502.688.546)	121,53%	
SECITECE	194 Formação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento	12.166.208	12.166.208	8.695.912	8.516.346	(179.566)	71,48%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.835.100	2.835.100	2.335.479	1.984.570	(350.909)	82,38%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	194.927.906	194.927.906	219.355.069	136.449.534	(82.905.535)	112,53%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	19.151.625	19.151.625	15.118.094	13.406.138	(1.711.957)	78,94%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.477.726	3.477.726	2.477.726	2.434.408	(43.318)	71,25%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	34.191.184	34.191.184	32.891.484	23.933.829	(8.957.655)	96,20%	
TOTAL		1.431.877.144,00	1.431.877.144	1.614.126.462,5	1.002.314.001			
Valor Limite do Desembolso [70% * TOTAL]		1.002.314.001	1.002.314.001					

Notas:

¹ O Programa 033 - Ceará Digital corresponde ao Programa 070 - Ciência, Tecnologia e Inovação em 2012.

² O Programa 048 - Qualidade da Educação Básica corresponde ao Programa 073 - Organização e Gestão da Educação Básica em 2012.

³ O Programa 196 - Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico corresponde ao Programa 070 - Ciência Tecnologia e Inovação em 2012.


⁴ Diferentemente dos Programas 033 e 048, para 2012, foi considerada a execução do Programa 196 até 31/05/2012.

Posição em: 31-mai-12

VI. SUMÁRIO DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Cristina Medeiros – IPECE passou a apresentar a posição de 20/06/2012 dos Projetos de Assistência Técnica, explicando que dos 32 projetos 31 estão com a execução conforme o Plano de Licitação e 1 está com atraso de mais de três meses, conforme apresentado no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Acompanhamento da Sinalização da Execução do Plano de Licitação dos Projetos

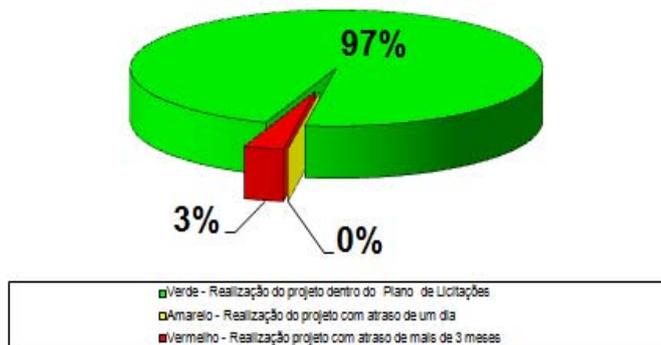

Sinalização	Setorial com o número do Projeto
Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações	31 PROJETOS: ARCE (1), CGE (2,3), CIDADES(4), CONPAM (5,6), ETICE (7,8), IPECE (09,10,11,12,13), PGE(14,15), SEDUC (16,17,18,19,20), SEPLAG (22,23,24,25), SESA (26,27,28,29,30),TCE(31,32).
Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia	-
Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses	1 PROJETO SEFAZ (21).


OBS: O número ao lado do nome da setorial se refere à identificação do número do Projeto cuja descrição encontra-se no Acompanhamento no site do IPECE:

http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/assistencia/Acompanhamento_Projetos_2011.htm

Cristina Medeiros – IPECE passou a explicar que em relação aos estágios dos processos licitatórios, dos 32 Projetos de Assistência Técnica (posição de 20/06/2012), 22 estão

concluídos, 10 estão sendo executados, sendo que desses, 1 está com seu processo licitatório em andamento e 9 estão com seus contratos assinados e os serviços estão sendo prestados, conforme apresentado no Gráfico 2.


Gráfico 2 – Estágio dos Processos Licitatórios



1 em andamento=	SEFAZ (21).
9 Contratos assinados =	CIDADES(4), CONPAM (6), ETICE (8), IPECE (12), PGE (14,15), SEDUC (20), SEPLAG(22,25).
22 Concluídos =	ARCE (1), CGE (2,3), COMPAM (5), ETICE (7), IPECE (09, 10, 11, 13), SEDUC (16,17, 18,19), SEPLAG (23, 24), SESA (26, 27, 28, 29, 30), TCE (31,32).

Cristina Medeiros – IPECE informou que todos os produtos dos nove contratos em andamento no gráfico 2 foram entregues até 29/06/12, restando apenas o processamento dos pagamentos. Acrescentou que os Projetos de Assistência Técnica portanto avançaram como esperado, com exceção de um, da SEFAZ, que está no estágio *Negociando Contrato*, conforme registrado no gráfico 3.

Gráfico 3 – Projetos em Andamento



MI ou Edital = 0	
Lista Curta e SDP = 0	
Avaliação = 0	
Negociação Contrato = 1	SEFAZ (21).

Rejane Muniz – SEFAZ informou sobre a dificuldade que encontrou para realizar o Projeto de Assistência Técnica. Adiantou que no Pregão Eletrônico para a aquisição dos notebooks da SEFAZ a qualidade das empresas que entraram no processo licitatório foi muito baixa e sem a devida habilitação. Sua percepção é que muitas dessas empresas entram para concorrer somente para dificultar o procedimento licitatório. Informou que somente a vigésima empresa atendeu a todos os requisitos, mas que outra empresa entrou com um recurso que teve de ser avaliado pela equipe técnica da SEFAZ. A PGE aprovou o relatório técnico e o processo foi homologado. Infelizmente, o prazo de contratação e entrega dos equipamentos até 30/06/12 não poderá ser cumprido. Dessa forma, foi informada pela coordenação do projeto que foi solicitado ao Banco Mundial a transferência do valor desse Projeto da Categoria II para a Categoria I e seu recurso será desembolsado na conta do Tesouro, como fonte 40 em vez de 48.

VII. INFORMAÇÕES SOBRE A AUDITORIA DO PROJETO

Giovanna Adjafre – TCE informou que a última auditoria contempla o ano de 2011 e os cinco primeiros meses de 2012. O relatório já está sendo elaborado e a entrega foi acordada com o Banco Mundial para o dia 30/09/2012.

Cristina Medeiros – IPECE informou que o IFR de 2011 e as Notas Explicativas revisado com a posição de 31 de maio 2012 do valor do Programa 196 foram enviadas hoje ao Banco Mundial e copiado o Alex (TCE), atendeu-se também a solicitação de envio do IFR em arquivo em Excel (posteriormente o documento foi enviado ao TCE por ofício).

VIII. SUMÁRIO DO DESEMPENHO

Cristina Medeiros – IPECE passou a apresentar a posição dos **indicadores primários**, conforme Tabela 2.

Tabela 2 – Acompanhamento mensal dos Indicadores Primários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011						
Sector	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento	Entrega de Evidências
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).	1.293,0 milhões	1.892,2 milhões	cumprido	03/02/2012
		2. Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).	≤0,35	0,297695	cumprido	03/02/2012
	SEPLAG	3. Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG. ¹	15	15	cumprido	30/03/2012
		4. Número de "Relatórios Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG. ¹	7	7	cumprido	11/04/2012
Educação	SEUDIC	5. Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas. ¹	≥90%	100%	cumprido	30/03/2012
		6.a Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: "Alfabetização na Idade Certa".	≥80%	100%	cumprido	16/03/2012
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização na Idade Certa" entregue às escolas.	≥80%	100%	cumprido	16/03/2012
		6.c Percentual de gerentes do programa "Alfabetização na Idade Certa" remunerados pelo Estado.	60%	100%	cumprido	16/03/2012
Saúde	SESA	7a. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	30%	76,40%	cumprido	15/02/2012
		7b. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	30%	30,70%	cumprido	14/03/2012
		8a. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.	12	13	cumprido	15/02/2012
		8b. Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.	1	-	Não será cumprido (1)	14/03/2012
		9. Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.	15	15	cumprido	15/12/2011
Água & Saneamento	CAGECE SRH	10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥37%	39%	cumprido	10/02/2012
		11.a Número de ligações urbanas de água.	275.122	315.803	cumprido	07/02/2012
		11.b Número de ligações de esgotos.	124.775	139.845	cumprido	07/02/2012
		12. Percentual de perda de água.	≤27%	26,03% ⁵	cumprido	07/02/2012
Negócios & Inovação	SEFAZ ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	4.365.700	4.387.816	cumprido	09/02/2012
		14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥35%	80,00%	cumprido	06/03/2012

Cristina Medeiros – IPECE solicitou que Ana Márcia (SESA) contasse um pouco sua experiência sobre processo de busca do cumprimento do indicador 8b.

Ana Márcia – SESA iniciou sua consideração informando que tudo aquilo que tinha ao alcance da Secretaria para o cumprimento do indicador foi feito, assim como houve um grande esforço do Hospital São Camilo de Itapipoca. Informou ainda que o referido hospital, num primeiro momento, enviou um Plano de Ação não adequado, superficial, que causou má impressão. Foi então elaborado um novo com a ajuda do grupo técnico da SESA e enviado ao Banco.

Ana Márcia – SESA informou que uma lição aprendida nesse processo foi a importância da escolha do indicador, principalmente os que estão fora de sua governabilidade, como era o caso desse indicador. Além disso, houve mudança na legislação e o foco ficou voltado para a segurança dos pacientes. Anteriormente, a certificação ONA dependia da estrutura do hospital e isso foi cumprido pela Secretaria.

Ana Márcia – SESA informou que no dia 13/06/2012 houve uma reunião bem extensa por telefone com Thomas Kenyon (Banco Mundial), André Médici (Banco Mundial), Ricardo Silveira (Banco Mundial) Vera Coelho (SESA), Ana Márcia (SESA) e Cristina Medeiros. Informou que na reunião alguns pontos do plano de ação foram discutidos e Vera Coelho (SESA) tentou responder os questionamentos mas sentiu um pouco de frustração já que ela tentava justificar mas parecia que não era entendida.

Cristina Medeiros – IPECE informou que após esse contato do dia 13/06, de forma a ficar esclarecido e registrado fez uma solicitação por e-mail das razões da não aceitação do Pedido formal de Waiver desse indicador, para nosso registro e e que em 21/06/12 Tom Kenyon - Banco Mundial atendeu a solicitação. (Pela importância da mesma transcrevemos abaixo a tradução dessa resposta *“Você nos pediu que informássemos, por escrito, as razões da nossa decisão de não aceitar o Waiver relacionado com o não cumprimento da meta para o indicador 8b (Número de Hospitais com Certificação ONA). A razão é que, com base no plano de ação apresentado, não nos sentimos confortáveis que a certificação ONA poderia ser realizado dentro do prazo estabelecido. Isto é porque, na sua atual forma, o plano tem as seguintes deficiências:*

1. Mudança de gestão: O plano prevê uma semana de 'sensibilização'. Isso não é o suficiente. Saff e gestores necessitam estar envolvido no processo de acreditação e quaisquer alterações relacionadas. Será necessário criar e implementar uma mudança estratégia de gestão.

2. Pessoal: Nós todos sabemos que este tem sido o principal fator por trás dos atrasos. O hospital tem pessoal , geral e especializado, insuficiente. O plano não tem qualquer menção de incentivos para atrair e manter pessoal qualificado.

3. Sistemas de TI: O plano não discute como essencial sistemas de TI (por exemplo, um call center, registros médicos eletrônicos e de contabilidade sistemas) serão criados no hospital ou como a SESA pode monitorar e avaliar sua implementação.

4. Indicadores de Resultados: O plano inclui uma discussão de indicadores de processo, mas nada de resultados ou de qualidade (para além de cliente satisfação, que não é suficiente). Deveria, pelo menos, apresentam indicadores básicos relacionados com a segurança do paciente.

5. Plano de manutenção do Hospital: Dado os investimentos previstos em infra-estrutura, o plano deveria apresentar um plano ou estratégia para a manutenção da infra-estrutura e de equipamentos e um orçamento associado ao mesmo.

6. Modelo de Gestão: O plano precisa apresentar um caminho claro e uma descrição do modelo de gestão (incluindo o arranjos de governança) para cumprir os requisitos de acreditação mínimos.

Por favor, entenda que isso não implica qualquer juízo com relação aos esforços envidados pela SESA. O simples fato é que nós desembolsar contra resultados não insumos. Onde Waivers tenham sido previamente concedido foi porque nós tivemos alguma garantia de que as metas acabariam por serem cumpridas, que não existe neste caso. Além disso, Waiver é diferente de um 'perdão', o último implica irregularidade ou negligência. Neste caso, sabíamos que existia um risco associado a este indicador específico e que o risco aconteceu de se materializar.

Eu acho que você e a equipe do SWAp deveria se orgulhar de que dos 14 indicadores primários associados a esta operação, apenas um não foi cumprido no final. Se todas as metas previstas fossem alcançadas, eu e outros membros da equipe do Banco provavelmente teriamse sentindo que eles tinham sido insuficientemente ambiciosos.”

Cristina Medeiros – IPECE solicitou a Ana Márcia escrevesse sobre essa lição aprendida e enviasse como uma contribuição da SESA para o relatório de Boas Práticas.

Cristina Medeiros – IPECE passou a apresentar a posição dos **indicadores secundários**, conforme Tabela 3.

Tabela 3 – Acompanhamento mensal dos Indicadores Secundários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011						
Sector	SEFAZ Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento	Entrega de Evidências
Setor Público	SEFAZ	1. Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário.	≤ 10%	3,26%	cumprido	08/03/2012
	SEPLAG	2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.	2	2	cumprido	25/01/12 e 02/02/12
	POE	3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	≤ 3 meses	1,24*	cumprido	01/02/2012
	POE	4. Percentual processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato reduzidos	≤ 10,5%	8,60%	cumprido	14/02/2012
Educação	SEDUC	5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa" (uma em 2009 e uma em 2011).	1	1	cumprido	01/12/2011
	SEDUC	6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.	80%	81,40%	cumprido	27/04/2012
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.468.331	7.028.280	cumprido	14/03/2012
	SESA	8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva à internação.	2	2	cumprido	01/02/2012
	SESA	9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	60%	70,13%	cumprido	15/02/2012
Água & Saneamento	ARCE CAGECE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	22,72%*	25,75%	cumprido	07/02/2012
	ARCE CAGECE	11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).	58%	20,34%	Não será cumprido	24/01/2012
Negócios & Inovação	ETICE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).	3	3	cumprido	09/02/2012
	SECITECE	13. Número de serviços tecnológicos realizados.	47.181	43.655	Não será cumprido	10/02/2012
Melo Ambiente	CONPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	≥ 20%	20,80%	cumprido	12/03/2012

(*) O valor da média anual é foi de 1,99

Cristina Medeiros – IPECE solicitou que Alexandre Caetano (ARCE) contasse um pouco sobre sua experiência com o acompanhamento do indicador secundário 11- *Índice de conformidade da qualidade distribuída pela CAGECE*, cuja meta não foi cumprida.

Alexandre Caetano – ARCE informou que o IRVF (Índice de Conformidade da Qualidade da Água) mede, em %, a quantidade de ações de fiscalização promovidas pela ARCE que resultaram na avaliação de regularidade na qualidade da água fornecida pela CAGECE, em relação à quantidade total de ações de fiscalização promovidas pela ARCE no período, e cujo escopo inclui a avaliação do controle e da qualidade da água para abastecimento. Esse indicador serviu para chamar atenção para um problema importante e complexo que é a qualidade da água. O principal problema constatado é de turbidez, especificamente na saída do tratamento. Uma hipótese possível para a crescente dificuldade no tratamento de água é a deterioração progressiva da qualidade da água nos mananciais, com o aumento da pressão ambiental sobre os recursos hídricos. Ao mesmo tempo que a qualidade dos mananciais provavelmente tem se deteriorado, as exigências de qualidade da legislação do setor ficou mais rigorosa e nas reuniões técnicas para revisão da Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde, que define o padrão de potabilidade da água, ficou certo que o VMP (Valor Máximo Permitido) na saída do tratamento seria reduzido à metade em um período de 4 anos. Acredita-se que o aumento de investimentos em tratamento de água pode ser ineficaz se não forem adotadas medidas de proteção dos mananciais, entre as quais a universalização do atendimento por esgotamento sanitário, principalmente no interior, a gestão adequada do solo nas propriedades rurais e a preservação das matas ciliares e do entorno das nascentes. As medidas de prevenção frequentemente provam ser mais econômicas do que o posterior tratamento. Finalizou dizendo que esse indicador mostrou um ponto muito importante para a segurança da qualidade da água, gerando uma mobilização do Estado, junto com as Secretarias envolvidas e um trabalho conjunto na parte de saneamento e resíduos sólidos.

Cristina Medeiros – IPECE sugeriu que Alexandre Caetano (ARCE) escrevesse também sobre essa mobilização e atuação do Estado, em nível de melhores práticas.

Cristina Medeiros – IPECE informou que em relação ao indicador 13 – *Número de Serviços Tecnológicos Realizados* da SECITECE/NUTEC, cuja meta não foi cumprida, um ponto que serve como uma lição aprendida no acompanhamento do mesmo é sempre buscar quantificar realisticamente cada meta. Nesse caso, existiu uma preocupação que a meta estivesse um pouco agressiva, no entanto ela foi mantida. Durante o ano de 2011 a concretização do alcance dessa meta mostrou-se um grande desafio visto que alguns funcionários do NUTEC se aposentaram e faltaram profissionais para da operacionalização dos serviços tecnológicos. Além disso, novas empresas entraram no mercado competindo na prestação dos mesmos serviços, reduzindo a demanda para o NUTEC e impactando negativamente no cumprimento da meta. Mesmo assim o NUTEC conseguiu chegar a 93% da meta.

Assistência Técnica

Cristina Medeiros – IPECE passou a apresentar a posição dos Projetos de Assistência Técnica, e adiantou que todos os produtos foram entregues, restando somente a realização dos pagamentos de alguns, conforme Tabela 4. Houve muitos desafios, como por exemplo, o projeto 20 da SEDUC, cujo último produto foi entregue dentro do prazo, mas sua qualidade não estava a contento. Outro exemplo foi o projeto 25 da SEPLAG, cujo um dos produtos teve o número de capacitações reduzido e o valor da fatura e do contrato teve que ser também ajustado. (Esses dois casos foram submetidos ao Banco Mundial, que no primeiro caso concordou com o recebimento do produto revisado em Julho e no segundo com a redução do produto e respectivo valor.) Com o projeto 14 da PGE, por um desentendimento de informações, achou-se que os produtos não seriam entregues até a data final de 30/06/12 e valor seria transferido para a Categoria I e desembolsado pela fonte 40, mas todos os produtos foram entregues e o pagamento está sendo processado. No caso do projeto 31 (Parte A – Digitalização) do TCE houve um problema de parte do material entregue ter baixa qualidade e

seu pagamento não ser consequentemente aprovado. Portanto, o valor de R\$29.102,56 será transferido para a Categoria I e desembolsado pela fonte 40.

Tabela 4 – Acompanhamento final dos Projetos de Assistência Técnica

Nº Projeto	Órgão	Nome do Projeto	Responsável	Pendências		STATUS
				Qde de produtos	valores	
4	CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade.	Tércia Pinheiro	0	1.653,07	Pagamento a ser processado
6	CONPAM	Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos	Maria Dias	0	194.400,00	Pagamento a ser processado
8	ETICE	Desenvolvimento de Sistema de Avaliação de Resultados do Cinturão Digital do Ceará (*)	Denise Olsen	0	44.625,00	Pagamento a ser processado
12	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo) Parte A.	Cristina Medeiros	0	6.450,00	Pagamento a ser processado
		Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II. (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo). Aquisição de material de TI para as novas instalações do projeto SWAp. Parte B.	Mário Aragão	1	13.100,04	Transferido Fonte 40
		Suporte para funcionamento da UGP.-Aquisição de material de mobiliário para as novas instalações do projeto SWAp - Parte C .	Debora Mariano	0	155.870,26	Pagamento a ser processado
14	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de Empresa para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva	Fernando Grangeiro	0	164.650,00	Pagamento a ser processado
15	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Aquisição de equipamentos.	Fernando Grangeiro	0	9.540,00	Pagamento a ser processado
				0	26.100,00	Pagamento a ser processado
19	SEDUC	Serviço de Consultoria para Fase 2 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará	Betânia e Ana Garcia	0	23.359,50	Pagamento a ser processado
20	SEDUC	Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (2012 - 3ª etapa)	Betânia e Ana Garcia	0	228.247,85	Pagamento a ser processado
21	SEFAZ	Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.	Rejane Muniz	1	439.900,00	Transferido Fonte 40
22	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	Sergio Lage e Fernanda Salles	0	4.620,00	Pagamento a ser processado
25	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.	Mario Fracalossi	0	46.858,27	Pagamento a ser processado
30	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação (servidor).	Vera Coelho	0	118.489,95	Pagamento a ser processado
31	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de Soluções Integradas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Informações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.(Programa TCE 100% Digital). Parte A - Digitalização	Giovanna Adjafre	0	22.237,10	Pagamento a ser processado
				1	29.102,56	Transferido Fonte 40
		Fortalecimento Institucional do TCE – Programa TCE 100% Digital - Aquisição 60 monitores - Parte C.	1	18.750,00	Transferido Fonte 40	
Total				4	1.547.953,60	

Giovanna Adjafre – TCE perguntou o que fazer numa situação como essa.

Cristina Medeiros – IPECE informou que no mês de junho, algumas Secretarias passaram por auditoria com Danilo Carvalho (Banco Mundial) e ele fez um comentário de que o Estado ainda tem algumas fragilidades na área de gerenciamento de Contratos. Com isso, existia a possibilidade de no seu relatório de auditoria haver uma diminuição da nota relativa a esse item.

IX. ACOMPANHAMENTO POR SETORIAL – Projetos em Andamento

1. SEFAZ

Projeto 21: Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.

- Responsável: Rejane Muniz
- Categoria de Licitação: BENS
- Valor: US\$ 221,06 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2011 - Junho 2012
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Adjudicado, aguardando contrato.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

2. SEPLAG

Projeto 22: Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará.

- Responsável: Sérgio Lage e Fernanda Salles
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 106,50 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2009 – Setembro 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço, o saldo contratual será pago com recursos oriundos da categoria I do projeto SWAp.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Fernanda Salles – SEPLAG informou que já recebeu o último produto e que está solicitando o pagamento.

Projeto 25: Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.

- Responsável: Mário Fracalossi
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 102,36 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2009 – Maio 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

3. SEDUC

Projeto 20: Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (3ª etapa).

- Responsável: Eneida Machado e Kennedy
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 127,54 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2011 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Ana Garcia – SEDUC informou que receberam o último produto, mas que não atendeu às expectativas e está aguardando a decisão do Banco Mundial para saber como proceder nessa situação já que produto foi entregue dentro do prazo, mas que existem algumas ressalvas que precisam ser corrigidas.

4. ETICE

Projeto 8: Desenvolvimento de Sistema de Avaliação de Resultados do Cinturão Digital do Ceará.

- Responsável: Denise Olsen
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 45,60 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2011 – Setembro 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

João Carlos – ETICE informou que os produtos foram entregues e aceitos e que até o final do dia, passará a documentação por e-mail.

5. PGE

Projeto 14: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Treinamentos e Seminários na área de Licitações

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 146,29
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2010 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 15: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Compra de Equipamento.

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 22,58 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2012 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Contrato Assinado.
- Estágio Atual: Contrato Assinado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Fernando Grangeiro – PGE informou que já recebeu todo o equipamento do Projeto 15 e que está processando o pagamento dos dois Projetos (14 e 15).

6. CONPAM

Projeto 6: Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos.

- Responsável: Maria Dias
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 106,81 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2011 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

X. SUMÁRIO DOS DESEMBOLSOS E RECURSOS TRANSFERIDOS

Cristina Medeiros – IPECE informou que o último desembolso da Categoria I foi realizado e que 98,12% dos recursos foram desembolsados, conforme Quadro 1. Adiantou que o valor não desembolsado de US\$4.430.218,18, refere-se ao valor retido pelo não cumprimento do Programa 033 da SECITECE de US\$ 3.352.597,54 e o valor retido pelo não cumprimento do Indicador 8b da SESA de US\$1.077.620,64, conforme Quadro 2. Porém Se o Programa Elegível 033 da SECITECE for cumprido até o final de julho, esse valor poderá ser desembolsado em agosto. Informou que o valor do saldo da Categoria II, de US\$ 533.940,75, será transferido para Categoria I e desembolsado na fonte 40, sendo que desse valor, R\$564.416,60¹ será para financiar os projetos 12, 21, 22 e 31, conforme Quadro 3, e o restante do valor de R\$514.864,55², que encontrava-se na reserva de contingência, visto que alguns projetos após a licitação ficaram com valores menores ficará livre para o Governador financiar projetos prioritários. Esclareceu ainda que essa informação já foi repassada por ofício para o Secretário Adjunto Philipe Nottingham (SEPLAG), com a solicitação de mudança dos referidos MAPPs para a fonte 40.

¹ Valor referente a US\$ 254.713,21 utilizando o valor do dólar do último desembolso de 2,0214

² Valor referente a US\$ 279.227,54 utilizando o valor do dólar do último desembolso de 2,0214

Quadro 1 – Valores previstos e desembolsados

TOTAIS VALORES PREVISTOS E DESEMBOLSADOS						
Categorias	Previsto	Realizado			Saldo	
	US\$	US\$	R\$	%	US\$	%
CATEGORIA I	\$235.730.000,00	\$231.299.781,82	\$364.483.801,77	98,12%	\$4.430.218,18	1,88%
CATEGORIA II	\$3.670.000,00	\$3.136.059,25	\$5.615.513,25	85,45%	\$533.940,75	14,55%
FRONT END FEE	\$600.000,00	\$600.000,00		100,00%	\$0,00	0,00%
Sub total	\$240.000.000,00	\$235.035.841,07	\$370.099.315,02	97,93%	\$4.964.158,93	2,07%

Quadro 2 – Sumário dos Desembolsos

SWAP II - Sumário Total Desembolsados (Posição Fevereiro 2012)	
Valor total já desembolsado	\$205.940.083,82
(+) Valor Saldo Projetos de Assistência Técnica I	\$533.940,75
(+) Valor previsto para Junho 2012 II	\$29.095.757,25
Valor Saldo total a ser desembolsado = I + II	\$29.629.698,00
Valor Total a ser desembolsado	\$235.569.781,82
(-) Valor retido de um Programa Elegível	\$3.352.597,54
(-) Valor retido indicador SESA 8b, cuja meta não foi cumprida em 2011	\$1.077.620,64
Valor total retido	\$4.430.218,18
Total Empréstimo	\$240.000.000,00
Atualizado em 18/06/12 pelo client connection	
(1) Statement of Expenditures enviado ao Banco Mundial para o 4º desembolso.	

Quadro 2 – Projetos Transferidos para fonte 40

Nº	nº Projeto Plano de Licitação	Órgão	Descrição Projeto	Valor estimado US\$ mil (1)	Valor estimado R\$ mil	MAPP	Saldo MAPP	Valor a ser incluído na 40	Valor a ser transferido da fonte 48 para 40
1	12	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II. Parte A - Renovação do contratos 14/2011 e 16/2011 (Fabiana Silva e Alice Helena Pinto)	13.357,41	27.000,00	Mapp 18 - Contratação Consultores para Assistir na Gestão e Coordenação de Projetos com o Banco Mundial (2)	8.400,00	18.600,00	8.400,00
2	12	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto. Parte B - Aquisição de material de TI para as novas instalações do projeto SWAp.	6.480,84	13.100,04	Mapp 28 - Aquisição de Material Permanente de TI (3)			13.100,04
3	21	SEFAZ	Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.	217.626,83	439.900,00	MAPP 4 - Maximização da Arrecadação II.			439.900,00
4	22	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	18.088,90	36.564,00	270 - Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará			36.564,00
5	31	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE - Programa TCE 100% Digital - Digitalização - Parte A.	14.397,59	29.102,56				
6	31	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE - Programa TCE 100% Digital - Aquisição 60 monitores - Parte C.	9.275,98	18.750,00				
Sub total - Transferir para categoria I				279.227,54	564.416,60				
Reserva de contingência (4)				254.713,21	514.864,55				
Total - Transferir para categoria I				533.940,75	1.079.281,15				
Conferência				533.940,75	1.079.281,15				

(1) O valor em R\$ foi convertido ao dólar de 2,0214 do último desembolso.

(2) Redação proposta com pequena alteração.

(3) Esse valor esta incluso atualmente no Mapp 52 - Substituição de forros, divisórias e equipamentos deteriorados da área ocupada pelo IPECE.

(4) Valor que sobrou dos Projeto de Assistência Técnica após as Licitação e conversão do dolar maior que previsto nos últimos desembolsos.

XI. ENCERRAMENTO

Cristina Medeiros - IPECE solicitou que ao encerrar essa última reunião do Comitê SWAp II, todos contribuíssem com um pronunciamento sobre a experiência de participar do Projeto de Apoio a Inclusão Social e Crescimento Econômico - SWAp II.

Fabrizio Gomes – SEFAZ informou que entrou no Projeto Swap II com certa desconfiança, pois como economista não entendia o porquê de um Estado com uma situação fiscal equilibrada submeter-se a um tipo de operação de crédito com tantas exigências, tendo em vista que o Governo poderia obter outras operações semelhantes, sem tantas exigências. Além disto, inicialmente as reuniões não pareciam algo muito proveitoso, pois muitos assuntos não estavam diretamente ligados a sua setorial e muitas vezes pensava em tudo que tinha para fazer na SEFAZ. Com o decorrer do processo e as participações nas reuniões percebeu a importância do projeto, da institucionalização de boas práticas que só vêm para contribuir com processo de melhoria da gestão do Estado do Ceará, percebeu também que a sinergia entre as setoriais é de fundamental importância para o sucesso de um modelo onde o todo se sobrepõe a interesses particulares. Então percebeu que já opinava sobre assuntos da SEDUC, da SESA, ou seja, já procurava participar de forma a contribuir para o sucesso da operação, já vibrava quando um colega trazia resultados positivos de outras setoriais. Apesar de muito esforço, alguns indicadores não foram cumpridos, mas não obstante essas “notas baixas”, no geral o resultado foi um sucesso, principalmente porque não importa a “nota” que você tire e sim o aprendizado, pois é o legado que fica e pode ser disseminado e inserido de forma efetiva na Instituição Estado do Ceará.

Ailson Filho – SEPLAG informou que, no período ao qual participou do Projeto, percebeu que há, em nível de Estado, uma fragilidade em relação aos sistemas corporativos, nos detalhamentos que o empréstimo requer. Devem se buscar, continuamente, melhorias para que a informação requerida seja repassada com mais confiabilidade pelas setoriais. Ao mesmo tempo, uma importante contribuição do Projeto, na sua visão, é o incentivo ao Estado para o atingimento de metas e na busca pelo aperfeiçoamento dos seus sistemas corporativos. Acredita que, do início do Projeto até o final, houve um avanço nas informações repassadas, mas ressalta que nem todas as fragilidades foram sanadas, como prova os relatórios de Auditoria do TCE que detectaram problemas recorrentes.

Ricardo Meira – CAGECE informou que o projeto foi conduzido de forma profissional e, pelos resultados produzidos, foi de grande importância para o Estado do Ceará. O desafio de realizar um Programa desse porte, envolvendo várias ações e um considerável número de setoriais, se traduziu em um grande aprendizado. Informou também sobre a dificuldade de realização de licitações nos Programas Elegíveis visto que as políticas do Banco impõem muitas restrições e muitas vezes não concilia com a legislação do Estado.

Ana Garcia – SEDUC informou que uma boa prática, e que considera como uma lição aprendida que muito contribuiu para melhor operacionalização dos Projetos constantes no SWAp II desta Secretaria, foi a participação efetiva nas reuniões do Comitê, o que favoreceu, sobremaneira, a articulação e entrosamento com as demais setoriais intervenientes e responsáveis pelos procedimentos e tramites processuais.

Giovanna Adjafre – TCE informou que o TCE vem trabalhando com o BID desde 2006, com o PROMOEX - Programa de Modernização dos Tribunais de Contas dos Estados, Distrito Federal e Municípios, em que também recebe recursos para execução de projetos. O SWAp configura-se como a 2ª experiência na execução de projetos financiados por recursos externos. Portanto, a participação do TCE no Componente de Assistência do SWAp, assim como no

PROMOEX, foi desafiadora para ela que coordeno os dois projetos pois, até então, sua experiência no Tribunal tinha sido apenas como auditora, até porque essa é sua função. A coordenação proporcionou-me vivenciar o outro lado, o da execução, inclusive passando a ser auditada. Também foi possível interagir com outras áreas do próprio Tribunal, envolvidas/beneficiadas com a execução dos projetos, bem como com as áreas operacionais. A participação nos Comitês mensais também foi enriquecedora, pois me permitiu interagir com outras setoriais, inclusive compartilhando as dificuldades enfrentadas na execução dos programas elegíveis, bem como na execução dos projetos de assistência técnica. Pela 1ª vez não houve inibição por parte de nossos jurisdicionados em tratar das dificuldades perante o Tribunal de Contas. Quanto à participação do TCE como auditor externo da Operação SWAp II, também foi um desafio haja visto que os trabalhos foram iniciados quando a Operação já tinha mais de um ano de execução. Além disto, com a auditoria foram desenvolvidas novas metodologias e procedimentos que estão sendo incorporados aos trabalhos de outras áreas de fiscalização do TCE. As reuniões com as setoriais para discussão dos achados de auditoria foi outro momento importante, pois as setoriais passaram a encarar o TCE não apenas como o órgão responsável pela fiscalização e aplicação de sanções, mas, também, como um orientador.

Fernando Grangeiro – PGE informou que participou do Projeto SWAp II desde sua implantação em 2009, sendo uma experiência nova e com muitos desafios. O Projeto proporcionou um grande aprendizado para os que trabalharam na Operação que envolveu recursos internacionais. Acredito que o objetivo de todas as Secretarias e Setoriais envolvidas foi o trabalho de forma integrada e com bastante interesse de todos que participaram do referido Projeto, fazendo com que chegássemos ao final com índices bastante significativos. No caso específico da Procuradoria Geral do Estado, o Projeto SWAp possibilitou a realização de Treinamentos na Área de Licitações e Contratos para os servidores da Central de Licitações. Os referidos Treinamentos foram realizados pela empresa TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA, e ministrados por professores de alto nível intelectual e notória especialização na área de licitações, contribuindo de forma expressiva na capacitação dos servidores da Central de Licitações do Estado do Ceará. Gostaria de ressaltar que o apoio recebido do Banco Mundial, através do Gerente do Projeto, Tom Kenyon e toda sua equipe de Especialistas e Consultores, bem como a participação do IPECE, na pessoa do seu Diretor Dr. Flávio Ataliba, da Coordenadora Cristina Medeiros e toda sua equipe de consultoras, foram fatores fundamentais para o êxito da Operação SWAp II.

Alexandre Caetano – informou que os resultados do Projeto ajudaram a identificar problemas ambientais importantes com impacto significativo na qualidade da água, motivando a formação de grupos de trabalho transversais no Estado, envolvendo áreas como saúde, meio ambiente, recursos hídricos e infraestrutura, com resultados concretos importantes como a produção de anteprojeto de Lei para revisão da política estadual de resíduos sólidos em trabalho coordenado pelo CONPAM, discussão de política estadual de saneamento básico, apoio à elaboração de mais de 60 planos de saneamento básico para pequenos municípios do interior e elaboração de planos regionais de resíduos sólidos. Além disso, a assistência técnica à ARCE para elaboração do Manual de Indicadores de Desempenho dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, que será aplicado à regulação da CAGECE, permitiu desenvolver um novo modelo para a regulação da qualidade dos serviços, a *regulação sunshine*, que poderia ser aplicada à outros modelos importantes de prestação dos serviços, em especial às Autarquias Municipais de Saneamento, abrindo nova perspectiva de desenvolvimento da regulação do saneamento no Estado.

Lorena Girão – COGERH teve como experiência o PROGERIRH, que também era um Programa financiado pelo Banco Mundial, e com isso, entende um pouco a sistemática do SWAp e elogiou as reuniões do Comitê que participou.

Rejane Muniz – SEFAZ informou que a SEFAZ tem um grande volume de investimentos com recursos do BID - PROFISCO. Isso levou a Secretaria a uma concentração de esforços e conhecimentos nas políticas de aquisição do BID, sendo as políticas do BIRD-SWAP II novas para esta Instituição, levando um certo tempo para adequações de rotinas internas ao novo processo. Informou também que ficou muito surpresa com o efetivo acompanhamento da Coordenação e agradeceu a PGE por ser flexível no processo de licitação do Projeto de Assistência Técnica.

João Carlos – ETICE informou que participando do Projeto SWAp II teve a possibilidade de conhecer e constatar a transversalidade de muitas ações por parte das setoriais, evitando retrabalho e permitindo a colaboração para o alcance dos objetivos estratégicos do Governo. Embora cada setorial tenha os seus objetivos específicos, esta interação ajuda a identificar que estamos todos colaborando com a missão maior do Governo do Estado, preconizada pelos pilares estabelecidos em suas diretrizes. A visão de "projeto" com início e fim determinados, além de possibilitar a prática de gerenciamento de projeto, tão incentivada pelo Governo do Estado, auxilia na conclusão de muitas ações que poderiam ser postergadas diante das dificuldades encontradas, ou em detrimento de outras ações, ou pelo acúmulo das atribuições diárias. No caso específico da ETICE, houve um grande aprendizado durante o processo de contratação de uma consultoria na modalidade de Seleção pela Qualificação do Consultor (SQC), segundo as normas do BM. A maior dificuldade foi que no momento inicial do Projeto, incluiu-se como assistência técnica um projeto de avaliação de impacto do Cinturão Digital, cuja realização mostrou-se impossível, diante da data de início de operação do Cinturão Digital e o prazo disponível para a conclusão do Projeto.

José Iran – SEDUC informou que para acompanhar os processos de aquisição dos Programas Elegíveis que, em um dia, chega a ter na faixa de 40 a 50 processos, foi implantado a auditoria interna para análise dos processos visando corrigir possíveis falhas antes da execução.

Eneida Machado – SEDUC informou que a Operação SWAp foi muito importante para a Secretaria da Educação, permitindo um monitoramento efetivo dos indicadores, a eficiência dos gastos, além de propiciar a intersetorialidade. Ressaltou o trabalho da Unidade de Gerenciamento do Projeto que cooperou com a instituição em momentos decisivos, quando da operacionalização das Assistências Técnicas. Possibilitou, também, com esse componente, a realização de pesquisas de interesse da Setorial e do Estado, onde seus resultados redirecionaram ações e tomadas de decisão. Adiantou que a inserção de outros profissionais da SEDUC no processo foi fundamental para melhoria do fluxo das ações. Por fim, frisou que o acompanhamento das ações da educação pelo Banco Mundial sempre ocorreu de forma a cooperar tecnicamente com o Estado.

Tércia Pinheiro – CIDADES informou que o Projeto SWAp II possibilitou a discussão de assuntos importantes como o da destinação final dos resíduos sólidos de saúde com a SESA e o CONPAM, assim como o referente a qualidade da água junto a ARCE e CAGECE. Além disso, o projeto de assistência técnica possibilitou a Secretaria adquirir diagnósticos e Planos de Ação para melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água de quatro municípios e ganhar experiência quanto ao processo de licitação para contratação de consultoria na modalidade SQC.

Ana Márcia - SESA informou que o Projeto de apoio á Inclusão Social e no Crescimento Econômico no Ceará possibilitou a melhoria da qualidade dos Serviços de Atenção Básica, tanto na qualidade do serviço, através da implantação/implementação do Projeto de Avaliação para a Melhoria da Estratégia Saúde da Família – AMQ, que orienta a gestão e as Equipes de Saúde da Família na priorização de ações com vistas á melhoria da qualidade, como também

na infra-estrutura, através da obtenção de recursos para construção de unidades básicas padronizadas e aquisição de veículos para transporte das Equipes de Saúde da Família. Na Atenção Especializada a implantação do sistema de custos nos hospitais pólo selecionados, possibilitou uma melhoria no nível de eficiência gerencial, através da capacitação da equipe desses hospitais, como também da tecnologia gerencial disponibilizada para estes, permitindo que a SESA faça o acompanhamento e análise da gestão financeira desses hospitais. O processo de certificação do Hospital São Vicente de Paulo de Itapipoca foi uma iniciativa que motivou a implantação de um processo de reestruturação e modernização do hospital, com a finalidade de obter a certificação da qualidade junto a ONA. Entretanto apesar dos esforços da SESA, do Hospital Geral Waldemar Alcântara -HGWA e do Hospital São Vicente de Paulo que passou por uma grande modernização tanto da estrutura física, como da reestruturação operacional voltado para a segurança do paciente, não foi possível dentro do prazo estabelecido, obter a certificação. Mas a SESA e o HGWA continuam apoiando o processo de certificação do hospital, que desenvolveu um plano de ação, no qual a SESA pode acompanhar melhor as ações necessárias para a certificação. Todo esse esforço possibilitou que a SESA adquirisse expertise no processo de Certificação de Qualidade pela ONA.

Fátima Falcão – SEPLAG informou que vários aspectos importantes no SWAp II merecem ser mencionados, neste momento de avaliação, no entanto, gostaria de destacar a importância do Projeto no Ceará ter elegido como um dos objetivos o fortalecimento da gestão por resultados, condicionando os desembolsos ao alcance das metas de indicadores e às regras definidas para os programas de gastos qualificados. Desta forma, avalia que o SWAp é mais do que um projeto de financiamento, é na verdade uma estratégia para fazer o Estado avançar na gestão pública. É uma estratégia inteligente porque não se trata de um programa setorial, como a maioria dos programas financiados com crédito externo, mas um projeto cujos recursos o Estado decide sobre em que setores alocá-los, tendo por outro lado, que desenvolver esforços na realização de ações que produzem efeito em indicadores de desempenho fiscal, de setores sociais, de recursos hídricos e de melhoria do ambiente de negócios. Como alguns colegas já destacaram, reafirma, usando as palavras de um ex-secretário do Estado – “o mais importante do trabalho com o Banco Mundial não são os recursos, mas a pedagogia de trabalho”. Quanto aos indicadores primários sob responsabilidade da SEPLAG, especificamente os RDS e RPR, destacou sua importância para se avançar com o modelo de gestão por resultado em implementação na administração estadual, na medida em que se buscou aperfeiçoar esses relatórios e a escolha dos seus temas e suas apresentações se constituíram pauta de reuniões e discussões no âmbito do COGERF. Da parte do BM, achou que faltou uma análise mais aprofundada desses relatórios, bem como uma recomendação ao Governo, de aprofundar questões desafiantes e de implementar sugestões indicadas para melhoria das políticas. Ressaltou que houve a frustração de não contratar o projeto de assistência técnica previsto para dar suporte à disseminação do modelo de Gestão Pública por Resultados (GPR), em virtude da licitação ter sido “fracassada”. Por fim, parabenizou a UGP do SWAp pela condução dos trabalhos e ressaltou o empenho desse Comitê para o alcance dos resultados do Projeto SWAp II.

Fernanda Salles – SEPLAG informou que o projeto SWAp II foi uma experiência bastante enriquecedora. Foi muito interessante ter uma visão sistêmica do Estado, conhecer os problemas e desafios das secretarias envolvidas. As reuniões do Comitê possibilitaram valiosa troca de experiências entre seus membros. Em relação ao Projeto de Assistência Técnica da CPREV/SEPLAG, ressaltou o significativo retorno financeiro gerado para o Estado. Aproveitou a oportunidade para parabenizar a coordenação do projeto, principalmente a Sra. Cristina Medeiros, que envidou grandes esforços para o sucesso do projeto.

Maurício Giffonni – SEMACE informou que representa a SEMACE neste Comitê do SWAP II. E como ficou por último, teve a oportunidade de ouvir os comentários de todos que o antecederam. Assim como todos, enalteceu a forma competente como foi conduzido esse Comitê pelo IPECE, na pessoa da Cristina Medeiros e a colaboração que recebeu também da equipe de apoio na pessoa da Consultora Fabiana Castro. Essa experiência de interagir com todas as setoriais envolvidas foi muito enriquecedora pois teve a oportunidade de conhecer como funciona a "roda" da máquina do Estado, numa visão sistêmica, e que o trabalho de cada setorial interage e contribui em conjunto, para o êxito do Projeto e a boa performance do Estado. Na sua visão, um dos grandes gargalos que impossibilitou que tirássemos a "nota 10" no Projeto foi o fato de os MAPPs relacionados com os projetos de interesse do Comitê não tivessem sido aprovados pelo Governador nas reuniões em que eram apresentados. Isso levou a uma reunião urgente, em outubro, deixando um tempo muito exíguo para as licitações e contratações de ações de alguns Programas Elegíveis. Como lição aprendida, acha que o IPECE e a SEPLAG devem chegar junto ao Governador e mostrar com clareza a importância da aprovação desses MAPPs para o bom êxito do Projeto. Em relação à SEMACE foi muito importante o resultado da Consultoria contratada dentro do Projeto de Assistência Técnica para organizar, modernizar e agilizar a tramitação dos processos de licenciamento no órgão. Entretanto apesar do grande avanço nesse sentido e do cumprimento da meta estabelecida para o indicador secundário, enfatizou a necessidade de haver um reforço no quadro de servidores da SEMACE. Atualmente contam com apenas 37 técnicos para analisar os processos de Licenciamento. Tem-se um passivo de mais de 5.000 processos e anualmente, mais de 3.000 processos novos dão entrada, demandando por licenciamento. Isso resulta num acúmulo de 250 a 300 processos por técnico - o que torna-se impossível a solução desse impasse. Ressaltou ainda que 60% dos servidores atuais da SEMACE poderão se aposentar nos próximos 6 anos. Adiantou que a SEMACE contribui muito para a preservação do meio ambiente nas liberações desses licenciamentos dentro dos padrões da legislação ambiental. São muitos os grandes projetos prioritários que necessitam desses serviços como a siderúrgica, a refinaria, as usinas de energia eólica, os resorts, etc. Portanto foi muito oportuna a conclusão dos trabalhos do recente Workshop com os técnicos do Banco Mundial, que colocou para o Governo como prioridade o reforço institucional da SEMACE, juntamente com a CAGECE e a ARCE.

Flávio Ataliba – IPECE informou que o projeto já havia iniciado quando se tornou Coordenador. O Projeto mostrou a importância da integração das Secretarias, já que a experiência de uma serve para acrescentar a experiência da outra. Percebeu que as Secretarias desejam fazer a coisa acontecer, mas existe a burocracia e legislações que dificultam o processo. Acredita que existe o temor de que as experiências sejam perdidas, percebeu também que há dificuldade da informação chegar até o Secretário, ou seja, um problema de comunicação entre os coordenadores e técnicos e o gestor principal. Concordou com o Maurício Giffonni quando ressaltou sobre o grande gargalo, fato de os MAPPs relacionados com os projetos de interesse do Projeto não foram aprovados pelo Governador nas reuniões em que eram apresentados. Acredita que as informações relatadas trimestralmente ao COGERF do desempenho do Projeto, seus desafios e necessidades de aprovação de MAPP não são repassadas ao Governador. Frisou a importância do momento no dia 28/10/2012 quando o Governador escutou as dificuldades do Projeto e tomou as devidas decisões que possibilitaram o cumprimento de várias metas. Agradeceu a Cristina Medeiros pelo trabalho realizado. Finalizou informando que o Projeto foi bom para o Estado deixando um desejo de melhorar e espera contar com todos para a execução do PforR.

Cristina Medeiros – IPECE saudou com palmas pela contribuição de todos no sucesso do Projeto SWAp II e agradeceu o compromisso de todos do Comitê no alcance dos resultados para o Estado.

Às 11h20m Flávio Ataliba encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

XII. PARTICIPAÇÃO

O acompanhamento das participações das setoriais nas reuniões do Comitê SWAp II é realizado mensalmente conforme tabela (**Anexo III**) e gráfico (**Anexo IV**).

XIII. ANEXOS

Anexo I – Relatório Completo de Acompanhamento do Desempenho das Setoriais;

Anexo II – Apresentação em *PowerPoint*;

Anexo III – Tabela – Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais;

Anexo IV - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais.

ANEXO I


RELATÓRIO COMPLETO DE ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DAS SETORIAIS

1. SEFAZ

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 1: Saldo Fiscal Corrente do Estado (Receitas Correntes menos Despesas Correntes).


- Meta 2011: R\$ 1.293,00 milhões
- Posição em 31/12: R\$ 1.882,18 milhões
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: As receitas e as despesas correntes se comportam conforme o esperado.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta superada.

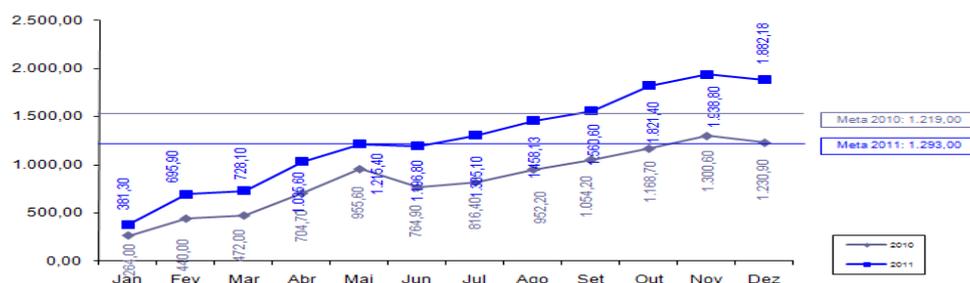

Sentido do indicador: ↑

Indicador 2: Índice Hefirndahl de arrecadação de ICMS usando quatro setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).

- Meta 2011: $\leq 0,35$
- Posição em 31/12: 0,297695
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: Não há nenhuma indicação de que haja concentração de arrecadação de ICMS em algum dos setores estudados que possa aumentar o índice além da meta.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.



Sentido do indicador: ↓

Indicador 14: Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.

- Meta 2011: $\geq 35,00\%$
- Posição em 31/12: 80,00%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE

- Justificativa: Com a vigência da Lei Complementar nº. 128/2010, as empresas do MEI são cadastradas automaticamente na SEFAZ/CE a partir do registro informado pela Receita Federal. Essas informações foram disponibilizadas por este órgão desde abril de 2010 e foram introduzidas no Estatístico do Cadastro da SEFAZ/CE nesta data.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.




Sentido do indicador: ↑

Fabrizio Gomes – SEFAZ explicou que a meta desse indicador foi cumprida e é referente à área de tributação.

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 1: Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário (% dos contribuintes ativos do regime de recolhimento normal que declaram saldo devedor na DÍEF que a SEFAZ inscreve na Dívida Ativa).

- Meta 2011: ≤10,00%
- Posição em 31/12: 3,26% (valor referente ao período de março a julho 2011)
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Comentários: Acordado com o BM que o indicador seria medido três vezes em 2011, com informações quadrimestrais referente ao período de cinco meses. Informação fornecida após a missão (19/12/11).

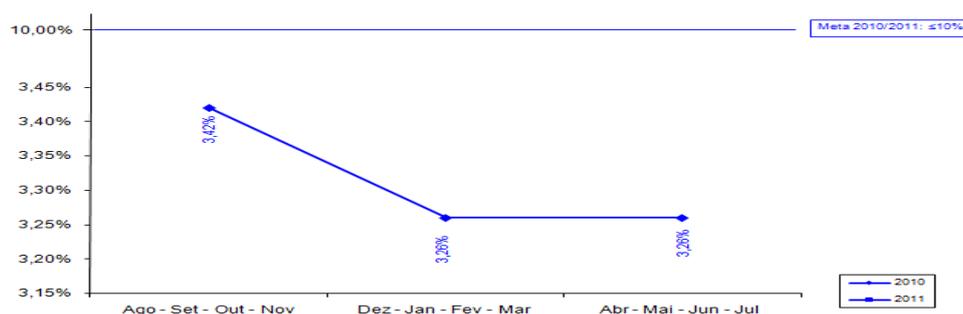

Sentido do indicador: ↓

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA¹

Projeto 21: Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.

¹ Legenda da Sinalização para cumprimento dos Projetos de Assistência Técnica:

Verde=Realização conforme o Plano de Licitações; Amarelo = Realização com atraso mais de um dia; Vermelho = Realização com atraso de mais de três meses.

- Responsável: Rejane Muniz
- Categoria de Licitação: BENS
- Valor: US\$ 221,06 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2011 - Junho 2012
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Adjudicado, aguardando contrato.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

2. SEPLAG

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 3: *Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.*

- Meta 2011: 15
- Posição em 31/12: 15
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.
- Comentário: Relatórios publicados no site em 30/03/2012.

Indicador 4: *Número de "Relatórios de Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.*

- Meta 2011: 7
- Posição em 31/12: 7
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de cumprimento: meta cumprida.
- Comentário: Relatórios publicados no site em 13/04/2012.

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 2: *Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no discurso anual do Governador na Assembleia.*

- Meta 2011: 2
- Posição em 31/12: 2
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de cumprimento: meta cumprida.
- Informações disponíveis nos links:
- ✓ http://www.seplag.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1911&Itemid=1702
- ✓ http://www.seplag.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1970&Itemid=1705

Indicador 3: *Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.*

- Meta 2011: ≤3 meses
- Posição em 31/12: 1,24 meses*
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de cumprimento: meta cumprida.

(*) Comentário: A média anual do indicador para 2011 foi de 1,99 meses.



Sentido do indicador: ↓

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 22: *Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará – SEPLAG.*

- Responsável: Sérgio Lage e Fernanda Salles
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 106,50 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2009 – Setembro 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço, o saldo contratual será pago com recursos oriundos da categoria I do projeto SWAp.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 23: *Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras.*

- Responsável: Soraya Quixadá
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 100 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2010 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Homologação.
- Estágio Atual: Homologação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 24: *Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo à sociedade em geral e as entidades representativas das empresas.*

- Responsável: Soraya Quixadá
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 107,60 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2010 – Maio 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 25: *Desenvolvimento de Solução Informatizada para monitoramento da Cooperação Técnico-financeira do Estado do Ceará – SEPLAG.*

- Responsável: Mário Fracalossi
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 102,36 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2009 – Maio 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

3. SEDUC


INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 5: Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas.

- Meta 2011: $\geq 90\%$
- Posição em 31/12: 100%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de cumprimento: meta cumprida.
- Comentários: Relatórios entregues no dia 30/04/2012

Indicador 6a: Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: "Alfabetização na Idade Certa".


- Meta 2011: 80%
- Posição em 31/12: 100%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida

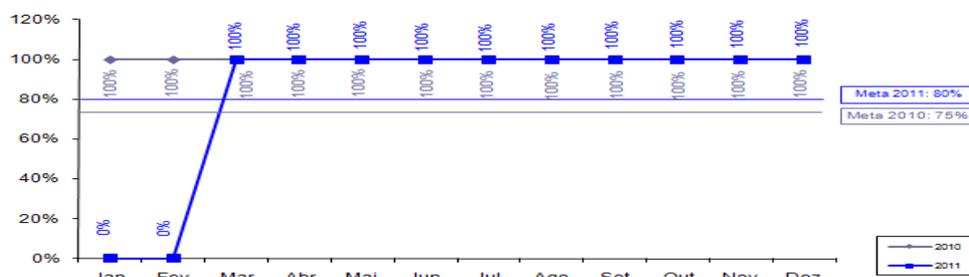

Sentido do indicador: ↑


Indicador 6b: Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização na Idade Certa" entregue às escolas.

- Meta 2011: $\geq 80\%$
- Posição em 31/12: 100%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida

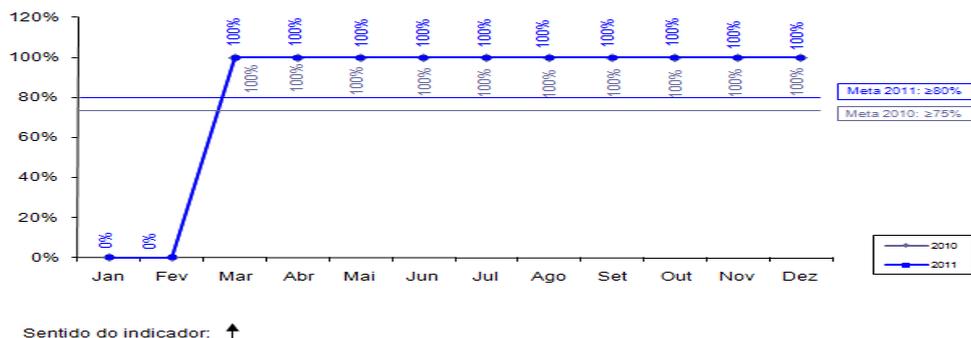

Indicador 6c: Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.

- Meta 2011: 60%
- Posição em 31/12: 100%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida

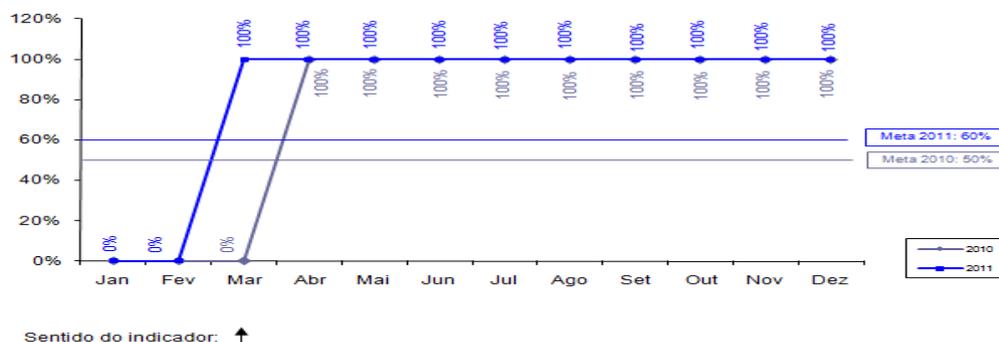

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 5: Avaliação da Implementação municipal do programa “Alfabetização da Idade Certa” (uma em 2009 e uma em 2011).

- Meta 2011: 1
- Posição em 31/12: 1
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.

Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- Meta 2011: 80%
- Posição em 31/12: 81,40%
- Posição em 31/12 em relação a meta: VERDE
- Perspectiva de cumprimento: meta cumprida.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 16: Avaliação do Programa E- Jovem.

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 72,90 mil
- Método de Aquisição: SQC

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2009 - Setembro 2010
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 17: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 1ª Etapa.

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 35,36 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2009 – Setembro 2010
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 17: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 2ª Etapa.

- Responsável: Eneida Machado
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 36,85 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2010 - Outubro 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Último produto entregue aguardando retorno da setorial quanto ao aceite para efetivação do pagamento.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 18: Serviço de consultoria para a Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico – Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará.

- Responsável: Eneida Machado e Kennedy
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 86,90 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2010 - Agosto 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 19: Serviço de consultoria para Fase 2 da Implantação de um Projeto Técnico-Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará.

- Responsável: Eneida Machado e Kennedy
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 180,47mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2011 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.

- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 20: Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (3ª etapa).


- Responsável: Eneida Machado e Kennedy
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 127,54 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2011 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

4. SESA

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicador 7a: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.

- Meta 2011: 30,00%
- Posição em 31/12: 76,40%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida
- Comentários: Relatório encaminhado em 12.03.2012.

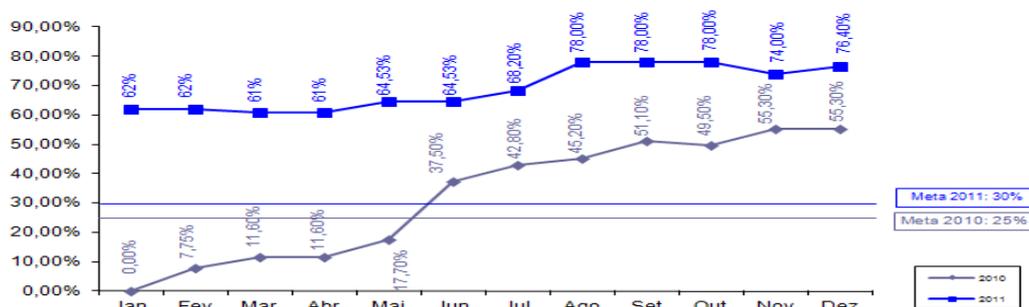


Sentido do indicador: ↑

Indicador 7b: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.

- Meta 2011: 30,0%
- Posição em 31/12: 30,7%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida
- Comentários: O relatório enviado em 14.03.2012.

Indicador 8a: Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.

- Meta 2011: 12
- Posição em 31/12: 13
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida

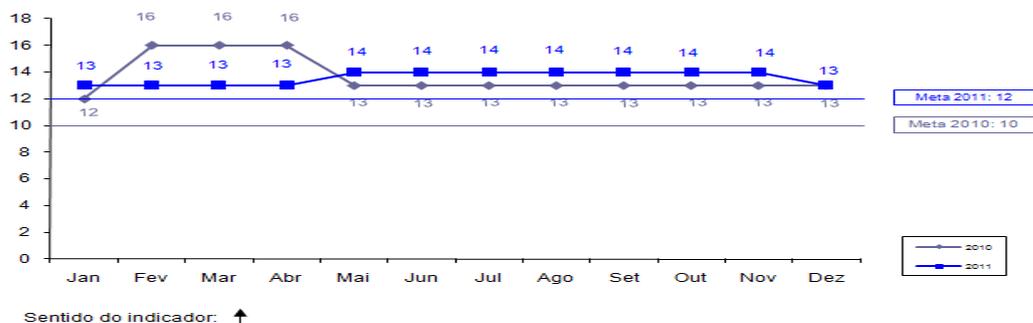


Indicador 8b: Número de hospitais com certificação de qualidade da ONA.

- Meta 2011: 1
- Posição em 31/12: -
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de Cumprimento: meta não será cumprida.
- Comentários: Banco Mundial informou que irá considerar o pedido de Waiver e SESA está elaborando Plano de Ação junto com a equipe do Hospital Waldemar de Alcântara e do Hospital São Vicente de Paulo - Itapipoca para dar prosseguimento aos esforços na obtenção da certificação.

Indicador 9: Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.


- Meta 2011: 15
- Posição em 31/12: 15
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.

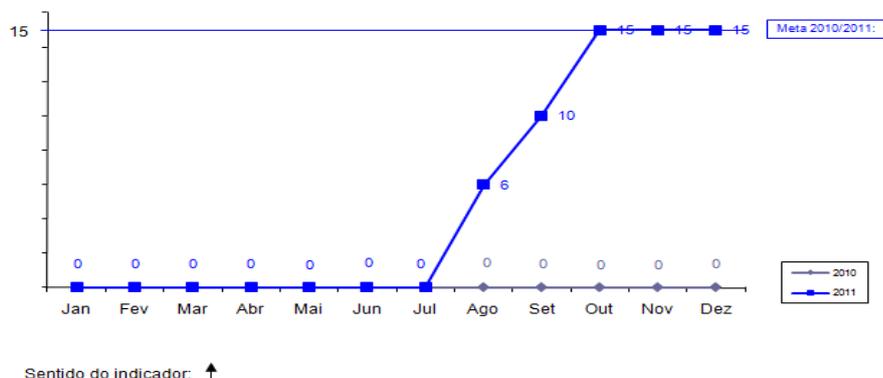

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicador 7: População Atendida pelas Equipes do PSF.

- Meta 2011: 6.468.331
- Posição em 31/12: 7.028.280
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.

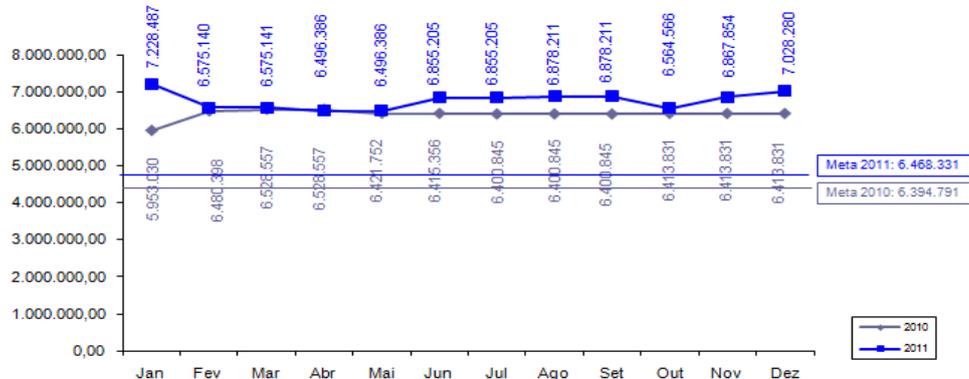


Sentido do indicador: ↑

Indicador 8: Relatórios semestrais do “Grupo da Água para combater a diarreia infantil que leva a internação”.

- Meta 2011: 2
- Posição em 31/12: 2
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.

Indicador 9: Coleta sistemática e relato peso/altura dos bebês.

- Meta 2011: 60,00%
- Posição em 31/12: 70,13% (*)
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.

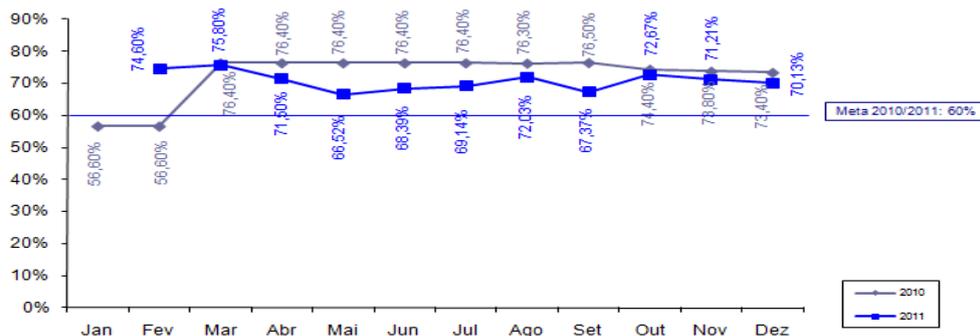

Sentido do indicador: ↑

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 26: Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 93,76 mil
- Método de Aquisição: SQC

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2010 – Dezembro 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 27: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Validação da Metodologia.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 28,89 mil
- Método de Aquisição: Diretrizes Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2009 – Agosto 2010
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 28: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Definições e ajustes no modelo de absorção.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 56,05 mil
- Método de Aquisição: Diretrizes Consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2010 – Outubro 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 29: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Compra de equipamentos de informática para habilitar as CRES.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 141,80 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2010 – Março 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 30(Parte A): Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informática.

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 234,16 mil
- Método de Aquisição: Pregão (Ata de Registro de Preço)
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2010 – Março 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 30(Parte B): Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informática (Servidores e Switches).

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 148,03 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2011 – Janeiro 2012
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Aguardando posicionamento do fornecedor quanto à entrega dos últimos equipamentos.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERMELHO

Projeto 30 (Parte C): Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação (no break e rádio).

- Responsável: Vera Coelho e Helena Lima
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 28,86 mil
- Método de Aquisição: Pregão (Ata de Registro de Preço)
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2010 – Março 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

SALVAGUARDAS

Gestão de Resíduos Sólidos Hospitalares.


Relatório Trimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II, entregues ao Banco Mundial até a posição do 1º trimestre de 2012.

5. COGERH

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador 10: Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.

- Meta 2011: $\geq 37\%$
- Posição em 31/12: 39%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.

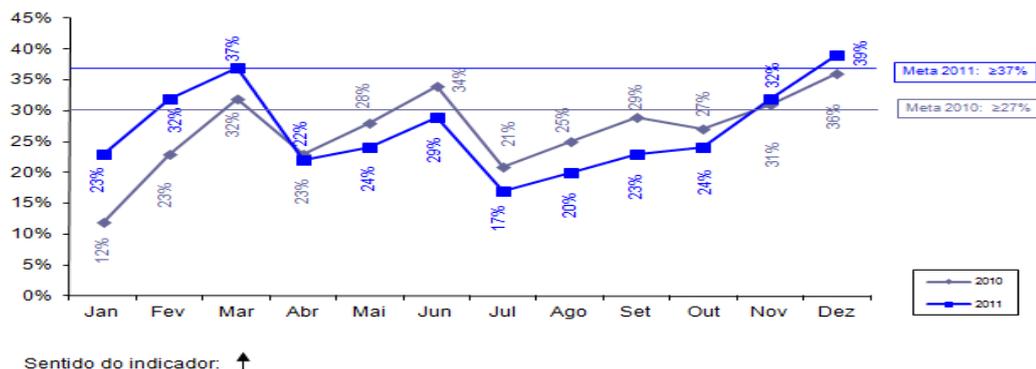


6. CAGECE

INDICADORES PRIMÁRIOS


Indicador 11a: *Número de ligações urbanas de água.*

- Meta 2011: 275.122
- Posição em 31/12: 315.803
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: De 2006 a dezembro de 2011 foram executadas 315.803 ligações domiciliares de água.
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.

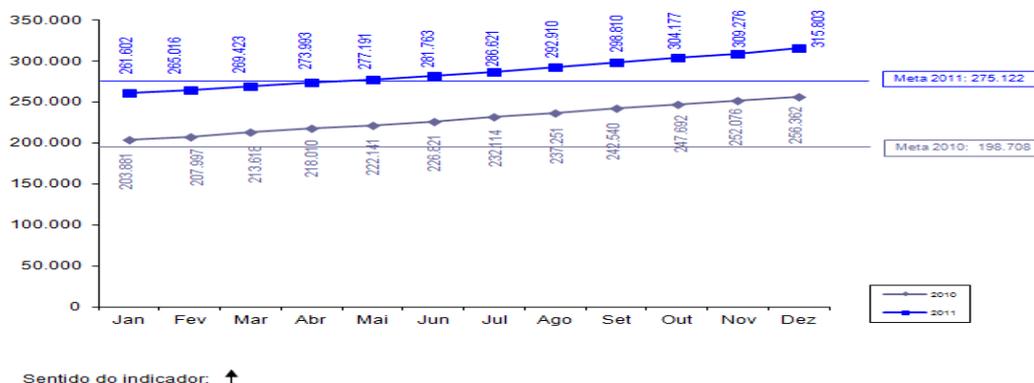

Indicador 11b: *Número de ligações de esgotos.*


- Meta 2011: 124.775
- Posição em 31/12: 139.845
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: De 2006 a dezembro de 2011 foram executadas 139.845 ligações domiciliares de esgoto.
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.

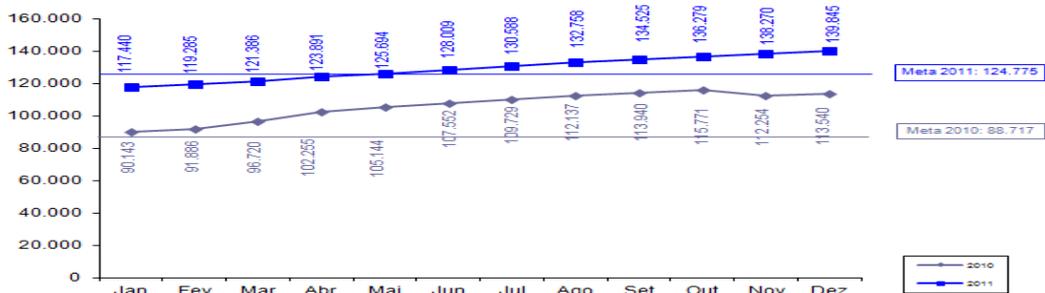

Sentido do indicador: ↑

Indicador 12: *Percentual de Perda de Água.*

- Meta 2011: ≤ 27% (*)
 - Posição em 31/12: 26,08%
 - Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
 - Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.
 - Justificativa: De 2007 a novembro de 2011, o percentual de perda de água foi de 26,03%.
- (*)Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 28,20% para 27%.

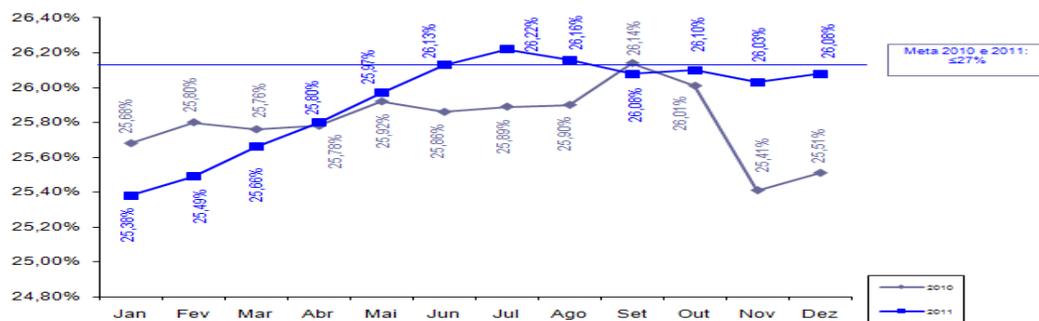


Sentido do indicador: ↓

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 10: *Margem EBITDA da CAGECE.*

- Meta 2011: 22,72% (*)
 - Posição em 31/12: 25,75%
 - Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
 - Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida
- (*)Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 29,50% para 22,72%.

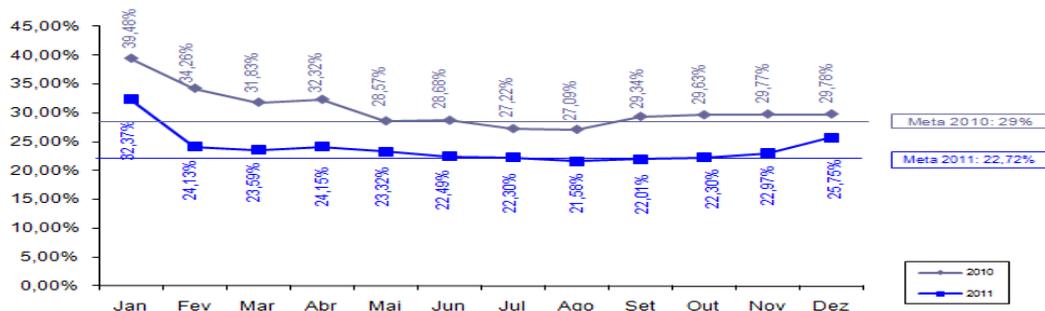

Sentido do indicador: ↑

SALVAGUARDAS

Reassentamento e Desapropriações

Relatório Trimestral de Acompanhamento da Salvaguarda de Reassentamento e Desapropriação entregue ao Banco Mundial até a posição do 1º trimestre de 2012.

7. CIDADES

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 4: Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade.

- Responsável: Tércia Pinheiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 106,43 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2011 – Maio 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

SALVAGUARDAS

Gestão de Resíduos Sólidos Hospitalares


Relatório Trimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II, entregues ao Banco Mundial até a posição do 1º trimestre de 2012.

8. ETICE

INDICADOR PRIMÁRIO

Indicador 13: Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.

- Meta 2011: 4.365.700
- Posição em 31/12: 4.387.816
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.

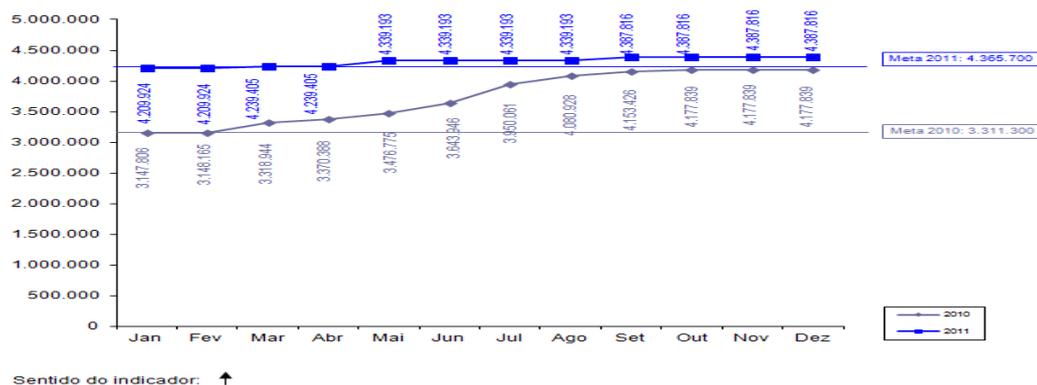

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 12: Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com sistemas).

- Meta 2011: 3
- Posição em 31/12: 3
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Justificativa: Os sistemas Ciclo Orçamentário, Middleware de Integração e Patrimônio, componentes do S2GPR, encontram-se implementados.
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 7 Realização de Workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de internet.

- Responsável: Denise Olsen
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor: US\$ 32,72 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2009 – Setembro 2009
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 8: Desenvolvimento de Sistema de Avaliação de Resultados do Cinturão Digital do Ceará.

- Responsável: Denise Olsen
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 45,60 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2011 – Setembro 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE


9. PGE

INDICADOR SECUNDÁRIO

Fernando Grangeiro – PGE informou que em 2011 a meta foi alcançada e que para conhecimento em março de 2012 atingiu-se 7,69% dos processos de licitação fracassados.

Indicador 4: *Redução de processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato.*

- Meta 2011: $\leq 10,5\%$
- Posição em 31/12: 9,76%*
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida.
- Comentário: o percentual médio da meta no período de janeiro a dezembro de 2011 foi de 8,60%.



Sentido do indicador: ↓

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 14 Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Treinamentos e Seminários na área de Licitações

- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 146,29
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2010 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 15 Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Compra de Equipamentos.


- Responsável: Tarso e Fernando Grangeiro
- Categoria de Licitação: Bens
- Valor: US\$ 22,58 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2012 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Contrato Assinado.
- Estágio Atual: Contrato Assinado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

10. ARCE

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 11: *Índice de Conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE*

- Meta 2011: 58,00%
- Posição em 31/12: 20,34%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERMELHO
- Justificativa: 59 relatórios concluídos de janeiro a dezembro de 2011, dos quais 47 relataram não-conformidades na qualidade da água.
- Perspectiva de cumprimento: a melhoria observada no início do ano, de fevereiro a abril de 2011, não se manteve nos meses seguintes. A meta não foi atingida.

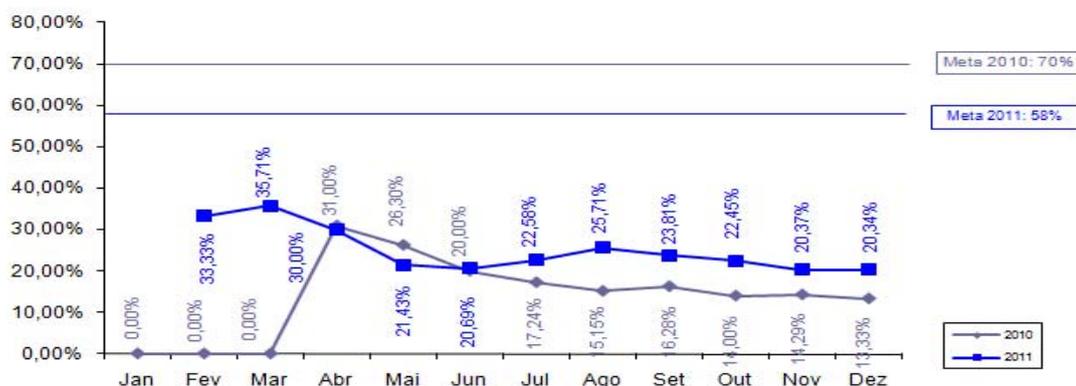

Sentido do indicador: ↑

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: *Elaboração do manual de indicadores de performance para o setor de saneamento ARCE.*

- Responsável: Mário Monteiro e Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 119,42 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2009 – Agosto 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE


11. SECITECE

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 13: *Número de serviços tecnológicos realizados.*

- Meta 2011: 47.181
- Posição em 31/12: 43.655
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERMELHO
- Perspectiva de cumprimento: Meta não alcançada.

- Comentários: Meta não cumprida. Encaminhada Nota Técnica justificando o não cumprimento meta.

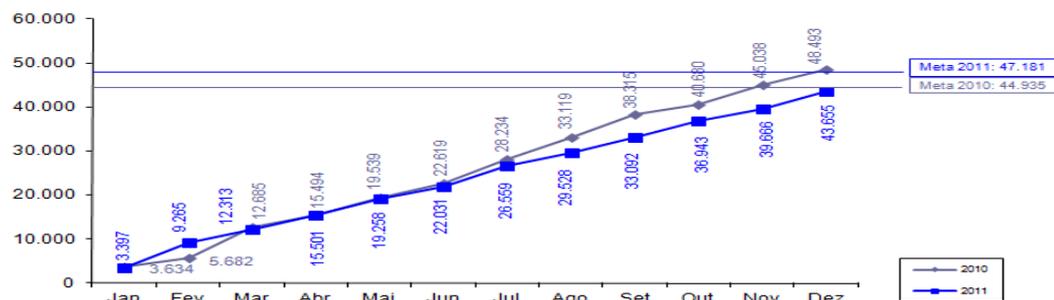

Sentido do indicador: ↑

12. CONPAM

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicador 14: Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.

- Meta 2011: 20,00%
- Posição em 31/12: 20,80%
- Posição em 31/12 em relação à meta: VERDE
- Perspectiva de cumprimento: meta cumprida



Sentido do indicador: ↑

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 5: Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente – CONPAM.

- Responsável: Maria Goretti de Castro e Maria Dias
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 39,68 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2009 – Novembro 2010
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.

- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 6: *Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos Sólidos de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos – CONPAM.*

- Responsável: Maria Dias
- Categoria de Licitação: Empresa de Consultoria
- Valor: US\$ 106,81 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2011 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

SALVAGUARDAS

Gestão de Resíduos Sólidos Hospitalares

Relatório Trimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II, entregues ao Banco Mundial até a posição do 1º trimestre de 2012.

13. CGE

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 2: *Capacitação em Mapeamento de Gestão e Auditoria de Processos com foco em Risco (no âmbito do Governo Estadual).*

- Responsável: Marconi Lemos
- Categoria de Licitação: Empresa de consultoria.
- Valor: US\$ 174,93 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2011 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 3: *Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará.*

- Responsável: Marconi Lemos
- Categoria de Licitação: Empresas de consultoria
- Valor: US\$ 119,52 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro 2009 – Janeiro 2012
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

14. IPECE

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 9: *Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Consultoria.*

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 31,34 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Guidelines de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2009 – Março 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 10: *Contratação de serviços para realização de evento c/ lideranças indígenas p/ apresentação dos livros didáticos/resultados da consultoria.*

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 1,24 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2011 – Maio 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 11: *Contratação de serviços gráficos para impressão e publicação dos livros didático-pedagógicos para as escolas indígenas do Estado do Ceará.*

- Responsável: Eveline Barbosa
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor: US\$ 1,24 mil
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2010 – Março 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 12: *Suporte p/ funcionamento da UGP do Projeto SWAp II – PARTE A: Contratação de Consultores Individuais.*

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 169,94 mil
- Método de Aquisição: Seção V- Diretrizes de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2009 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando Serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 12: *Suporte p/ funcionamento da UGP do Projeto SWAp II – PARTE B: Aquisição de equipamentos de TI.*

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: BENS

- Valor: US\$ 30,85 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2009 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Elaborando contrato.
- Estágio Atual: Shopping lançado aguardando recebimento das propostas até 25/05 às 16:30.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 12 Suporte p/ funcionamento da UGP do Projeto SWAp II - PARTE B: Aquisição de mobiliário.

- Responsável: Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: BENS
- Valor: US\$ 79,00 mil
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2009 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Elaborando contrato.
- Estágio Atual: Shopping lançado aguardando recebimento das propostas até 25/05 às 16:00.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

Projeto 13: *Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado.*

- Responsável: Leandro Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultores Individuais
- Valor: US\$ 17,95 mil
- Método de Aquisição: Seção V – Diretrizes de consultoria
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2009 – Maio 2010
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

SALVAGUARDAS

Povo Indígena

- No dia 15 de Abril de 2011, ocorreu um evento na Aldeia Indígena Jenipapo Kanindé para o lançamento das duas cartilhas (projetos AT 9,10 e 11), elaboradas dentro do escopo de Salvaguardas Social do Projeto SWAp II intituladas *Plantas Medicinais: Usos-saberes-sentidos; e Sentir-pensar-fazer: Artesanatos Indígenas no Ceará*);
- Ofício SEDUC nº 1268/2011 informou a entrega das cartilhas *Plantas Medicinais: Usos-saberes-sentidos; e Sentir-pensar-fazer: Artesanatos Indígenas no Ceará*) nas Escolas Indígenas do Ceará;
- No dia 25/01/2012 foram encaminhadas as cartilhas para José Mendes Fonteles Filho (Profº Babi) e para Professora da UFC Isabelle Bras Peixoto da Silva.

15. TCE

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 31: Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de soluções Integradas de Gerenciamento eletrônico de documento e informações do TCE (TCE 100% digital). (Parte A) – Digitalização.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor: US\$ 72,4 mil
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2010 – Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando Serviço.
- Estágio Atual: Prestando Serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 31: Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de soluções Integradas de Gerenciamento eletrônico de documento e informações do TCE (TCE 100% digital).

(Parte B) – Aquisição Equipamento Storage.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor: US\$ 229,36 mil
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2012 - Junho 2012
- Estágio Previsto: Negociando Contrato.
- Estágio Atual: Negociando Contrato.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 32: Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação. (Parte A) – Capacitação.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US\$ 65,72 mil
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2009 – Setembro 2011
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: Concluído.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Projeto 32: Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de Tecnologia da Informação. (Parte B) – Inscrição CISA.

- Responsável: Giovanna Adjafre
- Categoria de Licitação: Empresas de Consultoria
- Valor: US 6,98 mil
- Método de Aquisição: Contratação Direta
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2011- Junho 2012
- Estágio Previsto: Prestando serviço.
- Estágio Atual: Prestando serviço.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

ANEXO II

OPERAÇÃO Swap II

ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO

PROJETO SWAp II

29 DE JUNHO DE 2012

OPERAÇÃO Swap II

PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

- 1 - Apresentação dos Participantes;**
- 2 - Posição sobre status SWAp III – PforR;**
- 3 - Missões do Banco Mundial;**
- 4 - Relatórios Finais;**
- 5 - Acompanhamento da Execução dos Programas Elegíveis;**
- 6 - Sumário Execução dos Projetos de Assistência Técnica;**
- 7 - Informações sobre a Auditoria do Projeto;**
- 8 - Sumário do Desempenho;**
- 9 - Acompanhamento por Setorial da Execução;**
- 10- Sumário dos Desembolsos e Recursos Transferidos.**

OPERAÇÃO Swap II

1 - APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

OPERAÇÃO Swap II

2 - POSIÇÃO SOBRE STATUS SWAp III - PforR

2 - Posição sobre status do SWAp III - PforR

- ✓ Janeiro – Março: Preparação das Análises dos temas do SWAp III Social, Crescimento Econômico, Meio Ambiente e Gestão para apresentação nos Workshops;
- ✓ Abril (19-20/04/12): Missão de Avaliação Ambiental Estratégica com a Consultora Iara Verocai;
- ✓ Maio (21-25/05/12): Realização dos Workshops dos temas Social, Crescimento Econômico, Ambiental e Gestão Pública;
- ✓ Definição e escolha pelo Governador Cid Gomes de que seria o próximo Acordo de Empréstimo seria para financiar o Programa pro Resultados (PforR);
- ✓ Julho/2012–Maio/2013: Discussão e Negociação da Proposta;
- ✓ Junho/2013: Assinatura do Contrato.

OPERAÇÃO Swap II

3 - MISSÕES DO BANCO MUNDIAL

3 - Missões do Banco Mundial

- ✓ 11-12/06/12: Missão de Revisão Posterior de Aquisições de Assistência Técnica;
- ✓ Agosto 2012: Missão de Revisão Posterior de Aquisições de Assistência Técnica;
- ✓ Início de Setembro/12: Missão de Avaliação para o PforR

OPERAÇÃO Swap II

4 - RELATÓRIOS FINAIS

4 - Relatórios Finais: Lições e Práticas

1. Relatório de Lições Aprendidas, Melhores Práticas e Impacto do SWAp II

- ✓ Solicita-se as setoriais que enviem até 15/07/12 sugestões das lições aprendidas, melhores práticas e impacto (já enviado);
- ✓ Previsão de envio do Relatório Lições Aprendidas e Melhores Práticas e Impacto ao Banco Mundial até 31/07/12;

OPERAÇÃO Swap II

5 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ELEGÍVEIS

5 - Programas Elegíveis: Regra dos 70%

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2011 - **REGRA 70%**

R\$ 1

Setorial	Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2011 Jan-Dez (a)	Orçamento 2011 - Até 31/12 (b)	Realizado (até 31/03/12) (c)	Meta (até 31/03/12) (d)	Diferença (e) = (d) - (c)	Realizado/Previsto (%) (c)/(b)	Farol
SECITECE	033 Ceará Digital	3.268.447	3.268.447	-	2.287.913	2.287.913	0,00%	
SEDUC	041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	162.534.432	162.534.432	124.073.727	113.774.102	(10.299.625)	76,34%	
SEDUC	048 Qualidade da Educação Básica	23.826.799	23.826.799	23.642.022	16.678.759	(6.963.263)	99,22%	
SEDUC	058 Cooperação Estado e Município	975.497.717	975.497.717	1.185.536.948	682.848.402	(502.688.546)	121,53%	
SECITECE	194 Formação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento	12.166.208	12.166.208	8.695.912	8.516.346	(179.566)	71,48%	
SECITECE	196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	2.835.100	2.835.100	2.335.479	1.984.570	(350.909)	82,38%	
SESA	535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	194.927.906	194.927.906	219.355.069	136.449.534	(82.905.535)	112,53%	
SESA	536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	19.151.625	19.151.625	15.118.094	13.406.138	(1.711.957)	78,94%	
SESA	554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	3.477.726	3.477.726	2.477.726	2.434.408	(43.318)	71,25%	
CIDADES	711 Saneamento Ambiental do Ceará	34.191.184	34.191.184	32.891.484	23.933.829	(8.957.655)	96,20%	
TOTAL		1.431.877.144,00	1.431.877.144	1.614.126.462,5	1.002.314.001			
Valor Limite do Desembolso [70% * TOTAL]		1.002.314.001	1.002.314.001					

Notas:

¹ O Programa 033 - Ceará Digital corresponde ao Programa 070 - Ciência, Tecnologia e Inovação em 2012.

² O Programa 048 - Qualidade da Educação Básica corresponde ao Programa 073 - Organização e Gestão da Educação Básica em 2012.

³ O Programa 196 - Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico corresponde ao Programa 070 - Ciência Tecnologia e Inovação em 2012.

⁴ Diferentemente dos Programas 033 e 048, para 2012, foi considerada a execução do Programa 196 até 31/05/2012.


Posição em: 31-mai-12

OPERAÇÃO Swap II

6 - SUMÁRIO DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Cumprimento do Plano de Licitações

32 PROJETOS NO PLANO DE LICITAÇÃO

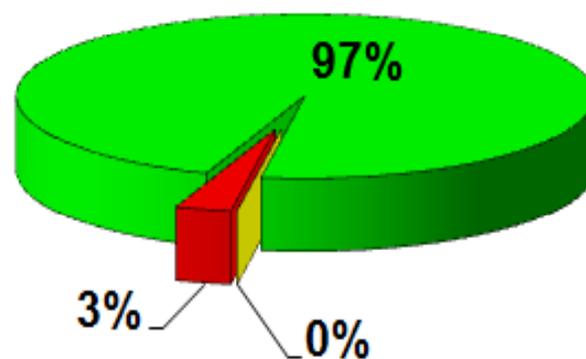

■ Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
■ Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia
■ Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses



Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações



Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia



Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses

31 PROJETOS:


ARCE (1), CGE (2,3), CIDADES(4), CONPAM (5,6), ETICE (7,8), IPECE (09,10,11,12,13), PGE(14,15), SEDUC (16,17,18,19,20), SEPLAG (22,23,24,25), SESA (26,27,28,29,30), TCE(31,32).

-

1 PROJETO SEFAZ (21).

Cumprimento do Plano de Licitações

10 PROJETOS EM EXECUÇÃO

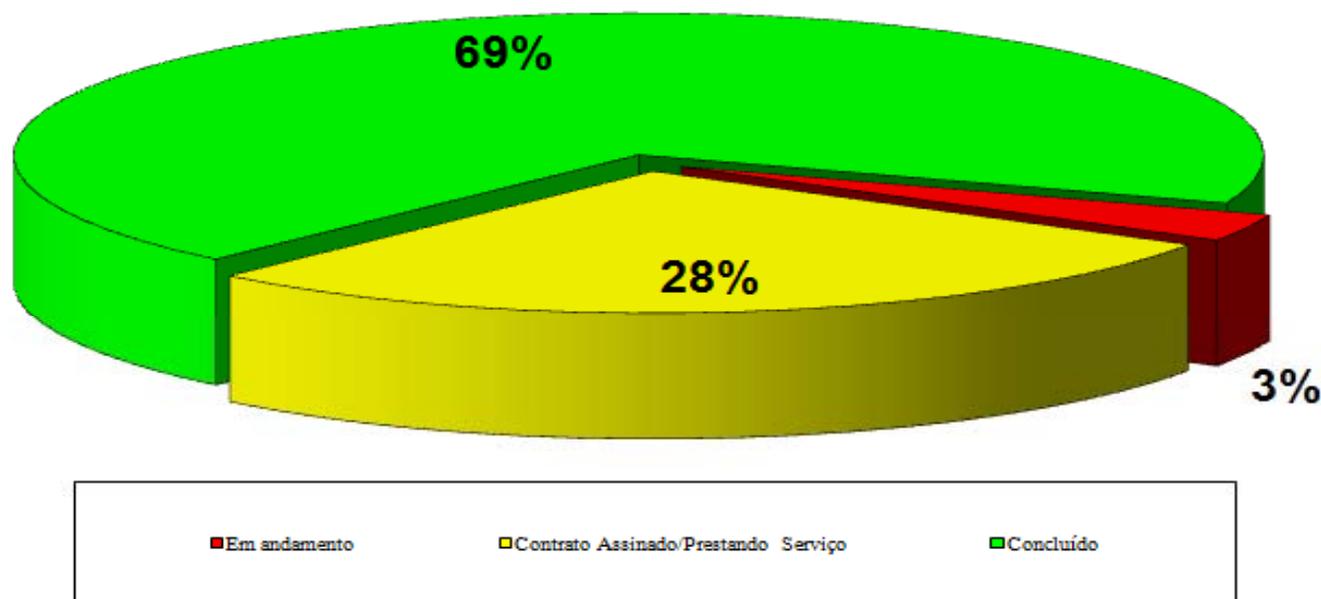

1 em andamento=

SEFAZ (21).

9 Contratos assinados =

CIDADES(4), CONPAM (6), ETICE (8), IPECE (12), PGE (14,15), SEDUC (20), SEPLAG(22,25) .

22 Concluídos = ARCE (1), CGE (2,3), COMPAM (5), ETICE (7), IPECE (09, 10, 11, 13), SEDUC (16,17, 18,19), SEPLAG (23, 24), SESA (26, 27, 28, 29, 30), TCE (31,32).

Cumprimento do Plano de Licitações

1 PROJETO EM ANDAMENTO:



MI ou Edital = -

Lista Curta e SDP = -

Avaliação = -

Negociação/Assinando Contrato = 1

SEFAZ (21).

OPERAÇÃO Swap II

7 - INFORMAÇÕES SOBRE A AUDITORIA DO PROJETO

7 - Informações sobre Auditoria do Projeto

- ✓ Relatório da Auditoria 2011 sendo elaborado pelo TCE para entrega até 30/09/12.

OPERAÇÃO Swap II

8 - SUMÁRIO DO DESEMPENHO

8 - Sumário do Desempenho 2011: Indicadores Primários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011						
Setor	Órgão	Indicador Primário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento	Entrega de Evidências
Setor Público	SEFAZ	1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).	1.293,0 milhões	1.882,2 milhões	cumprido	03/02/2012
		2. Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).	≤0,35	0,297695	cumprido	03/02/2012
	SEPLAG	3. Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG. ¹	15	15	cumprido	30/03/2012
		4. Número de "Relatórios Produtos - Resultados" (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG. ¹	7	7	cumprido	11/04/2012
Educação	SEDUC	5. Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas. ¹	≥90%	100%	cumprido	30/03/2012
		6.a Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: "Alfabetização na Idade Certa".	≥80%	100%	cumprido	16/03/2012
		6.b Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa "Alfabetização na Idade Certa" entregue às escolas.	≥80%	100%	cumprido	16/03/2012
		6.c Percentual de gerentes do programa "Alfabetização na Idade Certa" remunerados pelo Estado.	60%	100%	cumprido	16/03/2012
Saúde	SESA	7a. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.	30%	76,40%	cumprido	15/02/2012
		7b. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.	30%	30,70%	cumprido	14/03/2012
		8a. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.	12	13	cumprido	15/02/2012
		8b. Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.	1	-	Não será cumprido (1)	14/03/2012
		9. Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.	15	15	cumprido	15/12/2011
Água & Saneamento	SRH	10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.	≥37%	39%	cumprido	10/02/2012
		11.a Número de ligações urbanas de água.	275.122	315.803	cumprido	07/02/2012
	CAGECE	11.b Número de ligações de esgotos.	124.775	139.845	cumprido	07/02/2012
		12. Percentual de perda de água.	≤27%	26,03% ⁵	cumprido	07/02/2012
Negócios & Inovação	SEFAZ ETICE	13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.	4.365.700	4.387.816	cumprido	09/02/2012
		14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.	≥35%	80,00%	cumprido	06/03/2012

(1) Banco Mundial não aceitou o pedido de Waiver.

8 - Sumário do Desempenho 2011: Indicadores Secundários

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DA OPERAÇÃO SWAP II - 2011						
Setor	Órgão	Indicador Secundário	Meta	Realizado	Previsão de Cumprimento	Entrega de Evidências
Setor Público	SEFAZ	1. Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário.	≤ 10%	3,26%	cumprido	08/03/2012
	SEPLAG	2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.	2	2	cumprido	25/01/12 e 02/02/12
		3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.	≤ 3 meses	1,24*	cumprido	01/02/2012
	PGE	4. Percentual processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato reduzidos	≤ 10,5%	8,60%	cumprido	14/02/2012
Educação	SEDUC	5. Avaliação da implementação municipal do programa "Alfabetização da Idade Certa" (uma em 2009 e uma em 2011).	1	1	cumprido	01/12/2011
		6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.º	80%	81,40%	cumprido	27/04/2012
Saúde	SESA	7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.	6.468.331	7.028.280	cumprido	14/03/2012
		8. Relatórios semestrais do "Grupo da Água" para combater a diarreia infantil que leva à internação.	2	2	cumprido	01/02/2012
		9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.	60%	70,13%	cumprido	15/02/2012
Água & Saneamento	ARCE CAGECE	10. Margem do EBTIDA da CAGECE.	22,72% ^e	25,75%	cumprido	07/02/2012
		11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).	58%	20,34%	Não será cumprido	24/01/2012
Negócios & Inovação	ETICE SECITECE	12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).	3	3	cumprido	09/02/2012
		13. Número de serviços tecnológicos realizados.	47.181	43.655	Não será cumprido	10/02/2012
Meio Ambiente	CONPAM	14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.	≥ 20%	20,80%	cumprido	12/03/2012

(*) O valor da média anual é foi de 1,99

8 - Sumário do Desempenho 2011: Assistência Técnica.

Nº Projeto	Órgão	Nome do Projeto	Responsável	Pendências		STATUS
				Qde de produtos	valores	
4	CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade.	Tércia Pinheiro	0	1.653,07	Pagamento a ser processado
6	CONPAM	Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos	Maria Dias	0	194.400,00	Pagamento a ser processado
8	ETICE	Desenvolvimento de Sistema de Avaliação de Resultados do Cinturão Digital do Ceará (*)	Denise Olsen	0	44.625,00	Pagamento a ser processado
12	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo) Parte A.	Cristina Medeiros	0	6.450,00	Pagamento a ser processado
		Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II. (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo). Aquisição de material de TI para as novas instalações do projeto SWAp. Parte B.	Mário Aragão	1	13.100,04	Transferido Fonte 40
		Suporte para funcionamento da UGP.-Aquisição de material de mobiliário para as novas instalações do projeto SWAp - Parte C .	Debora Mariano	0	155.870,26	Pagamento a ser processado
14	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de Empresa para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva	Fernando Grangeiro	0	164.650,00	Pagamento a ser processado
15	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Aquisição de equipamentos.	Fernando Grangeiro	0	9.540,00	Pagamento a ser processado
				0	26.100,00	Pagamento a ser processado
19	SEDUC	Serviço de Consultoria para Fase 2 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará	Betânia e Ana Garcia	0	23.359,50	Pagamento a ser processado
20	SEDUC	Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (2012 - 3ª etapa)	Betânia e Ana Garcia	0	228.247,85	Pagamento a ser processado
21	SEFAZ	Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.	Rejane Muniz	1	439.900,00	Transferido Fonte 40
22	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	Sergio Lage e Fernanda Salles	0	4.620,00	Pagamento a ser processado
25	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.	Mario Fracalossi	0	46.858,27	Pagamento a ser processado
30	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação (servidor).	Vera Coelho	0	118.489,95	Pagamento a ser processado
31	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de Soluções Integradas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Informações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.(Programa TCE 100% Digital). Parte A - Digitalização	Giovanna Adjafre	0	22.237,10	Pagamento a ser processado
		1		29.102,56	Transferido Fonte 40	
		1		18.750,00	Transferido Fonte 40	
Total				4	1.547.953,60	

OPERAÇÃO Swap II

9 – ACOMPANHAMENTO POR SETORIAL

OPERAÇÃO Swap II

SEFAZ

Projeto 21: Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.

- **Responsável:** Rejane Muniz
- **Categoria de Licitação:** BENS
- **Valor:** US\$ 221,06 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2011 - Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Adjudicado, aguardando contrato.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

OPERAÇÃO Swap II

SEPLAG

Projeto 22: Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Sérgio Lage e Fernanda Salles
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 106,50 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2009 – Setembro 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço, o saldo contratual será pago com recursos oriundos da categoria I do projeto SWAp.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Projeto 25: Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Mário Fracalossi
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 102,36 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Outubro 2009 – Maio 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

SEDUC


Projeto 20: Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (3ª etapa).

- **Responsável:** Eneida Machado e Kennedy
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 127,54 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2011 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

ETICE

Projeto 8: Desenvolvimento de Sistema de Avaliação de Resultados do Cinturão Digital do Ceará.

- **Responsável:** Denise Olsen
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 45,60 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2011 – Setembro 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

PGE

Projeto 14: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Treinamentos e Seminários na área de Licitações

- **Responsável:** Tarso e Fernando Grangeiro
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 146,29
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2010 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 15: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Compra de Equipamento.

- **Responsável:** Tarso e Fernando Grangeiro
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 22,58 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2012 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Contrato Assinado.
- **Estágio Atual:** Contrato Assinado.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

CONPAM

Projeto 6: Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos.

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 106,81 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2011 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

10 - SUMÁRIO DOS DESEMBOLSOS E RECURSOS TRANSFERIDOS

Sumário dos Desembolsos

TOTAIS VALORES PREVISTOS E DESEMBOLSADOS						
Categorias	Previsto	Realizado			Saldo	
	US\$	US\$	R\$	%	US\$	%
CATEGORIA I	\$235.730.000,00	\$231.299.781,82	\$364.483.801,77	98,12%	\$4.430.218,18	1,88%
CATEGORIA II	\$3.670.000,00	\$3.136.059,25	\$5.615.513,25	85,45%	\$533.940,75	14,55%
FRONT END FEE	\$600.000,00	\$600.000,00		100,00%	\$0,00	0,00%
Sub total	\$240.000.000,00	\$235.035.841,07	\$370.099.315,02	97,93%	\$4.964.158,93	2,07%

Sumário dos Desembolsos

SWAP II - Sumário Total Desembolsados (Posição Fevereiro 2012)	
Valor total já desembolsado	\$205.940.083,82
(+) Valor Saldo Projetos de Assistência Técnica I	\$533.940,75
(+) Valor previsto para Junho 2012 II	\$29.095.757,25
Valor Saldo total a ser desembolsado = I + II	\$29.629.698,00
Valor Total a ser desembolsado	\$235.569.781,82
(-) Valor retido de um Programa Elegível	\$3.352.597,54
(-) Valor retido indicador SESA 8b. cuja meta não foi cumprida em 2011	\$1.077.620,64
Valor total retido	\$4.430.218,18
Total Empréstimo	\$240.000.000,00

Atualizado em 18/06/12 pelo client connection
(1) Statement of Expenditures enviado ao Banco Mundial para o 4º desembolso.

Recursos Transferidos

Nº	Nº Projeto Plano de Licitação	Órgão	Descrição Projeto	Valor estimado US\$ mil (1)	Valor estimado R\$ mil	MAPP	Saldo MAPP	Valor a ser incluído na 40	Valor a ser transferido da fonte 48 para 40
1	12	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II. Parte A - Renovação do contratos 14/2011 e 16/2011 (Fabiana Silva e Alice Helena Pinto)	13.357,41	27.000,00	Mapp 18 - Contratação Consultores para Assistir na Gestão e Coordenação de Projetos com o Banco Mundial (2)	8.400,00	18.600,00	8.400,00
2	12	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto. Parte B - Aquisição de material de TI para as novas instalações do projeto SWAp.	6.480,84	13.100,04	Mapp 28 - Aquisição de Material Permanente de TI (3)			13.100,04
3	21	SEFAZ	Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.	217.626,83	439.900,00	MAPP 4 - Maximização da Arrecadação II.			439.900,00
4	22	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	18.088,90	36.564,00	270 - Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará			36.564,00
5	31	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Programa TCE 100% Digital - Digitalização - Parte A.	14.397,59	29.102,56				
6	31	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Programa TCE 100% Digital - Aquisição 60 monitores - Parte C.	9.275,98	18.750,00				
Sub total - Transferir para categoria I				279.227,54	564.416,60				
Reserva de contingência (4)				254.713,21	514.864,55				
Total - Transferir para categoria I				533.940,75	1.079.281,15				
Conferência				533.940,75	1.079.281,15				

(1) O valor em R\$ foi convertido ao dólar de 2,0214 do último desembolso.

(2) Redação proposta com pequena alteração.

(3) Esse valor esta incluso atualmente no Mapp 52 - Substituição de forros, divisórias e equipamentos deteriorados da área ocupada pelo IPECE.

(4) Valor que sobrou dos Projeto de Assistência Técnica após as Licitação e conversão do dolar mairo que previsto nos últimos desembolsos.

OBRIGADA!

OPERAÇÃO
Swap II

The background of the slide is a solid blue color. On the right side, there is a faint, light blue graphic of a globe with latitude and longitude lines. On the left side, there are several vertical bars of varying heights and shades of blue, some with horizontal lines, resembling a stylized bar chart or data visualization.

OPERAÇÃO Swap II

**ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO
DAS SETORIAIS - COMPLETA**

OPERAÇÃO Swap II

SEFAZ


OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ


Indicador 1: Saldo Fiscal Corrente do Estado (Receita Correntes menos Despesas Correntes).

- **Meta 2011:** R\$ 1.293,00 milhões
- **Posição em 31/12:** R\$ 1.882,18 milhões
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** As receitas e as despesas correntes se comportam conforme o esperado.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta superada.

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Saldo Fiscal Corrente do Estado

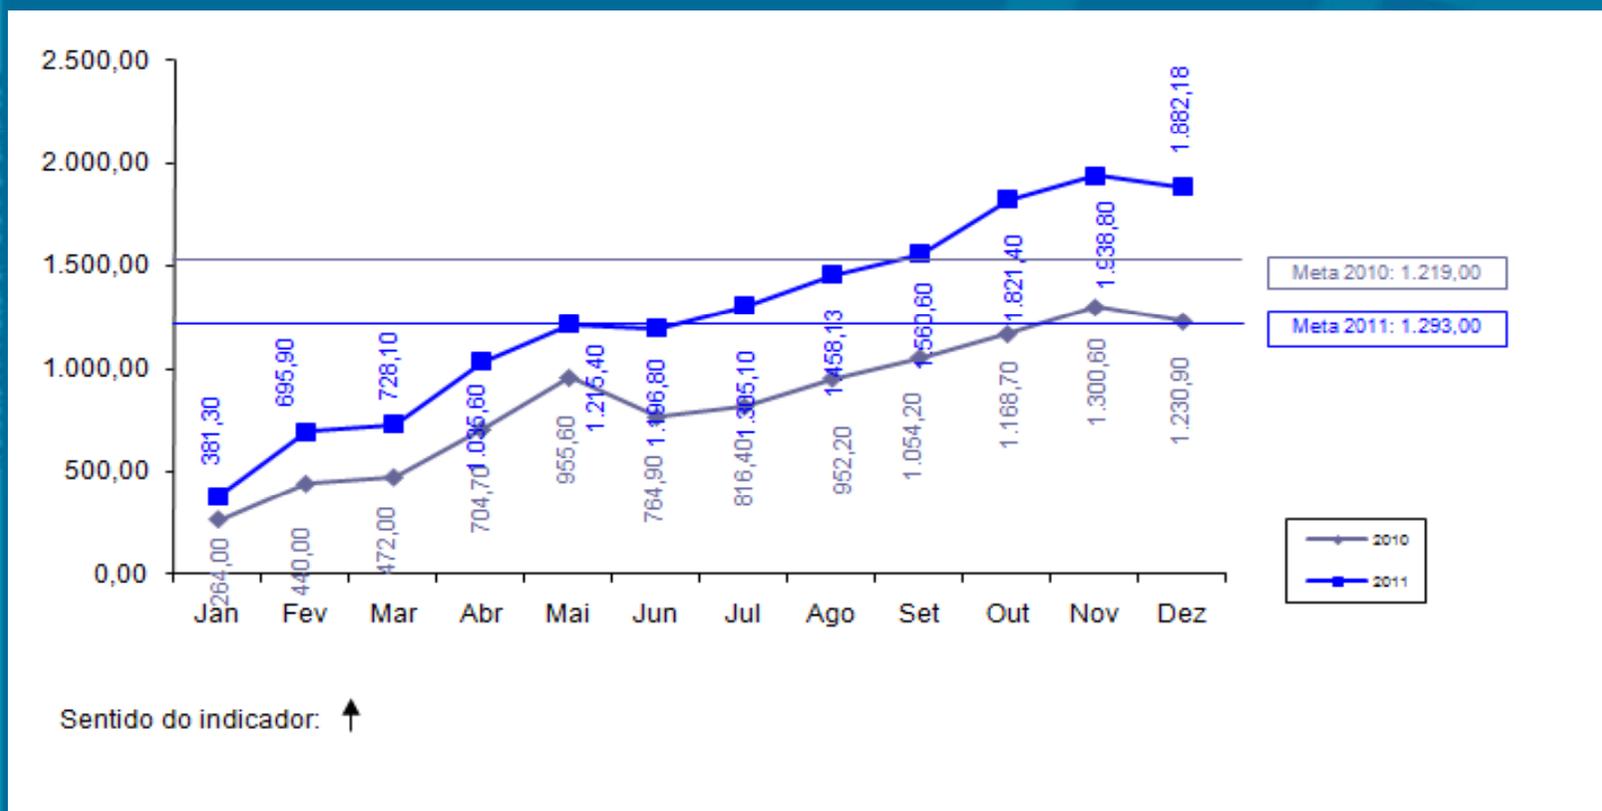

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Indicador 2: Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).

- **Meta 2011:** $\leq 0,35$
- **Posição em 31/12:** 0,297695
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Não há nenhuma indicação de que haja concentração de arrecadação de ICMS em algum dos setores estudados que possa aumentar o índice além da meta.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Índice Herfindahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores



Negócios e Inovação

Secretaria da Fazenda - SEFAZ


Indicador 14: Percentual de registros empresariais no CGF concluídos em 72 horas.

- **Meta 2011:** $\geq 35,00\%$
- **Posição em 31/12:** 80%
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Com a vigência da Lei Complementar nº. 128/2010, as empresas do MEI são cadastradas automaticamente na SEFAZ/CE a partir do registro informado pela Receita Federal. Essas informações foram disponibilizadas por este órgão desde abril de 2010 e foram introduzidas no Estatístico do Cadastro da SEFAZ/CE nesta data.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.

Negócios e Inovação

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Percentual de registros empresariais no CGF concluídos em 72 horas

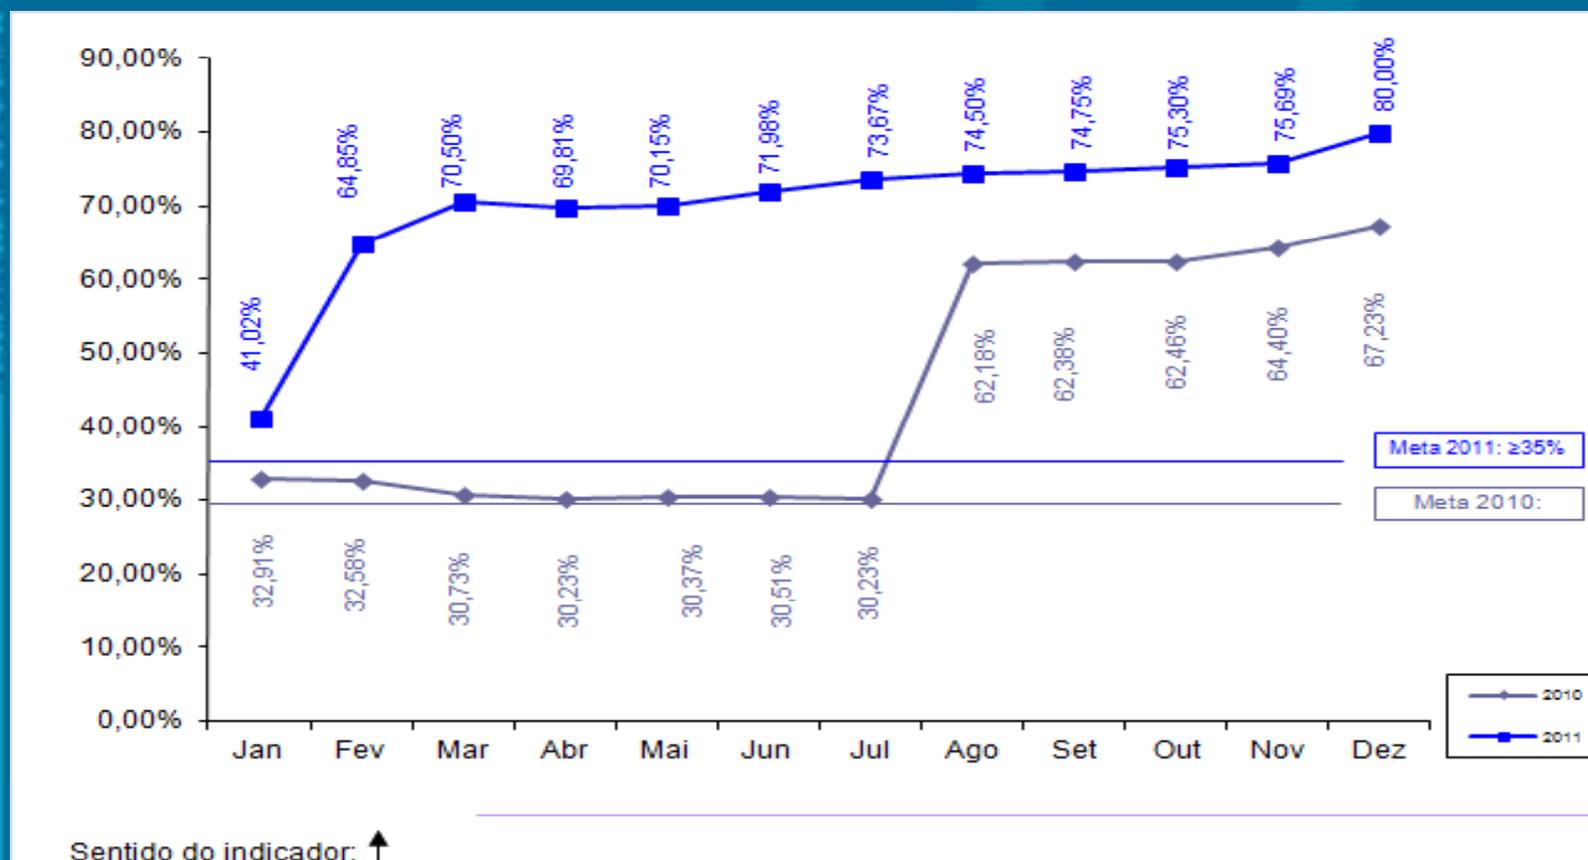

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ


Indicador 1: Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário (% dos contribuintes ativos do regime de recolhimento normal que declararam saldo devedor na DÍEF que a SEFAZ inscreve na Dívida Ativa).

- **Meta 2011:** $\leq 10,00\%$
- **Posição em 31/12:** 3,26% (valor referente ao período de março a julho 2011)
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Comentários:** Acordado com o BM que o indicador seria medido três vezes em 2011, com informações quadrimestrais referente ao período de cinco meses. Informação fornecida após a missão (19/12/11).

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Eficácia da Cobrança Administrativa do Crédito Tributário

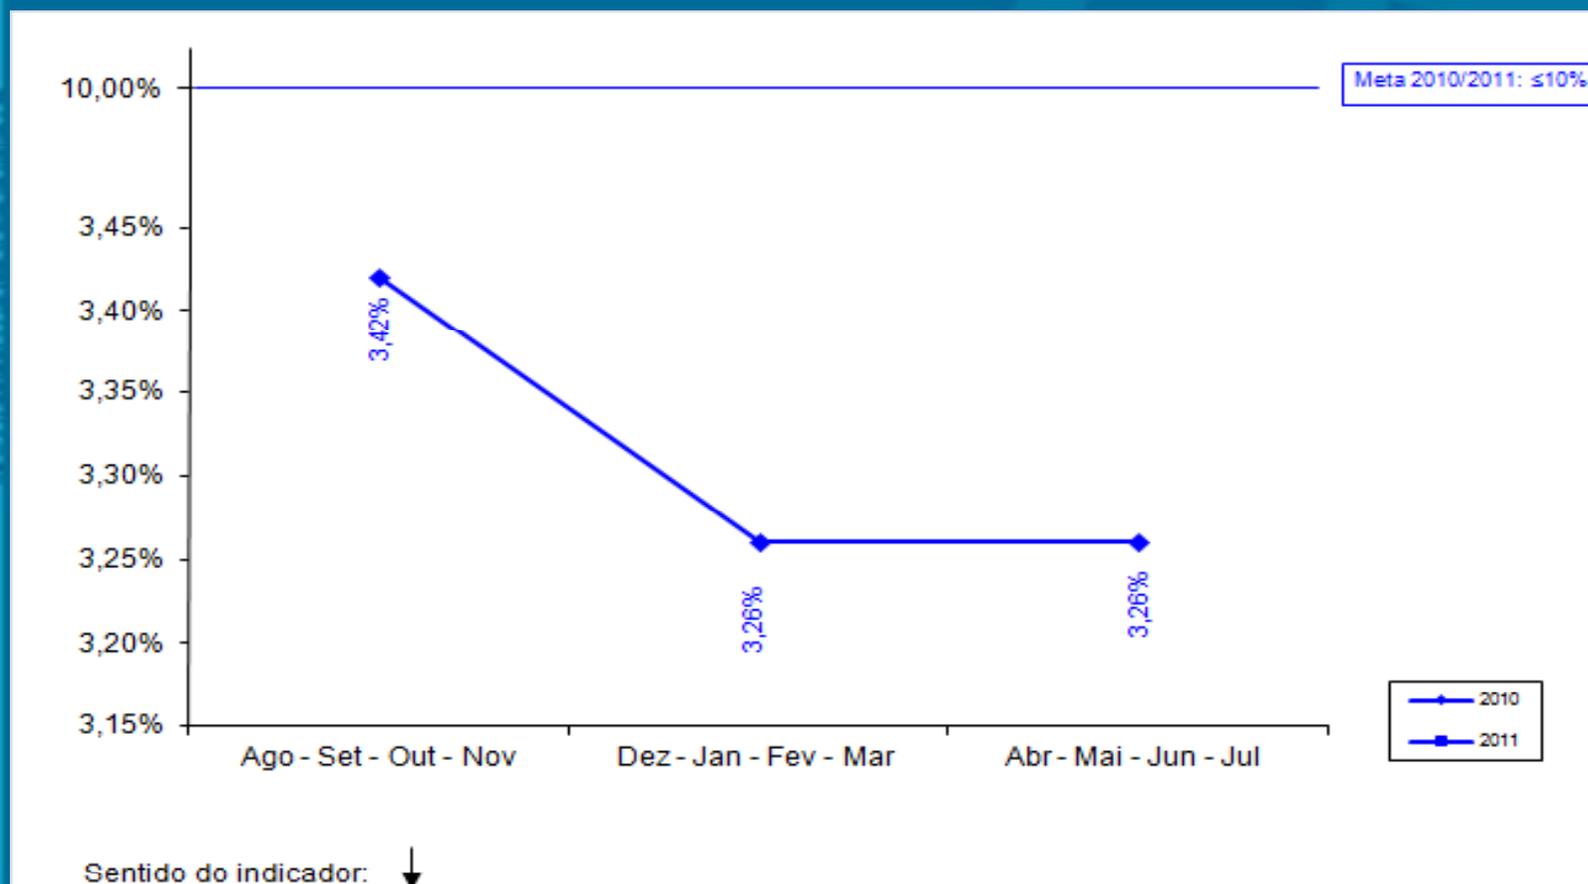

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Projeto 21: Aquisição de Notebooks como parte da Solução Tecnológica do Projeto da Auditoria Eletrônica.

- **Responsável:** Rejane Muniz
- **Categoria de Licitação:** BENS
- **Valor:** US\$ 221,06 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2011 - Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Adjudicado, aguardando contrato.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

OPERAÇÃO Swap II

SEPLAG

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Indicador 3: Número de Secretarias Setoriais com Relatórios Anuais de Desempenho Validados pela SEPLAG e pelo COGERF e Colocados na Página Eletrônica da SEPLAG.

- **Meta 2011: 15**
- **Posição em 31/12: 15**
- **Posição em 31/12 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento: cumprido.**
- **Comentário: Relatórios publicados no site em 30/03/2012.**

Gestão do Setor Público

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Indicador 4: Número de “Relatórios Produto-Resultado” (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- **Meta 2011: 7**
- **Posição em 31/12: 7**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de cumprimento: Cumprido.**
- **Comentário: Relatórios publicados no site em 13/04/2012.**

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

Indicador 2: Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembleia.

- **Meta 2011: 2**
- **Posição em 31/12: 2**
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento: Cumprido**
- **Informações disponíveis nos links:**
- [www.seplag.ce.gov.br/Planejamento/Lei Orçamentária Anual 2012](http://www.seplag.ce.gov.br/Planejamento/Lei%20Orçamentária%20Anual%202012)
- [www.seplag.ce.gov.br/Planejamento/Mensagem à AL/2012](http://www.seplag.ce.gov.br/Planejamento/Mensagem%20à%20AL/2012)

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

Indicador 3: Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.


- **Meta 2011: ≤ 3 meses**
- **Posição em 31/12: 1,24 meses***
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de cumprimento: Meta cumprida.**

***A média anual do indicador para 2011 foi de 1,99 meses.**

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades

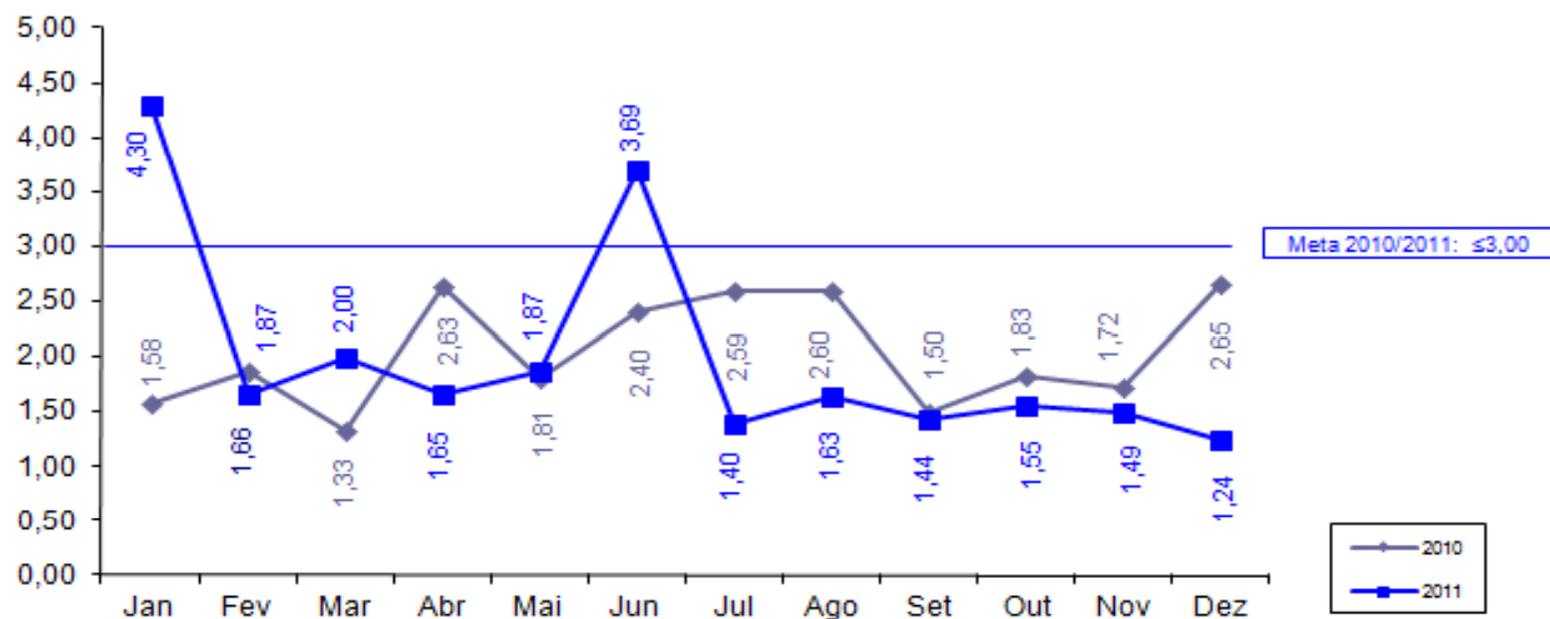

Sentido do indicador: ↓

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Projeto 22: Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Sérgio Lage e Fernanda Salles
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 106,50 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2009 – Setembro 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço, o saldo contratual será pago com recursos oriundos da categoria I do projeto SWAp.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Projeto 23: Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras.

- **Responsável:** Soraya Quixadá
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 100 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2010 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Avaliando propostas.
- **Estágio Atual:** Avaliando propostas.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 24: Realização de ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do Governo à sociedade em geral e às entidades representativas das empresas.

- **Responsável:** Soraya Quixadá
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 107,60 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2010 – Maio 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 25: Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Mário Fracalossi
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 102,36 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Outubro 2009 – Maio 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

SEDUC


OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

Indicador 5: Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com o relatório de melhores práticas.

- **Meta 2011:** $\geq 90 \%$
- **Posição em 31/12:** 100%
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento:** Pelo Ofício N.º.1023/12 de 30/03/2012, a SEDUC compromete-se em enviar até o dia 30/04/2012 o Relatório referente à divulgação e às estratégias de disseminação de boas práticas junto aos municípios e escolas das Redes Municipal e Estadual de ensino em substituição ao Relatório de Melhores Práticas, que só será concluído em setembro de 2012 como também a possibilidade de envio do rascunho do Relatório de Boas Práticas, para submissão ao BM após 30/06/2012.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


Indicador 6a: Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças “Alfabetização na Idade Certa”.

- **Meta 2011: 80%**
- **Posição em 31/12: 100%**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida**

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças “Alfabetização na Idade Certa”

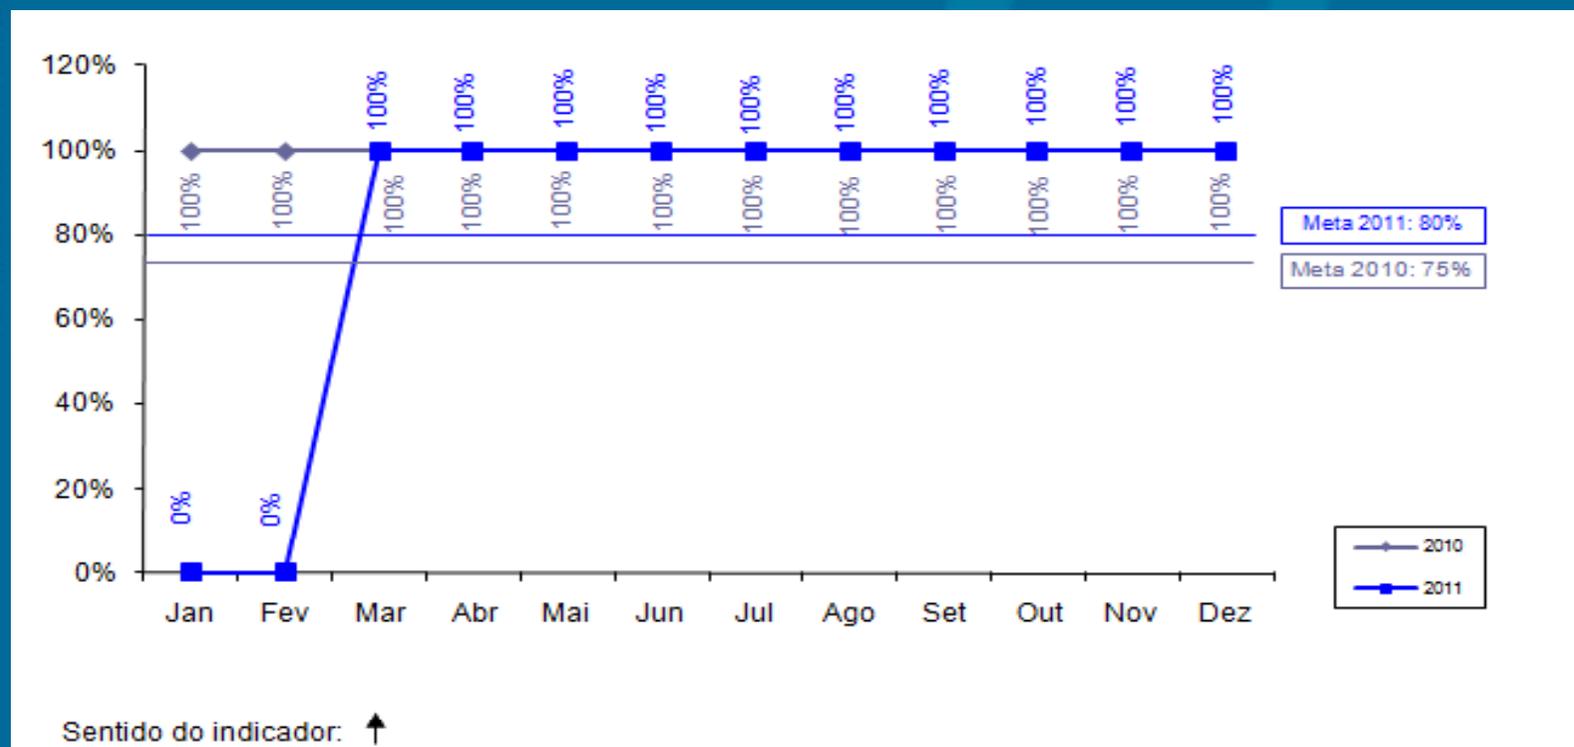

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


Indicador 6b: Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático p/ o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.

- **Meta 2011:** $\geq 80\%$
- **Posição em 31/12:** **100%**
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida**

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas

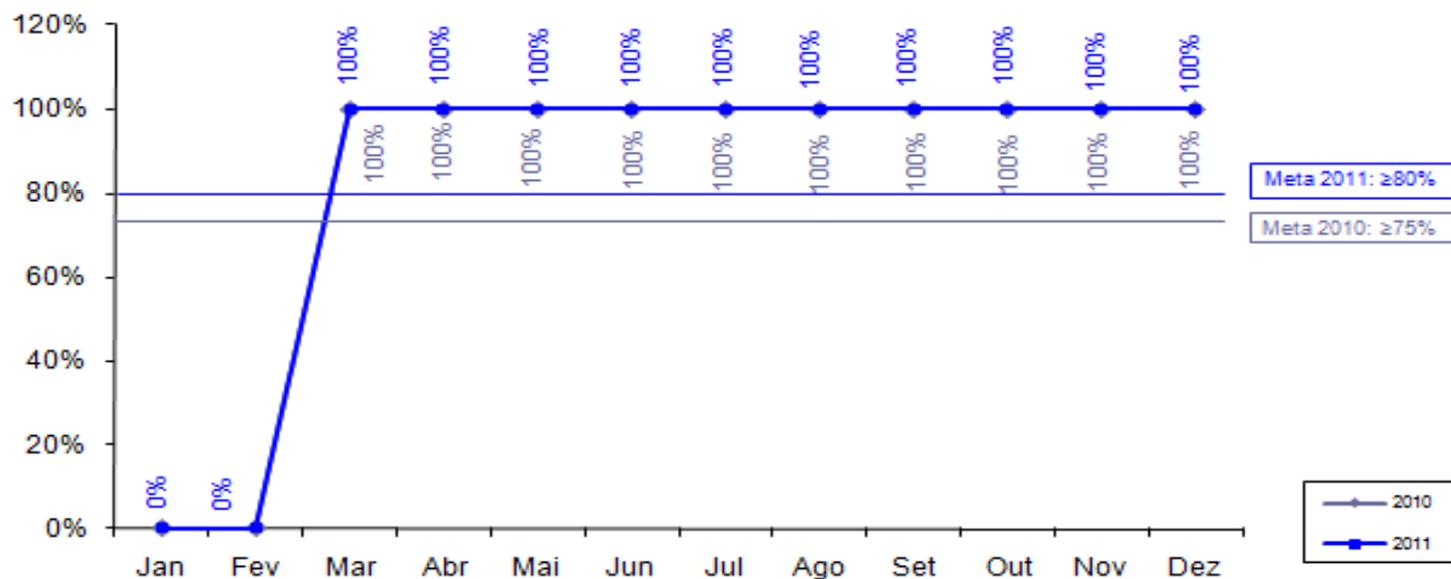

Sentido do indicador: ↑

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC


Indicador 6c: Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.

- **Meta 2011: 60%**
- **Posição em 31/12: 100%**
- **Posição em 31/12 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida**

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado

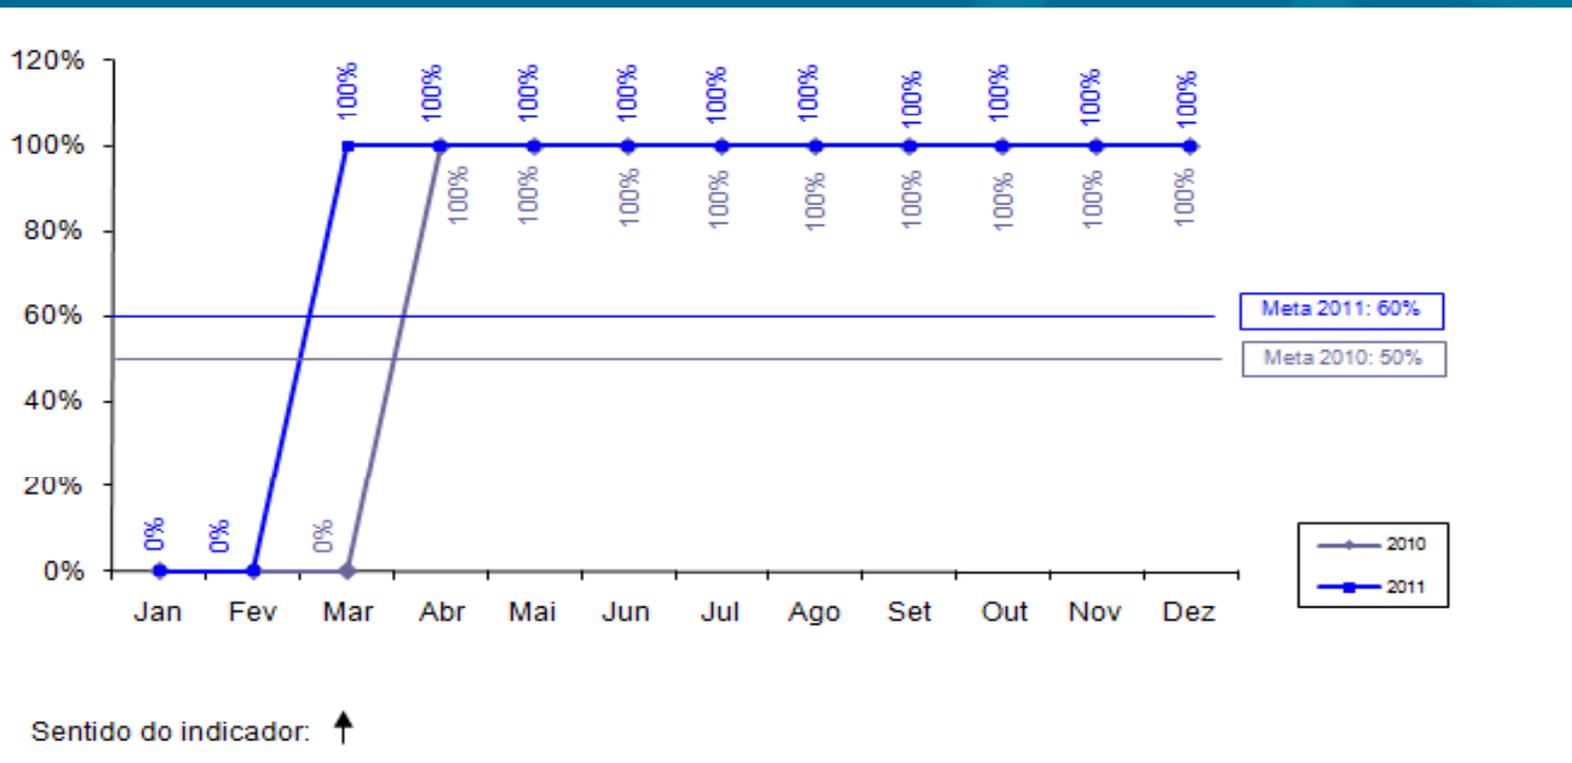


OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Educação

Secretaria de Educação - SEDUC

Indicador 5: Avaliação da implementação municipal do programa “Alfabetização da Idade Certa” (uma em 2009 e uma em 2011).

- **Meta 2011: 1**
- **Posição em 31/12: 1**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: meta cumprida em 08/12/2011.**

Educação

Secretaria de Educação - SEDUC

Indicador 6: Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- **Meta 2011:** 80%
- **Posição em 31/12:** -
- **Posição em 31/12 em relação a meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento:** A perspectiva é de possibilidade média de cumprimento da meta até 30/04/12.
- **Comentário:** Pelo Ofício N°.1085/12 de 03/04/2012 a SEDUC compromete-se em enviar até 30/04/2012 os dados preliminares da evidência de cumprimento do indicador.


OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Projeto 16: Avaliação do Programa E-Jovem.

- **Responsável:** Eneida Machado
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 72,90 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2009 - Setembro 2010
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 


Projeto 17: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 1ª Etapa.

- **Responsável:** Eneida Machado
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 35,36 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2009 – Setembro 2010
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 17: Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação – 2ª Etapa.

- **Responsável:** Eneida Machado
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 36,85 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2010 - Outubro 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Aguardando entrega do último produto. SEDUC e IPECE reuniram em 02/04/12 com Empresa IETS que prometeu Relatório revisado até 30/04/12.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Projeto 18: Serviço de consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Eneida Machado e Kennedy
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 93,94 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2010 - Agosto 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 19: Serviço de consultoria para Fase 2 da Implantação de um Projeto Técnico-Pedagógico nas Escolas Profissionais do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Eneida Machado e Kennedy
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 180,47mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2011 – Abril 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 20: Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (3ª etapa).

- **Responsável:** Eneida Machado e Kennedy
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 127,54 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2011 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

SESA

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA


Indicador 7a: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.

- **Meta 2011: 30,0%**
- **Posição em 31/12: 76,40%**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida**
- **Comentários: Relatório encaminhado em 12.03.2012.**

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ

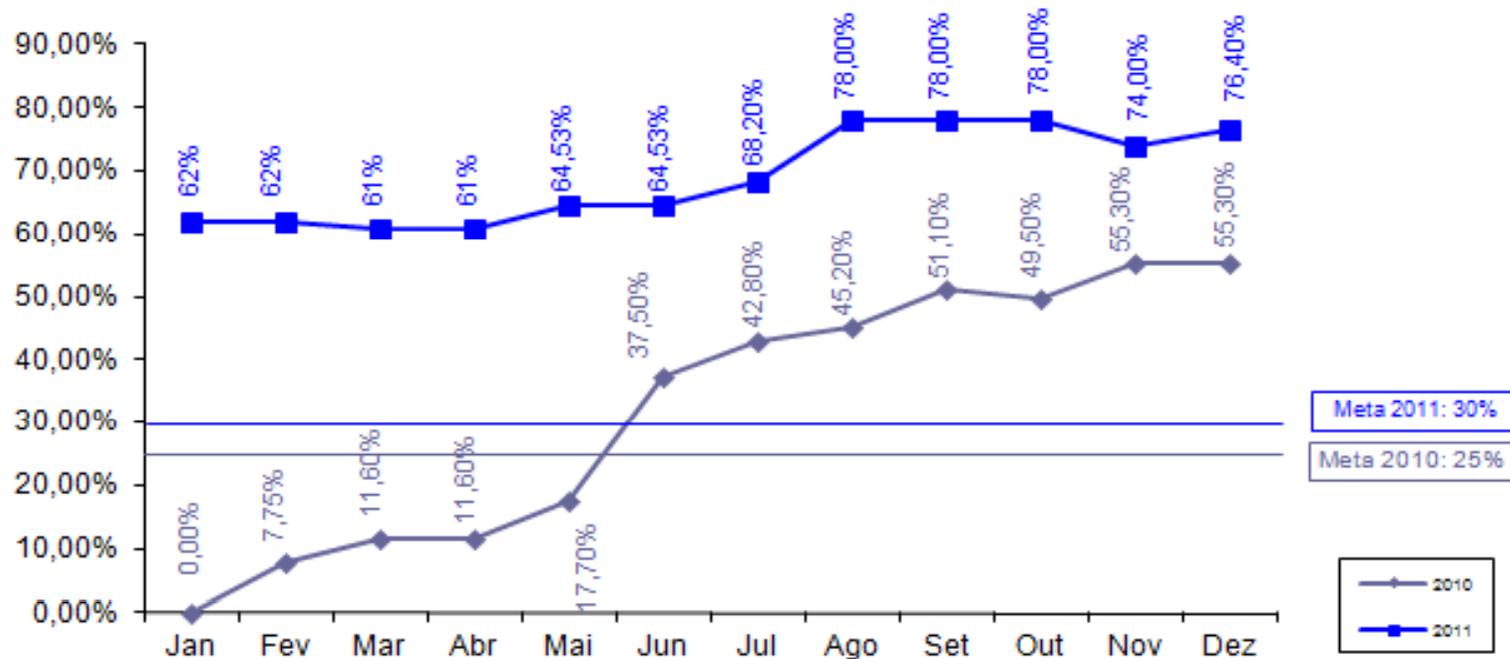

Sentido do indicador: ↑

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Indicador 7b: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas num ano anterior que melhoram sua classificação de qualidade do AMQ.

- **Meta 2011: 30%**
- **Posição em 31/12: 30,7%**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: cumprido**
- **Comentários: O relatório enviado em 14.03.2012.**

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA


Indicador 8a: Número de hospitais públicos e particulares no Estado (Hospital Polo) licenciados de acordo com a Lei nº.6.437/1977.

- **Meta 2011: 12**
- **Posição em 31/12: 13**
- **Posição em 31/12 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida**

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei nº. 6.437/1977

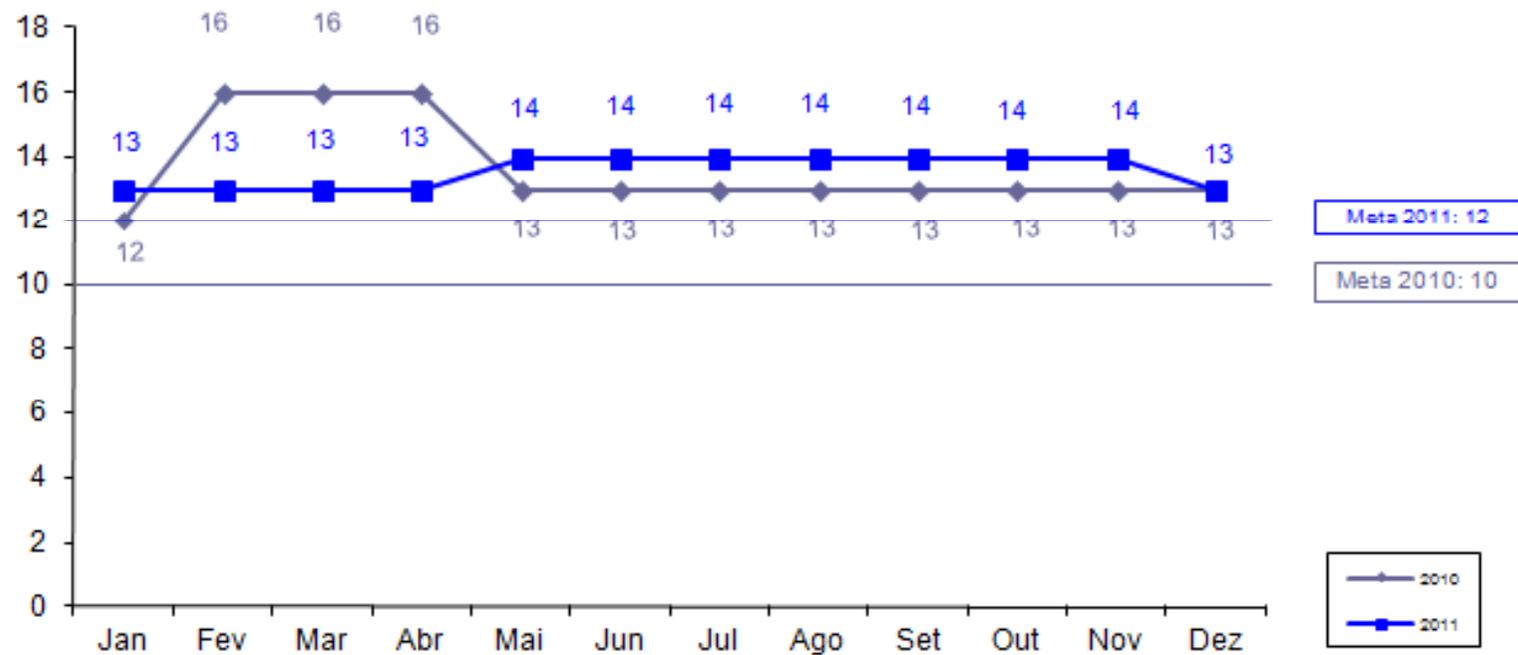

Sentido do indicador: ↑

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Indicador 8b: Número de hospitais com certificação de qualidade ONA.

- **Meta 2011:** 1
- **Posição em 31/12:** -
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** [REDACTED]
- **Perspectiva de Cumprimento:** meta não será cumprida.
- **Comentários:** Encaminhada nota técnica solicitando considerar indicador como cumprido.

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA


Indicador 9: Número de hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.

- **Meta 2011: 15**
- **Posição em 31/12: 15**
- **Posição em 31/12 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.**

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Nº. de hospitais públicos e particulares no Estado com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos à SESA

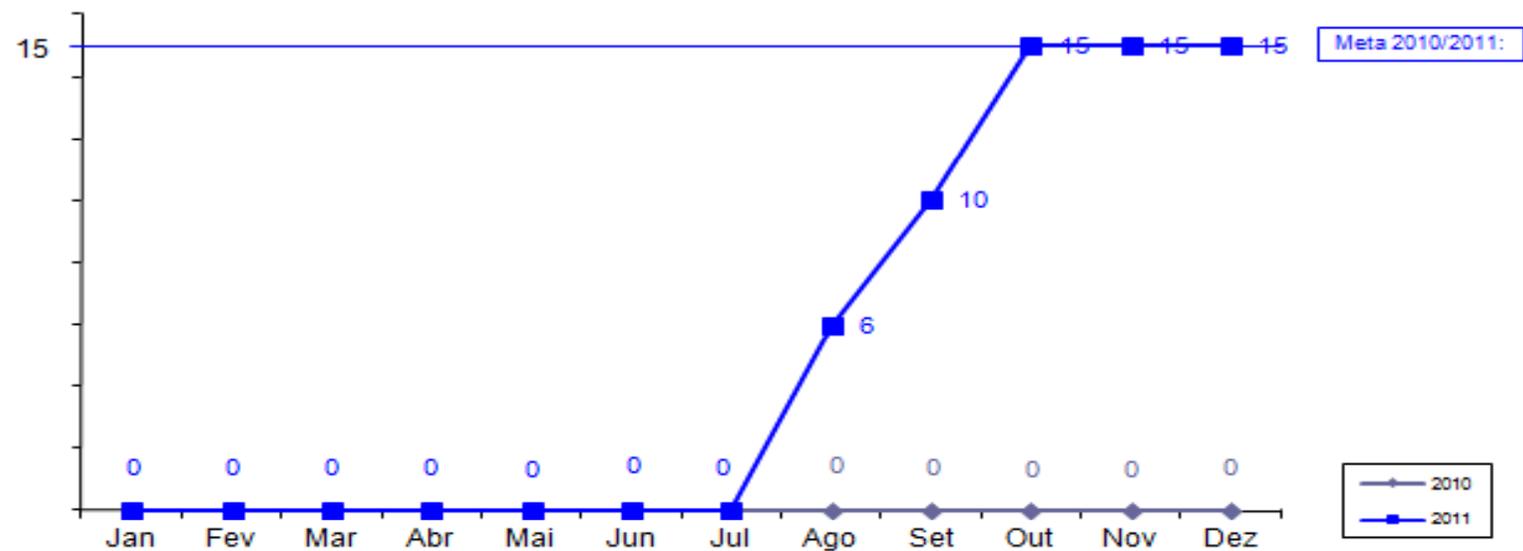

Sentido do indicador: ↑

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA


Indicador 7: População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.

- **Meta 2011:** 6.468.331
- **Posição em 31/12:** 7.028.280
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida. Dados de dezembro de 2011, enviados em 14.03.2012.

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família

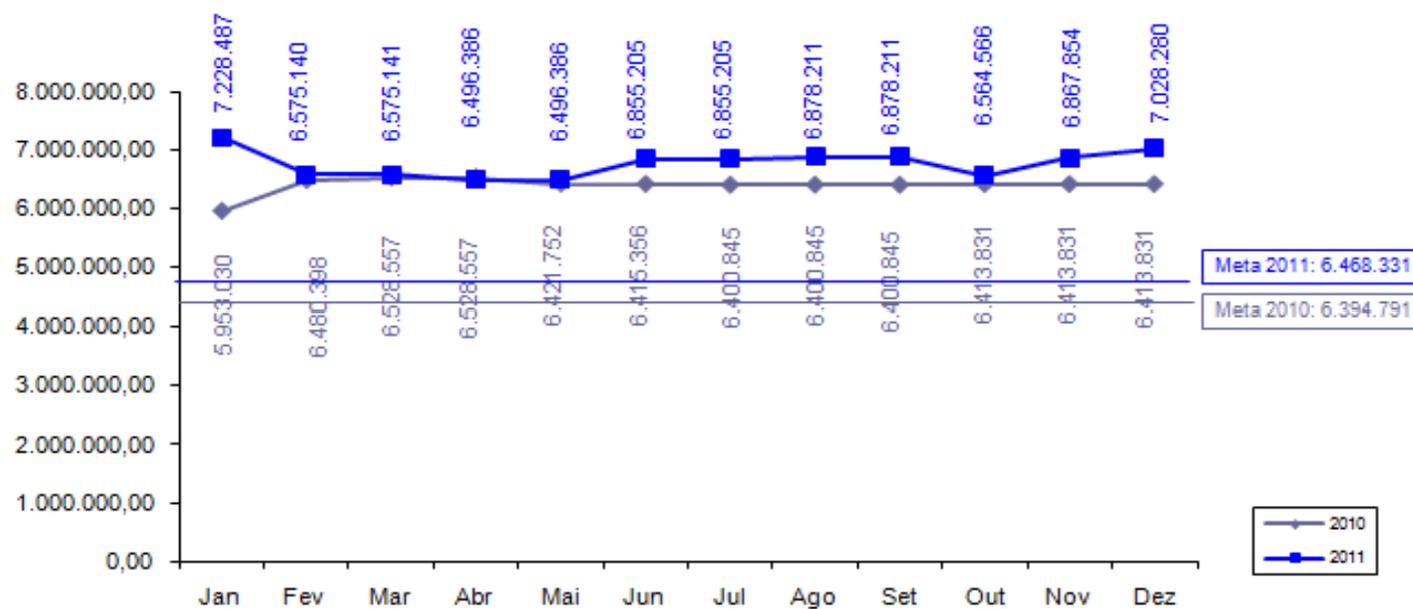

Sentido do indicador: ↑

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Indicador 8: Relatórios semestrais do “Grupo da Água” para combater a diarreia infantil que leva à internação.

- **Meta 2011: 2**
- **Posição em 31/12: 2**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta será cumprida.**


Indicador 9: Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.

- **Meta 2011:** 60 %
- **Posição em 31/12:** 70,13% (*)
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida.
- **Comentários:** Dados obtidos junto ao Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN. Valor alterado conforme a evidência enviada 15/02/12.

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês

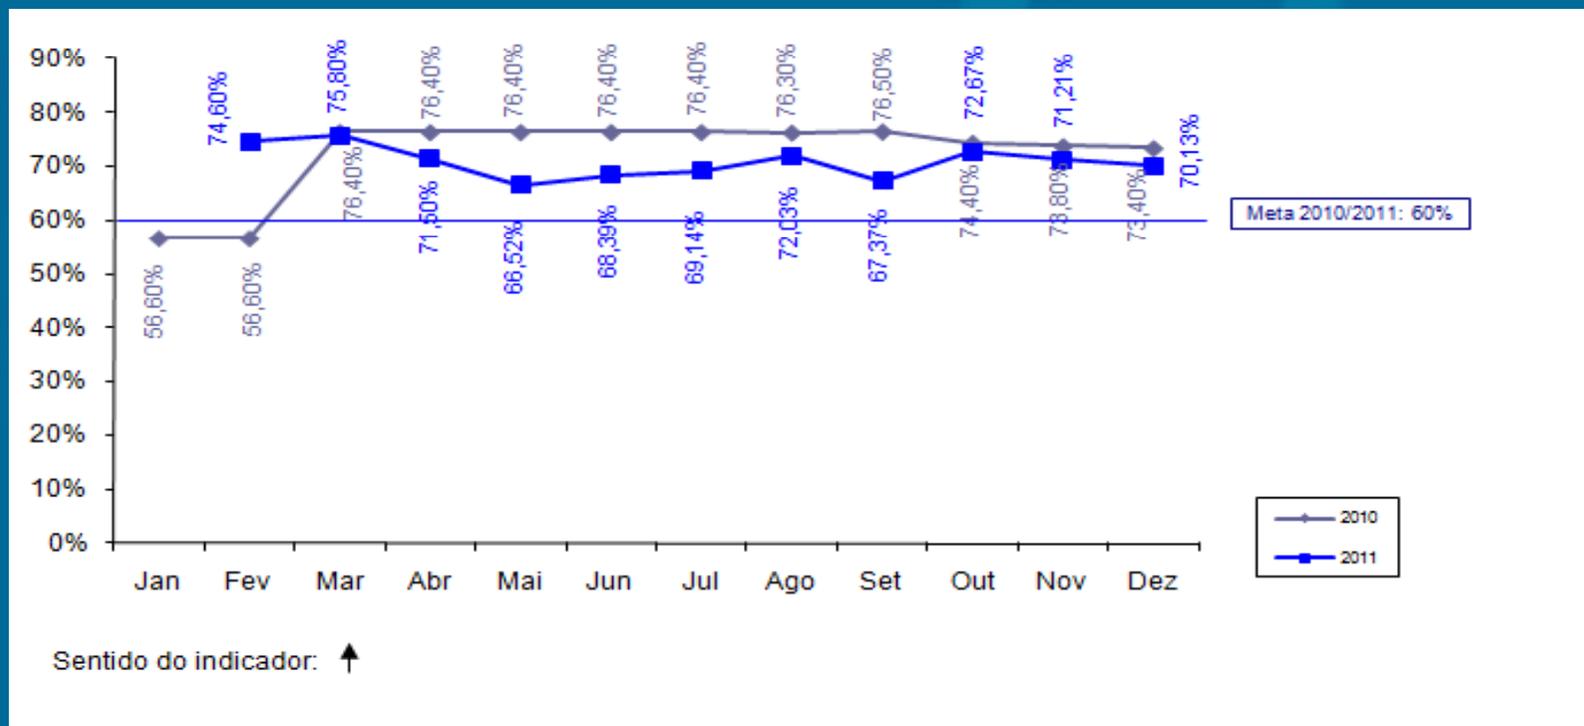

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Projeto 26: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Estratégia de capacitação e disseminação do uso do software.

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 93,76 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2010 – Dezembro 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 27: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Validação da Metodologia.

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 28,89 mil
- **Método de Aquisição:** Diretrizes Consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2009 – Agosto 2010
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**


Projeto 28: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Definições e ajustes no modelo de absorção.

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 56,05 mil
- **Método de Aquisição:** Diretrizes Consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2010 – Outubro 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 29: Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Compra de equipamentos de informática para habilitar as CRES.

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 141,80 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2010 – Março 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 30 (Parte A): Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação.

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 234,16 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão (Ata de Registro de Preço)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2010 – Março 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 30 (Parte B): Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação (Servidores e switches).

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 148,03 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2011 – Janeiro 2012
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído aguardando pagamento (restos a pagar).
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Projeto 30 (Parte C): Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais - pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação (No-break e Rádio).

- **Responsável:** Vera Coelho e Helena Lima
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 28,86 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão (Ata de Registro de Preço)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2010 – Março 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Relatório Quadrimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II, enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º trimestre de 2011).

OPERAÇÃO Swap II

COGERH

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR PRIMÁRIO

Água e Saneamento

Secretaria de Recursos Hídricos - SRH


Indicador 10: Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de Aqüicultura.

- **Meta 2011:** $\geq 37\%$
- **Posição em 31/12:** 39%
- **Posição em 31/12 em relação à meta:**
- **Justificativa:** O indicador na posição de dezembro/2011 atingiu e até sobrepujou a meta estabelecida em dois pontos percentuais pois, no período do último trimestre do ano, o consumo de água aumentou consideravelmente por parte dos usuários em geral, mormente quanto a categoria dos irrigantes, devida a falta de chuvas, que teve substancial influência para o cumprimento da meta.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta foi cumprida.

Água e Saneamento

Secretaria de Recursos Hídricos - SRH

Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura

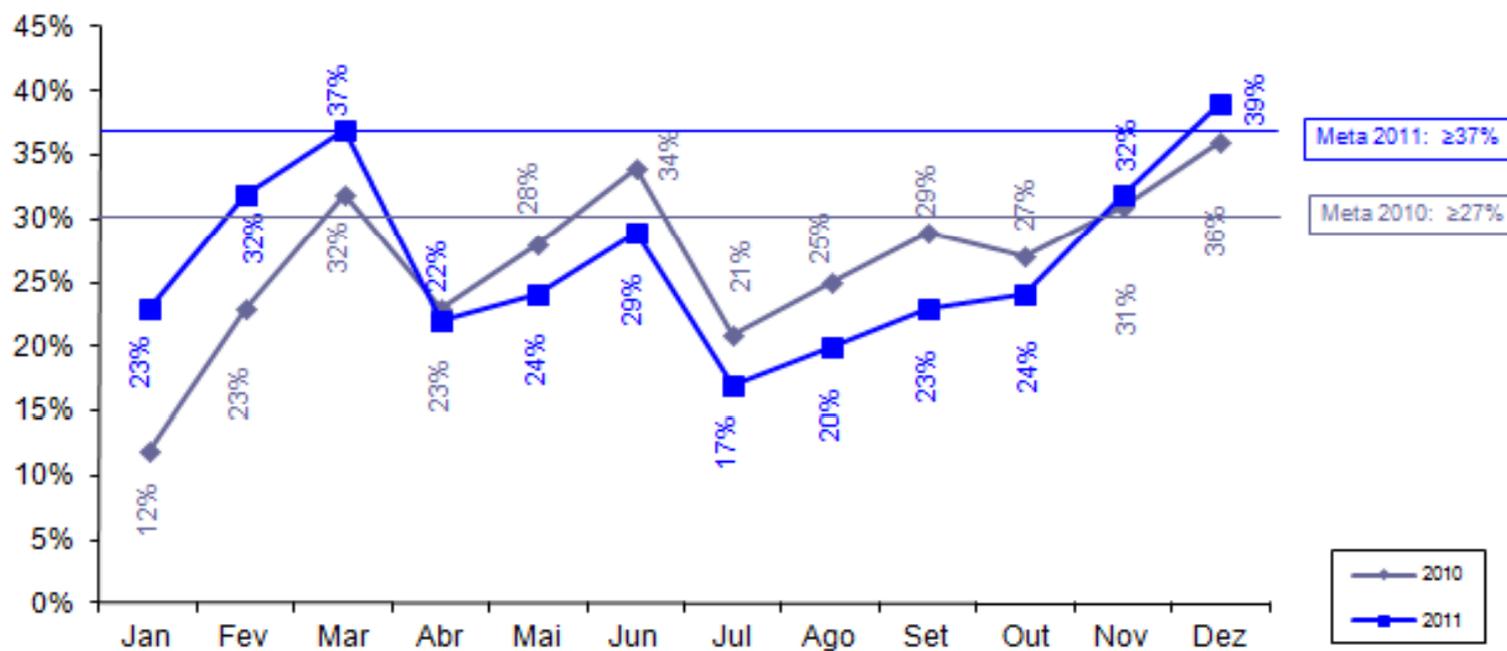

Sentido do indicador: ↑

OPERAÇÃO Swap II

CAGECE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADORES PRIMÁRIOS

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Indicador 11a: Número de ligações urbanas de água.


- **Meta 2011:** 275.122
- **Posição em 31/12:** 315.803 (*)
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2006 a dezembro de 2011 foram executadas 315.803 ligações domiciliares de água.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta superada.

(*) Valor modificado pela evidência encaminhada no dia 07/02/2012.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Número de ligações urbanas de água

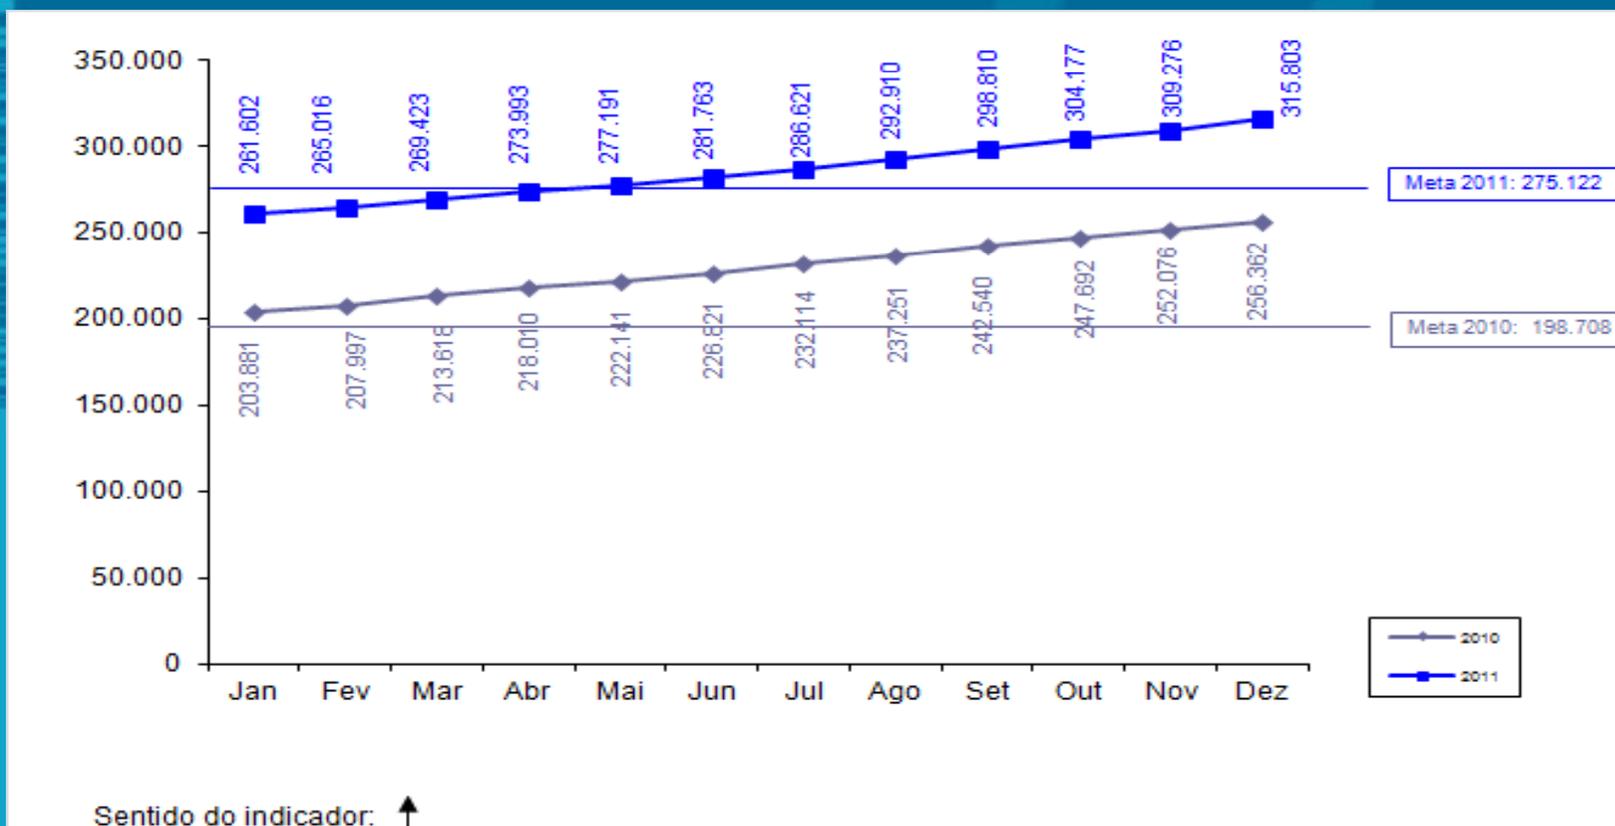

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE


Indicador 11b: Número de ligações de esgotos.

- **Meta 2011:** 124.775
- **Posição em 31/12:** 139.845
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2006 a dezembro de 2011 foram executadas 139.845 ligações domiciliares de esgoto.
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta superada.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE


Número de ligações de esgoto

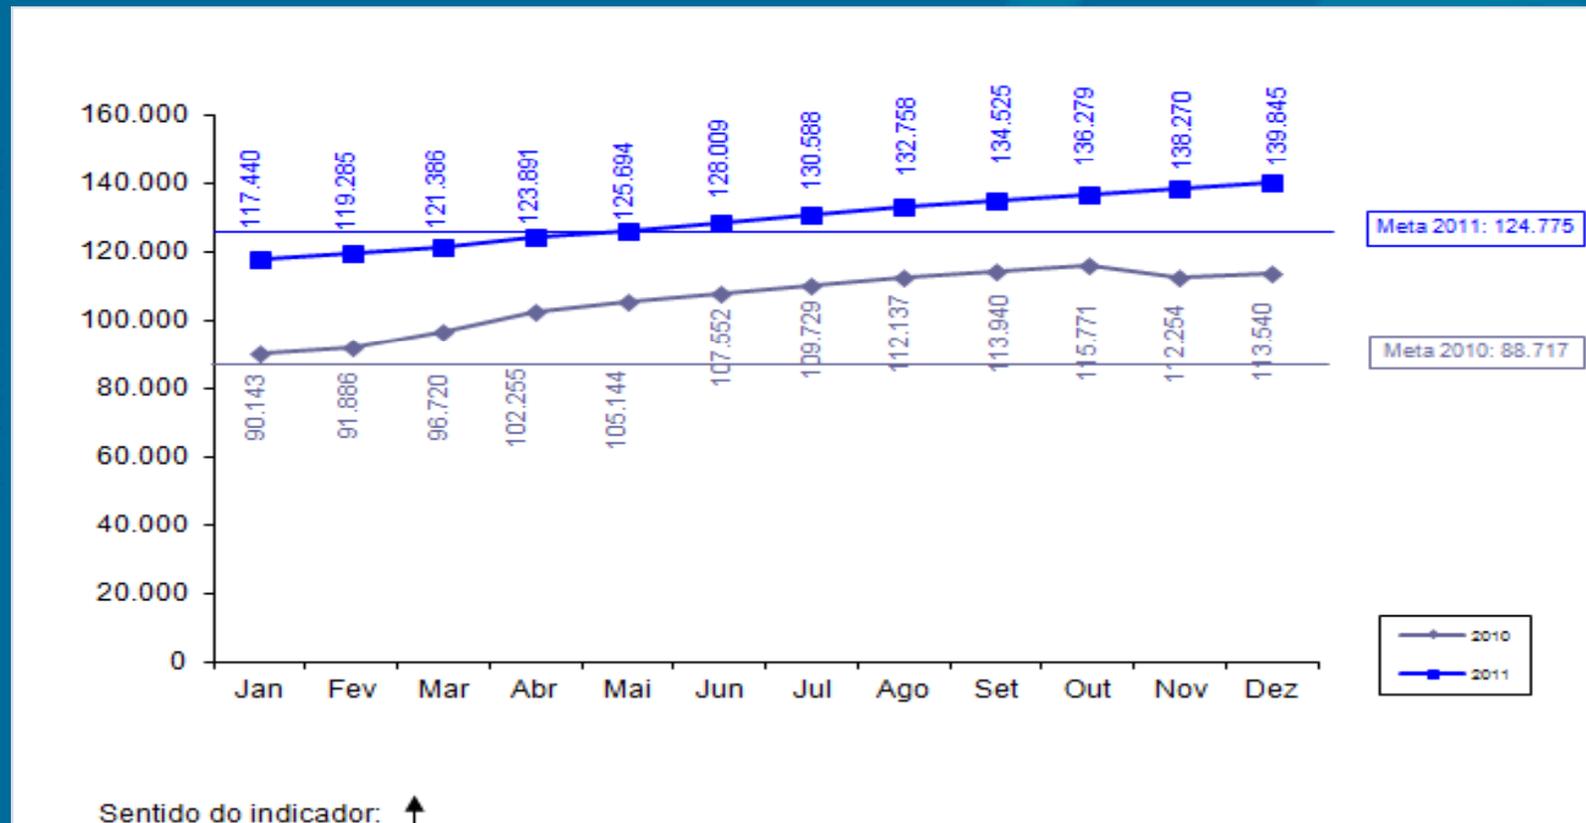

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Indicador 12: Percentual de Perda de Água.


- **Meta 2011:** $\leq 27\%$ (*)
- **Posição em 31/12:** 26,08%
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** De 2007 a novembro de 2011, o percentual de perda de água foi de 26,08%.

(*) Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 28,20% para 27%.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Percentual de Perda de Água

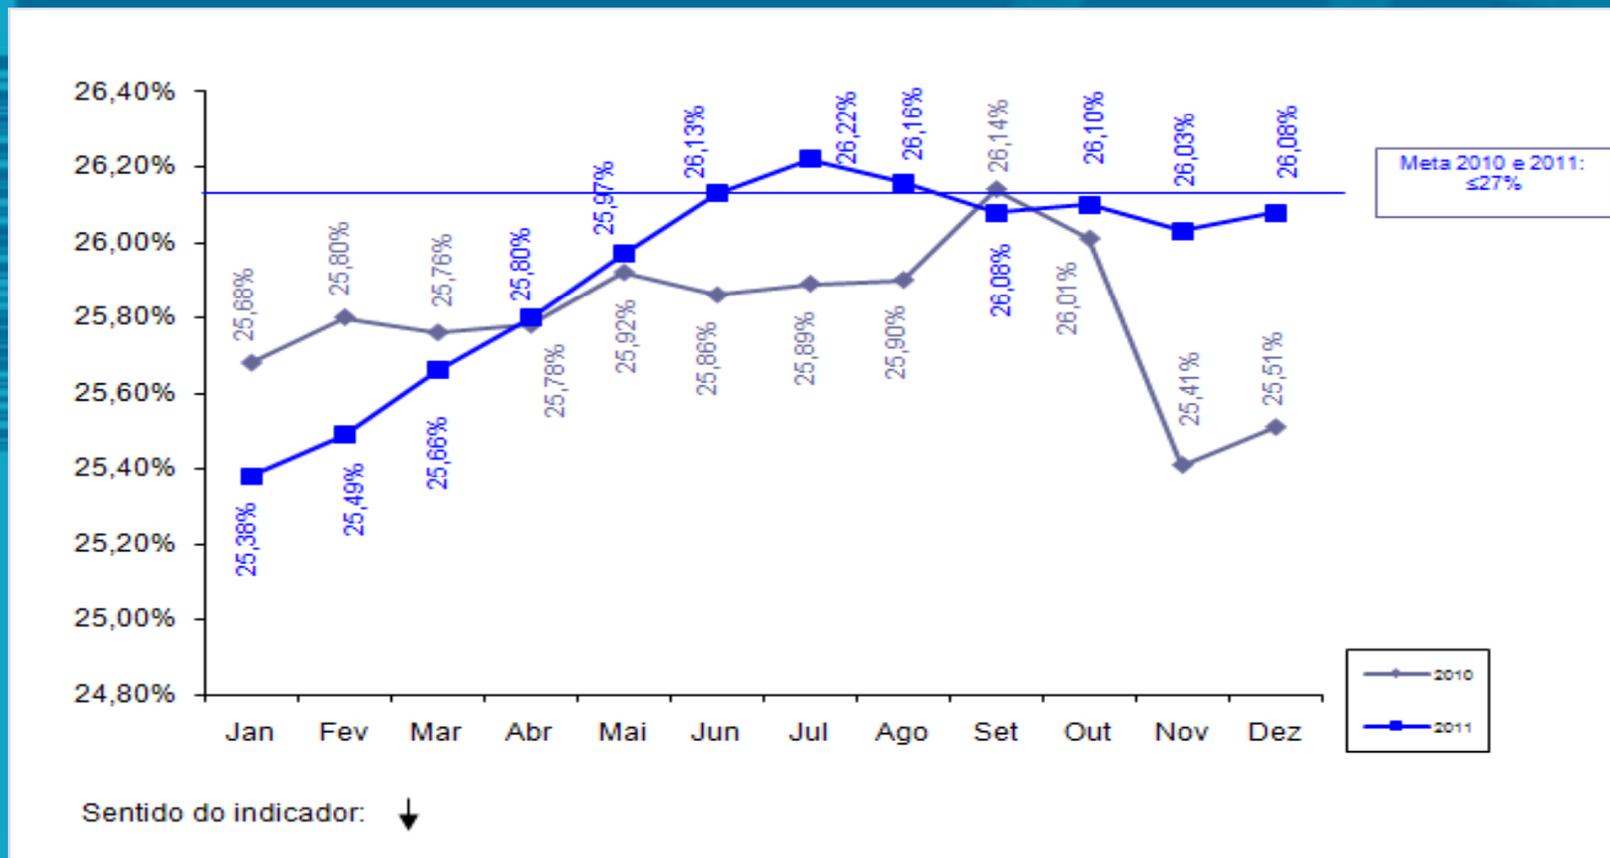

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE


Indicador 10: Margem EBITDA da CAGECE.

- **Meta 2011: 22,72%**
- **Posição em 31/12: 25,75%**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida**
- **Comentário: Redução da meta aprovada pelo BM em 16.11.11, de 29,50% para 22,72%. Valor provisório, pois o encerramento de 2011 ocorrerá após as análises da Auditoria Externa, cujo prazo para publicação das Demonstrações financeiras de 2011 é 31/03/2012**

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

Margem EBITDA da CAGECE

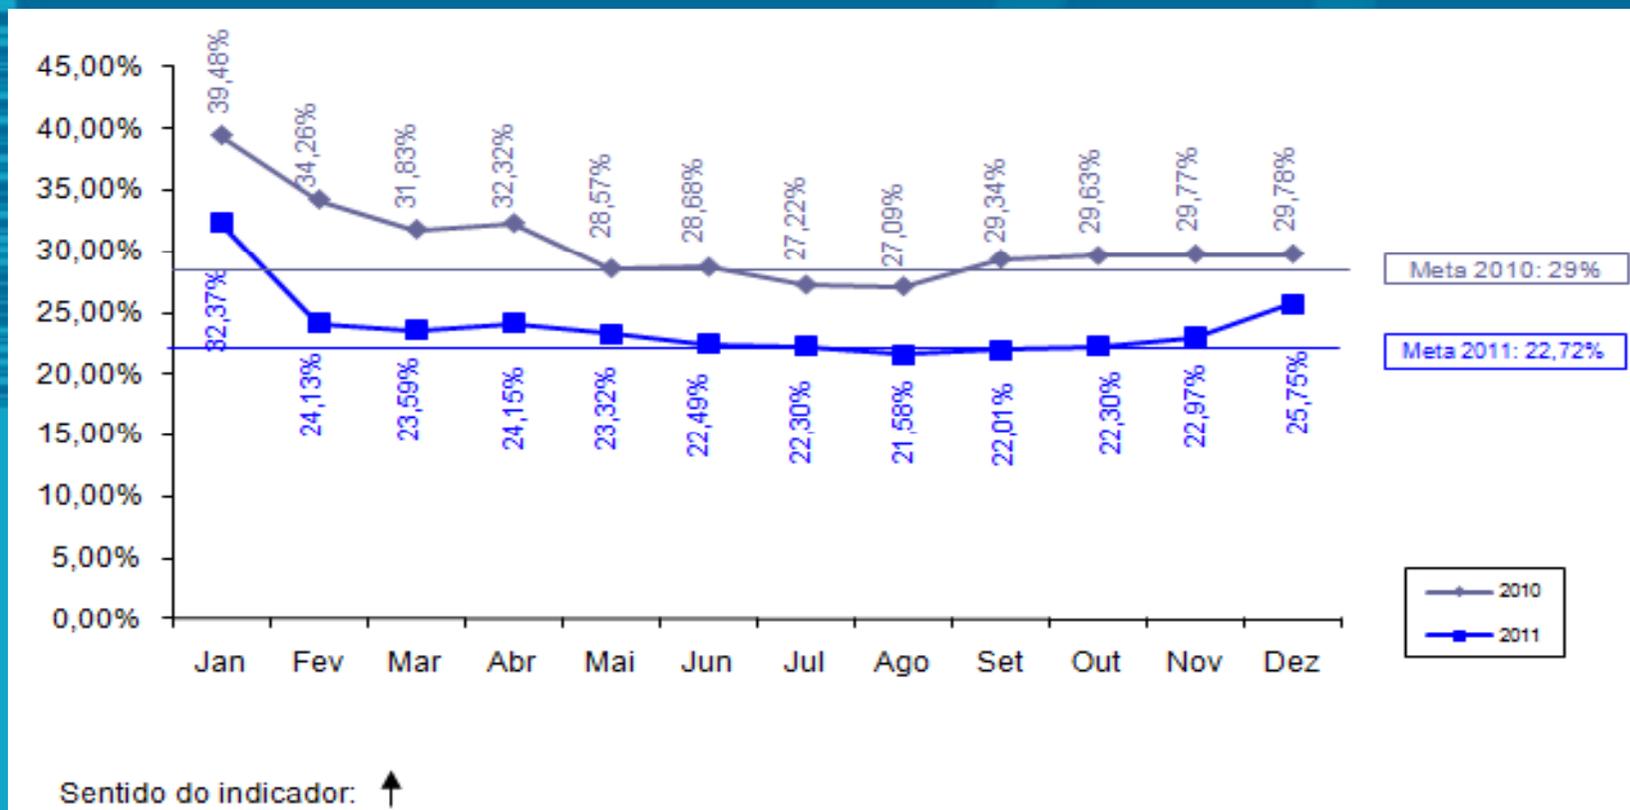

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

Relatório Quadrimestral de Acompanhamento da Salvaguarda de Reassentamento e Desapropriação enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º Trimestre de 2011).

OPERAÇÃO Swap II

CIDADES

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 4: Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade.

- **Responsável:** Tércia Pinheiro
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 106,43 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2011 – Fevereiro 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Relatório Quadrimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II, enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º trimestre de 2011).

OPERAÇÃO Swap II

ETICE


OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR PRIMÁRIO

Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE


Indicador 13: Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.

- **Meta 2011: 4.365.700**
- **Posição em 31/12: 4.387.816**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Justificativa: A partir do Cinturão Digital, o Governo do Estado do Ceará estenderá, por meios de ramificações de fibras óticas com uso da tecnologia Wimax, via rádio, a rede de banda larga aos municípios.**
- **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.**

Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE

Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga

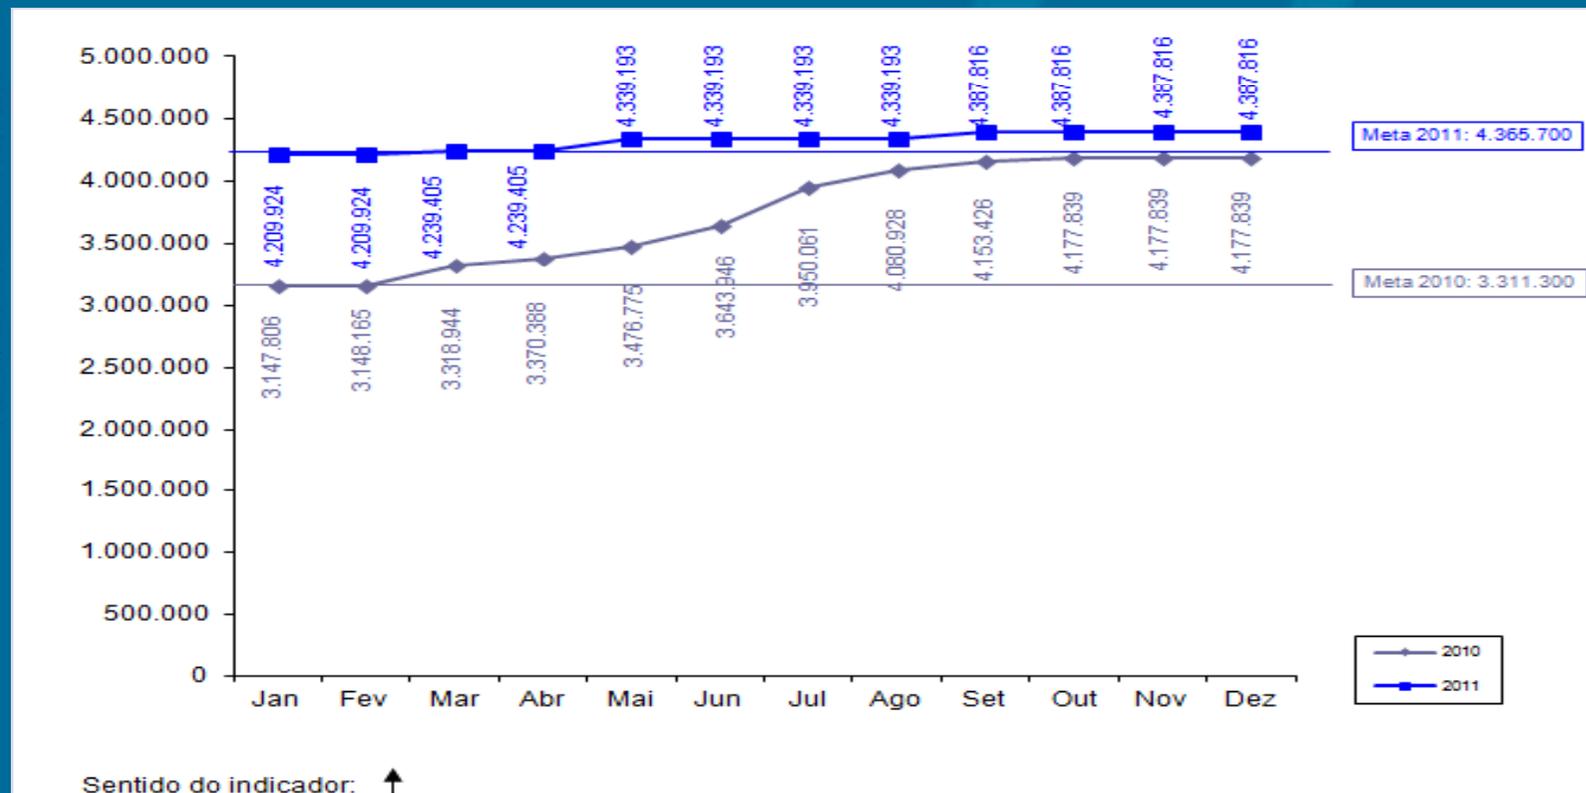

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Negócios & Inovação

Empresa de Tecnologia do Ceará - ETICE

Indicador 12: Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).

- **Meta 2011:** 3
- **Posição em 31/12:** 3
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** Os sistemas Ciclo Orçamentário, Middleware de Integração e Patrimônio, componentes do S2GPR, encontram-se implementados.
- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta foi cumprida.

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Negócios & Inovação

Empresa de Tecnologia do Ceará - ETICE

Projeto 7: Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de internet.

- **Responsável:** Denise Olsen
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor:** US\$ 32,72 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2009 – Setembro 2009
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Negócios & Inovação

Empresa de Tecnologia do Ceará - ETICE

Projeto 8: Desenvolvimento de Sistema de Avaliação de Resultados do Cinturão Digital do Ceará.

- **Responsável:** Denise Olsen
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 45,60 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2011 – Setembro 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

PGE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Gestão do Setor Público

Procuradoria Geral do Estado - PGE


Indicador 4: Redução de processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato.

- **Meta 2011:** $\leq 10,5\%$
- **Posição em 31/12:** 9,76%*
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta com perspectiva de cumprimento.
- **Comentário:** o percentual médio da meta no período de janeiro a dezembro de 2011 foi de 8,60%.

Gestão do Setor Público

Procuradoria Geral do Estado - PGE

Redução de processos de licitação fracassados antes da assinatura do contrato

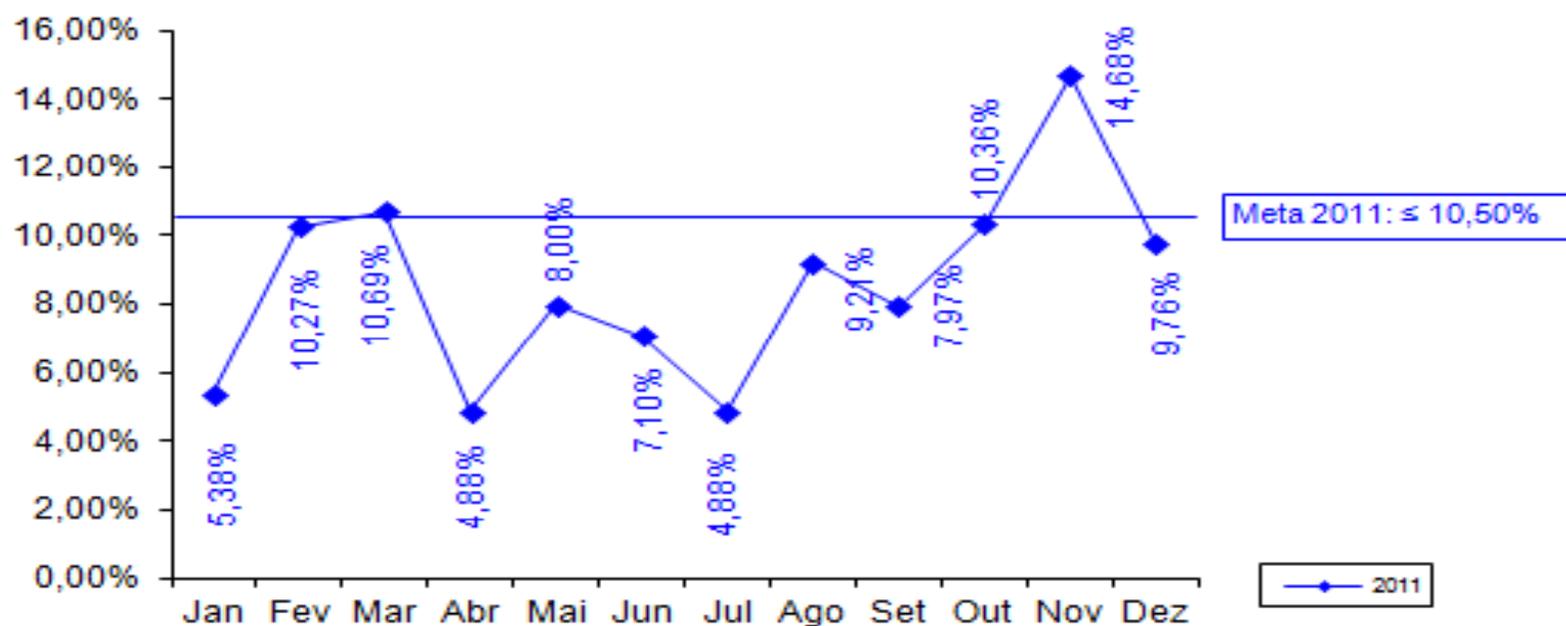

Sentido do indicador: ↓

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 14: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Treinamentos e Seminários na área de Licitações

- **Responsável:** Tarso e Fernando Grangeiro
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 146,29
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2010 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projeto 15: Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Compra de Equipamento.

- **Responsável:** Tarso e Fernando Grangeiro
- **Categoria de Licitação:** Bens
- **Valor:** US\$ 22,58 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2012 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Contrato Assinado.
- **Estágio Atual:** Contrato Assinado.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

ARCE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Água & Saneamento

Agência Reguladora do Ceará - ARCE


Indicador 11: Índice de conformidade da qualidade da Água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).

- **Meta 2011:** 58,00%
- **Posição em 31/12:** 20,34%
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Justificativa:** 59 relatórios concluídos de janeiro a dezembro de 2011, dos quais 47 relataram não-conformidades na qualidade da água.
- **Perspectiva de cumprimento:** a melhoria observada no início do ano, de fevereiro a abril de 2011, não se manteve nos meses seguintes. A meta não foi atingida.

Água & Saneamento

Agência Reguladora do Ceará - ARCE

Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE

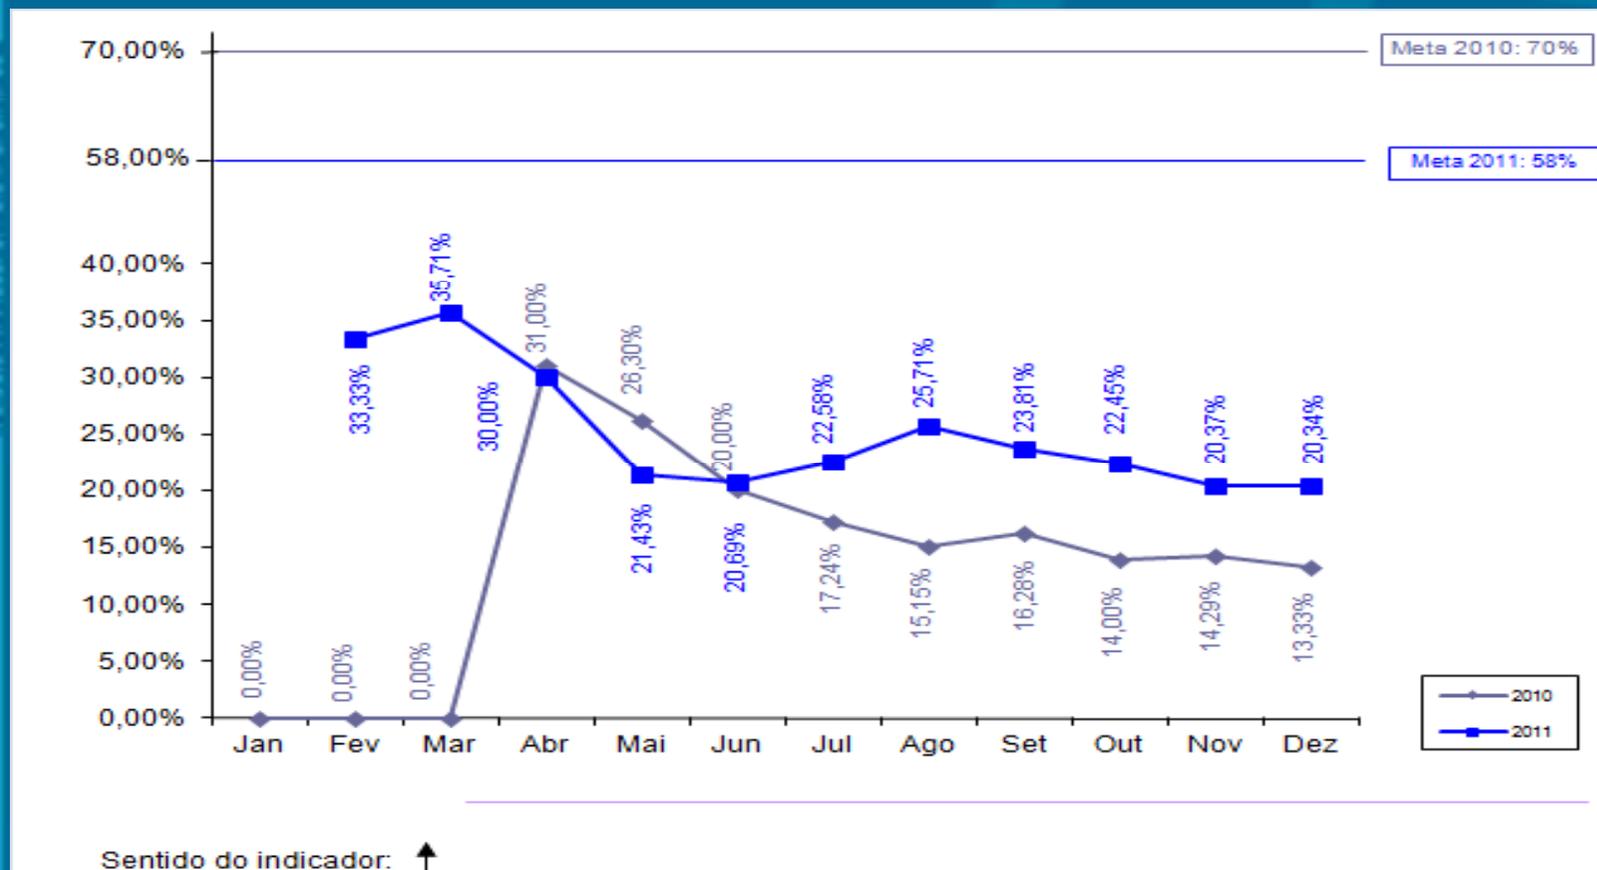

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 1: Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento.

- **Responsável:** Mário Monteiro e Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 119,42 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2009 – Agosto 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

SECITECE

OPERAÇÃO Swap II

SECITECE

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE

Indicador 13: Número de serviços tecnológicos realizados.

- **Meta 2011:** 47.181
- **Posição em 31/12:** 43.655
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento:** Meta não alcançada.

Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE


Indicador 13: Número de serviços tecnológicos realizados.

- **Meta 2011:** 47.181
- **Posição em 31/12:** 43.655
- **Posição em 31/12 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de cumprimento:** Meta não alcançada.

Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE

Número de serviços tecnológicos realizados

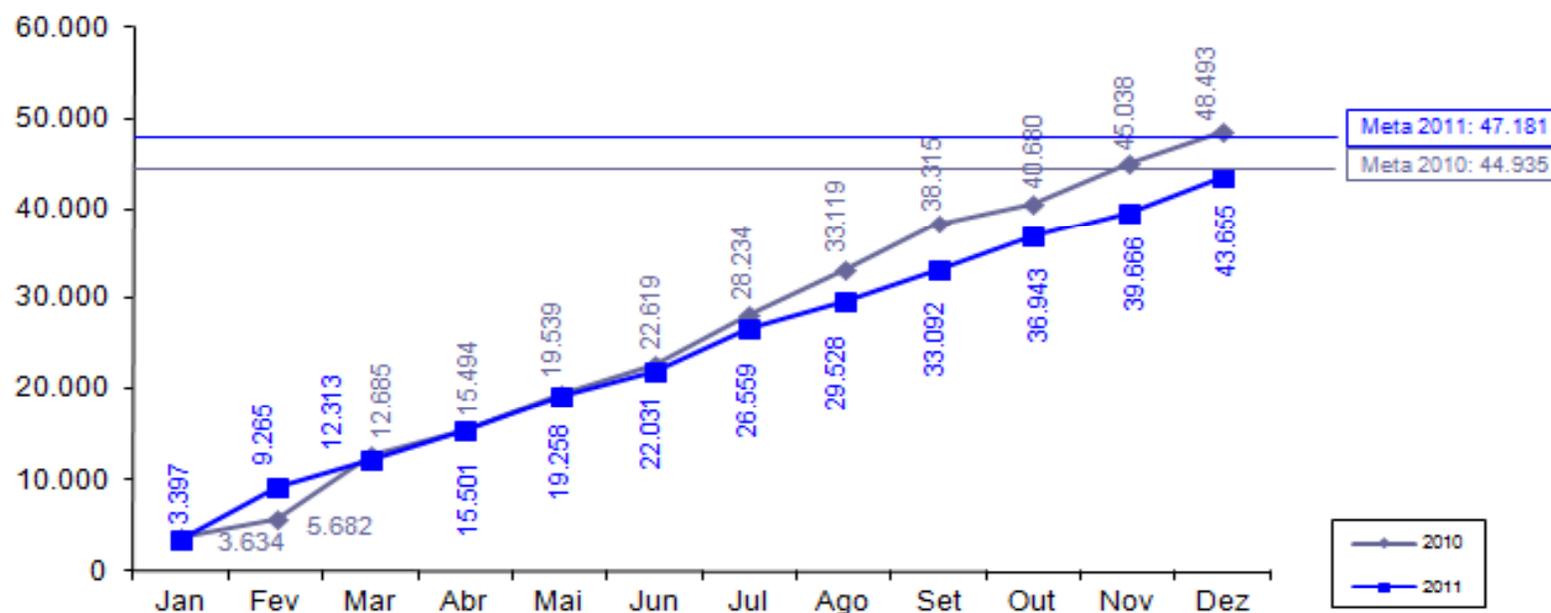

Sentido do indicador: ↑

OPERAÇÃO Swap II

CONPAM

OPERAÇÃO Swap II

INDICADOR SECUNDÁRIO

Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM


Indicador 14: Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado (percentual de licenças protocoladas na SEMACE no prazo de 60 dias).

- **Meta 2011: 20,00%**
- **Posição em 31/12: 20,80%**
- **Posição em 31/12 em relação à meta: **
- **Perspectiva de cumprimento: meta será cumprida**
- **Comentários: Informação referente a Dezembro de 2011**

Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM

Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado (percentual de licenças protocoladas na SEMACE no prazo de 60 dias)

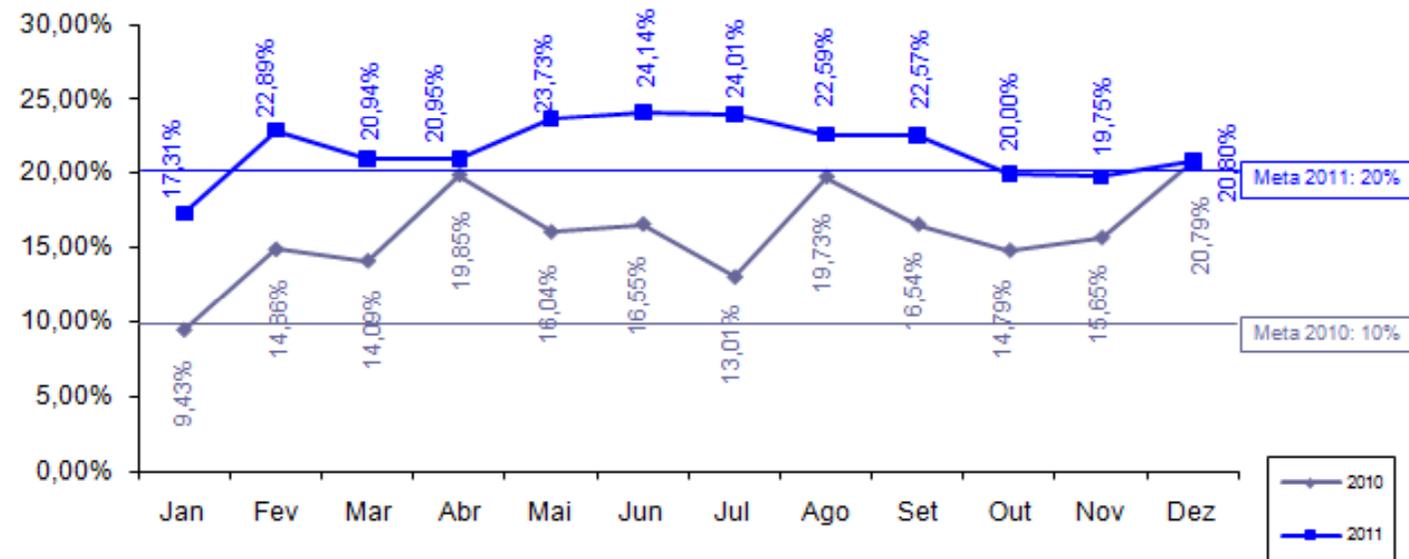

Sentido do indicador: ↑

OPERAÇÃO Swap II

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Projeto 5: Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente.

- **Responsável:** Maria Goretti de Castro e Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 39,68 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2009 – Novembro 2010
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Projeto 6: Estudo visando a integração da Gestão de Resíduos de Saúde com a Política Estadual de Resíduos Sólidos.

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Empresa de Consultoria
- **Valor:** US\$ 106,81 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2011 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Secretaria das CONPAM

Relatório Quadrimestral de acompanhamento da situação dos resíduos hospitalares, elaborado com a parceria da SESA, CONPAM e CIDADES, de forma a indicar os avanços durante a implementação do Projeto SWAp II, enviado ao Banco Mundial em 01/02/2012 (posição do 4º trimestre de 2011).

OPERAÇÃO Swap II

CGE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Projeto 3: Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Marconi Lemos
- **Categoria de Licitação:** Empresas de consultoria
- **Valor:** US\$ 120,92 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Novembro 2009 – Janeiro 2012
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 3: Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Marconi Lemos
- **Categoria de Licitação:** Empresas de consultoria
- **Valor:** US\$ 120,92 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Novembro 2009 – Janeiro 2012
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OPERAÇÃO Swap II

IPECE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Projeto 9: Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena: Consultoria.

- **Responsável:** Eveline Barbosa
- **Categoria de Licitação:** Consultores Individuais
- **Valor:** US\$ 31,34 mil
- **Método de Aquisição:** Seção V – Guidelines de consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2009 – Março 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Projeto 10: Contratação de serviços para realização de evento c/ lideranças indígenas p/ apresentação dos livros didáticos/resultados da consultoria.

- **Responsável:** Eveline Barbosa
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 1,24 mil
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2011 – Maio 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Projeto 11: Contratação de serviços gráficos para impressão e publicação dos livros didático-pedagógicos para as escolas indígenas do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Eveline Barbosa
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor:** US\$ 1,24 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2010 – Março 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

**Projeto 12: Suporte p/ funcionamento da UGP do Projeto
SWAP II - Contratação de Consultores Individuais.**

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultores Individuais
- **Valor:** US\$ 169,16 mil
- **Método de Aquisição:** Seção V- Diretrizes de consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2009 – Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando Serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 13: Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado.

- **Responsável:** Leandro Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultores Individuais
- **Valor:** US\$ 17,95 mil
- **Método de Aquisição:** Seção V – Diretrizes de consultoria
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2009 – Maio 2010
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

OPERAÇÃO Swap II

SALVAGUARDAS

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE

- No dia 15 de Abril de 2011, ocorreu um evento na Aldeia Indígena Jenipapo Kanindé para o lançamento das duas cartilhas (projetos AT 9,10 e 11), elaboradas dentro do escopo de Salvaguardas Social do Projeto SWAp II intituladas *Plantas Medicinais: Usos-saberes-sentidos; e Sentir-pensar-fazer: Artesanatos Indígenas no Ceará*);
- Ofício SEDUC nº 1268/2011 informou a entrega das cartilhas *Plantas Medicinais: Usos-saberes-sentidos; e Sentir-pensar-fazer: Artesanatos Indígenas no Ceará*) nas Escolas Indígenas do Ceará;
- No dia 25/01/2012 foram encaminhadas as cartilhas para José Mendes Fonteles Filho (Profº Babi) e para Professora da UFC Isabelle Bras Peixoto da Silva.

OPERAÇÃO Swap II

TCE

OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Projeto 31: Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de soluções integradas de Gerenciamento eletrônico de documento e informações do TCE (TCE 100% digital). (Parte A) – Digitalização.

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor:** US\$ 72,4 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2010 – Março 2012
- **Estágio Previsto:** Prestando Serviço.
- **Estágio Atual:** Prestando Serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação**

**Projeto 31: Fortalecimento Institucional do TCE -
Contratação de soluções integradas de Gerenciamento
eletrônico de documento e informações do TCE (TCE
100% digital). (Parte B) – Storage**

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor:** US\$ 196,8 mil
- **Método de Aquisição:** Pregão eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2012/Junho 2012
- **Estágio Previsto:** Publicação Edital
- **Estágio Atual:** Edital publicado – Pregão 23/04/12
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 32: Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação. (Parte A) – Inscrição.

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US\$ 7,54 mil
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2009 – Setembro 2011
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Projeto 32: Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação. (Parte B) – Inscrição CISA.

- **Responsável:** Giovanna Adjafre
- **Categoria de Licitação:** Empresas de Consultoria
- **Valor:** US 6,9 mil
- **Método de Aquisição:** Contratação Direta
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** novembro 2011- junho 2012
- **Estágio Previsto:** prestando serviço.
- **Estágio Atual:** prestando serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OBRIGADA!

OPERAÇÃO
Swap II

The background is a solid blue color. On the right side, there is a faint, light blue outline of a globe. On the left side, there are several vertical bars of varying shades of blue and white, some with horizontal lines, creating a decorative pattern.

ANEXO III



Estado do Ceará

Secretaria de Planejamento e Gestão

Instituto de Pesquisa e Estatística Econômica do Ceará - IPECE

SÍNTESE DA PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS E REPRESENTANTES DO COMITÊ SIWAP II NAS REUNIÕES DO ANO DE 2009

Table with columns: Órgão, Reunião, Função, and 30 numbered columns for meeting dates (3º to 30º). Includes rows for ARCE, CAGECE, CGE, COADES, COMPAM, EMACE, ETICE, IPECE, PGE, SECOTEC, SEDUC, SEFAP, SEPLAG, SRH/COGERH, and SESA. Each cell contains 'Presente' or 'Ausente'.

*A partir da 1ª reunião o Titular mudou de Alceu da Castro Galdino Júnior para Alexandre Cavetano
*A partir da 2ª reunião o Titular mudou de José Aurício de Oliveira para Denisia Maria Norões
*A partir da 3ª reunião o Titular mudou de Francisco C Coelho para Ricardo Costa e Silva
*A partir da 11ª reunião o Titular mudou de Luiz Jarcas de Mesquita Ramos para Fábio Ramos
*A partir da 11ª reunião o Titular mudou de Paulo Sérgio Rocha para Fabrício Santos
*A partir da 15ª reunião o Titular mudou de Fernando Antonio C. de Oliveira para Fernando Grangoso
*A partir da 15ª reunião o Suplente mudou de Fco. Antônio N. Bezerra para Tarcis Prohino Borges
*A partir da 18ª reunião o Suplente mudou de Luiz Fernando G Viana para Maria do Céu R Colares
*A partir da 19ª reunião o Titular mudou de Emliliana L. Filgueiras para Márcio Normando El Coelho
*A partir da 19ª reunião Emliliana L. Filgueiras deixou de ser Titular e passou a ser Suplente
*A partir da 20ª reunião o Titular mudou de Wanda Murta para Edilson Uchoa Lopes
*A partir da 22ª reunião o Coordenador da Operação SIWAP II mudou de Evelina Barbosa para Flávio Ataliba
*A partir da 24ª reunião o Titular mudou de Carlos Eduardo Sobrinho para Isaura Lima
*A partir da 29ª reunião o Titular mudou de Marcelo de Souza Monteiro para Sílvia Helena Costa
*A partir da 29ª reunião o Suplente mudou de Kelly Cristina de O. Barbosa para Paulo Roberto de C Nunes
*A partir da 30ª reunião o Suplente mudou de Maria do Céu Ramos Colares para Denilson Marcelino Fideles
*A partir da 31ª reunião José Maurício Gilson passou a ser Suplente pela SEMACE
*A partir da 33ª reunião o Suplente mudou de Márcio Augusto Pereira Monteiro para Daniela Cavahia Cambrata Dantas

ANEXO IV

Gráfico da Participação por Setorial

