



11ª REUNIÃO DO COMITÊ *PforR*
ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO
PROJETO *PforR*
19 DE DEZEMBRO DE 2014



PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

1. Abertura (9h30m)
2. Apresentação dos participantes (9h30m - 9h40m)
3. Apresentação por cada Setorial da Posição e Avaliação do desempenho dos Programas, Indicadores e Projetos de Assistência Técnica (9h40m -10h50m)
4. Aprovação Ata 10ª Reunião (10h50m-11h)
5. Encerramento (11h)



1. ABERTURA



2. APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES



3. Apresentação por cada Setorial da Posição e Avaliação do desempenho dos Programas, Indicadores e Projetos de Assistência Técnica

POSIÇÃO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2014



STDS



INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicadores – Assistência à Família

Indicador Primário: Porcentagem de famílias com crianças entre 0 e 5 anos no Cadastro Único em municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.

Responsável: Mary Anne Libório

- **Meta 2015:**

2º semestre – 10%

- **Posição em 30/11:**

- **Posição em 30/11 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:**

- **Justificativa:**

Indicadores – Assistência à Família

Indicador Primário: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.

Responsável: Mary Anne Libório

- **Meta 2015:**

1º semestre – 15%

2º semestre – 30%

- **Posição em 30/11:**

- **Posição em 30/11 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:**

- **Justificativa:**



INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicadores – Assistência à Família

Indicador Secundário: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.

Responsável: Mary Anne Libório

- **Meta 2015:**

2º semestre – 10%

- **Posição em 30/11:**

- **Posição em 30/11 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:**

- **Justificativa:**



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Redução da Pobreza

Projeto 50: *Monitoramento e capacitação dos CRAS.*

Subprojeto 77: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviço
- **Valor do Projeto:** US\$ 900.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 75.986,84
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2014 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Abertura Pública das Propostas
- **Estágio Atual:** Relançado o edital shopping e enviado as empresas convidadas em 10/12/14 para apresentarem proposta até o dia 22/12/14..
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Redução da Pobreza

Projeto 50: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

Subprojeto 80: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 900.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 117.055,35
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2014 – Abril 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Contrato
- **Estágio Atual:** Enviado a BM para NO em 17/12/14: RAC e minuta do contrato.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Redução da Pobreza

Projeto 50: *Monitoramento e capacitação dos CRAS.*

Subprojeto 78: Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PforR

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 900.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 400.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2015- Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de discussão e levantamento.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Redução da Pobreza

Projeto 50: *Monitoramento e capacitação dos CRAS.*

Subprojeto 79: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 900.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 306.957,81
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2015 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de discussão e levantamento com TI.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



PROGRAMAS

Programas – Redução da Pobreza

Programa: 050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

- **Setoriais envolvidas:** STDS
- **PPA Iniciativa:** 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.
- **Ação I:** 14330 - Cofinanciamento dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 34,57 (*)
- **Previsto para o Ano de 2014 em milhões:** R\$ 7,30
- **Realizado até 30/11/14 em milhões:** R\$ 6,65
- **Realizado/Previsto (%):** 100%
- **Periodicidade:** Frequência da execução mensal, com a execução iniciando em Abril.
- **Farol:**

(*) O programa 050 - Assistência Social da STDS passa de R\$ 28,99 milhões para R\$ 34,57 milhões, conforme explicações na Nota Técnica 01/2014 da STDS



PLANO DE AÇÃO

Plano de Ação

Risco 1: Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

1º Ação: Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar (incluindo a busca ativa de famílias vulneráveis).

Responsável: SEDUC, STDS e Gabinete do Governador

Coordenação: STDS

Período: Durante o primeiro ano

Indicador: Aumento do número de crianças indígenas e quilombolas atendidas em creches ou recebem atenção domiciliar (proporcional às metas gerais do projeto).

Encaminhamentos: Estabelecimento de Cronograma

Plano de Ação – Cronograma STDS

| CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO | | | |
|------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nº | ATIVIDADES | INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL | PERÍODO DE REALIZAÇÃO |
| 1 | Identificação de municípios com comunidades indígenas e quilombolas nos 36 municípios da área de abrangência do PforR, tendo como base o CadÚnico conforme levantamento realizado pelo IPECE. | IPECE | Até outubro/2014 |
| 2 | Identificação de famílias indígenas e quilombolas em situação de extrema pobreza, com crianças de até 3 anos nos 36 municípios da área de abrangência do PforR. | SEDUC | Até março/2015 |
| 3 | Identificação de famílias indígenas e quilombolas em situação de extrema pobreza, com crianças de até 5 anos nos 36 municípios da área de abrangência do PforR. | STDS | Até março/2015 |
| 4 | Realização de Seminário com Gestores Municipais para sensibilização e adesão ao PforR e início da implementação. | STDS | Até fevereiro/2015 |
| 5 | Identificação de famílias em situação de extrema pobreza com crianças de até 5 anos residentes em áreas rurais remotas por município da área de abrangência do PforR. | SEDUC e STDS | Até março/2015 |
| 6 | Elaboração de mapa de acompanhamento anual das famílias conforme meta definida no PforR, destacando as famílias indígenas, quilombolas e as residentes em áreas rurais remotas.[2] | STDS | Até julho/2015 |
| | | SEDUC | Até junho/2015 |
| 7 | Seleção de Jovens Agentes de Desenvolvimento Infantil - JADIs, nos 36 municípios. | SEDUC | |
| 8 | Apresentação pelos consultores do material elaborado para capacitação de equipes técnicas dos CRAS (STDS) e JADIs (SEDUC) no âmbito dos projetos de Assistência Técnica do PforR. | STDS | Até maio/2015 |
| | | SEDUC | Até abril/2015 |
| 9 | Realização de consulta junto as comunidades indígenas e quilombolas participantes do projeto com a participação das principais lideranças dos segmentos populacionais. | STDS, SEDUC e CEPIR | Até maio/2015 |
| 10 | Impressão do material teórico a ser utilizado nas capacitações | SEDUC | Até abril/2015 |
| 11 | Impressão do material teórico a ser utilizado nas capacitações. | STDS | Até junho 2015 |
| 12 | Realização das Capacitações com os JADIs (início). | SEDUC | Até maio/2015 |
| 13 | Realização das Capacitações com das equipes de referência dos CRAS (início). | STDS | Até julho/2005 |
| 14 | Acompanhamento às famílias pelos JADIs. | SEDUC | Até julho/2005 |
| 15 | Acompanhamento às famílias pelas equipes dos CRAS capacitadas (semestralmente). | STDS | Até setembro/2015 |
| 16 | Elaboração de Relatórios Semestrais. | STDS e SEDUC | Janeiro e Julho de cada ano |



CEDE / ADECE



INDICADOR PRIMÁRIO

Indicadores – Capacitação Profissional

Indicador Primário: Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação.

Responsável: Marilda dos Santos

- **Meta 2014:**

1º semestre - Comitê instituído pelo decreto;

2º semestre - Documento de estratégia finalizado

- **Meta 2015:**

1º semestre – Plano de Ação Publicado

- **Posição em 30/11:** Documento Finalizado e Entregue

- **Posição em 30/11 em relação à meta:** ██████████

- **Perspectiva de Cumprimento:** Documento Finalizado e Entregue



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Capacitação Profissional

Projeto 2: *Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas*

Subprojeto 2: Contratação de consultoria de empresa para desenvolver um sistema informatizado para o monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Cláudio Frota
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 200.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 196.396,32
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Abril 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TOR
- **Estágio Atual:** Recebido da Setorial em 16/12/14 o TdR devidamente corrigido conforme sugestões do BM para análise da UGP e, posterior envio ao BM para NO.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



CIDADES



PROGRAMAS

Programas – Qualidade da Água

Programa: 032 - SANEAMENTO AMBIENTAL

- **Setoriais envolvidas:** Cidades/CAGECE
- **PPA Iniciativa:** 0392 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário – CAGECE
- **Ação:** 19849 - Estruturação de Esgotamento Sanitário em Localidades Urbanas
- **Total Previsto para 2014 - 2017:** R\$ 15,83 (*)
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 5,65
- **Periodicidade da execução:** Frequência de Execução Mensal.
- **Realizado até 30/11/14:** R\$ 0,00
- **Farol:** ██████████

(*) A iniciativa da CAGECE 02617 mudou para iniciativa 0392 de acordo com a Nota Técnica 02/2014. A CIDADES criou uma nova iniciativa (5384) e ação (21751) para o PforR para os anos de 2015 – 2017.



CAGECE



INDICADOR PRIMÁRIO

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador Primário: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.

Responsável: Carlos Rossas

▪ **Meta 2014:**

1º semestre - 83.8%

2º semestre - 84.3%

▪ **Meta 2015:**

1º semestre – 84.6%

2º semestre – 84.9%

▪ **Posição em 30/11: 84,88%**

▪ **Posição em 30/11 em relação à meta:** 

▪ **Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida**



CGE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Gestão Transversal - Auditoria

Projeto 3: Auditoria Técnica dos Indicadores

Subprojeto 3: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 400.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 368.279,25
- **Valor do Contrato – Ano 1:** US\$ 49.564,77 *
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Novembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução
- **Estágio Atual:** Encaminhado o Ofício com a Minuta do Contrato do Consultor e "NO" para PGE em 15/12/14 para finalização do processo de seleção.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

OBS: Projeto em atraso em virtude de várias discussões com a Setorial, o Banco e a UGP.

* Valor do contrato em reais: R\$ 116.616,00 (R\$ 97.180,00(contrato) + R\$19.436,00 (INSS Patronal))

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 4: *Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais*

- **Responsável:** Marcelo Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 875.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Solicitado através do Ofício nº 1541/2014 em 16/12/14 alteração do P.A para 28/02/15 o início do Projeto.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 5: *Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social*

Subprojeto 5: Aprimoramento do Portal da Transparência

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015– março 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Solicitado através do Ofício nº 1541/2014 em 16/12/14 alteração do P.A para 28/02/15 o início do Projeto.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 5: *Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social*

Subprojeto 6: Aprimoramento do Sistema de Ouvidoria – SOU (Ouvidoria e Acesso à Informação).

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015– Março 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Solicitado através do Ofício nº 1541/2014 em 16/12/14 alteração do P.A para 28/02/15 o início do Projeto.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 5: *Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social*

Subprojeto 7: Capacitação da população para o Controle Social

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Solicitado através do Ofício nº 1541/2014 em 16/12/14 alteração do P.A para 28/02/15 o início do Projeto.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 6: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.

- **Responsável:** Denise Andrade Araújo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 150.000,00
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR analisado pela UGP em 11/12/14. Solicitado a MC para análise da UGP.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 7: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

- **Responsável:** Marcelo Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor:** US\$ 100.000,00
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR analisado pela UGP em 17/11/14 e encaminhado a setorial para ajustes e elaboração da MC.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



CONPAM



INDICADOR PRIMÁRIO

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador Primário: Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.

Responsável - Tereza Farias e Ulisses Rolim

- **Envolvidos:** SRH, COGERH e SEMACE

- **Meta 2014:**

1º semestre - 28%

2º semestre - 40%

- **Meta 2015:**

1º semestre – 50%

2º semestre – 60%

- **Posição em 30/11:** 42,60%

- **Posição em 30/11 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Meta cumprida

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador Primário: Estabelecimento de Comitê Multisetorial de Segurança Hídrica

Responsável - Tereza Farias e Ulisses Rolim

- **Meta 2015:**

1º semestre – Diagnóstico de Bacias Hidrográficas

- **Posição em 30/11:**

- **Posição em 30/11 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:**



INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador Secundário: Apresentação da Lei de Gestão de Resíduos Sólidos revista

Responsável - Tereza Farias e Ulisses Rolim

- **Meta 2015:**

2º semestre – Divulgação e Implementação

- **Posição em 30/11:** A minuta da Lei está na PGE para publicação.
- **Posição em 30/11 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade intermediária de atingir a meta



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 8: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.

Subprojeto 10: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto “AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.”

- **Responsável:** Tereza Farias e Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 450.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 416.854,24
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Avaliação Técnica das propostas
- **Estágio Atual:** Enviado a Setorial em 17/12/14 a Minuta de SDP para adequações conforme orientações da CEL04 e UGP.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 9: Capacitação para o pessoal técnico municipal.

Subprojeto 11: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas

- **Responsável:** Tereza Farias e Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 720.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 516.853,97
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Fevereiro 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** Enviado em 03/12/14 a Setorial comentários do BM sobre o TdR e MC e sugestão de desmembramento em duas licitações SBQC e Shopping.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 10: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.

Subprojeto 12: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Tereza Farias e Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 540.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 225.006,01
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2014 – Junho 2015
- **Estágio Previsto:** Abertura Pública da Proposta Financeira
- **Estágio Atual:** Após reunião do dia 05/12/14 com UGP, será providenciado a REPUBLICAÇÃO da MI, devido a não formação de 6 empresas para lista curta de mesma natureza jurídica.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 11: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.

Subprojeto 13 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Tereza Farias e Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 224.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 221.437,94
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2014 - Janeiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** Solicitado através de email em 10/12/14 alteração de data de início do projeto no P.A para FEVEREIRO/2015.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 12: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.

Subprojeto 14: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".

- **Responsável:** Tereza Farias e Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.345.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 1.344.963,40
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** TdR sendo discutido com o Especialista Gunars, tendo vista a realização em 34 municípios já contemplados pelo projeto da SCIDADES. Reunião marcada para o dia 12/12/14 com SEUMA para discussões sobre o lixão do Jangurussu.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** REVISÃO PRÉVIA

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 13: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

Subprojeto 15: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Tereza Farias e Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 2.242.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 1.120.935,31
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TDR
- **Estágio Atual:** Solicitado através de email em 10/12/14 alteração de data de início do projeto no P.A para FEVEREIRO/2015.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 13: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

Subprojeto 16: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver **plano de comunicação** para implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Tereza Farias e Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 2.242.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 661.746,51
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** Solicitado através de email em 10/12/14 alteração de data de início do projeto no P.A para MARÇO/2015
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 13: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

Subprojeto 17: Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas (**Equipamentos**)

- **Responsável:** Tereza Farias e Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Serviço de Não Consultoria
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 2.242.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 459.318,18
- **Método de Aquisição:** NCB
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Junho 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** TdR analisado pelo BM e enviado para setorial para providenciar adequações em 30/07/2014 .
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



PROGRAMAS

Programas – Qualidade da Água

Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- **Setoriais envolvidas:** CONPAM
- **PPA Iniciativa:** 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.
- **Ação:** 14190 - Elaboração dos Planos de Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 15,12
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 00,00
- **Realizado até 30/11/14:** R\$ 00,00
- **Periodicidade:** Frequência da execução quadrimestral
- **Farol:** 



PLANO DE AÇÃO

Plano de Ação

2º Ação: Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água.

Responsável: CONPAM, SEMACE, COGERH, CAGECE

Coordenação: CONPAM,

Período: Até o fim do segundo ano

Indicador: Campanha de comunicação estabelecida e sob execução.

Plano de Ação

| Plano de Ação – PforR- Campanha de Comunicação sobre a Qualidade da Água. | |
|--|---|
| Encaminhamentos | Posição em Novembro |
| O Conpam e a Cagece estão em articulação com a Casa Civil para a elaboração do Plano de Comunicação. | As discussões sobre o processo de contratação da empresa que irá elaborar o Plano foram temporariamente suspensas e têm previsão de serem retomadas em janeiro de 2015. |



SEMACE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 36: *Fortalecimento da gestão ambiental estadual*

Subprojeto 54: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a **manualização dos Procedimentos Técnicos** dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.

- **Responsável:** Maurício Giffoni
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.054.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 285.232,19
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2014 – Outubro 2015
- **Estágio Previsto:** Envio da SDP a Lista Curta
- **Estágio Atual:** Enviado a Setorial SDP e MC revisados pela UGP em 02/12/14 para ajustes.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 36: *Fortalecimento da gestão ambiental estadual*

Subprojeto 53: Contratação de Consultoria especializada que irá ministrar **Cursos de Capacitação** para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente

- **Responsável:** Maurício Giffoni
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.054.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** Termo sendo discutido com a equipe interna da Setorial.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



PROGRAMAS

Programas – Qualidade da Água

Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- **Setoriais envolvidas:** SEMACE
- **PPA Iniciativa:** 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.
- **Ação I:** 19861 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 1,70 (*)
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 0,40
- **Realizado até 30/11/14:** R\$ 0,98
- **Realizado/Previsto (%):** 270%
- **Periodicidade:** Frequência da execução quadrimestral
- **Farol:** ██████████

(*) o valor da iniciativa 04815 passou de R\$ 14,59 milhões para R\$ 1,70 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da SEMACE

Programas – Qualidade da Água

Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- **Setoriais envolvidas:** SEMACE
- **PPA Iniciativa:** 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.
- **Ação I:** 21570 - Monitoramento da Poluição / Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado.
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 1,70 (*)
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 0,40
- **Realizado até 30/11/14:** R\$ 00,00
- **Realizado/Previsto (%):** 0%
- **Periodicidade:** Frequência da execução quadrimestral
- **Farol:** ██████████

(*) o valor da iniciativa 02466 passou de R\$ 13,89 milhões para R\$ 1,70 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da SEMACE

Programas – Qualidade da Água

Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- **Setoriais envolvidas:** SEMACE
- **PPA Iniciativa:** 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.
- **Ação I:** 21317 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 26,44 (*)
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 6,95
- **Realizado até 30/11/14:** R\$ 1,05
- **Realizado/Previsto (%):** 17%
- **Periodicidade:** Frequência da execução quadrimestral
- **Farol:**

(*) o valor da iniciativa 05170 passou de R\$ 20,62 milhões para R\$ 26,44 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da SEMACE

Programas – Qualidade da Água

Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- **Setoriais envolvidas:** SEMACE
- **PPA Iniciativa:** 05155 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação das praias do litoral cearense.
- **Ação I:** 21571 - Monitoramento da Poluição / Contaminação das Praias do Litoral Cearense
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 0,70 (*)
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 0,15
- **Realizado até 30/11/14:** R\$ 0,00
- **Realizado/Previsto (%):** 0%
- **Periodicidade:** Frequência da execução quadrimestral
- **Farol:** XXXXXXXXXX

(*) o valor da iniciativa 05155 passou de R\$ 13,39 milhões para R\$ 0,70 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da SEMACE



PGE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 21 : Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.

Subprojeto 28: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Valéria Rodrigues
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 525.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 524.818,44
- **Método de Aquisição:** NCB
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração das Especificações Técnicas
- **Estágio Atual:** Recebido da Setorial em 16/12/14 o TdR e exposição de motivos para análise da UGP e posterior envio ao BM.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ████████████████████



ARCE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 1: *Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.*

Subprojeto 1: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.

- **Responsável:** Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 400.000,00
- **Valor TOR:** US\$ 391.546,55
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Abril 2014 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Envio da SDP para lista curta
- **Estágio Atual:** Edital de SDP encaminhado a lista curta em 02/12/14 com data limite de recebimento das propostas até o dia 20/01/2015.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████



SECITECE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 22: Definir e estabelecer um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas de apoio à inovação.

Subprojeto 29: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para Estabelecer um Sistema de Monitoramento e Avaliação para Coletar dados e Informações Relacionadas com Programas e Iniciativas de Apoio a Inovação.

- **Responsável:** Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 450.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 353.140,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** Aguardando contratação de Consultoria Individual em inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 23: Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

Subprojeto 30: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto :** US\$ 200.000,00
- **Valor TOR:** US\$ 212.900,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** Aguardando contratação de Consultoria Individual em inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 24: Avaliação do desempenho e impacto de REDENIT-CE no que diz respeito à sua missão de gestão da inovação e propriedade intelectual e apoiar a transferência de tecnologias para o mercado.

Subprojeto 31: Termo de Referência para Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para Avaliação de Desempenho e Impacto da REDENIT no que diz respeito à sua Missão de Gestão da Inovação e Propriedade Intelectual e Apoio à Transferência de Tecnologias para o Mercado.

- **Responsável:** Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 225.000,00
- **Valor do Termo:** US\$ 246.340,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** Aguardando contratação de Consultoria Individual em Inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 25: *Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.*

Subprojeto 32: Contratação de Consultoria de Empresa para elaborar estudo para avaliar um Parque Tecnológico.

- **Responsável:** Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 75.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Setembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** : Aguardando contratação de Consultoria Individual em Inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 26: Assistência na elaboração de uma avaliação de impacto para o projeto Tecnova (FINEP / SECITECE).

Subprojeto 33: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para assistência na elaboração de uma Avaliação de Impacto para o Projeto Tecnova (FINEP/SECITECE).

- **Responsável:** Edgar Monte Mariano Neto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 50.000,00
- **Valor do Processo:** US\$ 36.440,00
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** Aguardando contratação de Consultoria Individual em Inovação para auxiliar a conclusão do TOR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ████████████████████

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 27: *Suporte Técnico Especializado em Inovação Sênior*

Subprojeto 34: Suporte Técnico Especializado em Inovação Sênior- Pessoa Física, visando apoiar a COTEC/SECITECE na elaboração dos Termos de Referência que orientem os processos de contratação, execução e monitoramento de cada uma das Consultorias previstas no Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará, até sua total implantação.

- **Responsável:** Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 170. 612,66
- **Valor do TOR:** US\$ 170.612,66
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Novembro 2016
- **Estágio Previsto:** Não Objeção do Banco do RAC
- **Estágio Atual:** Encaminhados os currículos para Setorial em 12/12/14 para análise e elaboração do RAC.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**



FUNCEME



INDICADOR PRIMÁRIO

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador Primário: Implementação do Monitoramento participativo da Qualidade da Água

Responsável - Hoilton Rios

- **Meta 2015:**

1º semestre – Metodologia de monitoramento definida e adotada

2º semestre – Protocolo de coleta de dados definido e adotado

- **Posição em 30/11:**

- **Posição em 30/11 em relação à meta:**

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 14: *Metodologia de modelagem de qualidade da água.*

Subprojeto 18: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.

- **Responsável:** Francisco Hoilton
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 630.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 591.313,55
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Abertura Pública das Propostas.
- **Estágio Atual:** Enviado o Edital de SDP a lista curta em 10/12/2014 com data limite de recebimento das proposta até o dia 09/01/15.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**



PROGRAMAS

Programas – Qualidade da Água

Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ

- **Setoriais envolvidas:** FUNCEME
- **PPA Iniciativa:** 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.
- **Ação 1:** 13973 - Modernização e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.
- **Ação 2:** 21421 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de Informações Hidroagrometeorológicas.
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 15,93
- **Previsto para o Ano de 2014 em milhões:** R\$ 1,10
- **Realizado até 30/11/14 em milhões:** R\$ 1,32
- **Realizado/Previsto (%):** 131%
- **Periodicidade:** Frequência da execução quadrimestral
- **Farol:** 

Programas – Qualidade da Água

Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ

- **Setoriais envolvidas:** FUNCEME
- **PPA Iniciativa:** 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará. (2)
- **Ação 1:** 14037 - Mapeamento Hidroambiental do Ceará
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 0,60
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 0,09
- **Realizado até 30/11/14:** R\$ 00,00
- **Realizado/Previsto (%):** 0%
- **Periodicidade:** Frequência da execução Anual (previsão de execução de 100% do valor nos meses de novembro e dezembro.
- **Farol:** 



SEDUC



INDICADOR PRIMÁRIO

Indicadores – Capacitação Profissional

Indicador Primário: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.

Responsável - Andréa Rocha

- **Meta 2015:**

1º semestre – 10

2º semestre – 12

- **Posição em 30/11:**

- **Posição em 30/11 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Capacitação Profissional

Projeto 28: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.

Subprojeto 35: Termo de Referência para contratação de serviços de Consultoria para Avaliação do Desempenho Acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Andréa Rocha
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 250.000,00
- **Valor do TOR:** U\$ 491.128,15
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Outubro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Analisado o TdR e MC pela UGP em 10/1214 e enviados a Setorial para ajustes.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Capacitação Profissional

Projeto 29: Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos. Áreas a serem avaliadas, entre outras: gestão administrativa, gestão de recursos humanos, desenho de currículo, serviços de apoio aos estudantes.

Subprojeto 36: Contrato de Empresa para avaliar desempenho das escolas públicas profissionais de educação com recomendações de melhoria.

- **Responsável:** Andréa Rocha
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015– Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Capacitação Profissional

Projeto 30: Implantação de uma sistema de custos para a rede das escolas estaduais de Educação Profissional

Subprojeto 37: Contratação de empresa para implantação de uma sistema de curso para rede das escolas estaduais de Educação Profissional

- **Responsável:** Andréa Rocha
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 100.000,00
- **Método de Aquisição:** SOF/SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Capacitação Profissional

Projeto 31: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.

Subprojeto 38: Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da formação continuada para gestores, professores e instrutores de educação profissional secundárias

- **Responsável:** Andréa Rocha
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 100.000,00
- **Método de Aquisição:** SOF/SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Outubro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Capacitação Profissional

Projeto 32: Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.

Subprojeto 39: Contratação de empresa para apoiar na concepção de instrumentos/iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das escolas profissionais.

- **Responsável:** Andréa Rocha e Edilson Teixeira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 75.000,00
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Capacitação Profissional

Projeto 33: Avaliação de Impacto para um programa inovador para elevar qualidade dos professores do ensino médio das escolas

Subprojeto 40: Contratação de empresa para elaborar avaliação de impacto para um programa inovador para elevar qualidade dos professores do ensino médio das escolas.

- **Responsável:** Conceição Ávila
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 100.000,00
- **Método de Aquisição:** SOF/SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Redução da Pobreza

Projeto 34: *Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.*

Subprojeto 41- Contratação de Consultoria de Empresa para o Desenvolvimento das Ações de Formação para o núcleo gestor das creches e pré-escolas dos municípios e regionais de Fortaleza participantes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN – CURSO DE GESTÃO PARA DIRETORES.

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 250.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Janeiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Aguardando retorno da Setorial com o TdR revisado desde o dia 29/04/14
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Redução da Pobreza

Projeto 34: *Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.*

Subprojeto 42 - Contratação de Consultoria e Assessoria de Empresa de Treinamento para o Desenvolvimento das Ações de Formação ofertadas aos Diretores e Coordenadores Pedagógicos de Creches e Pré-Escolas dos Municípios e Regionais de Fortaleza através do Fortalecimento Institucional da Educação Infantil. – CURSO COACHING.

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 500.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Janeiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Aguardando retorno da Setorial com o TOR revisado desde o dia 30/05/14
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Redução da Pobreza

Projeto 35: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 44: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 19.971,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Fevereiro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Contrato
- **Estágio Atual:** Enviado em 15/12/14 ao BM para NO: Minuta do contrato, MC, Ata de negociação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Redução da Pobreza

Projeto 35: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 45: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 21.498,73
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Dezembro 2014
- **Estágio Previsto:** Início do Contrato
- **Estágio Atual:** Reunião marcada com o Consultor selecionado para o dia 17/12/14 para tratar sobre o Termo e Minuta do contrato.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Redução da Pobreza

Projeto 35: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 46: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em **Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil** e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 91.117,77
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Janeiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR e MC em fase de elaboração, sendo discutido o desmembramento para dois TdR, conforme orientação da PGE.



Assistência Técnica - Redução da Pobreza

Projeto 35: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 47: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de **Arte Gráfica/Design**, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 77.819,45
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração das especificações
- **Estágio Atual:** Em fase de elaboração das especificações técnicas
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica - Redução da Pobreza

Projeto 35: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 48: Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 1.000.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2015 – Janeiro 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Redução da Pobreza

Projeto 35: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 49: Realização de formação complementares para o PADIN

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 600.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2015 – Junho 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Redução da Pobreza

Projeto 35: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 50: Análise para compreensão investigativa das relações sociais que envolvam a estrutura familiar

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 132.289,48
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Março 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Redução da Pobreza

Projeto 35: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 51: Avaliação do Processo de Construção do PADIN

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 132.289,49
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Março 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica - Redução da Pobreza

Projeto 35: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 52: Aquisição de Materiais para Desenvolvimento das Ações do PADIN

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 400.000,00
- **Método de Aquisição:** NCB
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2015 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração das especificações
- **Estágio Atual:** Em fase de elaboração das especificações Técnicas
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



PROGRAMAS

Programas – Capacitação Profissional

Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

- **Setoriais envolvidas:** SEDUC
- **PPA Iniciativa:** 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional (1)
- **Ação I:** 28685 - Manutenção e Funcionamento das Unidades Escolares de Educação Profissional
- **Ação II:** 28686 - Garantia do funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 327,53
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 105,78
- **Realizado até 30/11/14:** R\$ 90,40
- **Realizado/Previsto(%):** 94%
- **Periodicidade:** Execução iniciando em Março 2014 - Frequência Bimestral;
- **Farol:**

Programas – Capacitação Profissional

Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

- **Setoriais envolvidas:** SEDUC
- **PPA Iniciativa:** 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- **Ação I:** 19475 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- **Ação II:** 19482 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 156,87
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 25,30
- **Realizado até 30/11/14:** R\$ 54,78
- **Realizado/Previsto (%):** 238%
- **Periodicidade:** Execução iniciando em Março 2014 - Frequência Bimestral;
- **Farol:** 

Programas – Capacitação Profissional

Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

- **Setoriais envolvidas:** SEDUC
- **PPA Iniciativa:** 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio.
- **Ação I:** 19483 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 126,28
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 1,70
- **Realizado até 30/11/14:** R\$ 20,54
- **Realizado/Previsto (%):** 1329%
- **Periodicidade:** Frequência da execução quadrimestral
- **Farol:** 



PLANO DE AÇÃO

Plano de Ação

Risco 1: Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

2º Ação: Inclusão de um módulo de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas de ensino) no programa de treinamento de professores dos cursos de capacitação profissional.

Responsável: SEDUC e Gabinete do Governador

Coordenação: SEDUC

Período: Durante o primeiro ano

Indicador: Módulo desenvolvido em colaboração com a FUNAI, Associações Quilombolas e Coordenadoria para a Igualdade Racial.

Plano de Ação

| Plano de Ação – PforR - Inclusão de um módulo de treinamento | |
|---|---|
| Encaminhamentos | Posição em Novembro |
| <p>A SEDUC, o GabGov e a equipe da Coordenadoria da Diversidade (SEDUC), entraram em contato com a FUNAI, e também com SECADI, do Ministério da Educação, a fim de identificar material já existente ou firmar parceria para o cumprimento da meta estabelecida. Entretanto, nenhuma das instituições dispunham de material ou de pessoas disponíveis para essa ação.</p> | <p>A meta da SEDUC foi considerada cumprida pelo Especialista Alberto Costa na reunião do dia 31/10/14 e a SEDUC enviou no dia 27/11 a metodologia utilizada na formação dos professores.</p> |

Plano de Ação

Risco 2: A localização exata dos trabalhos de construção civil (i.e., 8 Centros de Formação Profissional) não é conhecida. Três riscos sociais foram identificados em relação ao atual sistema de aquisição de áreas pelo Estado: (i) as pessoas sem título legal de propriedade não são compensadas, nem recebem assistência em caso de impactos negativos; (ii) atividades para recuperação dos modos de vida não são implementadas para as famílias afetadas; e (iii) embora haja algumas terras indígenas e territórios quilombolas demarcados no estado, há um certo número de reivindicações territoriais em processo. Também foram identificadas lacunas no processo de licenciamento – em termos de compartilhamento de informações entre a instituição responsável por licenciar os empreendimentos e a FUNAI e o INCRA.

1º Ação: . Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).

Responsável: PGE e SEDUC

Coordenação: SEDUC

Período: Durante o primeiro ano

Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.

Plano de Ação

| Plano de Ação – PforR - . Varredura fundiária | |
|---|--|
| Encaminhamentos | Posição em Novembro |
| Consulta Prévia a SEMACE das 22 EEEP: Incluso no edital da licitação as despesas e a responsabilidade da Regularização de Licença de Instalação Ambiental – REGLI. Responsabilidade da empresa. | Responsabilidade da empresa. E a SEDUC irá monitorar através dos contratos. (Cronograma: Prazo junho 2015) |

Plano de Ação

2º Ação: Exclusão das áreas em que a execução das obras civis venha a requerer o reassentamento involuntário ou a relocação de famílias (com ou sem título de propriedade)

Responsável: PGE e SEDUC

Coordenação: SEDUC

Período: Durante o primeiro ano

Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.

Plano de Ação

| Plano de Ação – PforR - Varredura fundiária | |
|--|---|
| Encaminhamentos | Posição em Novembro |
| Varredura Fundiária: Equipe UGP/SEDUC articulando com as CREDE a regularização dos terrenos. | Das 22 obras de EEEP, 12 Obras já estão com documentação do terreno, certidões dos imóveis. (Cronograma: Dezembro 2014) |



SEPLAG



INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicadores – Gestão por Resultado

Indicador Primário: Número de secretarias do Mutuário usando o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos.

Responsável: Avilton Júnior

- **Meta 2014:**

2º semestre - Aprovação de modelo para o alinhamento dos incentivos

- **Meta 2015:**

1º semestre – 1

2º semestre – 2

Posição em 30/11: Essa meta só será alcançada no final do primeiro semestre de 2015, pois a mesma é dependente de uma série de importantes atividades do projeto de AT. A SDP está em análise na UGP PforR desde 15/12/14.

- **Posição em 30/11 em relação à meta:** ██████████
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade baixa de atingir a meta
- **Justificativa:** Este Indicador depende da contratação de Consultoria de Empresa.

Indicadores – Gestão por Resultado

Indicador Primário: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparados com a metodologia aprovada.

Responsável: Aduino Oliveira

- **Meta 2014:**

2º semestre - Aprovação da metodologia

- **Meta 2015:**

Sem metas para o ano de 2015

- **Posição em 30/11:** Esse Indicador não será cumprido este ano, pois está vinculado à contratação de consultoria. O projeto está na PGE para lançamento da SDP.
- **Posição em 30/11 em relação à meta:** ██████████
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade baixa de atingir a meta
- **Justificativa:** Este Indicador depende da contratação de Consultoria de Empresa.

Indicadores – Assistência à Família

Indicador Primário: Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.

Responsável: Lara Costa

- **Meta 2015:**

1º semestre – 22.5%

2º semestre – 45%

- **Posição em 30/11:**

- **Posição em 30/11 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

- **Justificativa:**



INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicadores – Assistência à Família

Indicador Secundário: Criação e funcionamento de Comitê Consultivo ECD multissetorial (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE).

Responsável - Lara Costa

- **Meta 2014:**

2º semestre - Duas resoluções publicadas

- **Meta 2015:**

2º semestre – Outras duas Resoluções Publicadas

- **Posição em 30/11:** A Resolução será aprovada no II Seminário de Integração das Políticas de Desenvolvimento Infantil do Estado do Ceará que ocorrerá no dia 17/12/14, em seguida será providenciada a publicação.
- **Posição em 30/11 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta
- **Justificativa:** O Comitê tem uma Resolução aprovada e elaborou um Plano de Ação que resultará na segunda resolução

Indicadores – Capacitação Profissional

Indicador Secundário: Análise e melhoria dos mecanismos de governança da política de desenvolvimento do setor produtivo (incluindo Capacitação Profissional)

Responsável – Avilton Júnior

- **Meta 2015:**

2º semestre - Plano de Ação Publicado

- **Posição em 30/11:**

- **Posição em 30/11 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

- **Justificativa:**



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 37: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.

Subprojeto 55: Desenvolvimento de Metodologia para **previsão de receitas** tributárias e Outras Receitas Correntes.

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro/ 2014 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 37: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.

Subprojeto 56: Metodologias para a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará – *Matriz Insumo Produto*

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima/ Nicolino Trompieri (IPECE)
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 212.512,75
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 37: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.

Subprojeto 57: Metodologias para a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará – Indicadores Antecedentes e Coincidentes

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima/ Nicolino Trompieri (IPECE)
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 87.487,25
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Setembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 37: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.

*Subprojeto 58: Desenvolvimento de **Metodologia** para elaboração e execução do Orçamento Estadual*

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 300.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2015 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 38: *Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.*

Subprojeto 59: Contratação de empresa para desenvolver a metodologia para custeio de programas e projetos.

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto :** US\$ 800.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 39: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

Subprojeto 60: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Aduino Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.300.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 400.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Setembro 2015
- **Estágio Previsto:** Abertura Pública das Propostas
- **Estágio Atual:** Processo nº 7124883/2014 encaminhado a CEL04 em 27/12/14. CEL04 providenciando o edital de SDP para assinatura da Setorial.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 39: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

Subprojeto 61: Construção de um modelo de equilíbrio geral computável para economia cearense voltado à avaliação de impacto dos investimentos públicos estaduais.

- **Responsável:** Aduino Oliveira e Witalo Paiva (Ipece)
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.300.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 150.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Setembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 39: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

Subprojeto 62: Implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

- **Responsável:** Aduino Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.300.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 500.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 39: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

Subprojeto 63: Capacitação e viagens técnicas para a equipe da SEPLAG

- **Responsável:** Aduino Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.300.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 250.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 40: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.

Subprojeto 64: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará(1ª Etapa).

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 839.830,96
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Abertura Pública das Propostas
- **Estágio Atual:** Enviado ao BM para NO em 17/12/14: SDP, RFLC e MC.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 40: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersectorial.

Subprojeto 65: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial (2ª Etapa)

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 500.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2016 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 41: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.

Subprojeto 66: Fortalecer a participação cidadã no planejamento, monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Dominique Gomes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 446.073,87
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Envio da SDP para Lista Curta
- **Estágio Atual:** Recebido da Setorial em 17/12/14 email solicitando consulta junto ao BM sobre mudança do método de seleção de SBQC para SBQ. Enviado a Setorial o modelo de SDP.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 41: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.

Subprojeto 67: Desenvolvimento de Ferramentas de Suporte à aplicação do modelo de Gestão Participativa.

- **Responsável:** Dominique Gomes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 1.535.926,13
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2015 – Janeiro 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 42: Avaliação da Estrutura de Governança para os programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo.

Subprojeto 68: Contratação de Consultor Individual para avaliar a estrutura de governança dos programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo.

- **Responsável:** Avilton Júnior (SEPLAG)/ Witalo Paiva (IPECE)
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Junho 2015
- **Estágio Previsto:** Elaborando Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 43: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.

Subprojeto 69 - Termo de Referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada para elaborar o projeto de **Aprimoramento do Modelo de Administração e Gestão de Pessoas** do Governo do Estado do Ceará

- **Responsável:** Cláudia Teixeira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 4.400.00,00
- **Valor do TOR:** 3.310.133,28
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Novembro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Recebido do BM Sugestão pra o TdR em 07/11/14 e enviado a Setorial para providências.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 43: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.

Subprojeto 70 - Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para **Auditar a Folha de Pagamento** do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Fábio Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 4.400.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 1.089.866,72
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Maio 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Recebido da Setorial o TdR e MC em 15/12/14 para análise da UGP e posterior envio ao BM para NO.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 44: *Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).*

Subprojeto 71: Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado - GCOMPRAS

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.000.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 45: *Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.*

Subprojeto 72: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 196.914,15
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Recebido do BM o documento de "NO" em 08/12/14 e enviado a Setorial para providências.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



IPECE



INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicadores – Capacitação Profissional

Indicador Secundário: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).

Responsável: Victor Hugo

▪ **Meta 2014:**

2º semestre - 27,8

▪ **Meta 2015:**

2º semestre – 29.000

▪ **Posição em 30/11:** 25.403

▪ **Posição em 30/11 em relação à meta:** 

▪ **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade baixa de atingir a meta

▪ **Justificativa:** A RAIS informou que o número de trabalhadores de nível técnico formalmente empregados no mercado de trabalho cearense é de 25.403 em 2013.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Projeto 15: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

Subprojeto 19 e 20: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 500.000,00
- **Valor do Projeto:** US\$ 296.225,77
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Abril 2014 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Contratação
- **Estágio Atual:** Contrato em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial
- **Realizado até 30/11/14:** R\$ 58.080,00
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Projeto 15: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

Subprojeto 21: Ampliação e aquisição de mobiliário para o ambiente da unidade de gerenciamento do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – *PforR*.

- **Responsável:** Deusimar Lira
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor:** US\$ 500.000,00
- **Valor do Projeto:** US\$ 50.000,00
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2016 – Janeiro 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração das especificações técnicas
- **Estágio Atual:** Projeto adiado para 2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Projeto 15: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

Subprojeto 22: Aquisições de Equipamentos para Unidade de Gerenciamento do PforR.

- **Responsável:** Deusimar Lira
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor:** US\$ 500.000,00
- **Valor do Projeto:** US\$ 195.000,00
- **Método de Aquisição:** NCB
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2016 – Janeiro 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração das especificações técnicas
- **Estágio Atual:** Em fase de elaboração das especificações
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Projeto 16: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE -Sistema Informatizado de Monitoramento.

Subprojeto 23: Contratação de empresa para desenvolver sistema de monitoramento da UGP/PforR

- **Responsável:** Mário Aragão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 500.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Janeiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Em fase de elaboração do termo.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 17: Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.

Subprojeto 24: Contratação de Serviço Técnico de Consultoria de Empresa Especializada para a definição e estabelecimento de um Sistema de Inserção e Monitoramento de Egressos da Educação Profissional no Mercado de Trabalho.

- **Responsável:** Victor Hugo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 700.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 650.914,86
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Envio da SDP a Lista Curta
- **Estágio Atual:** MI nº 2014002/IPECE/CEL04 REPUBLICADA em 12/12/14 com data limite de recebimento dos Portfólios até o dia 06/01/2015.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 18: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.

Subprojeto 25: Contratação de Consultor Individual para realizar avaliação de impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.

- **Responsável:** Victor Hugo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 300.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2015 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Em fase de elaboração do termo.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 19: *Elaborar mapeamento dos programas e entidades envolvidas na educação profissional, capacitação e treinamento técnico e tecnológico, para identificar complementaridades e áreas de possível sobreposição de esforços.*

Subprojeto 26: Termo de Referência para contratação de Serviço Técnico de consultoria de Empresa Especializada para a Elaboração de um Diagnóstico e estabelecimento de Diretrizes para a Política de Educação Profissional no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Victor Hugo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 75.000,00
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração de Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Em discussão com as Setoriais envolvidas e o Banco Mundial a elaboração do Termo.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica – Redução da Pobreza

Projeto 20: Criação do Sistema de Monitoramento e Avaliação (M&A) dos projetos financiados pelo FECOP.

Subprojeto 27: Contratação de Empresa pra desenvolver sistema de monitoramento e avaliação dos projetos financiados pelo FECOP.

- **Responsável:** Jimmy Oliveira e Mário Aragão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 800.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** A parte técnica do TR está feita, faltando apenas a concepção do Sistema.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



SRH



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 46: Planejamento Estratégico do Sistema de Recursos Hídricos com Restruturação de Recursos Humanos.

Subprojeto 73: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica para Solução Integrada de Reestruturação Organizacional e Mapeamento de Perfil de Competências para a Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH

- **Responsável:** Denilson Fidelis
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 370.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Recebido da Setorial em 12/12/14 o TdR para análise da UGP. Solicitado a Setorial em 15/12/14 a MC para análise.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 47: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos.

Subprojeto 74: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Qualiquantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

- **Responsável:** João Lúcio Faria (COGERH)
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 670.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 668.936,95
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Preparação e envio da SDP a Lista Curta
- **Estágio Atual:** Recebido do BM a "NO" em 08/12/14 e enviado a Setorial para providências.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 48: *Enquadramento dos açudes das bacias estratégicas.*

Subprojeto 75: Termos de Referência para Contratação de Consultoria para a Execução do “Projeto de Desenvolvimento e Implantação do Enquadramento dos Açudes Pacoti, Riachão e Gavião”.

- **Responsável:** Adahil Sena (COGERH)
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 670.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TOR na setorial em fase de ajuste, para incorporação de sugestões da UGP desde 02/09/14 e MC.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 49: Diagnóstico do Plano de Segurança Hídrica

Subprojeto 76: Elaboração do Diagnóstico do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas

- **Responsável:** Adahil Sena(Cogerh)
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 629.728,24
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Enviado o TdR revisado pela UGP em 16/12/14 a Setorial para adequações. Marcada reunião para o dia 17/12/14 para discutir o TdR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



PROGRAMAS

Programas – Qualidade da Água

Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

- **Setoriais envolvidas:** SRH
- **PPA Iniciativa:** 05310 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.
- **Ação I:** 15690 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 6,50 (*)
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 1,20
- **Realizado até 30/11/14:** R\$ 0,00
- **Realizado/Previsto (%):** R\$ 0,00
- **Periodicidade:** Mensal
- **Farol:** ██████████

(*) Parte dos valores das iniciativas 5310 e 5311 foram remanejados para 5273; o valor da iniciativa 5310 passou de R\$ 19,60 milhões para R\$ 6,50 milhões, a diferença de R\$ 13,10 milhões foi realocada para iniciativa 5273, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da COGERH

Programas – Qualidade da Água

Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

- **Setoriais envolvidas:** SRH
- **PPA Iniciativa:** 05311 - Implantação do Plano de Segurança Hídrica para as Bacias Hidrográficas Metropolitanas.
- **Ação I:** 15777 - Elaboração de Estudos para enquadramento dos Açudes das Bacias Estratégicas
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 2,43 (*)
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 0,00
- **Realizado até 30/11/14:** R\$ 0,00
- **Realizado/Previsto (%):** 0,00%
- **Periodicidade:** Execução iniciando em 2015 - Frequência mensal
- **Farol:** ██████████

(*) Parte dos valores das iniciativas 5310 e 5311 foram remanejados para 5273; o valor da iniciativa 5311 passou de R\$ 14,04 milhões para R\$ 2,43 milhões, a diferença de valor de R\$ 11,61 milhões foi realocada para iniciativa 5273, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da COGERH

Programas – Qualidade da Água

Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

- **Setoriais envolvidas:** SRH
- **PPA Iniciativa:** 05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.
- **Ação I:** 14926 - Aquisição, Instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade)
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 43,58 (*)
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 1,81
- **Realizado até 30/11/14:** R\$ 0,46
- **Realizado/Previsto (%):** 28%
- **Periodicidade:** Mensal
- **Farol:** ██████████

(*) Parte dos valores das iniciativas 5310 e 5311 foram remanejados para 5273; o valor da iniciativa 5273 passou de R\$ 18,84 milhões para R\$ 43,58 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da COGERH



COGERH



INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador Secundário: Apresentação de Planos de Segurança Hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.

Responsável: Adahil Sena

- **Meta 2014:**

2º semestre - Termos de referência elaborados

- **Meta 2015:**

2º semestre - Planos preparados

- **Posição em 30/11:** Os Termos de referência foram enviados em 12/12/14 e encontram-se em análise na UGP para posterior envio ao Banco Mundial.
- **Posição em 30/11 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade intermediária de atingir a meta
- **Justificativa:** Os Termos de referência foram enviados em 12/12/14, analisados pela UGP e encontram-se em análise na setorial para posterior envio ao Banco Mundial.

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de proteção de bacias hidrográficas.

Responsável: Adahil Sena

- **Meta 2014:**

2º semestre - Proposta e consultas completos

- **Meta 2015:**

2º semestre – Projetos de Lei apresentados

- **Posição em 30/11:** A Proposta da Lei foi enviada à UGP e a reunião para realizar as consultas será agendada pela COGERH ainda este mês de dezembro.
- **Posição em 30/11 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade intermediária de atingir a meta
- **Justificativa:** A Proposta da Lei foi enviada à UGP e a reunião para realizar as consultas junto ao Comitê das Bacias foi realizada no dia 17/12/14 e a ata será encaminhada, se possível até sexta-feira (19/12/14).

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador Secundário: Índice da Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza (IQA).

Responsável: Fábio Lima

- **Envolvidos:** SRH e COGERH

- **Meta 2014:**

2º semestre - 62.7

- **Meta 2015:**

2º semestre – 64.3

- **Posição em 30/11:** 77,6

- **Posição em 30/11 em relação à meta:**

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

- **Justificativa:** Esse resultado corresponde à medição do mês de novembro.



PLANO DE AÇÃO

Plano de Ação

Risco 3: Planos de Gestão e Segurança Hídrica podem levar a algumas restrições adicionais no uso dos recursos naturais. Apesar de existirem mecanismos legais de proteção (Código Florestal), registraram-se limitações na capacidade institucional para assegurar seu cumprimento que requerem que atenção adicional seja dada para se desenvolverem soluções alternativas para as comunidades afetadas.

1º Ação: Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água

Responsável: COGERH, CONPAM, SRH (em consulta junto à FUNAI)

Coordenação: COGERH

Período: Até o fim do segundo ano

Indicador: Os planos de segurança hídrica para as três microbacias estratégicas incluem medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (definidas em consulta junto às comunidades afetadas – inclusive os povos indígenas). Documentar de maneira efetiva o apoio da comunidade indígena à sua elaboração.

Plano de Ação

| Plano de Ação – PforR - Desenvolvimento de um marco de compensação | |
|---|--|
| Encaminhamentos | Posição em Setembro |
| Verificar se os Termos de Referência já incluem diretrizes relativas à provisão de “medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais. Em seguida realizar consultas com as comunidades indígenas para obter seu amplo apoio aos Planos que sejam elaborados. | Os Termos de Referência que irão iniciar o processo de licitação para contratação de consultoria que irá elaborar o Plano foram elaborados e estão em fase de análise. |



TCE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 51: *Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)*

Subprojeto 82: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 1.000.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 149.096,50
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Início do processo
- **Estágio Atual:** Encerrado o prazo de recebimento dos currículos em 10/12/14. Encontra-se em análise para posterior elaboração do RFLC.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 51: *Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)*

Subprojeto 83: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 1.000.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 149.096,50
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Encerrado o prazo de recebimento dos currículos em 10/12/14. Encontra-se em análise para posterior elaboração do RFLC.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 51: *Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)*

Subprojeto 81: Reformulação do Processo eletrônico do TCE

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.000.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 700.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Recebido a NO do TOR e MC em 22/09/14. Aguardando a contratação da empresa para providenciar as publicações.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



Sumário do Desempenho

Legendas

Indicadores:



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

Assistência Técnica:



Realização do projeto dentro do Plano de Licitações



Realização do projeto com atraso de um dia



Realização projeto com atraso de mais de 3 meses

Programas:



Execução do previsto orçado no período, conforme critérios acordados com Setorial



Execução de menos do previsto orçado no período, conforme critérios acordados



Nenhuma Execução



Sumário da Posição da Execução Orçamentária dos Programas do Escopo do *PforR*

Posição dos Programas

| Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Novembro 2014 | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|------------------------|-------|--------|-------------------------|-------------------------------|--------|---------|---|
| Setorial | Programa | Iniciativa | Previsão (R\$ milhões) | | | Realizado 30/11/2014 | Realizado/ Previsto (%) | Farol | | |
| | | | Projeto | 2014 | nov/14 | | | | | |
| 1 | SEDUC | 014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional | 1 | 00328 | 327,53 | 105,78 | 96,16 | 90,40 | 94% | |
| | | | 2 | 00771 | 156,87 | 25,30 | 23,00 | 54,78 | 238% | |
| | | | 3 | 00834 | 126,28 | 1,70 | 1,55 | 20,54 | 1329% | |
| 2 | STDS | 050 - Assistência Social ¹ | 4 | 03180 | 34,57 | 7,30 | 6,64 | 6,65 | 100% | |
| 3 | SRH / COGERH | 041 - Gestão dos Recursos Hídricos ² | 5 | 05310 | 6,50 | 1,20 | 1,09 | 0,00 | 0% | |
| | | | 6 | 05311 | 2,43 | 0,00 | - | - | - | - |
| | | | 7 | 05273 | 43,58 | 1,81 | 1,65 | 0,46 | 28% | |
| 4 | CIDADES/ CAGECE | 032 - Saneamento Ambiental ³ | 8 | 0392 | 15,83 | 5,65 | 5,14 | 0,00 | 0% | |
| 5 | CONPAM | 082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais ⁴ | 9 | 03104 | 15,12 | 0,00 | - | - | - | - |
| | SEMACE | | 10 | 04815 | 1,70 | 0,40 | 0,36 | 0,98 | 270% | |
| | SEMACE | | 11 | 02466 | 1,70 | 0,40 | 0,36 | 0,00 | 0% | |
| | SEMACE | | 12 | 05170 | 26,44 | 6,95 | 6,32 | 1,05 | 17% | |
| | SEMACE | | 13 | 05155 | 0,70 | 0,15 | 0,14 | 0,00 | 0% | |
| 6 | FUCEME | 079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará | 14 | 02846 | 15,93 | 1,10 | 1,00 | 1,32 | 131% | |
| | FUCEME | | 15 | 02847 | 0,60 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0% | |
| Total | | | | | 775,78 | 157,83 | 143,49 | 176,18 | 122,78% | |

1. O programa 050 - Assistência Social da STDS passa de R\$ 28,99 milhões para R\$ 34,57 milhões, conforme explicações na Nota Técnica 01/2014 da STDS

2. O programa 041 – Gestão dos Recursos Hídricos da SRH/COGERH parte dos valores das iniciativas 5310 e 5311 foram remanejados para 5273 ; os valores da iniciativa 5310 passaram de R\$ 19,60 milhões para R\$ 6,50 milhões, a diferença de R\$ 13,10 milhões foi realocada para iniciativa 5273, os valores da iniciativa 5311 passaram de R\$ 14,04 milhões para R\$ 2,43 milhões, a diferença de valor de R\$ 11,61 milhões foi realocada para iniciativa 5273, os valores da iniciativa 5273 passaram de R\$ 18,84 milhões para R\$ 43,58 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da COGERH

3. A iniciativa da CAGECE 02617 mudou para iniciativa 0392 de acordo com a Nota Técnica 02/2014.

4. O programa 082 – Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais do CONPAM/SEMACE passa de R\$ 77,61 milhões para R\$ 45,66 milhões sendo: os valores da iniciativa 04815 passaram de R\$ 14,59 milhões para R\$ 1,70 milhões; os valores da iniciativa 02466 passaram de R\$ 13,89 milhões para R\$ 1,70 milhões; os valores da iniciativa 05170 passaram de R\$ 20,62 milhões para R\$ 26,44 milhões e; os valores da iniciativa 05155 passaram de R\$ 13,39 milhões para R\$ 0,70 milhões, conforme explicações da Nota Técnica 01/2014 da SEMACE

As Notas Técnicas (SEMACE/CAGECE/COGERH/STDS) foram aprovadas pelo B. M. no dia 22/09/2014

Posição dos Programas

✓ **Lembrete:** Regras Programas

A execução dos programas deve observar as seguintes restrições:

- Devem excluir despesas que são financiadas pelo próprio BIRD ou por outras operações de crédito, ou seja, não é permitido a alocação de recursos do BIRD ou outras operações de crédito para custear despesas dos programas e iniciativas do componente
- Verificar a lista negra do BIRD a cada licitação, antes de assinar contrato. Para atender o Art. 42 da Lei 8.666/93 a SEPLAG incluiu no orçamento de cada ação um valor na fonte 69;
- Não podem apresentar impacto sócio ambiental negativo;
- Os valores dos contratos não podem exceder os limites abaixo:
 - Obras – inferior a US\$ 50 milhões
 - Bens – inferior a US\$ 30 milhões
 - Sistemas de TIC – inferior a US\$ 20 milhões
 - Consultorias – inferior a US\$ 15 milhões.



Sumário da Posição dos Indicadores com metas para o 2º Semestre de 2014

METAS: 2º Semestre 2014 – INDICADOR PRIMÁRIO

| Tema | Nº | Nome do Indicador | Setorial | Responsável | Meta | Status | Valor Desembolso US\$ Milhões |
|----------------------------|----|--|----------|-----------------------------|--|---|-------------------------------|
| Gestão Pública | 1 | Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos | SEPLAG | Avilton Júnior | Aprovação de modelo para o alinhamento dos incentivos. | Essa meta só será alcançada no final do primeiro semestre de 2015, pois a mesma é dependente de uma série de importantes atividades do projeto de AT. | 6,198 |
| | 2 | Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada | | Adauto Oliveira | Aprovação da metodologia | Esse Indicador não será cumprido esse ano, pois está vinculado à contratação de consultoria. O projeto está na PGE para lançamento da SDP. | 6,198 |
| Crescimento Econômico | 3 | Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação | CEDE | Marilda Rocha | Documento de estratégia finalizado | Documento Finalizado e Entregue | 6,198 |
| Sustentabilidade Ambiental | 4 | Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto | CAGECE | Carlos Rossas | 84.3% | 84,88% | 6,198 |
| | 5 | Índice de qualidade da fiscalização ambiental. | CONPAM | Tereza Farias Ulisses Rolim | 40% | 42,60% | 6,198 |
| TOTAL | | | | | | | 30,99 |

METAS: 2º Semestre 2014 – INDICADOR SECUNDÁRIO

| Tema/Foco | Nº | Nome do Indicador | Setorial | Responsável | Meta | Status |
|--|----|---|----------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| Crescimento Econômico (Capacitação Profissional) | 1 | Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico). | IPECE | Victor Hugo | 27,8 | 25.403 |
| Redução da Pobreza (Assistência à Família) | 2 | Criação e funcionamento do multisetorial do Comitê Consultivo ECD (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE) | SEPLAG | Lara Costa | Duas resoluções publicadas | O Comitê tem uma Resolução aprovada e elaborou um Plano de Ação que resultará na segunda resolução. A Resolução será aprovada no II Seminário de Integração das Políticas de Desenvolvimento Infantil do Estado do Ceará que ocorrerá no dia 17/12/14, em seguida será providenciada a publicação. |
| Sustentabilidade Ambiental (Qualidade da Água) | 3 | Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza. | COGERH | Fábio Lima/Sarah Freire/Disney | 62.7 | 75,1 |
| | 4 | Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas | | Adahil Sena | Termos de referência elaborados. | Os Termos de referência foram enviados em 12/12/14, analisados pela UGP e encontram-se em análise na setorial para posterior envio ao Banco Mundial. |
| | 5 | Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas. | | Adahil Sena | Proposta e consultas completas | A Proposta da Lei foi enviada à UGP e a reunião para realizar as consultas junto ao Comitê das Bacias foi realizada no dia 17/12/14 e a ata será encaminhada, se possível até sexta-feira (19/12/14). |



Sumário dos Indicadores com metas para 2015

METAS 2015 – INDICADORES PRIMÁRIOS

| Tema | Nº | Nome do Indicador | Setorial | Responsável | Meta 1ºSemestre | Meta 2ºSemestre | Valor Desembolso US\$ Milhões |
|-----------------------|----|---|----------|-------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| Crescimento Econômico | 1 | Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação | CEDE | Marilda Rocha | Plano de Ação publicado. (Valor: US\$ 2,74 milhões) | - | 2,74 |
| | 2 | Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso. | SEDUC | Andrea | 10 (Valor: US\$ 2,74 milhões) | 12 (Valor: US\$ 3,40 milhões) | 6,14 |
| Redução da Pobreza | 3 | Porcentagem de famílias com crianças entre 0 e 5 anos no Cadastro Único em municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS. | STDS | Mary Anne Libório | - | 10.0% (Valor: US\$ 3,40 milhões) | 3,40 |
| | 4 | Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar. | STDS | Mary Anne Libório | 15% (Valor: US\$ 2,74 milhões) | 30% (Valor: US\$ 3,40 milhões) | 6,14 |
| | 5 | Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas. | SEPLAG | Lara Costa | 22.5% (Valor: US\$ 2,74 milhões) | 45% (Valor: US\$ 3,40 milhões) | 6,14 |
| SUB TOTAL | | | | | | | 24,56 |

METAS 2015 – INDICADORES PRIMÁRIOS

| Tema | Nº | Nome do Indicador | Setorial | Responsável | Meta 1ºSemestre | Meta 2ºSemestre | Valor Desembolso US\$ Milhões |
|----------------------------|----|--|----------|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Sustentabilidade Ambiental | 6 | Estabelecimento de Comitê Multisetorial de Segurança Hídrica. | CONPAM | Tereza Farias e Ulisses Rolim | Diagnóstico de Bacias Hidrográficas. (Valor: US\$ 2,74 milhões) | - | 2,74 |
| | 7 | Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto | CAGECE | Carlos Rossas | 84.6% (Valor: US\$ 2,74 milhões) | 84.9% (Valor: US\$ 3,40 milhões) | 6,14 |
| | 8 | Índice de qualidade da fiscalização ambiental. | CONPAM | Tereza Farias Ulisses Rolim | 50% (Valor: US\$ 2,74 milhões) | 60% (Valor: US\$ 3,40 milhões) | 6,14 |
| | 9 | Implementação do monitoramento participativo da Qualidade da Água. | FUNCEME | Hoilton Rios | Metodologia de monitoramento definida e adotada. (Valor: US\$ 2,74 milhões) | Protocolo de coleta de dados definido e adotado. (Valor: US\$ 3,40 milhões) | 6,14 |
| Gestão Pública | 10 | Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos | SEPLAG | Avilton Júnior | 1 (Valor: US\$ 2,74 milhões) | 2 (Valor: US\$ 3,40 milhões) | 6,14 |
| SUB TOTAL | | | | | | | 27,30 |
| TOTAL | | | | | | | 51,86 |

METAS 2015 – INDICADORES SECUNDÁRIOS

| TEMA | Nº | Indicador Secundário | Órgão | Responsáveis | Metas 1ª semestre 2015 | Metas 2ª semestre 2015 |
|----------------------------|----|---|--------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Crescimento Econômico | 1 | Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico). | IPECE | Victor Hugo | - | 29.000 |
| | 2 | Análise e melhoria dos mecanismos de governança da política de desenvolvimento do setor produtivo (incluindo Capacitação Profissional). | SEPLAG | Avilton Júnior | - | Plano de Ação Publicado. |
| Redução da Pobreza | 3 | Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE). | SEPLAG | Lara Maria Silva Costa | - | Outras duas Resoluções Publicadas |
| | 4 | Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada. | STDS | Mary Anne Libório | - | 10% |
| Sustentabilidade Ambiental | 5 | Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas. | COGERH | Adahil Sena | - | Planos Preparados |
| | 6 | Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas. | | Adahil Sena | - | Projetos de Lei apresentados |
| | 7 | Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza. | | Fábio Leite | - | 64.3 |
| | 8 | Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista. | CONPAM | Teresa Farias/ Ulisses | -- | Divulgação e Implementação |



Sumário da Posição dos Encaminhamentos do Plano de Ação

Plano de Ação

| Plano de Ação - PforR | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|------------------------|---|--|
| Descrição da Ação | Responsável | Período | Indicador | Coordenação | Encaminhamentos | Posição em Outubro |
| 1 A. Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar (incluindo a busca ativa de famílias vulneráveis) | SEDUC, STDS e Gabinete do Governador | Durante o primeiro ano | Aumento do número de crianças indígenas e quilombolas atendidas em creches ou recebem atenção domiciliar (proporcional às metas gerais do projeto). | STDS - Sebastião Lopes | a) Cruzar as informações da CEPIR com as da STDS sobre comunidades indígenas e quilombolas nos 36 municípios e concluir o levantamento. | As ações estão ocorrendo dentro no cronograma proposto pelas Setoriais e já enviado ao Alberto Costa em 18/11/14. Os próximos passos tem previsão para finalização em março de 2015. |
| | | | | | b) Realizar reunião com IPECE sobre a proposta de avaliação de impacto do PADIN, e sobre o levantamento do total e localização de famílias quilombolas e indígenas nos 36 municípios. | |
| c) A SEDUC vai viabilizar junto ao consultor individual para elaboração do material (cartilha/manual), que insira capítulo sobre a questão indígena e quilombola. | | | | | | |
| d) Sistematizar a versão preliminar da estratégia a ser adotada para o Plano. | | | | | | |
| B. Inclusão de um módulo de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas de ensino) no programa de treinamento de professores dos cursos de capacitação profissional | SEDUC e Gabinete do Governador | Durante o primeiro ano | Módulo desenvolvido em colaboração com a FUNAI, Associações Quilombolas e Coordenadoria para a Igualdade Racial. | SEDUC - Andréa | A SEDUC, o GabGov e a equipe da Coordenadoria da Diversidade (SEDUC) identificaram que os módulos proposta já estão sendo realizados pela Secretaria. Da Educação. | A meta da SEDUC foi considerada cumprida pelo Especialista Alberto Costa e a SEDUC enviou no dia 27/11 a metodologia utilizada na formação dos professores. |

Plano de Ação


| Plano de Ação - PforR | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---|-----------------|---|--|
| Descrição da Ação | Responsável | Período | Indicador | Coordenação | Encaminhamentos | Posição em Outubro |
| <p>2</p> <p>C. Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).</p> <p>D. Exclusão das áreas em que a execução das obras civis venha a requerer o reassentamento involuntário ou a relocação de famílias (com ou sem título de propriedade)</p> | PGE, SEDUC | Durante o primeiro ano | Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário. | SEDUC - Joízia | A Empresa é responsável por realizar a Varredura Fundiária e a SEDUC monitora através dos contratos. | O cronograma estabelecido para a entrega do relatório é junho de 2015. |
| | | | | | Das 22 obras de EEEP, 12 Obras já estão com documentação do terreno, certidões dos imóveis. | O cronograma estabelecido para a entrega do relatório é dezembro de 2014. |
| <p>3</p> <p>E. Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água</p> <p>F. Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água</p>  | COGERH, CONPAM, SRH (em consulta junto à FUNAI) | Até o fim do segundo ano | Os planos de segurança hídrica para as três microbacias estratégicas incluem medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (definidas em consulta junto às comunidades afetadas – inclusive os povos indígenas). Documentar de maneira efetiva o apoio da comunidade indígena à sua elaboração. | COGERH - Adahil | Verificar se os Termos de Referência já incluem diretrizes relativas à provisão de "medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais. Em seguida realizar consultas com as comunidades indígenas para obter seu amplo apoio aos Planos que sejam elaborados. | Os Termos de Referência que irão iniciar o processo de licitação para contratação de consultoria que irá elaborar o Plano foram elaborados e estão em fase de análise. |
| | | | | | CONPAM, SEMACE, COGERH, CAGECE | Até o fim do segundo ano |



Sumário da Posição da realização dos Projetos Assistência Técnica

Posição dos Projetos Assistência Técnica

51 PROJETOS NO PLANO DE LICITAÇÃO

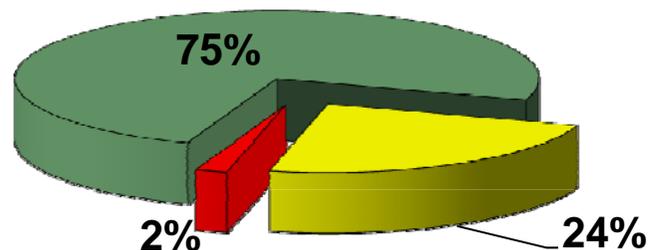


■ Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
■ Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia

| | | |
|--|---|---|
| | Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações | 38 PROJETOS: ARCE (1), ADECE (2), CGE (4,5,6,7), CONPAM (9,11,12,13), IPECE (15,16,18,19,20), PGE (21), SECITECE (22,23,24,25,26), SEDUC (28,29,30,31,32,33,34), SEPLAG (37,38,42,43,44,45), SRH (46,48,49), TCE (51) |
| | Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia | 12 PROJETOS: CGE (3), CONPAM (8,10), FUNCEME (14), IPECE (17), SECITECE (27), SEPLAG (39, 40,41), SEMACE (36), SRH (47), STDS (50) |
| | Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses | 1 PROJETO: SEDUC(35) |

O número em parênteses se refere ao número do projeto na lista dos Projetos de Assistência Técnica no site do IPECE no link:
http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/assistencia/Lista_dos_projetos_de_AT_rev_06102014_por_Setorial.pdf

Posição dos Projetos Assistência Técnica

83 SUBPROJETOS NO PLANO DE LICITAÇÃO

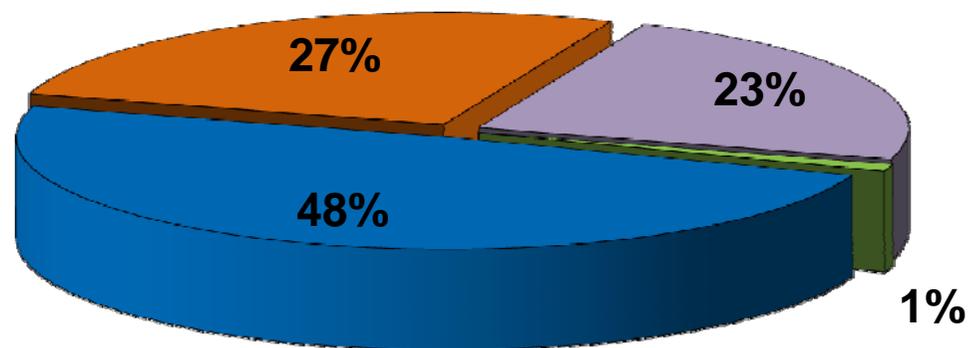


| | | |
|--|--------------------------|---|
| Em Andamento 43 Subprojetos | Atividades Preparatórias | 22 SUBPROJETOS ADECE(2), CGE (8,9),CONPAM (11,13,14,15,16,17), PGE (28), SEDUC (35,41,42,46,47), SEPLAG (69,70,72), SRH(46,49,48), TCE(81) |
| | Em Licitação | 19 SUBPROJETOS ARCE (1), CGE (3), CONPAM (10,12), FUNCEME (18), IPECE (24), SECITECE (34),SEDUC (43,44,45), SEMACE (54), SEPLAG(60,64,66), SRH (47), STDS (77,80), TCE (82,83) |
| | Em Execução | 2 SUBPROJETOS IPECE(19,20) |
| Não iniciado conforme Plano de Licitação 40 Subprojetos | | CGE (4,5,6,7), IPECE (21,22,23,25,26,27), SECITECE (29,30,31,32,33), SEDUC (36,37,38,39,40,48,49,50,51,52), SEMACE(53),SEPLAG (55,56,57,58,59,61,62,63,65,67,68,71), STDS(78,79) |

O número em parênteses se refere ao número do subprojeto na lista dos Projetos de Assistência Técnica no site do IPECE no link: http://www2.ipece.ce.gov.br/pforn/assistencia/Lista_dos_projetos_de_AT_rev_06102014_por_Setorial.pdf

Posição dos Projetos Assistência Técnica

43 SUBPROJETOS EM ANDAMENTO

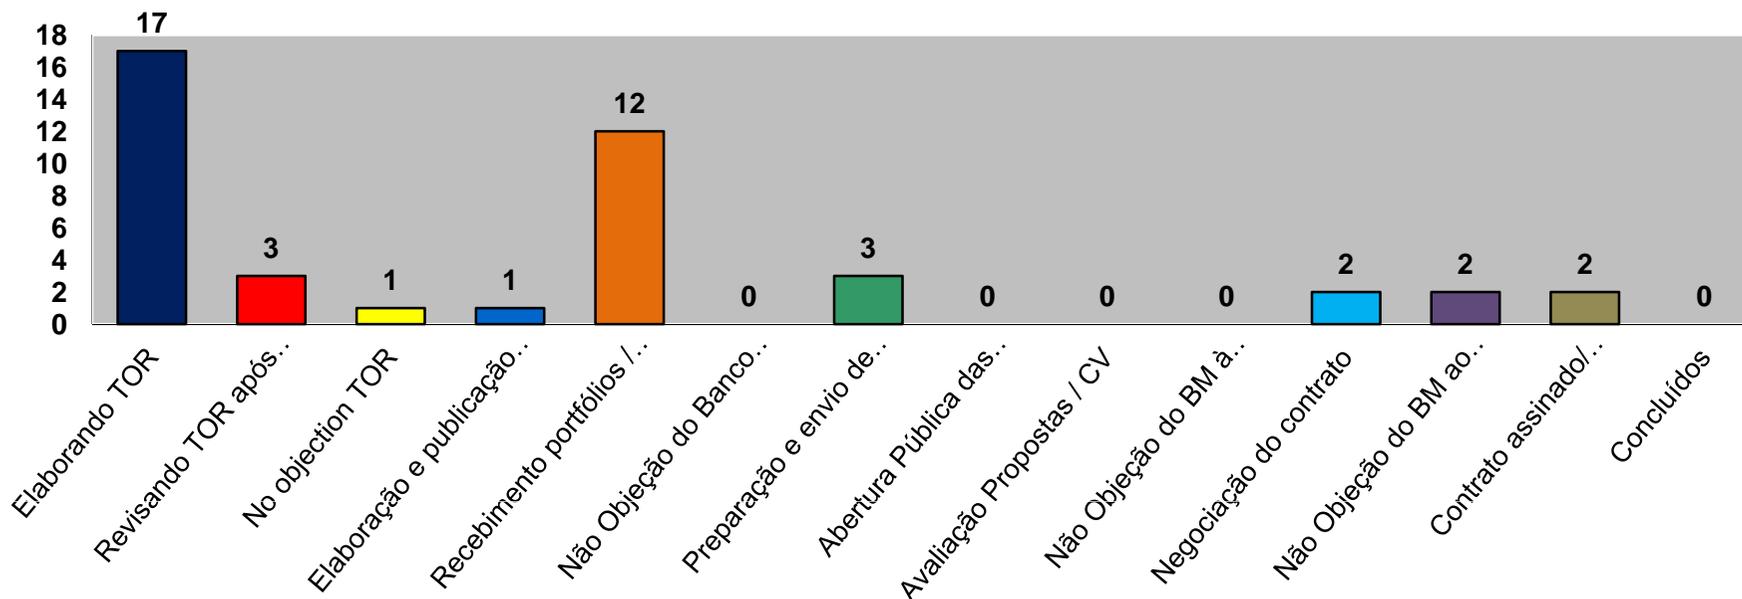

| Etapas | | Setoriais |
|--------|---|--|
| 1 | Elaborando TR | CGE(8,9),COMPAM(11,13,14,15,16,17), SEDUC(35,41,42,46,47),SEPLAG(69), SRH(46,48,49) – TOTAL 17 |
| 2 | Revisando TR após envio ao BM | ADECE(2), PGE(28), SEPLAG(70) – TOTAL 03 |
| 3 | No objection TR | TCE(81) – TOTAL 01 |
| 4 | Elaboração e publicação MI/Edital | SEPLAG (72) – TOTAL 01 |
| 5 | Recebimento portfólios / CV, Preparação Lista Curta e SDP | COMPAM(10,12), IPECE(24),SECITECE(34), SEMACE(54), SEPLAG(64,66), SRH(47), STDS(77,80),TCE(82,83) – TOTAL 12 |
| 6 | Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta) ou convocação do CI para negociação | ARCE(1), FUNCEME(18), SEPLAG (60) – TOTAL 03 |
| 7 | Negociação do Contrato | SEDUC (43,45) – TOTAL 02 |
| 8 | Não Objeção do BM ao contrato rubricado | CGE(3), SEDUC(44) – TOTAL 02 |
| 9 | Contrato assinado/ Prestando Serviço | IPECE(19,20) – TOTAL 02 |



4. APROVAÇÃO – ATA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE 21/11/14



5. ENCERRAMENTO

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE
Unidade de Gerenciamento de Projeto – UGP *PforR* Ceará
Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N - 2º Andar – SEPLAG – Cambéba
Contatos: 3101 3502 / 3101 3499 / 3101 3510
