



35ª REUNIÃO DO COMITÊ *PforR*
ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO
PROJETO *PforR*
15 DE DEZEMBRO DE 2016



PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

1. Abertura e apresentação dos participantes (14h30-14h35)
2. Algumas Informações (14h35 – 14h40m):
 - 2.1 Posição da Reestruturação do PforR
3. Indicadores, Plano de Ação, Programas e Assistência Técnica (14h40 - 15h10m)
 - 3.1. Indicadores Primários 2016.2 e Desembolsos – Thâmara Teixeira
 - 3.2. Indicadores Secundários 2016.2 – Thâmara Teixeira
 - 3.3. Plano de Ação de Mitigação de Riscos – Thâmara Teixeira
 - 3.4. Programas PforR - Thâmara Teixeira
 - 3.5. Assistência Técnica: Estatísticas – Lívia Castro
 - 3.6. Tempo disponível até o encerramento do PforR - Lívia Castro
4. Projetos de Assistência Técnica em Situação de Risco e Previsão de Assinatura dos Contratos – Giuseppe Nogueira (15h10 – 15h30)
 - 4.1 Risco de Prazo dos subprojetos – Giuseppe Nogueira
 - 4.2 Previsão de Assinatura dos contratos dos 22 Subprojetos sendo licitados – Giuseppe Nogueira
5. Monitoramento Contratos – Lívia Castro (15h30 – 15h40)
6. Projetos de Assistência Técnica por Setorial Contratados
7. Aprovação da Ata da 34 Reunião (24/11/2016) (15h40m - 15h45m) – Thâmara Teixeira
8. Encaminhamentos (15h45m - 16h) - Lívia Castro
9. Encerramento (16h)



1. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES



2. ALGUMAS INFORMAÇÕES



2.1 Posição da Reestruturação do PforR

2.1 Posição da Reestruturação do PforR

✓Cronograma:

| Atividades | Datas Previstas | Datas Realizado |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. A Justificativa Técnica será analisada pelo Grupo Técnico da COFLEX | 13/07/16 | 13/07/16 |
| 2. Encaminhamento do documento à Secretaria do Tesouro Nacional - STN | 12/08/16 | 09/12/2016 |
| 3. Conclusão do Parecer da PGFN | 26/08/16 | |
| 4. Retorno ao Banco Mundial e ao Estado do Ceará aprovando a assinatura do Aditivo | Novembro/16 | |
| 5. Previsão para assinatura do Aditivo de reestruturação do PforR | Dezembro/17 | |



3. INDICADORES, PLANO DE AÇÃO, PROGRAMAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA



3.1. Indicadores Primários 2016.2 e Desembolsos

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2016.2

| n° | SETORIAL RESPONSÁVEL | Indicadores | | Metas | Realizado |
|----|--------------------------|-------------|---|---|---------------------------------|
| | | DLI | Nome | 2ºSemestre2016 | |
| 1 | SEDUC | DLI3 | Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso. | 15 | 14 * |
| 2 | STDS | DLI4 | Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS. | 7% | 7,10% |
| | | DLI5 | Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família. | 55% | 96,36% |
| 3 | SEPLAG | DLI6 | Percentual de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com Marco Lógico implementado. | 70% | 60% |
| 4 | SRH | DLI7 | Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água. | Minutas de pelo menos duas reuniões | 2 Atas |
| 5 | CAGECE | DLI8 | Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto | 85.5% | 86,79% |
| 6 | SEMA SEMACE COGERH | DLI9 | Índice de qualidade da fiscalização ambiental. | 70% | 78,86% |
| 7 | FUNCEME | DLI10 | Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água. | Metodologia implementada em um reservatório estratégico | Implementação em 1 Reservatório |
| 8 | SEPLAG | DLI11 | Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados. | 4 | - |
| 9 | SEPLAG | DLI12 | Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada. | 10% | 20% |

* O 15º acordo está na publicação

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

| Indicador | Setorial Responsável | Semestres | Metas | Valores em US\$ | Farol |
|--|-----------------------|---------------------------|-------|-----------------|-------|
| DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos. | SEDUC Rivanir Bezerra | 2015.1 | 10 | 2.744.444,00 | ■ |
| | | 2015.2 | 12 | 3.403.750,00 | ■ |
| | | 2016.1 | 13 | 3.444.000,00 | ■ |
| | | 2016.2 | 15 | 3.438.000,00 | |
| | | 2017.1 | 16 | 3.444.000,00 | |
| | | 2017.2 | 18 | 3.120.000,00 | |
| | | Total do Indicador | | | |


Legenda: ■ Metas alcançadas

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2016


| Indicador | Setorial Responsável | Meta | Realizado | Status |
|--|--------------------------|------------|---------------------|---|
| DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso. | SEDUC Rivanir Bezerra | 15 acordos | 14 acordos firmados | A SEDUC assinou o 15º Termo de cooperação técnica com a empresa Maracañas Viagem e Turismo LTDA e o mesmo já foi encaminhado para a publicação. |

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

| Indicador | Setorial Responsável | Semestres | Metas* | Valores em US\$ | Farol |
|--|--------------------------------------|---------------------------|--------|-----------------|---|
| DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS. | STDS Sebastião Lopes Mary Anne | 2015.2 | 5% | 3.403.750,00 |  |
| | | 2016.2 | 7% | 3.438.000,00 | |
| | | 2017.2 | 10% | 3.120.000,00 | |
| | | Total do Indicador | | | 9.961.750,00 |

*As metas deste Indicador foram alteradas na reestruturação, anteriormente eram: 10%, 15% e 25%

Legenda:  Meta alcançada em 5,11%


INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

| Indicador | Setorial Responsável | Meta | Realizado | Status |
|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---|
| DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS. | STDS Sebastião Lopes Mary Anne | 7% ¹ | 7,10% | <p>Articulação realizada com os gestores e equipes municipais, para a execução do acompanhamento familiar.</p> <p>Visitas de acompanhamento familiar sendo realizadas pela STDS, nos municípios no âmbito do PforR para o cumprimento do indicador até o final do segundo semestre de 2016.</p> <p>Até o momento foram acompanhadas <u>3.247</u> famílias (total de 45.697), as informações obtidas nas visitas estão sendo registradas em instrumental próprio e informadas no Sistema de Monitoramento da STDS.</p> |

¹Meta alterada por ocasião da reestruturação do PforR

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

| Indicador | Setorial Responsável | Semestres | Metas | Valores em US\$ | Farol | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|-------|-----------------|---------------|--|
| DLI 5: Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família. | STDS Sebastião Lopes Mary Anne | 2015.1 | 15% | 2.744.444,00 | | |
| | | 2015.2 | 30% | 3.403.750,00 | | |
| | | 2016.1 | 42.5% | 3.444.000,00 | | |
| | | 2016.2 | 55% | 3.438.000,00 | | |
| | | 2017.1 | 75% | 3.444.000,00 | | |
| | | 2017.2 | 95% | 3.120.000,00 | | |
| | | Total do Indicador | | | 19.594.194,00 | |


Legenda:  Metas alcançadas

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2016

| Indicador | Setorial Responsável | Meta | Realizado | Status |
|---|--------------------------------------|------|-----------|--|
| DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar. | STDS Sebastião Lopes Mary Anne | 55% | 96,36% | <p>A Meta de 2016.2 foi alcançada.</p> <p>Até Setembro de 2016, foram realizadas capacitações com a participação de 36 municípios, atingindo 55 CRAS, cumprindo-se, portanto, as metas referentes ao 1º e 2º semestre de 2016, que eram de 42,5% e 55% respectivamente, bem como as metas do próximo ano que são de 75% (1º semestre) e 95% (2º semestre).</p> |

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

| Indicador | Setorial Responsável | Semestres | Metas | Valores em US\$ | Farol |
|--|------------------------|---------------------------|-------|-----------------|-------|
| DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas | SEPLAG José Freitas | 2015.1 | 22.5% | 2.744.444,00 | |
| | | 2015.2 | 45% | 3.403.750,00 | |
| | | 2016.1 | 55% | 3.444.000,00 | |
| | | 2016.2 | 70% | 3.438.000,00 | |
| | | 2017.1 | 82.5% | 3.444.000,00 | |
| | | 2017.2 | 95% | 3.120.000,00 | |
| | | Total do Indicador | | | |

Legenda:  Metas alcançadas

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2016

| Indicador | Setorial Responsável | Meta | Realizado | Status |
|--|------------------------|------|-----------|--|
| DLI 6: Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas. | SEPLAG José Freitas | 70% | 60% | <ul style="list-style-type: none"> • De 12 a 16 de dezembro de 2016: Conclusão da revisão dos marcos lógicos construídos; • De 19 a 23 de dezembro de 2016: Consolidação de Relatório demonstrativo de cumprimento da Meta; • Dia 22 de dezembro de 2016: Entrega do Relatório. |

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

| Indicadores | Setorial Responsável | Semestres | Metas | Valores em US\$ | Farol |
|---|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|----------------------|
| DLI 7: Estabelecimento de um Comitê multissetorial de Segurança Hídrica. | SRH Carlos Campelo | 2013.2 | Comitê instituído pelo decreto | 39.375.000,00 | |
| | | 2015.1 | Diagnóstico de Bacias completos | 2.744.444,00 | |
| | | 2016.1 | Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas | 3.444.000,00 | |
| | | 2016.2 | Minutas de pelo menos duas reuniões | 3.438.000,00 | |
| | | 2017.1 | Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas | 3.444.000,00 | |
| | | 2017.2 | Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas | 3.120.000,00 | |
| | | Total do Indicador | | | 55.565.444,00 |

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

| Indicador | Setorial Responsável | Metas | Realizado | Status |
|---|-----------------------|---|---------------------------|--|
| DLI 7: Estabelecimento do Comitê multisetorial de Segurança da Água. | SRH Carlos Campelo | Atas de pelo menos duas reuniões realizadas | Duas Atas já encaminhadas | Já foram encaminhadas à UGP duas Atas de reuniões. A última reunião ocorreu no dia 06/12/16. |

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

| Indicador | Setorial Responsável | Semestres | Metas | Valores em US\$ | Farol |
|---|----------------------------|---------------------------|-------|-----------------|-------|
| DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto. | CAGECE Carlos Rossas | 2014.1 | 83.8% | 5.250.000,00 | |
| | | 2014.2 | 84.3% | 6.198.000,00 | |
| | | 2015.1 | 84.6% | 2.744.444,00 | |
| | | 2015.2 | 84.9% | 3.403.750,00 | |
| | | 2016.1 | 85.2% | 3.444.000,00 | |
| | | 2016.2 | 85.5% | 3.438.000,00 | |
| | | 2017.1 | 85.7% | 3.444.000,00 | |
| | | 2017.2 | 85.9% | 3.120.000,00 | |
| | | Total do Indicador | | | |

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

| Indicador | Setorial Responsável | Meta | Realizado | Status |
|---|-------------------------|-------|-----------|--|
| DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto | CAGECE Carlos Rossas | 85.5% | 86,79% | Esse indicador foi cumprido em 2015.2 com o resultado de 86,05%. O resultado do mês de outubro foi de <u>86,79%</u> . |





INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

| Indicadores | Semestres | Metas | Valores em US\$ | Farol |
|--|---------------------------|-------|-----------------|---------------|
| DLI 9: Índice da qualidade da fiscalização ambiental | 2014.1 | 28% | 5.250.000,00 | ■ |
| | 2014.2 | 40% | 6.198.000,00 | ■ |
| | 2015.1 | 50% | 2.744.444,00 | ■ |
| | 2015.2 | 60% | 3.403.750,00 | ■ |
| | 2016.1 | 65% | 3.444.000,00 | ■ |
| | 2016.2 | 70% | 3.438.000,00 | |
| | 2017.1 | 75% | 3.444.000,00 | |
| | 2017.2 | 80% | 3.120.000,00 | |
| | Total do Indicador | | | 31.042.194,00 |

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

| Indicador | Setorial Responsável | Meta | Realizado | Status |
|---|---|------------|-----------|---|
| DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental. | SEMA Maria Dias SEMACE Tiago Bessa COGERH Denilson Fidelis | 70% | 78,86% | 78,86% (Medição referente a 09/12/16). |

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

| Indicador | Setorial Responsável | Semestres | Metas | Valores em US\$ | Farol |
|--|-------------------------|------------------------|---|-----------------|--|
| DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água. | FUNCEME Hoilton Rios | 2015.1 | Metodologia de monitoramento definida e adotada. | 2.744.444,00 |  |
| | | 2015.2 | Protocolo de coleta de dados definida e adotada. | 3.403.750,00 |  |
| | | 2016.2 | Metodologia implementada em um reservatório estratégico. | 3.438.000,00 |  |
| | | 2017.2 | Metodologia implementada em dois reservatórios estratégicos adicionais. | 3.120.000,00 |  |
| | | Total Indicador | | | 12.706.194,00 |

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

| Indicador | Setorial Responsável | Meta | Realizado | Status |
|---|---------------------------------|---|---|--|
| <p>DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.</p> | <p>FUNCEME Hoilton Rios</p> | <p>Metodologia implementada em um reservatório estratégico.</p> | <p>Metodologia implementada em um reservatório estratégico.</p> | <p>A Meta de 2016.2 foi alcançada.</p> <p>Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em execução no âmbito do Contrato No. 010/2015.</p> <p>A segunda versão do Relatório 04 (Avaliação da metodologia/estratégia proposta) foi analisada pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento e os comentários encaminhados ao Consórcio.</p> |

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

| Indicador | Setorial Responsável | Semestres | Metas | Valores em US\$ | Farol |
|---|--------------------------|--------------|---|-----------------|----------------------|
| DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.* | SEPLAG Avilton Júnior | 2014.2 | Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará.** | 6.198.000,00 | |
| | | 2015.1 | 1 | 2.744.444,00 | |
| | | 2015.2 | 2 | 3.403.750,00 | |
| | | 2016.1 | 3 | 3.444.000,00 | |
| | | 2016.2 | 4 | 3.438.000,00 | |
| | | 2017.1 | 5 | 3.444.000,00 | |
| | | 2017.2 | 6 | 3.120.000,00 | |
| | | Total | | | 25.792.194,00 |

* Nome do Indicador alterado por ocasião da reestruturação do PforR

** Meta do Indicador alterada por ocasião da reestruturação do PforR

Legenda: ■ Probabilidade baixa de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2016

| Indicador | Setorial Responsável | Metas | Realizado | Status |
|---|--------------------------|---|-----------|--|
| DLI11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados. | SEPLAG Avilton Júnior | 2014.2 | - | A primeira meta deste indicador, Aprovação do modelo de GPR, está condicionada à assinatura de um decreto por parte do Governador, institucionalizando o referido modelo no Estado do Ceará, o que está prevista para ocorrer no dia <u>16 de dezembro, em reunião geral de secretariado.</u> Na ocasião, deverão ser assinados os seis acordos de resultados com as secretarias-piloto escolhidas (SCIDADES, SEDUC, SEINFRA, SEMA, SESA, SRH e SSPDS), o que comprovará o atingimento das metas do indicador DLI 11. |
| | | Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará. | | |
| | | 2015.1 | | |
| | | 1 Secretaria | | |
| | | 2015.2 | | |
| | | 2 Secretarias | | |
| | | 2016.1 | | |
| | | 3 Secretarias | | |
| | | 2016.2 | | |
| 4 Secretarias | | | | |

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

| Indicador | Setorial Responsável | Semestres | Metas | Valores em US\$ | Farol |
|--|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|---------------|
| DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada | SEPLAG Adauto Oliveira | 2014.2 | Aprovação da metodologia | 6.198.000,00 | |
| | | 2015.1 | - | - | |
| | | 2015.2 | - | - | |
| | | 2016.1 | 5% | 3.444.000,00 | |
| | | 2016.2 | 10% | 3.438.000,00 | |
| | | 2017.1 | 15%* | 3.444.000,00 | |
| | | 2017.2 | 20%* | 3.120.000,00 | |
| | | Total | | | 19.644.000,00 |

*As metas deste Indicador foram modificadas na reestruturação do PforR, anteriormente as metas eram 25% e 40%

Legenda:  Metas alcançadas

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

| Indicador | Setorial Responsável | Metas | Realizado | Status |
|--|---------------------------|------------------|-----------|---|
| DLI12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada. | SEPLAG Adauto Oliveira | 2016.1 | 20% | A Meta de 2016.2 foi alcançada. As próximas metas do ano de 2017 serão cumpridas somente após a publicação da LOA para 2017. Assim que forem definidos os valores dos recursos destinados para os Projetos Estratégicos serão selecionados quais deles utilizarão a metodologia de Planejamento de Investimentos. |
| | | 5% dos Projetos | | |
| | | 2016.2 | | |
| | | 10% dos Projetos | | |





3.2. Indicadores Secundários 2016.2


INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2016

| n° | Setorial | Indicadores | Metas 2016.2 | Realizado | Status |
|----|----------|---|-------------------------------------|---|--------|
| 1 | IPECE | Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico). | 30.300 | 25.463 Técnicos absorvidos | |
| 2 | SEPLAG | Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT). | Outras duas resoluções publicadas | Duas Resoluções Publicadas | |
| 3 | STDS | Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas | 7% | 7,10% | |
| 4 | COGERH | Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas. | Encaminhamento do Projeto ao CONERH | A Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais será encaminhado ao Conselho Estadual dos Recursos Hídricos até o dia 30/12/2016 | |
| | | Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza. | 65.9 | 73,9 | |
| 5 | SEMA | Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista. | Implementação e monitoramento | Relatório de ações para implementação da Política Estadual de Resíduos Sólidos foi enviado hoje. | |

Total de Indicadores Secundários no semestre 2016.2: 6 Indicadores

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Meta 2º Semestre 2016

| Nome do Indicador | Setorial Responsável | Meta 2ª semestre | Realizado | Status |
|---|----------------------|------------------|--------------------|---|
| PDO1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico). | IPECE Victor Hugo | 30.300 | 25.463 técnicos | Houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos). |

Legenda  Probabilidade baixa de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

| Nome do Indicador | Setorial Responsável | Meta 2ª semestre | Realizado | Status |
|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multisetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT). | SEPLAG Lara Costa | Outras duas resoluções publicadas | Duas Resoluções publicadas | <p>A meta de publicação de duas resoluções no ano foi cumprida em 2016.</p> <p>O Comitê realizou a 4ª Reunião Ordinária de 2016 em 12/12, quando foi realizado um balanço das ações realizadas no ano, bem como discutidos pontos relevantes para o alinhamento do Programa Criança Feliz, do Governo Federal, ao programas desenvolvidos para a primeira infância no âmbito estadual.</p> <p>A Primeira-dama também anunciou a perspectiva de realização de um seminário internacional em março de 2017, cujo detalhamento ainda está em discussão.</p> |

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

| Nome do Indicador | Setorial Responsável | Metas 2ª semestre | Realizado | Status |
|--|---|-------------------|--------------|--|
| <p>PDO2: Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas</p> | <p>STDS Sebastião Lopes Mary Anne</p> | <p>7%</p> | <p>7,10%</p> | <p>O Sistema de Monitoramento da STDS está sendo alimentado com os dados do acompanhamento familiar, provenientes das visitas domiciliares de acompanhamento técnico, com vistas a emissão de relatórios e verificação dos resultados obtidos no cumprimento do indicador até o final do segundo semestre de 2016.</p> |

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Meta 2º Semestre 2016

| Nome do Indicador | Setorial Responsável | Meta 2ª semestre | Realizado | Status |
|---|---|------------------|-----------|--|
| PDO3:Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza. | COGERH Denilson Fidelis, Disney Paulino | 65,9 | 73,9 | 73,9 (referente ao mês de novembro) IQARce: 4,11 (criticamente degradado a poluído) |

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

| Nome do Indicador | Setorial Responsável | Metas 2ª semestre | Realizado | Status |
|---|----------------------|-------------------------------------|---|---|
| Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas. | COGERH Ana Araújo | Encaminhamento do Projeto ao CONERH | As Consultas foram realizadas nos 12 Comitês de Bacias Hidrográficas. | A Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais será encaminhado ao Conselho Estadual dos Recursos Hídricos até o dia 30/12/2016 |

*Comitês Bacias Hidrográficas

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

| Nome do Indicador | Responsável | Metas | Realizado | Status |
|--|--------------------|-------------------------------|--|--|
| Apresentação da Lei de gestão de Resíduos Sólidos revista. | SEMA Maria Dias | Implementação e monitoramento | 3 municípios assinaram consórcios aderindo ao Plano Regional de Resíduos Sólidos | O Relatório de ações para implementação da Política Estadual de Resíduos Sólidos foi enviado hoje. |



3.3. Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental

Pendências Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental - PforR

| | Descrição da Ação | Responsável | Posição |
|---|---|-------------|--|
| 1 | <p>A. Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar.</p> | STDS | <p>A SEDUC mandou o documento e será analisado pela UGP para posterior envio ao Banco.</p> |
| 2 | <p>E. Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água</p> | COGERH | <p>Em 24 e 28 de novembro foram realizadas visitas na Comunidade do Trilho e Comunidade dos Anaces, no município de Caucaia.</p> <p>Para Dezembro, estão previstas as visitas, conforme cronograma enviado em 12/12/16 nos dias 02, 05, 13, 14, 15, 19, 20 e 21.</p> |



3.4. Programas *PforR*

Posição do Programa 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional - SEDUC

| Iniciativas | Previsão | | Execução | FAROL (C)/(A) |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| | 2016 (A) | 2017 (B) | Até 15.12.16 (C) | |
| 020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional. | R\$ 43,10 | R\$ 31,49 | R\$ 29,66 | 69% |
| 020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional. | R\$ 15,44 | R\$ 8,06 | R\$ 9,99 | 65% |
| 020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional. | R\$ 87,52 | R\$ 98,93 | R\$ 153,53 | 175% |
| 020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional. | R\$ 2,47 | R\$ 2,30 | R\$ 1,26 | 51% |
| 020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos. | R\$ 29,00 | R\$ 30,00 | R\$ 26,45 | 91% |
| TOTAL SEDUC | R\$ 177,53 | R\$ 170,78 | R\$ 220,90 | |

Posição do Programa 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional - SEDUC

| Iniciativas | | Execução até 15.12.2016 | Restos a Pagar até 15.12.2016 | TOTAL |
|--------------|----------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 771 | 020.1.01 | R\$ 29.657.563,32 | R\$ - | R\$ 29.657.563,32 |
| | 020.1.02 | R\$ 4.493.081,71 | R\$ 5.496.820,11 | R\$ 9.989.901,82 |
| 328 | 020.1.03 | R\$ 151.549.058,04 | R\$ 1.984.286,63 | R\$ 153.533.344,67 |
| - | 020.1.04 | R\$ 1.263.878,23 | R\$ - | R\$ 1.263.878,23 |
| 834 | 020.1.06 | R\$ 24.666.900,99 | R\$ 1.786.487,16 | R\$ 26.453.388,15 |
| Total | | R\$ 211.630.482,29 | R\$ 9.267.593,90 | R\$ 220.898.076,19 |

Posição do Programa 080 – Proteção Social Básica - STDS

| Iniciativa | Previsão | | Execução | FAROL (C)/(A) |
|--|-----------------|------------------|---------------------|------------------|
| | 2016 (A) | 2017 (B) | Até 15.12.16 (C) | |
| 080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social. | R\$ 7,30 | R\$ 10,51 | R\$ 7,19 | 99% |
| TOTAL STDS | R\$ 7,30 | R\$ 10,51 | R\$ 7,19 | |

| Iniciativas | | Execução até 15.12.2016 | Restos a Pagar até 15.12.2016 | TOTAL |
|-------------|----------|----------------------------|----------------------------------|------------------|
| 03180 | 080.1.01 | R\$ 7.054.650,00 | R\$ 136.800,00 | R\$ 7.191.450,00 |

Posição do Programa 025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana - CIDADES

| Iniciativa | Previsão | | Execução | FAROL (C)/(A) |
|---|-------------|-------------|------------------------|------------------|
| | 2016 (A) | 2017 (B) | Até 15.12.16 (C) | |
| 025.1.12 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário. | R\$ - | R\$ 8,58 | R\$ - | 0% |

Posição do Programa 064 – Resíduos Sólidos - SEMA

| Iniciativa | Previsão | | Execução | FAROL (C)/(A) |
|---|-------------|-------------|------------------------|------------------|
| | 2016 (A) | 2017 (B) | Até 15.12.16 (C) | |
| 064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos. | R\$ 1,10 | R\$ 2,00 | R\$ 0,20 | 18% |

| Iniciativas | | Execução até 15.12.2016 | Restos a Pagar até 15.12.2016 | TOTAL |
|-------------|----------|----------------------------|----------------------------------|----------------|
| 03104 | 064.1.04 | R\$ 99.750,00 | R\$ 99.425,00 | R\$ 199.175,00 |

Posição do Programa 066 – Ceará Mais Verde - SEMA

| Iniciativa | Previsão | | Execução | FAROL (C)/(A) |
|---|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| | 2016 (A) | 2017 (B) | Até 15.12.16 (C) | |
| 066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas. | R\$ 0,60 | R\$ 0,60 | R\$ 0,05 | 8% |

| Iniciativas | | Execução até 15.12.2016 | Restos a Pagar até 15.12.2016 | TOTAL |
|-------------|----------|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| - | 066.1.02 | R\$ 46.299,00 | R\$ - | R\$ 46.299,00 |

Posição do Programa 067 – Ceará no Clima - SEMA

| Iniciativa | Previsão | | Execução | FAROL (C)/(A) |
|---|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| | 2016 (A) | 2017 (B) | Até 15.12.16 (C) | |
| 067.1.05 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro. | R\$ 0,55 | R\$ 0,55 | R\$ - | 0% |

Posição do Programa 066 – Ceará Mais Verde - SEMACE

| Iniciativas | Previsão | | Execução | FAROL (C)/(A) |
|---|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| | 2016 (A) | 2017 (B) | Até 15.12.16 (C) | |
| 066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais. | R\$ - | R\$ 26,96 | R\$ - | |
| 066.1.12 – Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará. | R\$ 0,28 | R\$ 2,34 | R\$ 0,51 | 180% |
| 066.1.13 – Ampliação das ações de proteção dos recursos ambientais das áreas protegidas do Estado do Ceará. | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,13 | 129% |

| Iniciativas | | Execução até 15.12.2016 | Restos a Pagar até 15.12.2016 | TOTAL |
|--------------|----------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| - | 066.1.09 | R\$ - | - | - |
| 05170 | 066.1.12 | R\$ 391.472,11 | R\$ 113.640,87 | R\$ 505.112,98 |
| 04815 | 066.1.13 | R\$ - | R\$ 129.000,00 | R\$ 129.000,00 |
| Total | | R\$ 391.472,11 | R\$ 242.640,87 | R\$ 634.112,98 |

Posição do Programa 067 – Ceará no Clima - SEMACE

| Iniciativa | Previsão | | Execução | FAROL (C)/(A) |
|---|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| | 2016 (A) | 2017 (B) | Até 15.12.16 (C) | |
| 067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar. | R\$ 2,00 | R\$ 0,18 | R\$ - | 0% |

Posição do Programa 500 – Gestão e Manutenção - SEMACE

| Iniciativa | Previsão | | Execução | FAROL (C)/(A) |
|--|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| | 2016 (A) | 2017 (B) | Até 15.12.16 (C) | |
| 500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas. | R\$ 0,42 | R\$ 0,76 | R\$ 0,53 | 127% |

| Iniciativas | | Execução até 15.12.2016 | Restos a Pagar até 15.12.2016 | TOTAL |
|-------------|----------|----------------------------|----------------------------------|----------------|
| 00001 | 500.1.02 | R\$ 227.645,00 | R\$ 306.197,92 | R\$ 533.842,92 |

Posição do Programa 018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis - FUNCEME

| Iniciativa | Previsão | | Execução | FAROL (C)/(A) |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|
| | 2016 (A) | 2017 (B) | Até 15.12.16 (C) | |
| 018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias. | R\$ 1,81 | R\$ 1,91 | R\$ 1,57 | 87% |
| 018.1.03 - Ampliação e modernização do sistema de monitoramento e previsão. | R\$ 0,05 | R\$ 0,07 | R\$ 0,04 | 90% |
| TOTAL FUNCEME - QUALIDADE DA ÁGUA | R\$ 1,86 | R\$ 1,97 | R\$ 1,62 | |

| Iniciativas | | Execução até 15.12.2016 | Restos a Pagar até 15.12.2016 | TOTAL |
|-------------|----------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 2846 | 018.1.01 | R\$ 1.483.623,44 | R\$ 88.499,99 | R\$ 1.572.123,43 |
| - | 018.1.03 | R\$ - | R\$ 44.890,00 | R\$ 44.890,00 |
| Total | | R\$ 1.483.623,44 | R\$ 133.389,99 | R\$ 1.617.013,43 |

Posição de Execução dos Programas de 2016 até 15.12.2016

| Eixo | Setorial | Previsão | Execução | % |
|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Capacitação Profissional | SEDUC | R\$ 177,53 | R\$ 220,90 | 124% |
| Assistência à Família | STDS | R\$ 7,30 | R\$ 7,19 | 99% |
| Qualidade da Água | CIDADES | R\$ - | R\$ - | 0% |
| | SEMA | R\$ 2,25 | R\$ 0,25 | 11% |
| | SEMACE | R\$ 2,70 | R\$ 1,17 | 43% |
| | FUNCEME | R\$ 1,86 | R\$ 1,62 | 87% |
| Total | | R\$ 191,64 | R\$ 231,12 | 121% |

Posição de Execução dos Programas de 2016 até 15.12.2016

| Execução Acumulada Projeto até 15.12.2016 | | | |
|---|------------|---------------|---------------|
| Meta 2014-2017 | R\$ | 893,49 | 100,00% |
| Execução 2014 | R\$ | 243,35 | 27,24% |
| Execução 2015 | R\$ | 233,28 | 26,11% |
| Execução 2016 | R\$ | 231,12 | 25,87% |
| Total Executado | R\$ | 707,74 | 79,21% |
| Falta Executar | R\$ | 185,75 | 20,79% |

Posição dos Programas

| EIXO | SETORIAL | PROGRAMAS | Previsão | | Execução | FAROL (C)/(A) |
|---------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| | | | 2016 (A) | 2017 (B) | Até 15.12.16 (C) | |
| CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | SEDUC | 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional | R\$ 177,53 | R\$ 170,78 | R\$ 220,90 | 124% |
| TOTAL CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | | | R\$ 177,53 | R\$ 170,78 | R\$ 220,90 | 124% |
| ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA | STDS | 080 – Proteção Social Básica | R\$ 7,30 | R\$ 10,51 | R\$ 7,19 | 99% |
| TOTAL ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA | | | R\$ 7,30 | R\$ 10,51 | R\$ 7,19 | 99% |
| QUALIDADE DA ÁGUA | CIDADES | 025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana; | R\$ - | R\$ 8,58 | R\$ - | 0% |
| | SEMA/ SEMACE | 064 – Resíduos Sólidos; | R\$ 1,10 | R\$ 2,00 | R\$ 0,20 | 18% |
| | | 066 – Ceará Mais Verde; | R\$ 0,88 | R\$ 29,90 | R\$ 0,68 | 77% |
| | | 067 – Ceará no Clima; | R\$ 2,55 | R\$ 0,73 | R\$ - | 0% |
| | SEMACE | 500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada; | R\$ 0,42 | R\$ 0,76 | R\$ 0,53 | 127% |
| FUNCEME | 018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis. | R\$ 1,86 | R\$ 1,97 | R\$ 1,62 | 87% | |
| TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA | | | R\$ 6,81 | R\$ 43,94 | R\$ 3,03 | 44% |
| TOTAL EXECUÇÃO DE 2016 | | | R\$ 191,64 | R\$ 225,23 | R\$ 231,12 | 121% |

Posição dos Programas

✓ **Lembrete:** Regras Programas


A execução dos programas deve observar as seguintes restrições:

- Devem excluir despesas que são financiadas pelo próprio BIRD ou por outras operações de crédito, ou seja, não é permitido a alocação de recursos do BIRD ou outras operações de crédito para custear despesas dos programas e iniciativas do componente
- Verificar a lista negra do BIRD a cada licitação, antes de assinar contrato. Para atender o Art. 42 da Lei 8.666/93 a SEPLAG incluiu no orçamento de cada ação um valor na fonte 69;
- Não podem apresentar impacto sócio ambiental negativo;
- Os valores dos contratos não podem exceder os limites abaixo:
 - Obras = US\$ 50 milhões
 - Bens = US\$ 30 milhões
 - Sistemas de TIC = US\$ 20 milhões
 - Consultorias = US\$ 15 milhões.



3.5. Assistência Técnica – Estatísticas


Execução dos Subprojetos de AT por Etapa

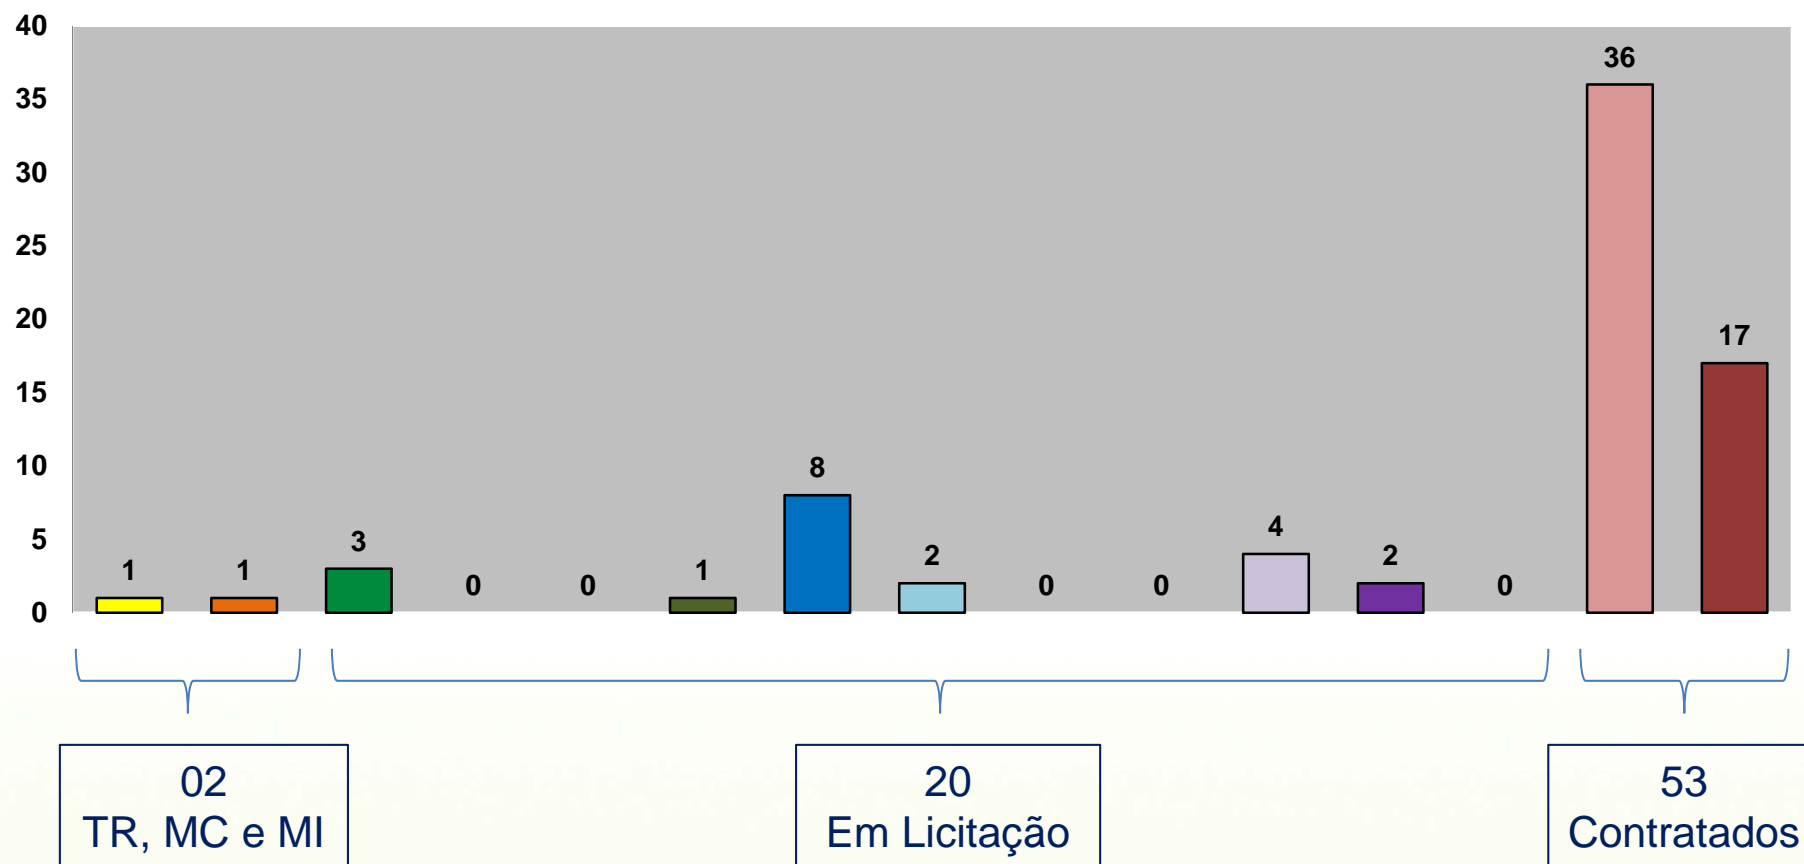

Subprojetos de Assistência Técnica por Etapa

| Etapas | | | Setoriais com Subprojetos | Valor US\$ |
|--------------|--|-----------|---|----------------------|
| 1 | TDR e MC sendo elaborados para NO BM | 1 | SEPLAG(58); | 337.500,00 |
| 2 | TDR e MC aprovado pelo BM e elaborando MI | 1 | SEDUC(34); | \$ 25.728,75 |
| 3 | Manifestação de Interesse Publicada | 3 | CGE(11); SEDUC(36,37); | \$ 1.171.327,67 |
| 4 | Elaborando o Relatório Final da Lista Curta | 0 | - | - |
| 5 | Elaborando a Solicitação de Proposta | 0 | - | - |
| 6 | Solicitação de Proposta Lançada | 1 | SEMA(52); | 723.273,62 |
| 7 | Elaborando o Relatório Técnico ou Curricular | 8 | CGE(08); IPECE(22); SECITECE(26,27); SEDUC(30,31,35); SEPLAG(55); | 1.410.880,13 |
| 8 | Elaborando o Relatório Financeiro e o Combinado | 2 | SEDUC(29); SEPLAG(62); | 940.834,66 |
| 9 | Não Objeção do BM à Avaliação Combinado / Avaliação Curricular | 0 | - | - |
| 10 | Divulgação da Avaliação Combinada / Ofício para Negociação | 0 | - | - |
| 11 | Negociação do Contrato | 4 | CGE(10); SEMA(50); SEMACE(53); SEPLAG(61); | 1.497.573,01 |
| 12 | Divulgação PGE Resultado Final | 2 | CGE (07); IPECE(21); | 1.119.534,47 |
| 13 | Assinando o Contrato / Publicação | 0 | - | - |
| 14 | Projetos com Contratos em Execução | 36 | ARCE(01); CGE(04,05,0609); FUNCEME(13); IPECE(14,15,17,18,19,20); PGE(23); SDE(24); SECITECE(28); SEDUC(42,43,44,45); SEMA(46,47,48,49,51); SEMACE(54); SEPLAG(57,59,60,63); SRH(64,65,66); COGERH(67,68); STDS(72); TCE(73); | 15.239.851,03 |
| 15 | Projetos com Contratos Finalizados | 17 | CGE(02,03,12); IPECE(16); SDE(25); SEDUC(32,33,38,39,40,41); SEPLAG(56); COGERH(69); STDS(70,71); TCE(74,75). | 1.065.757,23 |
| Total | | 75 | | 23.532.260,56 |

Execução dos Subprojetos de AT por Etapa

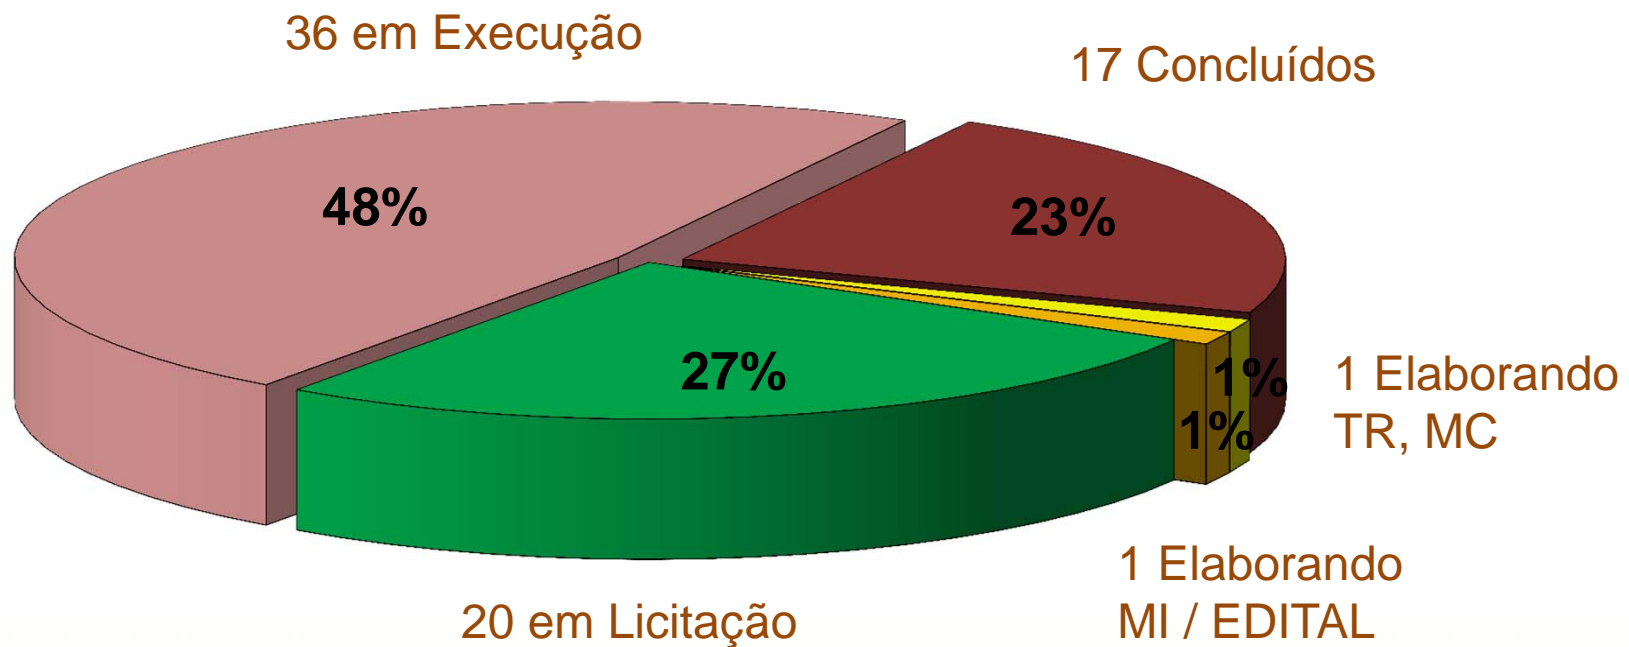



3.6 Tempo disponível até encerramento do *PforR*

Tempo disponível até encerramento do PforR = 31/01/2018

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 meses |
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | |
| 2º Semestre 2017 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 meses |
| | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Jan 2018 | 13 | | | | | | 1 meses |
| | Jan | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | |

| | |
|--------------|-----------------|
| TOTAL | 13 Meses |
|--------------|-----------------|

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 09 meses |
| | Médio - de 10 e 11 meses |
| | Alto - de 12 e 13 meses |
| | Altíssimo - acima de 13 meses - Inviabiliza o Projeto |



3.7 Pontos Principais de Aquisições

Pontos Principais de Aquisições

✓ **Contratações**

1. Currículos dos Especialistas devem estar assinados no contrato; e
2. Portaria da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Execução do contrato.

✓ **Gerenciando Riscos dos Contratos**


1. Riscos relacionados aos custos (eventos que podem afetar o valor , através de custos excedentes);
2. Riscos relacionados ao tempo (eventos que podem atrasar a execução do contrato);
3. Riscos relacionados ao objeto do contrato (eventos que podem comprometer a entrega ou a qualidade do produto).



4. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SITUAÇÃO DE RISCO E PREVISÃO DE ASSINATURA DOS CONTRATOS

4. 1 Risco de Prazo dos Subprojetos

Resumo dos Riscos de Prazo dos Subprojetos de AT

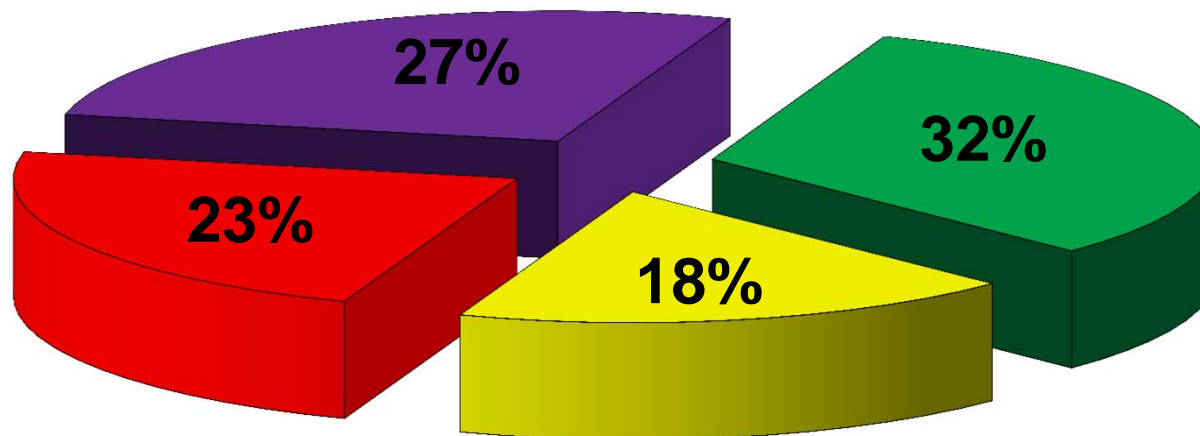

| Qtd. | % | Setoriais |
|------|------|--|
| 07 | 32% | CGE(2), IPECE(1), SEDUC(3), SEPLAG(1) |
| 04 | 18% | CGE(1), SECITECE(2), SEMA(1) |
| 05 | 23% | CGE(1), SEDUC(1), SEMA(1), SEPLAG(2), |
| 06 | 27% | IPECE(1), SEDUC(3), SEMACE(1), SEPLAG (1). |
| 22 | 100% | |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 09 meses |
| | Médio - de 10 e 11 meses |
| | Alto - de 12 e 13 meses |
| | Altíssimo - acima de 13 meses - Inviabiliza o Projeto |

Subprojetos de AT em Risco Altíssimo - Inviabilizado

| Nº | Órgão | Subprojetos | Risco |
|----|--------|--|-------|
| 1 | IPECE | Metodologias para análise de impacto econômico. | 15 |
| 2 | SEDUC | Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil. | 15 |
| 3 | SEDUC | Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo. | 14 |
| 4 | SEDUC | Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (02 analistas) | 14 |
| 5 | SEPLAG | Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS). | 14 |
| 6 | SEMACE | Contratação de consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE. | 13,5 |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 09 meses |
| | Médio - de 10 e 11 meses |
| | Alto - de 12 e 13 meses |
| | Altíssimo - acima de 13 meses - Inviabiliza o Projeto |

Subprojetos de AT em Risco Alto

| Nº | Órgão | Subprojetos | Risco |
|----|--------|---|-------|
| 1 | CGE | Capacitação da população para o Controle Social. | 13 |
| 2 | SEDUC | Contratação de empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto. | 12 |
| 3 | SEMA | Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas. | 12 |
| 4 | SEPLAG | Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos. | 12 |
| 5 | SEPLAG | Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará. | 12 |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 09 meses |
| | Médio - de 10 e 11 meses |
| | Alto - de 12 e 13 meses |
| | Altíssimo - acima de 13 meses - Inviabiliza o Projeto |

Subprojetos de AT em Risco Médio

| Nº | Órgão | Subprojetos | Risco |
|----|----------|---|-------|
| 1 | CGE | Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO). | 11 |
| 2 | SEMA | Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais. | 11 |
| 3 | SECITECE | Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará. | 10 |
| 4 | SECITECE | Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará. | 10 |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 09 meses |
| | Médio - de 10 e 11 meses |
| | Alto - de 12 e 13 meses |
| | Altíssimo - acima de 13 meses - Inviabiliza o Projeto |

Subprojetos de AT em Risco Baixo

| Nº | Órgão | Subprojetos | Risco |
|----|--------|---|-------|
| 1 | IPECE | Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP. | 9 |
| 2 | SEPLAG | Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial (2a. Etapa) | 9 |
| 3 | CGE | Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos. | 8 |
| 4 | SEDUC | Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado. Incluindo a Avaliação de Desempenho Institucional | 8 |
| 5 | CGE | consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO). | 7 |
| 6 | SEDUC | Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey). | 6 |
| 7 | SEDUC | Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados | 3,5 |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 09 meses |
| | Médio - de 10 e 11 meses |
| | Alto - de 12 e 13 meses |
| | Altíssimo - acima de 13 meses - Inviabiliza o Projeto |



4.2. Previsão de Assinatura dos contratos dos 22 Subprojetos sendo licitados

Previsão de Assinatura dos Contratos dos 22 Subprojetos sendo Licitados - Sumário

| Previsão de Assinatura dos Contratos | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Setoriais | Dezembro | | Janeiro | | Fevereiro | | Março | | Total |
| | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | |
| CGE | 1 | | 2 | | 1 | | | | 4 |
| IPECE | 1 | | | | 1 | | | | 2 |
| SEPLAG | | | 3 | | | | 1 | | 4 |
| SECITECE | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
| SEMA | 1 | | | | 1 | | | | 2 |
| SEDUC | | | 4 | | 2 | | 1 | | 7 |
| SEMACE | 1 | | | | | | | | 1 |
| Total | 4 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 22 |



Previsão de Assinatura dos Contratos dos 04 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Dezembro

| Setorial | Projeto | Risco (Tempo execução em meses) | Risco (Previsão de Contratação em meses) | Risco (Tempo contratação + execução em meses) |
|----------|--|---------------------------------|--|---|
| 1 CGE | Capacitação da população para o Controle Social. | 12 | 1 | 13 |
| 2 IPECE | Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP. | 8 | 1 | 9 |
| 3 SEMA | Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais. | 9 | 2 | 11 |
| 4 SEMACE | Contratação de consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE. | 12 | 1,5 | 13,5 |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 09 meses |
| | Médio - de 10 e 11 meses |
| | Alto - de 12 e 13 meses |
| | Altíssimo - acima de 13 meses - Inviabiliza o Projeto |

CGE - Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 7: Capacitação da população para o Controle Social.

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 292.587,32
- **Método de Aquisição:** LPN
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Assinatura Contrato.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Aguardando a garantia estendida da Fundação Demócrito Rocha para continuidade do processo, após contato em 15/12/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



IPECE - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 21: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para Desenvolvidos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.

- **Responsável:** Mário Aragão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 826.947,14
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial remeteu a documentação referente a negociação à PGE/Cel04 em 12/12/2016 para análise e posterior publicação do Aviso de Resultado Final.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 50: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Maria Dias / Monica Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 242.143,78
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial está ajustando a Ata da reunião e Minuta do Contrato para posterior envio a empresa para assinatura, após contato em 14/12/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

SEMACE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 53: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE

- **Responsável:** Elizabeth Romão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 385.212,76
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial remeteu a documentação referente a negociação a empresa para assinatura em 12/12/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Previsão de Assinatura dos Contratos dos 10 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Janeiro 2017

| Setorial | Projeto | Risco (Tempo execução em meses) | Risco (Previsão de Contratação em meses) | Risco (Tempo contratação + execução em meses) | |
|----------|----------|--|--|---|----|
| 1 | CGE | Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos. | 6 | 2 | 8 |
| 2 | CGE | Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO). | 5 | 2 | 7 |
| 3 | SECITECE | Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará. | 7 | 3 | 10 |
| 4 | SEDUC | Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo. | 12 | 2 | 14 |
| 5 | SEDUC | Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado. Incluindo a Avaliação de Desempenho Institucional | 6 | 2 | 8 |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 09 meses |
| | Médio - de 10 e 11 meses |
| | Alto - de 12 e 13 meses |
| | Altíssimo - acima de 13 meses - Inviabiliza o Projeto |

Previsão de Assinatura dos Contratos dos 10 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Janeiro 2017

| Setorial | | Projeto | Risco (Tempo execução em meses) | Risco (Previsão de Contratação em meses) | Risco (Tempo contratação + execução em meses) |
|----------|--------|--|---------------------------------|--|---|
| 6 | SEDUC | Contratação de empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto | 10 | 2 | 12 |
| 7 | SEDUC | Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados | 1,5 | 2 | 3,5 |
| 8 | SEPLAG | Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos. | 10 | 2 | 12 |
| 9 | SEPLAG | Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará. | 10 | 2 | 12 |
| 10 | SEPLAG | Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS). | 12 | 2 | 14 |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 09 meses |
| | Médio - de 10 e 11 meses |
| | Alto - de 12 e 13 meses |
| | Altíssimo - acima de 13 meses - Inviabiliza o Projeto |

CGE - Assistência Técnica - Gestão Pública

Subprojeto 8: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na “Detecção de Casos de Fraude e Corrupção” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.

- **Responsável:** Denise Andrade Araújo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 152.225,69
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Cel04 encaminhou o Relatório de Avaliação Técnica analisado para impressão e assinatura em 15/12/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

CGE - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 10: Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema (MODELO).

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 93.436,26
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2016 – Fevereiro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Realizado a 2ª reunião de negociação no dia 14/12/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 27: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Sandra Monteiro / Tarcísio Hilter
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 208.751,32
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Novembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Relatório de Avaliação Técnica encontra-se para assinatura do Secretário e posterior envio a Cel04, após contato em 13/12/2016. Previsão de envio a Cel04 ___/___?
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

SEDUC- Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 29: Contratação de serviços de consultoria para avaliação de desempenho acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará. (Teste de Proficiência)

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 374.353,64
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Em licitação – Aguardando posicionamento da SEDUC quanto a reunião com o Secretário para alinhamento sobre a forma de contratação. Previsão ___/___?
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SEDUC - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 30: Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da **formação continuada para gestores**, professores e instrutores de educação profissional secundárias do Estado (com a inclusão da Avaliação de Desempenho Institucional).*

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 83.599,52
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Novembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em licitação – Setorial remeteu as Avaliações individuais para análise da UGP no dia 09/12/2016. Realizado reunião de orientação no dia 15/12/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 36: Contratação de empresa especializada para operacionalizar e executar os **serviços de logística** das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.*

- **Responsável:** Emília Lucy
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 318.941,00
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2016 – Fevereiro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Processo Pregão Eletrônico nº 20160073 lançado no dia 09/12/2016. Com Inicio da Sessão de Disputa de Preços no dia 21/12/2016 às 10:30.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SEDUC- Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 37: Contratação de Empresa Especializada para serviço de **Impressão Gráfica dos materiais** de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.*

- **Responsável:** Emília Lucy
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 91.449,17
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2016 - Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Processo Comparação de Preços (SHOPPING) Nº 20160004 lançado no dia 09/12/2016. Com recebimento das propostas até às 16:00 horas do dia 20 de dezembro de 2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 55: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 85.603,96
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial remeteu o Relatório de Avaliação Curricular e a Justificativa para análise da UGP em 09/12/2016 e posterior envio para “não objeção” do Banco Mundial.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 61: Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Silvana Dourado
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 776.780,21
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Abril 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Realizado a 2ª reunião de negociação no dia 14/12/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

SEPLAG - Assistência Técnica – Fiduciário

Subprojeto 62: Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado – GCOMPRAS.

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 566.481,02
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Abril 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Aguardando posicionamento da SEPLAG quanto a reunião com o Secretário para alinhamento sobre a forma de contratação. Reunião agendado entre a setorial e a UGP para o dia 16/12/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Previsão de Assinatura dos Contratos dos 06 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Fevereiro 2017

| Setorial | Projeto | Risco (Tempo execução em meses) | Risco (Previsão de Contratação em meses) | Risco (Tempo contratação + execução em meses) |
|----------|----------|---------------------------------|--|---|
| 1 | CGE | 8 | 3 | 11 |
| 2 | IPECE | 12 | 3 | 15 |
| 3 | SECITECE | 6 | 4 | 10 |
| 4 | SEDUC | 12 | 2 | 14 |
| 5 | SEDUC | 12 | 3 | 15 |
| 6 | SEMA | 9 | 3 | 12 |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 09 meses |
| | Médio - de 10 e 11 meses |
| | Alto - de 12 e 13 meses |
| | Altíssimo - acima de 13 meses - Inviabiliza o Projeto |

CGE - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 11: Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 760.937,50
- **Método de Aquisição:** LPN
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2016 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Publicado o Edital de Licitação Pública Nacional, com data limite de recebimento das propostas até às 15hs do dia 12 de janeiro de 2017.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 22: Contratação de Consultoria de Empresa para Desenvolvimento de Metodologia para análise de impacto econômico no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 432.682,09
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Setembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial remeteu o Relatório de Avaliação Técnica a Cel04 em 12/12/2016 para análise.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 26: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.

- **Responsável:** Sandra Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 149.556,68
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – SECITCE está avaliando a Proposta Técnica após reunião de orientação da UGP. Previsão de envio a UGP ___/___?
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

SEDUC- Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 31: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (02 analistas).

- **Responsável:** Luciano Nery
- **Categoria de Licitação:** CI
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 54.151,20
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação - Setorial está avaliando e elaborando o Relatório de Avaliação Curricular após recebimento dos currículos e reunião de orientação com a UGP e recebimento dos currículos em 13/12/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 35: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de **formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.***

- **Responsável:** Emília Lucy
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 244.309,68
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Junho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Cel04 enviou a notificação da avaliação as empresas em 12/12/2016. Reapresentação das Propostas Técnicas e Financeiras remarcada para o dia 12/01/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 52: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da **coleta seletiva** nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias e Fabiola Martins
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 723.273,62
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Processo de SDP relançada em 16/11/2016. Reunião prévia realizado no dia 28/11/2016. Recebimento das Proposta Técnica e Financeira até as 16:00hrs do dia 16/12/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Previsão de Assinatura dos Contratos dos 02 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Março 2017

| Setorial | | Projeto | Risco (Tempo execução em meses) | Risco (Previsão de Contratação em meses) | Risco (Tempo contratação + execução em meses) |
|----------|--------|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | SEDUC | Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey). | 3 | 3 | 6 |
| 2 | SEPLAG | Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial (2a. Etapa) | 6 | 3 | 9 |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 09 meses |
| | Médio - de 10 e 11 meses |
| | Alto - de 12 e 13 meses |
| | Altíssimo - acima de 13 meses - Inviabiliza o Projeto |



SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 34: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)

- **Responsável:** Emília Lucy
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 25.728,75
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Atividades Preparatórias – Setorial está finalizando o Termo de Referência e Memória de Calculo para posterior envio a UGP. Previsão ___/___?
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 58: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter setorial (2a. Etapa)

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 337.500,00
- **Método de Aquisição:**
- **Revisão Prévia/Posterior:**
- **Início/Término:** Junho 2016 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaborando o Termo de Referência – Termo de Referência e Memória de Calculo em análise na UGP em 09/12/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



5. MONITORAMENTO CONTRATOS

Situação dos Contratos – Resumo Financeiro


| Setorial | Nº de Contratos | Nº de Contratos em Andamento | Nº de Contratos Concluídos | Valor Contratado (R\$) | Valor Pago (R\$) | Saldo a Pagar (R\$) | % PAGO |
|--------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| ARCE | 1 | 1 | - | 838.996,66 | 377.908,50 | 461.088,16 | 45% |
| CGE | 7 | 4 | 3 | 6.695.088,26 | 235.134,59 | 6.459.953,67 | 4% |
| COGERH | 3 | 2 | 1 | 4.408.834,66 | 1.584.428,09 | 2.824.406,57 | 36% |
| FUNCEME | 1 | 1 | - | 1.492.246,27 | 1.058.618,64 | 433.627,63 | 71% |
| IPECE | 7 | 6 | 1 | 1.127.719,00 | 929.537,42 | 198.181,58 | 82% |
| PGE | 1 | 1 | - | 1.434.107,25 | - | 1.434.107,25 | 0% |
| SDE | 2 | 1 | 1 | 1.148.959,99 | 97.937,23 | 1.051.022,76 | 9% |
| SECITECE | 1 | 1 | - | 164.620,00 | - | 164.620,00 | 0% |
| SEDUC | 10 | 4 | 6 | 5.727.318,15 | 289.420,70 | 5.437.897,45 | 5% |
| SEMA | 5 | 5 | - | 4.976.407,80 | 490.841,03 | 4.485.566,77 | 10% |
| SEMACE | 1 | 1 | - | 672.609,00 | 235.413,15 | 437.195,85 | 35% |
| SEPLAG | 5 | 4 | 1 | 7.406.350,24 | 2.963.267,60 | 4.443.082,64 | 40% |
| SRH | 3 | 3 | - | 2.990.615,88 | 134.784,00 | 2.855.831,88 | 5% |
| STDS | 3 | 1 | 2 | 2.282.850,00 | 585.556,00 | 1.697.294,00 | 26% |
| TCE | 3 | 1 | 2 | 3.034.992,37 | 529.663,21 | 2.505.329,16 | 17% |
| TOTAL | 53 | 36 | 17 | 44.401.715,53 | 9.512.510,16 | 34.889.205,36 | 21% |

Situação dos Contratos - Financeiro

| Valores Contratados (R\$) | Previsão a Contratar (R\$) | | Total Contratos (R\$) |
|---------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| | Dez 2016 | 2017 | |
| 44.401.715,53 | 5.049.235,35 | 19.737.391,24 | 69.188.342,12 |
| 64,18% | 7,30% | 28,53% | 100% |
| 53 Contratos | 04 Contratos | 18 Contratos | 75 Contratos |


| Valores Pagos (R\$) | Previsão a Pagar (R\$) | | Total (R\$) |
|---------------------|------------------------|------------|-------------|
| | Dez 2016 | 2017 | |
| 9.512.510 | 3.064.514 | 56.611.318 | 69.188.342 |
| 13,75% | 4,43% | 81,82% | 100% |

Situação dos Contratos - Financeiro

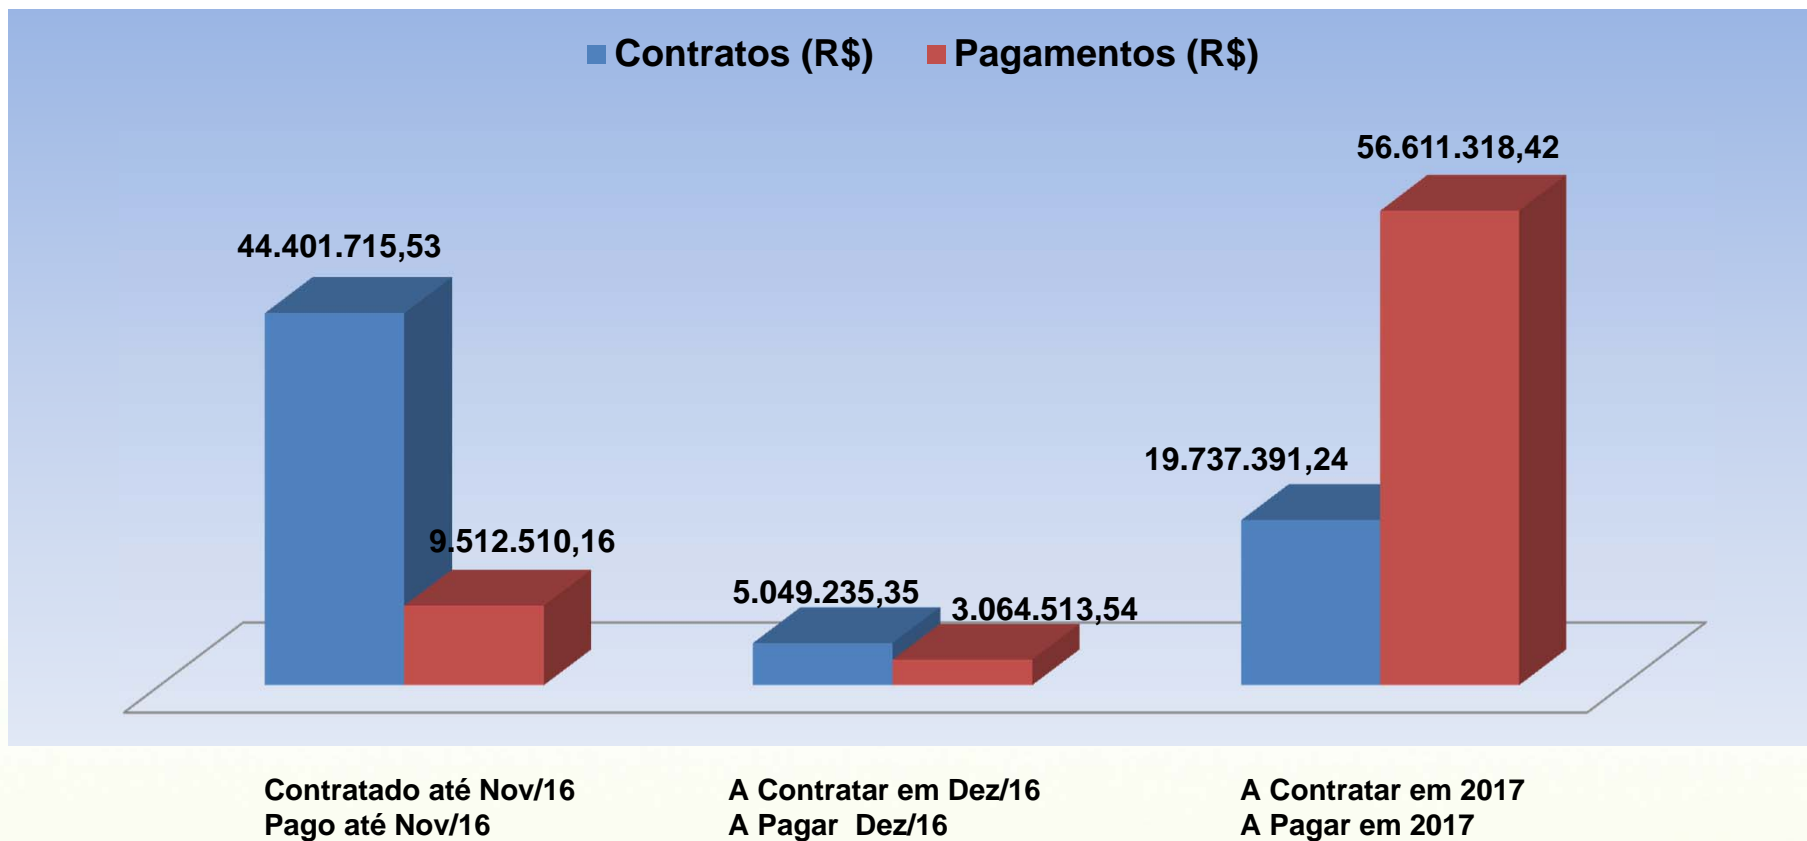

Situação dos Contratos – Aditivos de Prazo

| Setorial | ARCE | CGE | COGERH | FUNCEME | PGE | SEMA | SEMACE | SEPLAG | SDE | SEDUC | STDS | SECITECE | IPECE | TCE | SRH | TOTAL |
|------------------|------|-----|--------|---------|-----|------|--------|--------|-----|-------|------|----------|-------|-----|-----|-----------|
| Nº Contratos | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 53 |
| Aditivo de Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 21 |

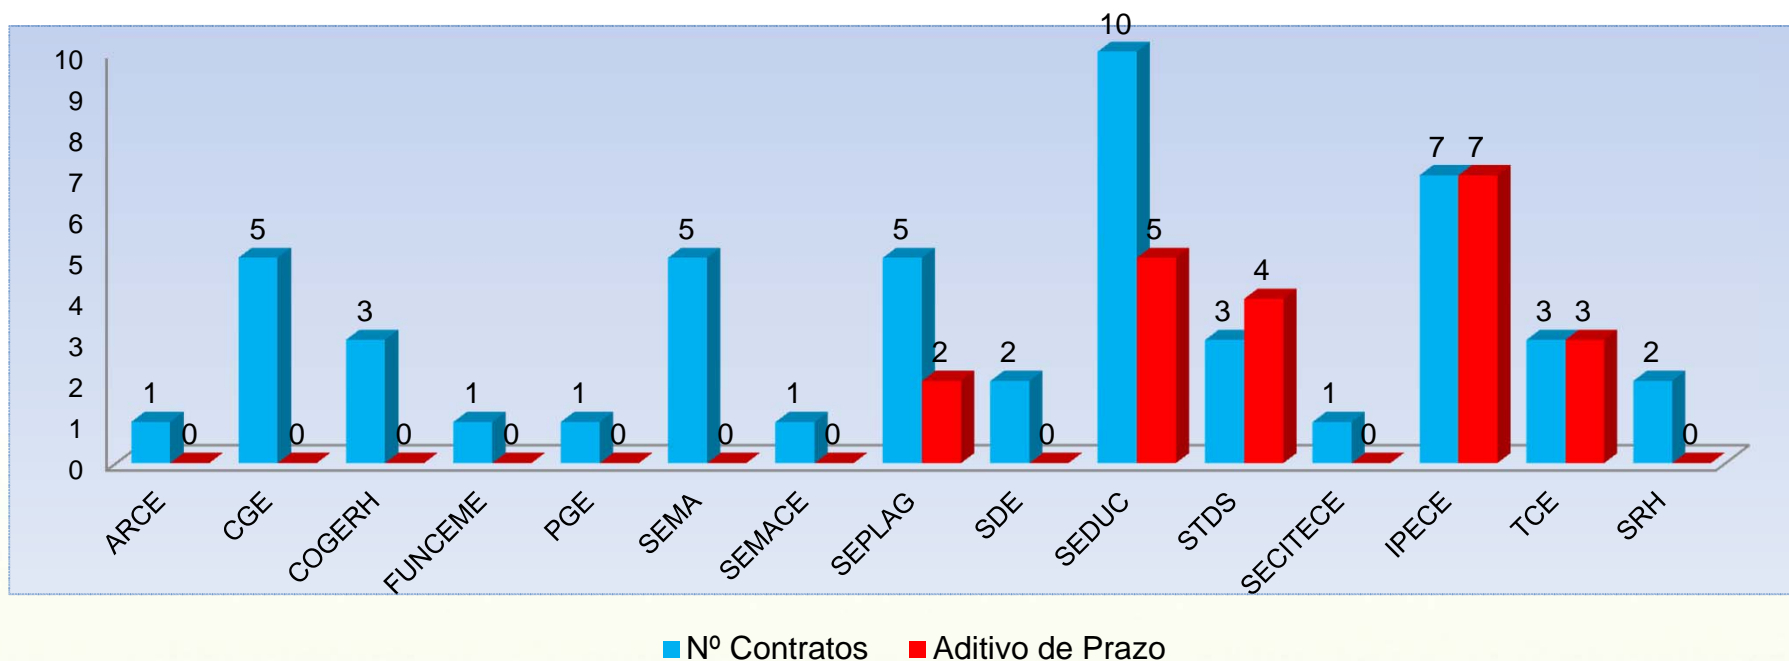

40% dos Contratos já foram elaborados Aditivos de Prazo



6. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR SETORIAL CONTRATADOS



CGE

CGE- Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojetos 2 e 3: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR. ¹

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 67.354,63
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 - Fevereiro 2016
- **Estágio Atual:** Contratos Concluídos.

Nota 1: Auditoria será realizada pela equipe da CGE a partir do semestre 16.1

CGE - Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Subprojeto 4: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Marcelo Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 224.190,70
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2016 – Abril 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 08/2016 - Publicado em 28/06/2016.
- **Consultora Vencedora:** Empresa NT Consult Tecnologia e Consultoria LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 725.256,92
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

CGE - Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 5: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).

- **Responsável:** Carlos Jorge Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 658.560,58
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2016 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 026/2016 - Publicado em 16/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** Ivia Serviços de Informática Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.130.443,48.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

CGE - Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 6: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.207.049,74
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2016 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 029/2016 – Publicado em 02/12/2016.
- **Consultora Vencedora:** CAIENA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 3.467.885,35.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Assistência Técnica – Gestão Financeira

*Subprojeto 9: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamentos com foco no “**Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público**” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos do processo de convergência das Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público (IPSAS).*

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 63.341,12
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2016 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 025/2016 - Publicado em 30/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** KPMG ASSESSORES LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 197.421,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

CGE - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 12: Contratação de consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.


- **Responsável:** Aglaio Soares
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 24.411,82
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Março de 2016
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.



IPECE

CGE- Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojetos 14 e 15: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.
CONSULTORES PLENOS

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 322.192,82
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contratos em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


CGE- Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 16: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.
CONSULTOR JÚNIOR

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 21.227,67
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.


CGE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojetos 17,18 e 19: Contratação de 03 (três) **Analistas em Licitações** para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 223.560,31
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contratos em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

CGE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojeto 20: Contratação de Consultor Individual especializado em **Políticas Públicas** para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução a Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.*

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 109.139,93
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévio
- **Início/Término:** Julho 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 10/2015 publicado em 18/09/2015. Serviços em execução.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



PGE

PGE - Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Subprojeto 23: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.


- **Responsável:** Valéria Rodrigues
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 443.309,81
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2015 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 23/2016 assinado em 14/09.
- **Consultora Vencedora:** NTConsult Tecnologia e Consultoria Ltda.
- **Valor do Contrato:** 1.434.107,25
- **Sinalização em relação ao Prazo:**



SECITECE

SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 28: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.


- **Responsável:** Sandra Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 87.362,46
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Fevereiro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 16/2016, assinado em 06/07/2016.
- **Consultora:** Maria Fatima Ludovico da Gama e Souza.
- **Valor do Contrato:** R\$ 138.720,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SEPLAG

SEPLAG - Assistência Técnica - Gestão Pública

Subprojeto 56: Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Aduino Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 481.856,65
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído. Aguardando o pagamento.
- **Consultora vencedora:** Consórcio Macroplan e Transplan.
- **Valor do contrato:** 913.714,44.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 57: Consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.128.001,21
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 023/2015. Serviço em Execução.
- **Consultora vencedora:** Macroplan Prospectiva, Estratégia e Gestão S/S Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ 2.143.275,24
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 59: Consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Dominique Gomes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 317.051,64
- **Método de Aquisição:** SBQ
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Outubro 2016 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Contrato e ordem de serviço assinados em 04/10/2016. Realizado 1ª reunião de partida do projeto. Aguardando a publicação no DOE.
- **Consultora vencedora:** Consórcio IADH x DELOS.
- **Valor do contrato:** R\$ 1.025.662,05.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

SEPLAG - Assistência Técnica - Gestão Pública

*Subprojeto 60: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para **Auditar a Folha de Pagamento** do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Fábio Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 529.102,21
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2016 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato assinado e emitido a Ordem de Serviço em 16/09/2016.
- **Consultora vencedora:** Deloitte Touche Tohatsu Consultores LTDA .
- **Valor do contrato:** R\$ 1.800.000,00
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

SEPLAG - Assistência Técnica – Fiduciário

Subprojeto 63: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 238.726,47
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2016– Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato assinado em 22/11/16. Aguardando publicação.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



STDS

STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 70: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 64.213,69
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Novembro 2016
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído - Consultora Maria Cílvia Queiroz.
- **Valor do Contrato:** R\$ 121.000,00.


STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 71: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 63.174,42
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Setembro 2015
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Consultora Vencedora:** Empresa Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 142.850,00.

STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 72: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará


- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 892.888,73
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico (NCB)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução - Contrato nº 058/2016, assinado em 25/05/2016.
- **Consultora Vencedora:** Maestria Comunicação e Eventos LTDA- EPP.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.019.000,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



ARCE

ARCE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 1: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.

- **Responsável:** Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Subprojeto:** US\$ 371.040,45
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2016 – Janeiro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 019/2016, assinado em 14/06/2016.
- **Consultora Vencedora:** RPG – Regulation, Performance and Governace LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 838.996,66.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



COGERH


COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 67: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Quali-quantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 663.482,08
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em execução – Contrato 48/2015, assinado em 24/11/2015.
Consultora Vencedora: Consórcio Água e Solo / Quanta / Engeplus.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.908.665,65.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 68: Termo de Referência para Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 742.914,10
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2016 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Contrato em execução – Contrato 21/2016, assinado em 19/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Nippon Koei Latin America - Caribbean Co. Ltd. / Nippon Koei LAC do Brasil Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.403.327,11.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 69: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor Subprojeto:** US\$ 27.326,28
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2015 – Outubro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato concluído.



FUNCEME

FUNCEME - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 13: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.

- **Responsável:** Francisco Hoilton
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Proposta Vencedora:** €267.442,11 + R\$ 687.325,77 equivalente a R\$ 1.492.246,27
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Setembro 2016 – Março 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 10/2015, assinado em 09/09/2015.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Aqualogus / Azurit.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.492.246,27.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SDE / ADECE

SDE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 24: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.

- **Responsável:** Fernando Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 353.142,52
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2016 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato assinado em 26/08/2016.
- **Consultora Vencedora:** Ivia Serviços de Informática Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.142.416,04
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SDE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 25: Impact Evaluation Workshop Instambul

- **Responsável:** Inês Studart
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 2.894,02
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Maio 2015.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.



SEDUC

SEDUC- Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 33: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 4.466,03
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Julho 2015
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 38: Contratação de Consultor Individual Especialista em **Avaliação de Programas para Identificar o Impacto** do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)*

- **Responsável: SEDUC** - Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor Subprojeto:** US\$ 4.139,40
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2014 – Maio 2016
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 39: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 25.207,85
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Agosto 2015
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 40: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 29.188,04
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Agosto 2015
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído

SEDUC - Assistência Técnica –Assistência à Família

*Subprojeto 41: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de **Arte Gráfica/Design**, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 61.838,85
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Setembro 2016
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Consultora Vencedora:** Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 139.830,00.

SEDUC - Assistência Técnica –Assistência à Família

Subprojeto 42: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 202.891,81
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2016 – Setembro 2017
- **Estágio Atual:** Contratado em Execução – Contrato nº 236/2016, assinado em 30/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** CASAM – Centro de Apoio Social e de Animação Missionária.
- **Valor do Contrato:** R\$ 656.355,00
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 43: Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 309.109,89
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2016 – Setembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 214/2016, assinado em 12/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** VC Promoções e Eventos Ltda – EPP.
- **Valor do Contrato:** R\$ 999.970,50.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 44: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados).

- **Responsável: SEDUC** – Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 1.155.818,22
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Outubro 2017
- **Estágio Atual:** Contratado em Execução – Contrato nº 214/2016, assinado 28/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** OVERVIEW SERVICOS & INFORMACAO LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 3.739.071,95
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 45: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN

- **Responsável: SEDUC** – Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 41.489,95
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2016 – Outubro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contratado em Execução – Contrato nº 253/2016, assinado 19/10/2016.
- **Consultora Vencedora:** Rafaela Martins Leite Monteiro.
- **Valor do Contrato:** R\$ 63.000,00
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SEMA

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 46: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto “AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.” (AIEDA)

- **Responsável:** Maria Dias / Magda Marinho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 376.432,70
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2016 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 18/2016, assinado em 16/08/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Aquino – Mcrit SL – Barcelona Brasil Group.
- **Valor do Contrato:** R\$ 885.207,23.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 47: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 314.274,86
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2016 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 06/2016, assinado em 25/02/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Engesoft Engenharia / Quanta Consultoria Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 710.638,32.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 48: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicos.

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor Subprojeto:** US\$ 107.269,38
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 26/2016, assinado em 26/11/2015.
- **Consultora Vencedora:** Empresa MSV Multiserviços ME.
- **Valor do Contrato:** R\$ 242.557,52.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 49: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Maria Dias / Francisco Leorne
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** 174.236,97
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2014 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 16/2016, assinado em 05/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** Arcadis Logos S.A.
- **Valor do Contrato:** R\$ 563.157,73.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 51: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 1.153.752,25
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2016 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 20/2016, assinado em 01/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** Bureau de Projetos e Consultoria Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.608.864,60.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████



SEMACE

SEMACE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 54: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a **Manualização dos Procedimentos Técnicos** dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.*


- **Responsável:** Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 207.916,23
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2016 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 20/2016, assinado em 13/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** MBS CONSULTING – MBS Estratégias e Sistemas LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 672.609,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SRH

SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 64: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.

- **Responsável:** Deborah Mithya e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 446.328,65
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2016 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato N° 02/2016, assinado em 27/10/2016.
- **Consultora Vencedora:** IBI Engenharia Consultiva.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.396.292,47
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 65: Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. **SIGERH***

- **Responsável:** Deborah Mithya e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 418.975,09
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2016 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 01/2016, assinado em 18/05/2016.
- **Consultora Vencedora:** CAPGEMINI CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.306.323,41.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 66: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - **Malha D'agua.***


- **Responsável:** Deborah Mithya e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do TOR:** US\$ 152.839,20
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2016 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 01/2016, assinado em 18/05/2016.
- **Consultora:** Dorian Ponte Lima – R\$ 288.000,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



TCE

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 73: Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.

- **Responsável:** Glinton Ferreira / Delinda Almeida
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 843.588,82
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/ Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato Nº 21/2016 em Execução.
- **Consultora Vencedora:** Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
- **Valor do Contrato:** 2.699.484,21.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 74: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 84.010,26
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato concluído.

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 75: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 100.915,62
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato concluído.



7. APROVAÇÃO DA ATA

34ª REUNIÃO COMITÊ *PforR* (24/11/2016)

Próxima Reunião do Comitê PforR

Próximas Reuniões do Comitê PforR:

| ANO 2017 | |
|-----------|------------------|
| MÊS | DIA ¹ |
| JANEIRO | 26 |
| FEVEREIRO | 23 |
| MARÇO | 30 |
| ABRIL | 27 |
| MAIO | 25 |
| JUNHO | 29 |
| JULHO | 27 |
| AGOSTO | 31 |
| SETEMBRO | 28 |
| OUTUBRO | 26 |
| NOVEMBRO | 30 |
| DEZEMBRO | 21 |

14h30m

IPECE



8. ENCAMINHAMENTOS

Encaminhamentos da 34ª Reunião realizada em 24/11/2016

- ✓ Todos os encaminhamentos foram realizados.



9. ENCERRAMENTO



*Natal é tempo de esperança e reflexão.
Que o nascimento de Cristo permita-nos
refletir o ano que se encerra renovando a
esperança de novos tempos!*

*A UGP PforR deseja à todos
Boas Festas!*

Unidade de Gerenciamento do Projeto PforR (UGP)
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora
Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N
Ed. SEPLAG, 2º andar- Fortaleza-CE
Tel.: (85) 3101.3499 e (85) 3101.3510
