



**10ª REUNIÃO DO COMITÊ *PforR***  
**ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO**  
**PROJETO *PforR***

**20 DE NOVEMBRO DE 2014**



## PAUTA DA REUNIÃO

# Pauta da Reunião

1. Abertura e apresentação dos participantes (14h30 - 14h40);
2. Posição dos Programas, Indicadores, Projetos de Assistência Técnica por Setorial e Plano de Ação em Outubro 2014 (14h40 - 15h):
  - ✓ Sumário da Posição da execução Orçamentária dos Programas do Escopo do PforR - Heloísa Cunha;
  - ✓ Sumário da Posição dos Indicadores com metas para o Segundo Semestre de 2014 - Laura Gonçalves;
  - ✓ Sumário da Posição dos encaminhamentos do Plano de Ação - Laura Gonçalves;
  - ✓ Sumário da Posição da realização dos Projetos de Assistência Técnica - Giuseppe Nogueira e Viviane Costa;
3. *Program Appraisal Document* (PAD) do PforR: Foco Capacitação Profissional (15h-16h10m):
  - ✓ Apresentação da Proposta e Lógica no PAD do Tema Capacitação Profissional – Witalo Paiva (10 min)
  - ✓ Apresentação do Resumo do Documento da Estratégia - Witalo Paiva (10 min)
  - ✓ Apresentação do Resumo do Projeto de Governança - Avilton Júnior e Witalo Paiva (10 min)
  - ✓ Apresentação do Comitê Técnico Intersetorial - Marilda dos Santos (10 min)
  - ✓ Apresentação do Envolvimento da SECITECE - Luiz Carlos Dodt (10 min)
  - ✓ Apresentação do Envolvimento da SEDUC – Andréa Rocha (10 min)
  - ✓ Apresentação da proposta do acompanhamento dos Egressos - Victor Hugo (10 min)
4. Encaminhamentos (16h10m - 16h30m);
  - ✓ Aprovação da Ata da 9ª Reunião de 16/10/14 - minuta enviada em 12/11/14 para revisão do Comitê.
  - ✓ Proposta para discussão nas próximas reuniões do Comitê: Lógica PAD dos temas Gestão Pública e Qualidade da Água.
5. Encerramento (16h30m)



# 1. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES



## 2. POSIÇÃO DOS PROGRAMAS, INDICADORES, PLANO DE AÇÃO E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POSIÇÃO EM 31 DE OUTUBRO DE 2014

# Legendas

## Indicadores:



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

## Assistência Técnica:



Realização do projeto dentro do Plano de Licitações



Realização do projeto com atraso de um dia



Realização projeto com atraso de mais de 3 meses

## Programas:



Execução do previsto orçado no período, conforme critérios acordados com Setorial



Execução de menos do previsto orçado no período, conforme critérios acordados



Nenhuma Execução



## Sumário da Posição da Execução Orçamentária dos Programas do Escopo do *PforR*

# Posição dos Programas

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Outubro 2014											
Setorial	Programa	Iniciativa	Previsão (R\$ milhões)			Realizado	Realizado / Previsto (%)	Farol			
			Projeto	2014	out/14	31/10/2014					
1	SEDUC	014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional	1	00328	383,23	105,78	86,55	77,52	90%	Amarelo	
			2	00771	209,52	25,30	20,70	50,23	243%	Verde	
			3	00834	119,35	1,70	1,39	15,47	1112%	Verde	
2	STDS	050 - Assistência Social	4	03180	34,18	7,30	5,97	5,30	89%	Amarelo	
3	SRH/ COGERH	041 - Gestão dos Recursos Hídricos	5	05310	6,50	1,20	0,98	0,00	0%	Vermelho	
			6	05311	2,43	0,00	-	-	-	-	-
			7	05273	14,39	1,81	1,48	1,08	73%	Amarelo	
4	CIDADES/ CAGECE	032 - Saneamento Ambiental	8	0392	16,73	5,65	4,62	0,00	0%	Vermelho	
	CONPAM		9	03104	13,35	0,00	-	-	-	-	
5	SEMACE	082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais	10	04815	1,74	0,40	0,33	0,49	150%	Verde	
	SEMACE		11	02466	1,74	0,40	0,33	0,00	0%	Vermelho	
	SEMACE		12	05170	30,28	6,95	5,69	1,05	18%	Amarelo	
	SEMACE		13	05155	0,70	0,15	0,12	0,00	0%	Vermelho	
6	FUCEME	079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará	14	02846	17,21	1,10	0,90	1,19	132%	Verde	
	FUCEME		15	02847	0,10	0,09	0,09	0,00	0%	Verde	
<b>Total</b>					<b>851,45</b>	<b>157,83</b>	<b>129,15</b>	<b>152,31</b>	<b>117,94%</b>		



## Posição dos Programas

### ✓ **Lembrete:** Regras Programas

A execução dos programas deve observar as seguintes restrições:

- Devem excluir despesas que são financiadas pelo próprio BIRD ou por outras operações de crédito, ou seja, não é permitido a alocação de recursos do BIRD ou outras operações de crédito para custear despesas dos programas e iniciativas do componente
- Verificar a lista negra do BIRD a cada licitação, antes de assinar contrato. Para atender o Art. 42 da Lei 8.666/93 a SEPLAG incluiu no orçamento de cada ação um valor na fonte 69;
- Não podem apresentar impacto sócio ambiental negativo;
- Os valores dos contratos não podem exceder os limites abaixo:
  - Obras – inferior a US\$ 50 milhões
  - Bens – inferior a US\$ 30 milhões
  - Sistemas de TIC – inferior a US\$ 20 milhões
  - Consultorias – inferior a US\$ 15 milhões.



## Sumário da Posição dos Indicadores com metas para o 2º Semestre de 2014

# METAS: 2º Semestre 2014 – INDICADOR PRIMÁRIO

Tema	Nº	Nome do Indicador	Setorial	Responsável	Meta	Status	Valor Desembolso US\$ Milhões
Gestão Pública	1	Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos	SEPLAG	Avilton Júnior	Aprovação de modelo para o alinhamento dos incentivos.	Esse Indicador não será cumprido esse ano, pois está vinculado a contratação de consultoria. O processo licitatório está na fase de recebimento dos portfólios das empresas da 2º publicação da MI.	6,198
	2	Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada					
Crescimento Econômico	3	Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação	CEDE	Marilda Rocha	Documento de estratégia finalizado	No dia 02 de dezembro acontecerá um Workshop sobre a Estratégia a fim de concluir o Documento da Estratégia de desenvolvimento.	6,198
Sustentabilidade Ambiental	4	Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	CAGECE	Carlos Rossas	84.3%	84,84%	6,198
	5	Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	CONPAM	Tereza Farias Ulisses Rolim	40%	45,30%	6,198
<b>TOTAL</b>							<b>30,99</b>

## Valores 2º Semestre 2014 – INDICADOR SECUNDÁRIO

Tema	Nº	Nome do Indicador	Setorial	Responsável	Meta	Status
Crescimento Econômico	1	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	IPECE	Victor Hugo	27,8	25.403
Redução da Pobreza	2	Criação e funcionamento do multisetorial do Comitê Consultivo ECD (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE)	SEPLAG	Lara Costa	Duas resoluções publicadas	O Comitê tem uma Resolução aprovada e elaborou um Plano de Ação que resultará na segunda resolução. Plano este que aguarda aprovação do Comitê na próxima reunião que ocorrerá na semana do dia 17-21/11.
Sustentabilidade Ambiental	3	Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	COGERH	Fábio Lima/Sarah Freire/Disney	62.7	77,6
	4	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas		Adahil Sena	Termos de referência elaborados	Os Termos estão em fase de elaboração. Foi agendada uma reunião com a UGP e a Cogerh para a próxima semana (24-25/11) a fim de propor um Plano de Ação para a execução deste indicador.
	5	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.		Adahil Sena	Proposta e consultas completos	A lei de proteção de bacias hidrográficas é decorrente da elaboração do Plano de Segurança Hídrica.



## Sumário da Posição dos Encaminhamentos do Plano de Ação

# Plano de Ação

Plano de Ação - PforR						
Descrição da Ação	Responsável	Período	Indicador	Coordenação	Encaminhamentos	Posição em Outubro
1 A. Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar (incluindo a busca ativa de famílias vulneráveis)	SEDUC, STDS e Gabinete do Governador	Durante o primeiro ano	Aumento do número de crianças indígenas e quilombolas atendidas em creches ou recebem atenção domiciliar (proporcional às metas gerais do projeto).	STDS - Sebastião Lopes	a) Cruzar as informações da CEPIR com as da STDS sobre comunidades indígenas e quilombolas nos 36 municípios e concluir o levantamento.	Após a reunião com o Especialista do Banco Mundial Alberto Costa a STDS estabeleceu um cronograma para cada um dos encaminhamentos o qual foi enviado ao BM para apreciação e acompanhamento.
					b) Realizar reunião com IPECE sobre a proposta de avaliação de impacto do PADIN, e sobre o levantamento do total e localização de famílias quilombolas e indígenas nos 36 municípios.	
c) A SEDUC vai viabilizar junto ao consultor individual para elaboração do material (cartilha/manual), que insira capítulo sobre a questão indígena e quilombola.						
d) Sistematizar a versão preliminar da estratégia a ser adotada para o Plano.						
B. Inclusão de um módulo de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas de ensino) no programa de treinamento de professores dos cursos de capacitação profissional	SEDUC e Gabinete do Governador	Durante o primeiro ano	Módulo desenvolvido em colaboração com a FUNAI, Associações Quilombolas e Coordenadoria para a Igualdade Racial.	SEDUC - Andréa	A SEDUC, o GabGov e a equipe da Coordenadoria da Diversidade (SEDUC) identificaram que os módulos proposta já estão sendo realizados pela Secretaria. Da Educação.	A meta da SEDUC foi considerada cumprida pelo Especialista Alberto Costa, no entanto a SEDUC deve enviar até o dia 30/11 a metodologia utilizada na formação dos professores.

# Plano de Ação

Plano de Ação - PforR						
Descrição da Ação	Responsável	Período	Indicador	Coordenação	Encaminhamentos	Posição em Outubro
<b>2</b> <b>C.</b> Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas). <b>D.</b> Exclusão das áreas em que a execução das obras civis venha a requerer o reassentamento involuntário ou a relocação de famílias (com ou sem título de propriedade)	PGE, SEDUC	Durante o primeiro ano	Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.	SEDUC - Joízia	A Empresa é responsável por realizar a Varredura Fundiária e a SEDUC monitora através dos contratos.	O cronograma estabelecido para a entrega do relatório é junho de 2015.
					Das 22 obras de EEEP, 12 Obras já estão com documentação do terreno, certidões dos imóveis.	O cronograma estabelecido para a entrega do relatório é dezembro de 2014.
<b>3</b> <b>E.</b> Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água  <b>F.</b> Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água	COGERH, CONPAM, SRH (em consulta junto à FUNAI)	Até o fim do segundo ano	Os planos de segurança hídrica para as três microbacias estratégicas incluem medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (definidas em consulta junto às comunidades afetadas – inclusive os povos indígenas). Documentar de maneira efetiva o apoio da comunidade indígena à sua elaboração.	COGERH - Adahil	Verificar se os Termos de Referência já incluem diretrizes relativas à provisão de "medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais. Em seguida realizar consultas com as comunidades indígenas para obter seu amplo apoio aos Planos que sejam elaborados.	Os Termos de Referência que irão iniciar o processo de licitação para contratação de consultoria que irá elaborar o Plano estão em fase de conclusão.
						CONPAM, SEMACE, COGERH, CAGECE




## Sumário da Posição da realização dos Projetos Assistência Técnica



# Posição dos Projetos Assistência Técnica


## 51 PROJETOS NO PLANO DE LICITAÇÃO

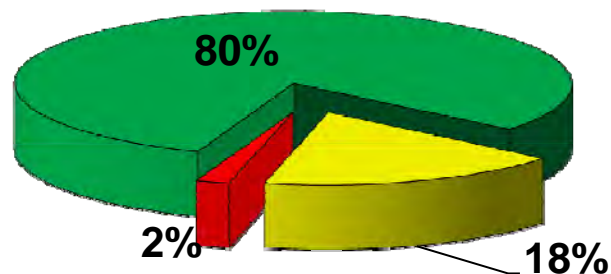

- Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
- Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia
- Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses

	Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações	<b>41 PROJETOS:</b> ARCE (1), ADECE (2), CGE (4,5,6,7), CONPAM (9,11,12,13), FUNCEME (14), IPECE (15,16,18,19,20), PGE (21), SECITECE (22,23,24,25,26,27), SEDUC (28,29,30,31,32,33,34), , SEPLAG (37,38,42,43,44,45), , SRH (46,47,48,49), TCE (48)
	Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia	<b>9 PROJETOS:</b> CGE (3), CONPAM (8,10), IPECE (17),SEPLAG (39, 40,41), SEMACE (36),STDS (47)
	Vermelho - Realização projeto com a traso de mais de 3 meses	<b>1 PROJETO:</b> SEDUC(35)


# Posição dos Projetos Assistência Técnica

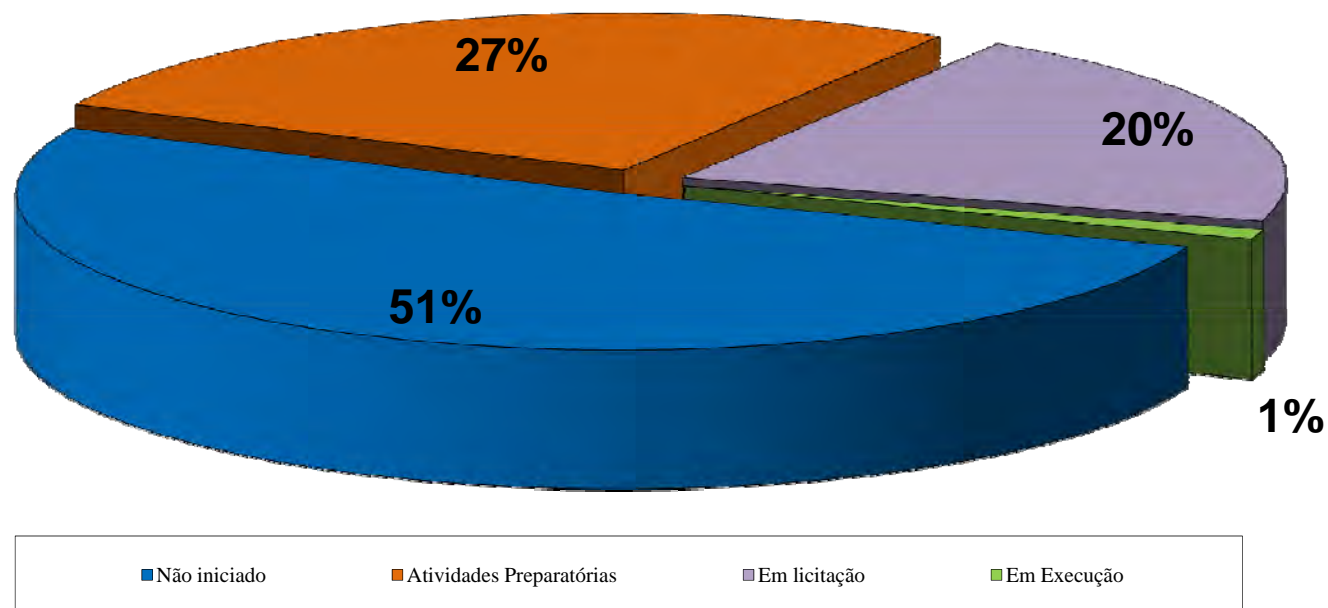

■	<b>Não iniciado conforme Plano de Licitação</b>	<b>42 SUBPROJETOS</b> CGE (4,5 - 3TdR), IPECE (15 - 2TdR, 16,18,19,20), SECITECE (22,23,24,25,26), SEDUC (29,30,31,32,33,35 - 5 TdR), SEMACE(36 -1TdR),SEPLAG (37 - 4TdR, 38,39 - 3TdR, 40 - 1TdR, 41 - 1TdR, 42, 44), SRH (46, 49), STDS(50-2TdR)
■	<b>Atividades Preparatórias</b>	<b>22 SUBPROJETOS</b> ADECE(2), CGE (6,7),COMPAM (9,11,12,13 - 3TdR), PGE (21), , SEDUC (28,34 - 2TdR, 35 - 2TdR), SEPLAG (43- 2TdR, 45), SRH(48), TCE (51 - 3TdR)
■	<b>Em Licitação</b>	<b>17SUBPROJETOS</b> ARCE (1), CGE (3), COMPAM (8,10), FUNCEME (14), IPECE (17), SECITECE (27),SEDUC (35 - 3TdR), SEMACE (36- 1TdR), SEPLAG(39-1TdR, 40 - 1TdR, 41 - 1TdR), SRH (47), STDS (50-2TdR)
■	<b>Em Execução</b>	<b>2 SUBPROJETOS</b> IPECE(15- 2TdR)

# Posição dos Projetos Assistência Técnica

## 41 SUBPROJETOS EM ANDAMENTO

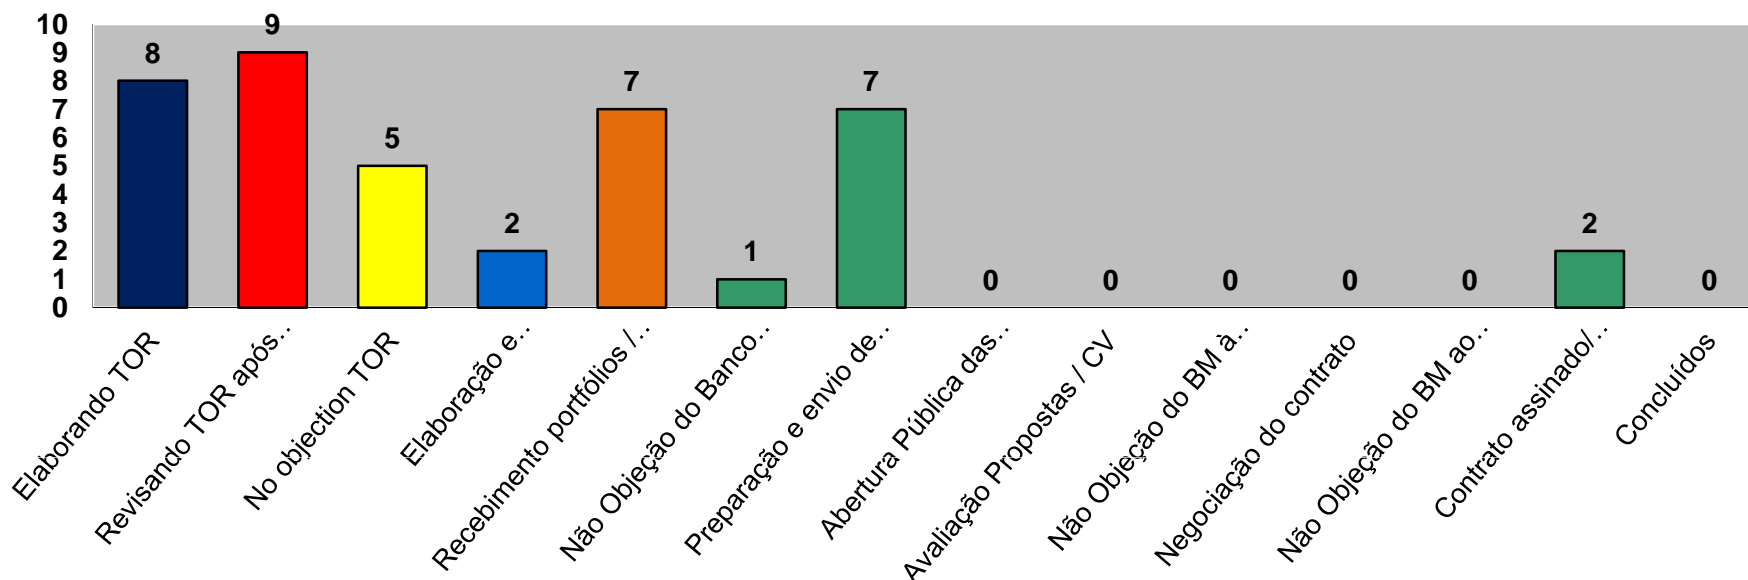

Etapas		Setoriais
1	Elaborando TR	ADECE(2), CGE (6,7), SEDUC(28, 35 - 2TdR), SEPLAG(43-1TdR), SRH(48) – <b>TOTAL 08</b>
2	Revisando TR após envio ao BM	CONPAM (11,12,13-3TdR), PGE(21), SEDUC (34 - 2TdR), SEPLAG(43 - 1TdR) – <b>TOTAL 09</b>
3	No objection TR	CONPAM(9), SEPLAG (45), TCE(51-3TdR) – <b>TOTAL 05</b>
4	Elaboração e publicação MI/Edital	SECITECE(27), SEPLAG (41-1TdR) – <b>TOTAL 02</b>
5	Recebimento portfólios / CV, Preparação Lista Curta e SDP	CONPAM (8,10), IPECE(17), SEMACE(36- 1TdR), SEPLAG (40 - 1TdR), STDS(50-2TdR) – <b>TOTAL 07</b>
6	Não Objeção do Banco Mundial (SDP)	SRH(47) – <b>TOTAL 01</b>
7	Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta) ou convocação do CI para negociação	ARCE(1),CGE(3),FUCEME(14), SEDUC(35 - 3TdR), SEPLAG(39-1TdR) – <b>TOTAL 07</b>
8	Contrato assinado/ Prestando Serviço	IPECE (15 - TdR 2) – <b>TOTAL 02</b>

# Posição dos Projetos Assistência Técnica

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

1. Publicações de Manifestações de Interesse;
2. Retorno dos comentários do BM ou UGP;
3. Análise de currículos;
4. Composição da Lista Curta (empresas x instituições sem fins lucrativos);



# DETALHAMENTO POR SETORIAL



# CEDE / ADECE



# INDICADOR PRIMÁRIO

## Indicadores – Capacitação Profissional

**Indicador Primário: Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação.**

**Responsável:** Marilda dos Santos

- **Meta 2014:**

1º semestre - Comitê instituído pelo decreto;

2º semestre - Documento de estratégia finalizado

- **Posição em 31/10:** No dia 02 de dezembro acontecerá um Workshop sobre a Estratégia a fim de concluir o Documento da Estratégia de desenvolvimento.
- **Posição em 31/10 em relação à meta:** ██████████
- **Perspectiva de Cumprimento:** Existe a possibilidade do cumprimento da meta





# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

# Assistência Técnica - Capacitação Profissional

**Projeto: *Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas***

- **Responsável:** Cláudio Frota
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 200.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 196.442,10
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Novembro 2014 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TOR
- **Estágio Atual:** Recebido da Setorial o TdR após análise da COETI em 17/11/14, para análise da UGP.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



# CIDADES



# PROGRAMAS

# Programas – Qualidade da Água

## Programa: 032 - SANEAMENTO AMBIENTAL

- **Setoriais envolvidas:** Cidades/CAGECE
- **PPA Iniciativa:** 02617 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário – CAGECE
- **Ação:** 19849 - Estruturação de Esgotamento Sanitário em Localidades Urbanas
- **Total Previsto para 2014 - 2017:** R\$ 15,82
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 5,65
- **Periodicidade da execução:** Os processos licitatórios para contratação dos serviços ainda estão em andamento. Provavelmente a execução terá início no final do ano.
- **Realizado até 31/10/14:** R\$ 0,00
- **Farol:** ██████████

A CIDADES criou uma nova iniciativa (5384) e ação (21751) para o PforR para os anos de 2015 – 2017.



# CAGECE



# INDICADOR PRIMÁRIO

## Indicadores – Qualidade da Água

**Indicador Primário: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.**

**Responsável:** Carlos Rossas

- **Meta 2014:**

1º semestre - 83.8%

2º semestre - 84.3%

- **Posição em 31/10:** 84,84%

- **Posição em 31/10 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Existe a possibilidade do cumprimento da meta





# CGE



# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

# Assistência Técnica - Gestão Transversal - Auditoria


## Projeto 1: Auditoria Técnica dos Indicadores

Termo: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 400.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 368.279,25
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Abril 2014 – Novembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução
- **Estágio Atual:** Realizando negociações com Consultor selecionado, após recomendações do BM durante a Missão do mês de Outubro.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

# Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

## Projeto 2: *Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais*

- **Responsável:** Marcelo Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 875.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Junho 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

# Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

## Projeto 3: *Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social*


### *TOR I – Aprimoramento do Portal da Transparência*

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015– Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

### Projeto 3: *Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social*

*TOR II – Aprimoramento do Sistema de Ouvidoria – SOU (Ouvidoria e Acesso à Informação).*

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015– Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

# Assistência Técnica - Sistema Fiduciário


## Projeto 3: *Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social*

### *TOR III – Capacitação da população para o Controle Social*

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2015 – Maio 2018
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

### Projeto 4: *Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.*

- **Responsável:** Denise Andrade Araújo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 150.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC/SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2014 – Outubro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR analisado pela UGP em 17/11/14 e encaminhado a setorial para ajustes e elaboração da MC.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



## Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

### **Projeto 5: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.**

- **Responsável:** Marcelo Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor:** US\$ 100.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC/SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Novembro 2014 – Outubro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR analisado pela UGP em 17/11/14 e encaminhado a setorial para ajustes e elaboração da MC.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



# CONPAM



# INDICADOR PRIMÁRIO

# Indicadores – Qualidade da Água

**Indicador Primário: Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.**

**Responsável** - Tereza Farias e Ulisses Rolim

- **Envolvidos:** SRH, COGERH e SEMACE

- **Meta 2014:**

1º semestre - 28%

2º semestre - 40%

- **Posição em 31/10:** 45,30%

- **Posição em 31/10 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta



# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

# Assistência Técnica - Qualidade da Água

## **Projeto 1: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.**

Termo I: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto “AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.”

- **Responsável:** Tereza Farias e Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 450.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 416.854,24
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Não Objeção do BM do RFLC e SDP
- **Estágio Atual:** SDP analisada pela UGP e enviada a Setorial em 17/11/14 com observações.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

# Assistência Técnica - Qualidade da Água

## Projeto 2: Capacitação para o pessoal técnico municipal.

Termo I: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para A Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas

- **Responsável:** Tereza Farias e Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 720.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 516.853,97
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Abril 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** TdR e MC revisados pela UGP em 17/11/17 e enviado ao BM para NO

XXXX

- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Qualidade da Água

### **Projeto 3: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.**

Termo I: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Tereza Farias e Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 540.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 225.006,01
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Junho 2014 – Junho 2015
- **Estágio Previsto:** Não Objeção da BM da Avaliação Técnica
- **Estágio Atual:** SDP analisada pela UGP e enviada à Setorial em 05/11/14 observações a serem providenciadas, para posterior envio ao BM para NO
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**



## Assistência Técnica - Qualidade da Água

### **Projeto 4: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.**

Termo I - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Tereza Farias e Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 224.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 221.437,94
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2014 - Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** Aguardando retorno da Setorial com o TdR revisado desde o dia 04/06/14 e 13/06/14 .
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## Assistência Técnica - Qualidade da Água

### Projeto 5: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.

Termo I: TOR - Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".

- **Responsável:** Tereza Farias e Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.345.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 1.344.963,40
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Novembro 2014 – Novembro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** NO do TdR datada no dia 25/06/14 e enviada à Setorial para prosseguimento do Processo de Seleção.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Qualidade da Água

### Projeto 6: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.


Termo I: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Tereza Farias e Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 2.242.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 1.120.935,31
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Novembro 2014 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TDR
- **Estágio Atual:** NO do TdR condicional do BM em 28/07/14, encaminhada à setorial na mesma data para adequações.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Qualidade da Água

### Projeto 6: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.


Termo II: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver **plano de comunicação** para implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Tereza Farias e Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 2.242.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 661.746,51
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Novembro 2014 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** TdR sendo discutido com a Casa Civil
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Qualidade da Água

### Projeto 6: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

Termo III: Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas (**Equipamentos**)


- **Responsável:** Tereza Farias e Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Serviço de Não Consultoria
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 2.242.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 459.318,18
- **Método de Aquisição:** NCB
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Novembro 2014 – Junho 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** TOR analisado pelo BM e enviado para setorial para providenciar adequações em 30/07/2014 .
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



# PROGRAMAS

## Programas – Qualidade da Água

### Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- **Setoriais envolvidas:** CONPAM
- **PPA Iniciativa:** 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.
- **Ação:** 14190 - Elaboração dos Planos de Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 15,12
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 00,00
- **Realizado até 31/10/14:** R\$ 00,00
- **Periodicidade:** Frequência da execução quadrimestral
- **Farol:** 



# SEMACE





# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

# Assistência Técnica - Qualidade da Água

## Projeto 1: *Fortalecimento da gestão ambiental estadual*

Termo I: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a **manualização dos Procedimentos Técnicos** dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.

- **Responsável:** Maurício Giffoni
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.054.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 285.232,19
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2014 – Outubro 2015
- **Estágio Previsto:** Envio da SDP a Lista Curta
- **Estágio Atual:** RFLC analisado pela UGP e enviado comentários a serem ajustados pela Setorial em 05/11/14. Aguardando a SDP.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

# Assistência Técnica - Qualidade da Água

## Projeto 1: *Fortalecimento da gestão ambiental estadual*

Termo II: Contratação de Consultoria especializada que irá ministrar **Cursos de Capacitação** para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente

- **Responsável:** Maurício Giffoni
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.054.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Novembro 2014 – Junho 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** Aguardando retorno da Setorial com o TdR revisado desde 18/03/14 para NO do BM.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



# PROGRAMAS

## Programas – Qualidade da Água

### Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- **Setoriais envolvidas:** SEMACE
- **PPA Iniciativa:** 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.
- **Ação I:** 19861 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 14,59
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 0,40
- **Realizado até 31/10/14:** R\$ 0,49
- **Realizado/Previsto (%):** 150%
- **Periodicidade:** Frequência da execução quadrimestral
- **Farol:** 

## Programas – Qualidade da Água

### Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- **Setoriais envolvidas:** SEMACE
- **PPA Iniciativa:** 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.
- **Ação I:** 21570 - Monitoramento da Poluição / Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado.
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 13,89
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 0,40
- **Realizado até 31/10/14:** R\$ 00,00
- **Realizado/Previsto (%):** 0%
- **Periodicidade:** Frequência da execução quadrimestral
- **Farol:** ██████████

## Programas – Qualidade da Água

### Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- **Setoriais envolvidas:** SEMACE
- **PPA Iniciativa:** 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.
- **Ação I:** 21317 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 20,62
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 6,95
- **Realizado até 31/10/14:** R\$ 1,05
- **Realizado/Previsto (%):** 0%
- **Periodicidade:** Frequência da execução quadrimestral
- **Farol:**

## Programas – Qualidade da Água

### Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- **Setoriais envolvidas:** SEMACE
- **PPA Iniciativa:** 05155 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação das praias do litoral cearense.
- **Ação I:** 21571 - Monitoramento da Poluição / Contaminação das Praias do Litoral Cearense
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 13,39
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 0,15
- **Realizado até 31/10/14:** R\$ 0,00
- **Realizado/Previsto (%):** 0%
- **Periodicidade:** Frequência da execução quadrimestral
- **Farol:** ██████████





# PGE




# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

**Projeto 1: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.**

Termo I: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Valéria Rodrigues
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 525.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 524.818,44
- **Método de Aquisição:** NCB
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração das Especificações Técnicas
- **Estágio Atual:** Em fase de elaboração do Edital de NCB, conforme sugestões do BM, desde do dia 07/10/14.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



# ARCE



# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## Assistência Técnica - Qualidade da Água

**Projeto 1: *Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.***

Termo I: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.

- **Responsável:** Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 400.000,00
- **Valor TOR:** US\$ 391.546,55
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Abril 2014 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Não Objeção do BM
- **Estágio Atual:** Concluída MI em 22/10/14 e Encaminhado o Processo SDP nº 6623304/2014 em 22/10/14, que está aguardando a solução da TI para lançamento.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



# SECITECE



# ASSISTÊNCIA TÉCNICA



## Assistência Técnica – Capacitação Profissional

**Projeto 1: Definir e estabelecer um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas de apoio à inovação.**


Termo I: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para Estabelecer um Sistema de Monitoramento e Avaliação para Coletar dados e Informações Relacionadas com Programas e Iniciativas de Apoio a Inovação.

- **Responsável:** Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 450.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 353.140,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** Aguardando contratação de Consultoria Individual em inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## Assistência Técnica – Capacitação Profissional

### **Projeto 2: Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.**

Termo I: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto :** US\$ 200.000,00
- **Valor TOR:** US\$ 212.900,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** Aguardando contratação de Consultoria Individual em inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica – Capacitação Profissional

**Projeto 3: Avaliação do desempenho e impacto de REDENIT-CE no que diz respeito à sua missão de gestão da inovação e propriedade intelectual e apoiar a transferência de tecnologias para o mercado.**

Termo I: Termo de Referência para Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para Avaliação de Desempenho e Impacto da REDENIT no que diz respeito à sua Missão de Gestão da Inovação e Propriedade Intelectual e Apoio à Transferência de Tecnologias para o Mercado.

- **Responsável:** Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 225.000,00
- **Valor do Termo:** US\$ 246.340,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** Aguardando contratação de Consultoria Individual em Inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## Assistência Técnica – Capacitação Profissional

**Projeto 4: *Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.***

- **Responsável:** Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 75.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** : Aguardando contratação de Consultoria Individual em Inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## Assistência Técnica – Capacitação Profissional

**Projeto 5: Assistência na elaboração de uma avaliação de impacto para o projeto Tecnova (FINEP / SECITECE).**

Termo I: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para assistência na elaboração de uma Avaliação de Impacto para o Projeto Tecnova (FINEP/SECITECE).

- **Responsável:** Edgar Monte Mariano Neto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 50.000,00
- **Valor do Processo:** US\$ 36.440,00
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Agosto 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** Aguardando contratação de Consultoria Individual em Inovação para auxiliar a conclusão do TOR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica – Capacitação Profissional

### Projeto 6: *Suporte Técnico Especializado em Inovação Sênior*

Termo I: Suporte Técnico Especializado em Inovação Sênior- Pessoa Física, visando apoiar a COTEC/SECITECE na elaboração dos Termos de Referência que orientem os processos de contratação, execução e monitoramento de cada uma das Consultorias previstas no Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará, até sua total implantação.

- **Responsável:** Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 170. 612,66
- **Valor do TOR:** US\$ 170.612,66
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Novembro 2016
- **Estágio Previsto:** Publicação da MI
- **Estágio Atual:** Aviso de Manifestação de Interesse publicados em 04/11/14 com data limite de recebimento em 21/11/14
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



# FUNCEME



# ASSISTÊNCIA TÉCNICA



# Assistência Técnica - Qualidade da Água

## Projeto 1: *Metodologia de modelagem de qualidade da água.*

Termo I: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.


- **Responsável:** Francisco Hoilton
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 630.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 591.313,55
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Preparação da SDP
- **Estágio Atual:** Recebido a NO do BM ref. RFLC e SDP e enviado a Setorial em 06/11/14 para conhecimento e continuidade do seleção.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



# PROGRAMAS


## Programas – Qualidade da Água

### Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ

- **Setoriais envolvidas:** FUNCEME
- **PPA Iniciativa:** 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.
- **Ação 1:** 13973 - Modernização e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.
- **Ação 2:** 21421 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de Informações Hidroagrometeorológicas.
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 15,93
- **Previsto para o Ano de 2014 em milhões:** R\$ 1,10
- **Realizado até 31/10/14 em milhões:** R\$ 1,19
- **Realizado/Previsto (%):** 132%
- **Periodicidade:** Frequência da execução quadrimestral
- **Farol:** 

## Programas – Qualidade da Água

### Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ

- **Setoriais envolvidas:** FUNCEME
- **PPA Iniciativa:** 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará. (2)
- **Ação 1:** 14037 - Mapeamento Hidroambiental do Ceará
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 13,69
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 0,09
- **Realizado até 31/10/14:** R\$ 00,00
- **Realizado/Previsto (%):** 0%
- **Periodicidade:** Frequência da execução Anual (previsão de execução de 100% do valor nos meses de novembro e dezembro.
- **Farol:** 



# SEDUC



# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## Assistência Técnica - Capacitação Profissional

**Projeto 1: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.**

Termo I: Termo de Referência para contratação de serviços de Consultoria para Avaliação do Desempenho Acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Andréa Rocha
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 250.000,00
- **Valor do TOR:** U\$ 250.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2014 – Outubro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Recebido da Setorial em 17/11/14 o TdR e MC para análise da UGP.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Capacitação Profissional


**Projeto 2: Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos. Áreas a serem avaliadas, entre outras: gestão administrativa, gestão de recursos humanos, desenho de currículo, serviços de apoio aos estudantes.**

- **Responsável:** Andréa Rocha
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015– Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 




# Assistência Técnica - Capacitação Profissional

## Projeto 3: Implantação de uma sistema de custos para a rede das escolas estaduais de Educação Profissional

- **Responsável:** Andréa Rocha
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 100.000,00
- **Método de Aquisição:** SOF/SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Janeiro 2015– Outubro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 


## Assistência Técnica - Capacitação Profissional

**Projeto 4: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.**

- **Responsável:** Andréa Rocha
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 100.000,00
- **Método de Aquisição:** SOF/SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Novembro 2014 – Outubro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 


## Assistência Técnica - Capacitação Profissional

**Projeto 5: Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.**

- **Responsável:** Andréa Rocha e Edilson Teixeira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 75.000,00
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

# Assistência Técnica - Capacitação Profissional


## Projeto 6: Avaliação de Impacto para um programa inovador para elevar qualidade dos professores do ensino médio das escolas

- **Responsável:** Conceição Ávila
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 100.000,00
- **Método de Aquisição:** SOF/SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Redução da Pobreza

### Projeto 7: *Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.*


Termo I - Contratação de Consultoria de Empresa para o Desenvolvimento das Ações de Formação para o núcleo gestor das creches e pré-escolas dos municípios e regionais de Fortaleza participantes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN – CURSO DE GESTÃO PARA DIRETORES.

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 250.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Novembro 2014 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Aguardando retorno da Setorial com o TdR revisado desde o dia 29/04/14
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Redução da Pobreza

### Projeto 7: *Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.*

Termo II - Contratação de Consultoria e Assessoria de Empresa de Treinamento para o Desenvolvimento das Ações de Formação ofertadas aos Diretores e Coordenadores Pedagógicos de Creches e Pré-Escolas dos Municípios e Regionais de Fortaleza através do Fortalecimento Institucional da Educação Infantil. – CURSO COACHING.

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 500.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Novembro 2014 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Aguardando retorno da Setorial com o TOR revisado desde o dia 30/05/14
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Redução da Pobreza

**Projeto 8: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

Termo I: Contratação de Consultor Individual Especialista em **Avaliação de Programas para Identificar o Impacto** do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do Projeto:** US\$ 14.932,38
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2014 – Fevereiro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Contrato
- **Estágio Atual:** Recebido a NO do RAC em 18/11/14 e enviado a Setorial para continuidade da seleção.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Redução da Pobreza

**Projeto 8: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

Termo II: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 30.055,70
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Fevereiro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Contrato
- **Estágio Atual:** Recebido a NO do BM referente o RAC em 05/11/10, e enviado a Setorial para prosseguimento do Processo.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**



## Assistência Técnica - Redução da Pobreza

**Projeto 8: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

Termo III: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 21.498,73
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Dezembro 2014
- **Estágio Previsto:** Início do Contrato
- **Estágio Atual:** Recebido a NO do RAC em 18/11/14 e enviado a Setorial para continuidade da seleção
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

## Assistência Técnica - Redução da Pobreza

**Projeto 8: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

Termo IV: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em **Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil** e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 91.117,77
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Janeiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR e MC em fase de elaboração, sendo discutido o desmembramento para dois TdR, conforme orientação da PGE.



## Assistência Técnica - Redução da Pobreza

**Projeto 8: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**


Termo V: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de **Arte Gráfica/Design**, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 77.819,45
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração das especificações
- **Estágio Atual:** Em fase de elaboração das especificações técnicas
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## Assistência Técnica - Redução da Pobreza

**Projeto 8: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**


Termo VI: Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 1.000.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2015 – Janeiro 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Redução da Pobreza

**Projeto 8: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**


Termo VII: Realização de formação complementares para o PADIN

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 600.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2015 – Junho 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Redução da Pobreza

**Projeto 8: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

Termo VIII: Análise para compreensão investigativa das relações sociais que envolvam a estrutura familiar

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 132.289,48
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Março 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

# Assistência Técnica - Redução da Pobreza

**Projeto 8: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

**Termo IX: Avaliação do Processo de Construção do PADIN**

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 132.289,49
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Março 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## Assistência Técnica - Redução da Pobreza

**Projeto 8: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

**Termo X: Aquisição de Materiais para Desenvolvimento das Ações do PADIN**

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 400.000,00
- **Método de Aquisição:** NCB
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2015 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração das especificações
- **Estágio Atual:** Em fase de elaboração das especificações Técnicas
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** [REDACTED]





# PROGRAMAS


## Programas – Capacitação Profissional

### Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

- **Setoriais envolvidas:** SEDUC
- **PPA Iniciativa:** 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional (1)
- **Ação I:** 28685 - Manutenção e Funcionamento das Unidades Escolares de Educação Profissional
- **Ação II:** 28686 - Garantia do funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 327,53
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 105,78
- **Realizado até 31/10/14:** R\$ 77,52
- **Realizado/Previsto(%):** 90%
- **Periodicidade:** Execução iniciando em Março 2014 - Frequência Bimestral;
- **Farol:**


## Programas – Capacitação Profissional

### Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

- **Setoriais envolvidas:** SEDUC
- **PPA Iniciativa:** 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- **Ação I:** 19475 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- **Ação II:** 19482 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 156,87
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 25,30
- **Realizado até 31/10/14:** R\$ 50,23
- **Realizado/Previsto (%):** 243%
- **Periodicidade:** Execução iniciando em Março 2014 - Frequência Bimestral;
- **Farol:** 

## Programas – Capacitação Profissional

### Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

- **Setoriais envolvidas:** SEDUC
- **PPA Iniciativa:** 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio.
- **Ação I:** 19483 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 15,12
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 1,70
- **Realizado até 31/10/14:** R\$ 15,47
- **Realizado/Previsto (%):** 1112%
- **Periodicidade:** Frequência da execução quadrimestral
- **Farol:** 



# SEPLAG



# INDICADORES PRIMÁRIOS


## Indicadores – Gestão por Resultado

**Indicador Primário: Número de secretarias do Mutuário usando o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos.**

**Responsável:** Avilton Júnior

- **Meta 2014:**

2º semestre - Aprovação de modelo para o alinhamento dos incentivos

- **Posição em 31/10:** Esse Indicador não será cumprido este ano, pois está vinculado a contratação de consultoria. O processo licitatório está na fase de recebimento dos portfólios das empresas da 2º publicação da MI.
- **Posição em 31/10 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade baixa de atingir a meta
- **Justificativa:** Este Indicador depende da contratação de Consultoria de Empresa.

## Indicadores – Gestão por Resultado

**Indicador Primário: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparados com metodologia aprovada.**

**Responsável:** Aduino Oliveira

- **Meta 2014:**

2º semestre - Aprovação da metodologia

- **Posição em 31/10:** Esse Indicador não será cumprido este ano, pois está vinculado à contratação de consultoria. O projeto está na PGE para lançamento da SDP.
- **Posição em 31/10 em relação à meta:** ██████████
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade baixa de atingir a meta
- **Justificativa:** Este Indicador depende da contratação de Consultoria de Empresa.





# INDICADOR SECUNDÁRIO

## Indicadores – Assistência à Família

**Indicador Secundário: Criação e funcionamento de Comitê Consultivo ECD multissetorial (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE).**

**Responsável - Lara Costa**

- **Meta 2014:**

2º semestre - Duas resoluções publicadas

**Posição em 31/10:** O Comitê tem uma Resolução aprovada e elaborou um Plano de Ação que resultará na segunda resolução. Plano este que aguarda aprovação do Comitê na próxima reunião que ocorrerá na semana do dia 17-21/11.

- **Posição em 31/10 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

- **Justificativa:** O Comitê do Desenvolvimento Infantil realizou a 2a. reunião técnica dia 16.09.2014, quando foi estabelecida uma divisão entre as setoriais membros para composição do Plano de Ação. As contribuições já foram recebidas e consolidadas pelo relator e membro da equipe, e agora o Comitê deve aprovar a versão final do documento na próxima reunião técnica, que deve ocorrer ainda nessa semana.




# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

# Assistência Técnica - Gestão por Resultado

## **Projeto 1: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.**


TOR I: Desenvolvimento de Metodologia para **previsão de receitas** tributárias e Outras Receitas Correntes.

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Novembro/ 2014 – Outubro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Gestão por Resultado

**Projeto 1: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.**


**TOR II: Metodologias para a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará – Matriz Insumo Produto**

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima/ Nicolino Trompieri (IPECE)
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 212.512,75
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Gestão por Resultado

**Projeto 1: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.**

**TOR III: Metodologias para a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará – Indicadores Antecedentes e Coincidentes**

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima/ Nicolino Trompieri (IPECE)
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 87.487,25
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Setembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

# Assistência Técnica - Gestão por Resultado


**Projeto 1: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.**

*TOR IV: Desenvolvimento de **Metodologia** para elaboração e execução do Orçamento Estadual*

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 300.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Junho 2015 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## Assistência Técnica - Gestão por Resultado

**Projeto 2: *Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.***


- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto :** US\$ 800.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



## Assistência Técnica - Gestão por Resultado

**Projeto 3: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.**

TOR I - Termo de Referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada para elaborar o projeto de **Aprimoramento do Modelo de Administração e Gestão de Pessoas** do Governo do Estado do Ceará

- **Responsável:** Cláudia Teixeira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 4.400.00,00
- **Valor do TOR:** 3.310.133,28
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Novembro 2014 – Setembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Recebido do BM Sugestão pra o TdR em 07/11/14 e enviado a Setorial para providências.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Gestão por Resultado

**Projeto 3: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.**

TOR II - Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para **Auditar a Folha de Pagamento** do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Fábio Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 4.400.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 1.089.866,72
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Novembro 2014 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Enviado Email a Setorial com os comentários do BM sobre o TOR a serem considerados e ajustados no termo e MC em 22 10 14.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## Assistência Técnica - Gestão por Resultado

**Projeto 4: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.**

TOR I: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Aduino Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.300.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 400.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Julho 2015
- **Estágio Previsto:** Envio da SDP a Lista Curta
- **Estágio Atual:** Enviado a NO da SDP e Lista Curta a Setorial em 29/10/14 para dá continuidade ao processo da SDP.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

## Assistência Técnica - Gestão por Resultado

**Projeto 4: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.**


TOR II: Implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

- **Responsável:** Aduino Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.300.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 500.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2015 – Abril 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## Assistência Técnica - Gestão por Resultado

**Projeto 4: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.**

Tor III: Capacitação e viagens técnicas para a equipe da SEPLAG

- **Responsável:** Aduino Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.300.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 250.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Janeiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Gestão por Resultado

### Projeto 4: *Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.*

Tor IV: Construção de um modelo de equilíbrio geral computável para economia cearense voltado à avaliação de impacto dos investimentos públicos estaduais.

- **Responsável:** Aduino Oliveira e Witalo Paiva (Ipece)
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.300.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 150.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Setembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## Assistência Técnica - Gestão por Resultado

**Projeto 5: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.**


TOR I: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará(1ª Etapa).

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 839.830,96
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Envio da SDP a Lista Curta
- **Estágio Atual:** Finalizado o recebimento de Portfólios em 11/11/14(REPUBLICAÇÃO).  
Encontra-se em análise na CEL/04 desde 12/11/14, para posterior envio à Setorial.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

## Assistência Técnica - Gestão por Resultado

**Projeto 5: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersectorial.**

TOR II: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial (2ª Etapa)


- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 500.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2016 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



## Assistência Técnica - Gestão por Resultado

**Projeto 6: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.**

*TOR I: Fortalecer a participação cidadã no planejamento, monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Dominique Gomes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 446.073,87
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Preparação da SDP
- **Estágio Atual:** MI e Minuta do TOR enviada para REPUBLICAÇÃO em 07/11/14 com data limite de recebimento até o dia 28/11/14, por não ter dito empresas qualificadas suficientes para compor a lista curta.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Gestão por Resultado


**Projeto 6: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.**

*TOR II: Desenvolvimento de Ferramentas de Suporte à aplicação do modelo de Gestão Participativa.*

- **Responsável:** Dominique Gomes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 1.535.926,13
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2015 – Janeiro 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████


# Assistência Técnica – Capacitação Profissional

**Projeto 7: Avaliação da Estrutura de Governança para os programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo.**

- **Responsável:** Avilton Júnior (SEPLAG)/ Witalo Paiva (IPECE)
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Junho 2015
- **Estágio Previsto:** Elaborando Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

# Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

## Projeto 8: *Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).*

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.000.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Novembro 2014 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

### Projeto 9: *Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.*

TOR: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 196.914,15
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2014 – Março 2016
- **Estágio Previsto:** Manifestação de Interesse
- **Estágio Atual:** TOR E MC analisados pela UGP e encaminhados à Setorial com observações em 17/11/14.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



# IPECE



# INDICADOR SECUNDÁRIO

## Indicadores – Capacitação Profissional

**Indicador Secundário: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).**

**Responsável:** Victor Hugo

▪ **Meta 2014:**

2º semestre - 27,8

▪ **Posição em 31/10:** 25.403

▪ **Posição em 31/10 em relação à meta:** 

▪ **Perspectiva de Cumprimento:** A meta não foi atingida

▪ **Justificativa:** A RAIS informou que o número de trabalhadores de nível técnico formalmente empregados no mercado de trabalho cearense é de 25.403 em 2013.






# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

**Projeto 1: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.**


TOR I: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 500.000,00
- **Valor do Projeto:** US\$ 296.225,77
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Abril 2014 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Contratação
- **Estágio Atual:** Contrato em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial
- **Realizado até 31/10/14:** R\$ 43.560,00
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

**Projeto 1: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.**

TOR II: Ampliação e aquisição de mobiliário para o ambiente da unidade de gerenciamento do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – *PforR*.

- **Responsável:** Deusimar Lira
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor:** US\$ 500.000,00
- **Valor do Projeto:** US\$ 50.000,00
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Fevereiro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração das especificações técnicas
- **Estágio Atual:** Suspenso Temporariamente.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP


**Projeto 1: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.**

TOR III: Aquisições de Equipamentos para Unidade de Gerenciamento do PforR.

- **Responsável:** Deusimar Lira
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor:** US\$ 500.000,00
- **Valor do Projeto:** US\$ 195.000,00
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2015 – Outubro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração das especificações técnicas
- **Estágio Atual:** Em fase de elaboração das especificações
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

**Projeto 2: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE -Sistema Informatizado de Monitoramento.**

- **Responsável:** Mário Aragão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 500.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Novembro 2014 – Outubro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Em fase de elaboração do termo
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica – Capacitação Profissional


### **Projeto 3: Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.**

Termo I: Contratação de Serviço Técnico de Consultoria de Empresa Especializada para a definição e estabelecimento de um Sistema de Inserção e Monitoramento de Egressos da Educação Profissional no Mercado de Trabalho.

- **Responsável:** Victor Hugo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 700.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 650.914,86
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Não Objeção do BM da Lista Curta e SDP
- **Estágio Atual:** Após reuniões com a comissão de avaliação, será republicado o Aviso de Manifestação de Interesse, por não ter tido empresas bem qualificadas para compor a lista curta..
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

# Assistência Técnica – Capacitação Profissional

## **Projeto 4: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.**

- **Responsável:** Victor Hugo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 300.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Setembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Em fase de elaboração do termo.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica – Capacitação Profissional

**Projeto 5: *Elaborar mapeamento dos programas e entidades envolvidas na educação profissional, capacitação e treinamento técnico e tecnológico, para identificar complementaridades e áreas de possível sobreposição de esforços.***


TOR I: Termo de Referência para contratação de Serviço Técnico de consultoria de Empresa Especializada para a Elaboração de um Diagnóstico e estabelecimento de Diretrizes para a Política de Educação Profissional no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Victor Hugo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 75.000,00
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Janeiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração de Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Em discussão com as Setoriais envolvidas e o Banco Mundial a elaboração do Termo
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



## Assistência Técnica – Redução da Pobreza

### Projeto 6: *Criação do Sistema de Monitoramento e Avaliação (M&A) dos projetos financiados pelo FECOP.*

- **Responsável:** Jimmy Oliveira e Mário Aragão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 800.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** A parte técnica do TR está feita, faltando apenas a concepção do Sistema.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



# SRH




# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

# Assistência Técnica - Qualidade da Água

## **Projeto 1: Planejamento Estratégico do Sistema de Recursos Hídricos com Restruturação de Recursos Humanos.**

TOR I: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica para Solução Integrada de Reestruturação Organizacional e Mapeamento de Perfil de Competências para a Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH

- **Responsável:** Paulo Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 370.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Novembro 2014 – Março 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual** TdR encontra-se na fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Qualidade da Água

### Projeto 2: *Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos.*


TOR I: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Qualiquantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

- **Responsável:** Ubirajara Silva (COGERH)
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 670.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 668.936,95
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Não Objeção do BM da Lista Curta e SDP
- **Estágio Atual:** Recebido da Setorial em 17/11/14 RFLC corrigido e SDP para envio ao BM para NO.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Qualidade da Água


### Projeto 3: *Enquadramento dos açudes das bacias estratégicas.*

TOR I: Termos de Referência para Contratação de Consultoria para a Execução do “Projeto de Desenvolvimento e Implantação do Enquadramento dos Açudes Pacoti, Riachão e Gavião”.

- **Responsável:** Adahil Sena (COGERH)
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 670.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Novembro 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TOR na setorial em fase de ajuste, para incorporação de sugestões da UGP desde 02/09/14 e MC.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

# Assistência Técnica - Qualidade da Água

## Projeto 4: Diagnóstico do Plano de Segurança Hídrica

- **Responsável:** Adahil Sena(Cogerh)
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 629.728,24
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Novembro 2014 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração do termo
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



# PROGRAMAS




# Programas – Qualidade da Água

## Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

- **Setoriais envolvidas:** SRH
- **PPA Iniciativa:** 05311 - Implantação do Plano de Segurança Hídrica para as Bacias Hidrográficas Metropolitanas.
- **Ação I:** 15777 - Elaboração de Estudos para enquadramento dos Açudes das Bacias Estratégicas
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 14,04
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 0,00
- **Realizado até 31/10/14:** R\$ 0,00
- **Realizado/Previsto (%):** 0,00%
- **Periodicidade:** Execução iniciando em 2015 - Frequência mensal
- **Farol:** ██████████

# Programas – Qualidade da Água

## Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

- **Setoriais envolvidas:** SRH
- **PPA Iniciativa:** 05310 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.
- **Ação I:** 15690 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 6,50
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 1,20
- **Realizado até 30/09/14:** R\$ 0,00
- **Realizado/Previsto (%):** R\$ 0,00
- **Periodicidade:** Mensal
- **Farol:** - 

## Programas – Qualidade da Água

### Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

- **Setoriais envolvidas:** SRH
- **PPA Iniciativa:** 05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.
- **Ação I:** 14926 - Aquisição, Instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade)
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 14,39
- **Previsto para o Ano de 2014:** R\$ 1,82
- **Realizado até 31/10/14:** R\$ 1,08
- **Realizado/Previsto (%):** 73%
- **Periodicidade:** Mensal
- **Farol:** 



# COGERH



# INDICADORES SECUNDÁRIOS

## Indicadores – Qualidade da Água

**Indicador Secundário: Apresentação de Planos de Segurança Hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.**

**Responsável:** Adahil Sena

- **Meta 2014:**

2º semestre - Termos de referência elaborados

- **Posição em 31/10:** Os Termos estão em fase de elaboração. Foi agendada uma reunião com a UGP e a Cogerh para a próxima semana (24-25/11) a fim de propor um Plano de Ação para a execução deste indicador.
- **Posição em 31/10 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade intermediária de atingir a meta
- **Justificativa:** -


## Indicadores – Qualidade da Água

**Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de proteção de bacias hidrográficas.**

**Responsável:** Adahil Sena

▪ **Meta 2014:**

2º semestre - Proposta e consultas completos

- **Posição em 31/10:** Aguardando elaboração de Diagnóstico que subsidiará o Plano de Segurança e a nova Lei.
- **Posição em 31/10 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade baixa de atingir a meta
- **Justificativa:** A lei de proteção de bacias hidrográficas é decorrente da elaboração do Plano de Segurança Hídrica.

## Indicadores – Qualidade da Água

**Indicador Secundário: Qualidade da água bruta, na Região Metropolitana de Fortaleza.**

**Responsável: Fábio Lima**

- **Envolvidos:** SRH e COGERH

- **Meta 2014:**

2º semestre - 62.7

- **Posição em 31/10:** 77,6

- **Posição em 31/10 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

- **Justificativa:** Esse resultado corresponde à medição do mês de outubro.





# STDS



# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

# Assistência Técnica - Redução da Pobreza

## Projeto 1: *Monitoramento e capacitação dos CRAS.*

*TOR I:* Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviço
- **Valor do Projeto:** US\$ 900.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 75.986,84
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2014 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Publicação do Edital
- **Estágio Atual:** EDITAL lançado e enviados para empresas convidadas em 04/11/14 para apresentar propostas através do formulário padrão até o dia 14/11/2014.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

# Assistência Técnica - Redução da Pobreza

## Projeto 1: *Monitoramento e capacitação dos CRAS.*


TOR II: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 900.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 117.055,35
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Maio 2014 – Abril 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Contrato
- **Estágio Atual:** Analisando os currículos e elaborando o RAC
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

# Assistência Técnica - Redução da Pobreza

## Projeto 1: *Monitoramento e capacitação dos CRAS.*

TOR III: Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PfroR

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 900.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 400.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2015- Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de discussão e levantamento
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

# Assistência Técnica - Redução da Pobreza

## Projeto 1: *Monitoramento e capacitação dos CRAS.*

TOR IV: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 900.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 306.957,81
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2015 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de discussão e levantamento com TI
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



# PROGRAMAS

# Programas – Redução da Pobreza

## Programa: 050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

- **Setoriais envolvidas:** STDS
- **PPA Iniciativa:** 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS. (1)
- **Ação I:** 14330 - Cofinanciamento dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 34,57
- **Previsto para o Ano de 2014 em milhões:** R\$ 7,30
- **Realizado até 31/10/14 em milhões:** R\$ 5,72
- **Realizado/Previsto (%):** 86%
- **Periodicidade:** Frequência da execução mensal, com a execução iniciando em Abril.
- **Farol:**





# TCE




# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

### Projeto 1: *Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)*

TOR I: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 1.000.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 149.096,50
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** **MI fracassada.** Sendo providenciado republicação para dezembro/2014, após conclusão da licitação para contratação de empresa para realizar as publicações
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

### Projeto 1: *Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)*

TOR II: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 1.000.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 149.096,50
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** **MI fracassada.** Sendo providenciado republicação para dezembro/2014, após conclusão da licitação para contratação de empresa para realizar as publicações
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

### Projeto 1: *Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)*

#### TOR III: Reformulação do Processo eletrônico do TCE

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.000.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 700.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Recebido a NO do TOR e MC em 22/09/14. Aguardando a contratação da empresa para providenciar as publicações.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



**3. PROGRAM APPRAISAL DOCUMENT (PAD)  
DO PROGRAMA PARA RESULTADOS  
Foco na Capacitação Profissional**



### **3.1. Apresentação Geral da Lógica PAD do Tema Capacitação Profissional Witalo Paiva - IPECE**



## 3.2. Apresentação do Resumo do Documento da Estratégia Witalo Paiva - IPECE





### **3.3. Apresentação do Resumo do Projeto de Governança** **Avilton Júnior – SEPLAG e Witalo Paiva - IPECE**



## 3.4. Apresentação do Comitê Técnico Intersectorial

Marilda Rocha – CEDE



### **3.5. Apresentação do Envolvimento da SECITECE**

**Prof. Almir Bittencourt e Luiz Carlos Dodt - SECITECE**



## 3.6. Apresentação do Envolvimento da SEDUC

Andréa Rocha - SEDUC



**3.7. Apresentação da proposta do  
Acompanhamento dos Egressos  
Victor Hugo - SECITECE**



## 4. ENCAMINHAMENTOS

# Encaminhamentos

1. Aprovação da Ata da 9ª reunião Comitê *PforR* de 16/10/14 enviada por e-mail para revisão dos membros até o dia 19/11/2014;
2. Proposta para discussão nas próximas Reuniões do Comitê: Lógica PAD nos temas:
  - Qualidade da Água
  - Gestão Pública



## 5. ENCERRAMENTO



# Obrigada!

**Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE**  
**Unidade de Gerenciamento de Projeto – UGP *PforR* Ceará**  
**Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N - 2º Andar – SEPLAG – Cambéba**  
**Contatos: 3101 3502 / 3101 3499 / 3101 3510**
