



47ª REUNIÃO DO COMITÊ *PforR*
ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO
PROJETO *PforR*
21 DE DEZEMBRO DE 2017



PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

1. Abertura e apresentação dos participantes
2. Indicadores, Programas e Assistência Técnica
 - 2.1. Indicadores Primários 2017.1, 2017.2 e Desembolsos – **Laura Gonçalves**
 - 2.2. Indicadores Secundários 2017.2 – **Laura Gonçalves**
 - 2.3. Programas PforR - **Thâmara Teixeira**
 - 2.4. Assistência Técnica: Estatísticas – **Giuseppe Nogueira**
3. Monitoramento Contratos – **André Morel**
4. Projetos de Assistência Técnica por setorial contratados – **Giuseppe Nogueira**
5. Aprovação da Ata da 46ª Reunião (30/11/2017) – **Viviane Costa**
6. Encerramento



1. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES



2. INDICADORES, PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA



2.1. Indicadores Primários 2017.2

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 1: Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação.	SDE Filipe Rabelo	Uma ação adicional implementada a partir do Plano de Ação	1 Ação já implementada em 2017.2	A SDE sugeriu a apresentação da Ação: Distrito Empreendedor, que apesar de não estar no Documento inicial apresenta forte ligação com duas estratégias sugeridas. O documento descrevendo a Ação foi elaborado e enviado ao Banco Mundial para análise.

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.	SEDUC Rivanir Bezerra	18 acordos	18 acordos firmados	A Seduc encaminhou Ofício com a publicação do 18º Acordo.

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	10%	7,11%	Até dezembro de 2017, foram acompanhadas 5.014 famílias nos municípios do PforR. As informações obtidas nas visitas foram registradas em instrumentais físicos e no Sistema de Monitoramento da STDS.

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	95%	100%	As Capacitações foram realizadas nos CRAS dos 36 municípios mais pobres, portanto, todas as metas do Indicador já foram alcançadas. No entanto, a STDS continua realizando as capacitações tendo em vista a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão em alguns municípios. O Contrato foi aditivado por mais 04 (quatro) meses, até março/2018.

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 6: Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	SEPLAG José Freitas	95%	86,49%	Levantamento de projetos realizado. Construção de Marcos Lógicos realizada. Falta consolidar o Relatório. Previsão de entrega do Relatório para 22/12/2017

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Metas	Realizado	Status
DLI 7: Estabelecimento do Comitê multisetorial de Segurança da Água.	SRH Carlos Campelo	Atas de pelo menos duas reuniões realizadas	-	A duas Atas foram enviadas pela SRH.

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	CAGECE Carlos Rossas	85.9%	87,17%	87,27% (referente ao mês de outubro)

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	SEMA Maria Dias SEMACE Tiago Bessa COGERH Denilson Fidelis	80%	98,29%	98,24% (referente à 01/11/2017)

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME Hoilton Rios	Metodologia implementada em mais dois reservatórios estratégicos.	Metodologia implementada em mais dois reservatórios estratégicos.	Meta já alcançada no Primeiro semestre de 2017.

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	SEPLAG Avilton Júnior	6 Secretarias	5 Secretarias	A minuta do 6º Acordo de Resultados, Secretaria do Meio Ambiente, já foi assinada pelos secretários da Seplag, Sefaz e Sema, aguardando a assinatura do Governador.

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	SEPLAG Adauto Oliveira	20%	20%	Meta já alcançada no Primeiro semestre de 2017.






2.2. Indicadores Secundários 2017.2

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Meta 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Meta 2ª semestre	Realizado	Status
PDO1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	IPECE Victor Hugo	31.600	23.457 técnicos	Em 2016 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: 23.457. 2015: 25.463. 2014: 26.141

Legenda  Probabilidade baixa de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Meta 2ª semestre	Realizado	Status
Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	SEPLAG Lara Costa	Outras duas resoluções publicadas e relatório sobre as atividades do Comitê publicado	Duas Resoluções já publicadas em 2017.2	O relatório sobre as atividades do Comitê está sendo concluído e deverá ser entregue até o começo da próxima semana. A 3ª resolução foi encaminhada para publicação e deverá sair no Diário oficial ainda nessa semana.

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Metas 2ª semestre	Realizado	Status
<p>PDO2: Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas</p>	<p>STDS Sebastião Lopes Mary Anne</p>	<p>10%</p>	<p>7,11%</p>	<p>O Sistema de Monitoramento do PforR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, os dados dos instrumentais dos 36 dos municípios foram inseridos no Sistema e estão sendo consolidados para apresentação de Relatório.</p>

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Meta 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Meta 2ª semestre	Realizado	Status
PDO3:Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	COGERH Denilson Fidelis, Disney Paulino	67.5	79,3	81,7 (referente ao mês de novembro). IQAR: 4,09

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta


INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Metas 2ª semestre	Realizado	Status
Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	COGERH Ana Araújo	Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa	A minuta do Decreto foi apresentada ao CONERH.	Enviado à Procuradoria Geral do Estado - PGE, no dia 05 de dezembro de 2017, o Decreto que regulamenta o inciso II, do artigo 28, da Lei nº 14.844, de 28 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes e normas para Proteção das Bacias Hidrográficas para a Conservação e Recuperação dos Mananciais de Interesse Regional das Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.

*Comitês Bacias Hidrográficas

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Metas 2ª semestre	Realizado	Status
Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.	COGERH Zulene Almada	Plano de Segurança Hídrica elaborados e apresentados em Reunião do CONERH. Resolução do CONERH criando Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução dos Planos	-	A COGERH apresentou uma Nota Técnica propondo a alteração da meta deste Indicador, pois o contrato com a consultoria que está elaborando o Plano será aditivado. O Banco ainda não retornou com o parecer.

Legenda:  Probabilidade intermediária de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Responsável	Metas	Realizado	Status
Apresentação da Lei de gestão de Resíduos Sólidos revista.	SEMA Maria Dias	Implementação e monitoramento	Foi encaminhado Relatório demonstrando os resultados da implementação e do monitoramento da Política Estadual de Resíduos Sólidos.	Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para as 11 regiões do Estado, e vão ser iniciadas as Audiências Públicas para esses planos. Foram entregues os seguintes produtos: Panoramas Regional de Gestão Integrada de RS (em análise) e Relatório de Percepção das 2ª oficinas de RS. Estão sendo trabalhados os Termos de Compromisso da logística reversa para o Estado e assinado o Termo para as embalagens vazias de agrotóxico. Está sendo acompanhado o cumprimento das metas dos TAC's de Sobral, Limoeiro e Cascavel.



2.3. Programas *PforR*

Posição do Programa 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional - SEDUC

Iniciativas	Previsão		Execução		FAROL 2017 (B)/(A)
	2017 (A)		Até 20/12/2017 (B)		
020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$	31,49	R\$	69,82	222%
020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$	8,06	R\$	1,13	14%
020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$	98,93	R\$	135,80	137%
020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.	R\$	2,30	R\$	0,25	11%
020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.	R\$	30,00	R\$	21,98	73%
TOTAL SEDUC - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	R\$	170,78	R\$	228,98	

Posição do Programa 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional - SEDUC

Iniciativas		Execução até 20/12/2017	Restos a Pagar até 20/12/2017	TOTAL
771	020.1.01	R\$ 67.716.450,13	R\$ 2.105.227,23	R\$ 69.821.677,36
	020.1.02	R\$ 286.587,49	R\$ 838.972,07	R\$ 1.125.559,56
328	020.1.03	R\$ 124.562.144,34	R\$ 11.236.425,05	R\$ 135.798.569,39
-	020.1.04	R\$ 239.821,85	R\$ 14.304,54	R\$ 254.126,39
834	020.1.06	R\$ 21.750.104,99	R\$ 225.895,20	R\$ 21.976.000,19
Total		R\$ 214.555.108,80	R\$ 14.420.824,09	R\$ 228.975.932,89

Posição do Programa 080 – Proteção Social Básica - STDS

Iniciativa	Previsão	Execução	FAROL
	2017 (A)	Até 20/12/2017 (B)	2017 (B)/(A)
080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.	R\$ 7,30	R\$ 7,29	100%
TOTAL STDS - ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA	R\$ 7,30	R\$ 7,29	

Iniciativas		Execução até 20/12/2017	Restos a Pagar até 20/12/2017	TOTAL
03180	080.1.01	R\$ 7.270.750,00	R\$ 15.750,00	R\$ 7.286.500,00

Posição do Programa 025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana - CIDADES

Iniciativa	Previsão	Execução	FAROL 2017 (B)/(A)
	2017 (A)	Até 20/12/2017 (B)	
025.1.07 - Ampliação do serviço de esgotamento sanitário.	R\$ 5,00	R\$ 5,70	114%
TOTAL CIDADES - QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 5,00	R\$ 5,70	

Iniciativas	Execução até 20/12/2017	Restos a Pagar até 20/12/2017	TOTAL
025.1.07	R\$ 5.702.243,26	R\$ -	R\$ 5.702.243,26

Na Missão de Gerenciamento Financeiro do Banco Mundial, a especialista Susana Amaral analisou a Nota Técnica da SCidades aceitando a inclusão de execução da Ação 18954 no Componente 1.

Posição dos Programas - SEMA

064 – Resíduos Sólidos

066 – Ceará Mais Verde

067 – Ceará no Clima

064 – Resíduos Sólidos	Previsão	Execução	FAROL
	2017 (A)	Até 20/12/2017 (B)	2017 (B)/(A)
064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.	R\$ 1,10	R\$ 0,17	15%
066 – Ceará Mais Verde			
066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.	R\$ 0,42	R\$ 0,43	102%
067 – Ceará no Clima			
067.1.02 – Promoção de ações voltadas ao fortalecimento do Sistema de Gestão Ambiental do Estado do Ceará.	R\$ 0,55	R\$ -	0%
TOTAL SEMA - QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 2,07	R\$ 0,60	29%

Posição dos Programas - SEMA

064 – Resíduos Sólidos

066 – Ceará Mais Verde

067 – Ceará no Clima

Iniciativas		Execução até 20/12/2017	Restos a Pagar até 20/12/2017	TOTAL
03104	064.1.04	R\$ 34.743,57	R\$ 131.536,43	R\$ 166.280,00
-	066.1.02	R\$ 431.235,01		R\$ 431.235,01
-	067.1.02	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 465.978,58	R\$ 131.536,43	R\$ 597.515,01

Posição dos Programas da SEMACE

066 – Ceará Mais Verde

067 – Ceará no Clima

500 – Gestão e Manutenção

066 – Ceará Mais Verde	Previsão		Execução		FAROL 2017 (B)/(A)
	2017 (A)		Até 20/12/2017 (B)		
066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais.	R\$	2,50	R\$	1,14	46%
066.1.12 – Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará.	R\$	-	R\$	0,08	100%
066.1.13 – Ampliação das ações de proteção dos recursos ambientais das áreas protegidas do Estado do Ceará.	R\$	-	R\$	-	
067 – Ceará no Clima					
067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.	R\$	0,10	R\$	0,10	102%
500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada					
500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas.	R\$	0,76	R\$	0,05	7%
TOTAL SEMACE - QUALIDADE DA ÁGUA	R\$	3,36	R\$	1,38	41%

Posição dos Programas da SEMACE

066 – Ceará Mais Verde

067 – Ceará no Clima

500 – Gestão e Manutenção

Iniciativas		Execução até 20/12/2017	Restos a Pagar até 20/12/2017	TOTAL
-	066.1.09	R\$ 1.142.319,65	R\$ -	R\$ 1.142.319,65
05170	066.1.12	R\$ 81.150,43	R\$ -	R\$ 81.150,43
-	067.1.09	R\$ -	R\$ 101.603,34	R\$ 101.603,34
00001	500.1.02	R\$ 13.329,99	R\$ 40.054,66	R\$ 53.384,65
Total		R\$ 1.236.800,07	R\$ 141.658,00	R\$ 1.378.458,07

Posição do Programa 018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis - FUNCEME

018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis	Previsão	Execução	FAROL 2017 (B)/(A)
	2017 (A)	Até 20/12/2017 (B)	
018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias.	R\$ 1,50	R\$ 1,34	89%
TOTAL FUNCEME - QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 1,50	R\$ 1,34	89%

Iniciativas		Execução até 20/12/2017	Restos a Pagar até 20/12/2017	TOTAL
2846	018.1.01	R\$ 1.341.278,36	R\$ -	R\$ 1.341.278,36
Total		R\$ 1.341.278,36	R\$ -	R\$ 1.341.278,36

TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 11,93	R\$ 9,02	76%
--------------------------------	------------------	-----------------	------------

Posição de Execução dos Programas

Sumário de Execução 2017 até 20/12/2017					
Eixo	Setorial	Previsão	Execução Novembro	Execução Dezembro	%
Capacitação Profissional	SEDUC	R\$ 170,78	R\$ 213,41	R\$ 228,98	134%
Assistência à Família	STDS	R\$ 7,30	R\$ 7,29	R\$ 7,29	100%
Qualidade da Água	CIDADES	R\$ 5,00	R\$ 5,70	R\$ 5,70	114%
	SEMA	R\$ 2,07	R\$ 0,51	R\$ 0,60	29%
	SEMACE	R\$ 3,36	R\$ 0,24	R\$ 0,24	7%
	FUNCEME	R\$ 1,50	R\$ 1,01	R\$ 1,34	89%
Total		R\$ 190,01	R\$ 228,87	R\$ 245,28	129,09%

Execução Acumulada dos Programas

Meta 2014-2017	Estipulada em Reuniões com as Setoriais	949,58	Glosa em 2016	Total
Execução 2014	Auditada pelo TCE	243,35	19,99	223,36
Execução 2015	Auditada pelo TCE	233,28	7,13	226,15
Execução 2016	Auditada pelo TCE	282,94	7,55	275,39
Execução 2017	Em execução - a ser auditado em 2018	245,28	-	245,28
Total		1004,85	34,67	970,18

- ✓ Ao final do ano de 2017, foi realizada auditoria do TCE relacionada ao exercício de 2016, o que resultou na Glosa de despesas no valor de R\$ 34,67 milhões.

Posição dos Programas

EIXO	SETORIAL	PROGRAMAS	Previsão	Execução	FAROL 2017 (B)/(A)
			2017 (A)	Até 20/12/2017 (B)	
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	SEDUC	020 – Ensino Integrado à Educação Profissional;	R\$ 170,78	R\$ 228,98	134%
TOTAL CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			R\$ 170,78	R\$ 228,98	134%
ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA	STDS	080 – Proteção Social Básica;	R\$ 7,30	R\$ 7,29	100%
TOTAL ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA			R\$ 7,30	R\$ 7,29	100%
QUALIDADE DA ÁGUA	CIDADES	025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana;	R\$ 5,00	R\$ 5,70	114%
	SEMA/ SEMACE	064 – Resíduos Sólidos;	R\$ 1,10	R\$ 0,17	15%
		066 – Ceará Mais Verde;	R\$ 2,92	R\$ 1,65	57%
		067 – Ceará no Clima;	R\$ 0,65	R\$ 0,10	16%
	SEMACE	500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada;	R\$ 0,76	R\$ 0,05	7%
FUNCEME	018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis.	R\$ 1,50	R\$ 1,34	89%	
TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA			R\$ 11,93	R\$ 9,02	76%
TOTAL EXECUÇÃO DE 2017			R\$ 190,01	R\$ 245,28	129,09%

Posição dos Programas

✓ **Lembrete:** Regras Programas



A execução dos programas deve observar as seguintes restrições:

- Devem excluir despesas que são financiadas pelo próprio BIRD ou por outras operações de crédito, ou seja, não é permitido a alocação de recursos do BIRD ou outras operações de crédito para custear despesas dos programas e iniciativas do componente
- Verificar a lista negra do BIRD a cada licitação, antes de assinar contrato. Para atender o Art. 42 da Lei 8.666/93 a SEPLAG incluiu no orçamento de cada ação um valor na fonte 69;
- Não podem apresentar impacto sócio ambiental negativo;
- Os valores dos contratos não podem exceder os limites abaixo:
 - Obras = US\$ 50 milhões
 - Bens = US\$ 30 milhões
 - Sistemas de TIC = US\$ 20 milhões
 - Consultorias = US\$ 15 milhões.



2.4. Assistência Técnica – Estatísticas


Execução dos Subprojetos de AT por Etapa – 77 Subprojetos

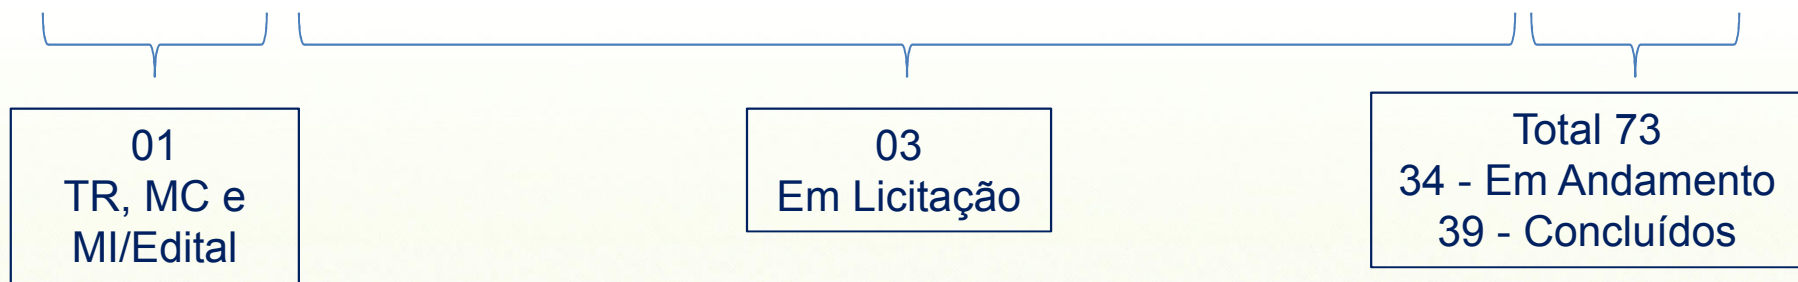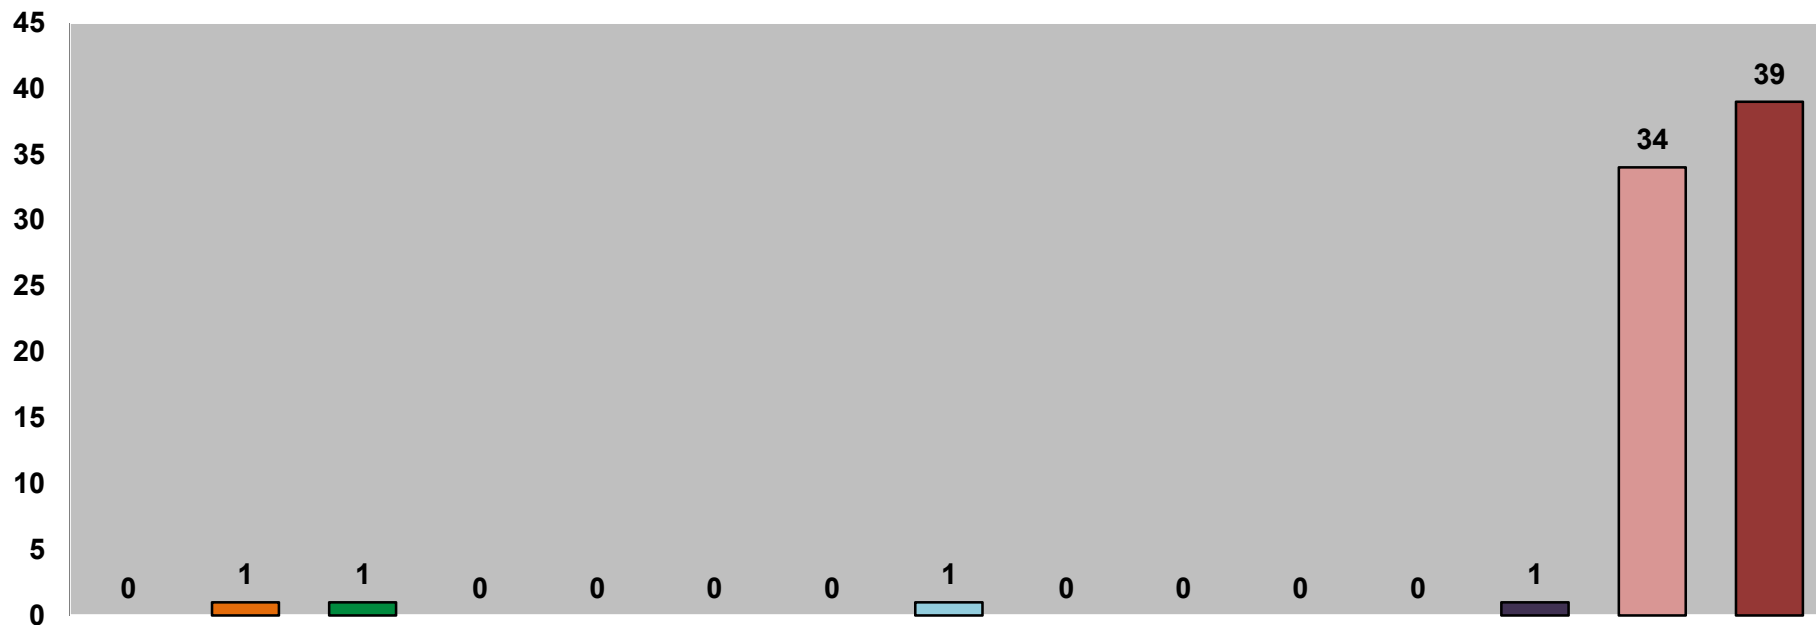

Subprojetos de Assistência Técnica por Etapa

Etapas			Setoriais com Subprojetos	Valor US\$
1	TDR e MC sendo elaborados para NO BM	0	-	-
2	TDR e MC aprovado pelo BM e elaborando MI	1	IPECE (21);	197.836,17
3	Manifestação de Interesse Publicada	1	SEDUC (38);	3.091,19
4	Elaborando o Relatório Final da Lista Curta	0	-	-
5	Elaborando a Solicitação de Proposta	0	-	-
6	Solicitação de Proposta Lançada	0	-	-
7	Elaborando o Relatório Técnico ou Curricular	0	-	-
8	Elaborando o Relatório Financeiro e o Combinado	1	SDE (24);	569.255,26
9	Não Objeção do BM à Avaliação Combinado / Avaliação Curricular	0	-	-
10	Divulgação da Avaliação Combinada / Ofício para Negociação	0	-	-
11	Negociação do Contrato	0	-	-
12	Divulgação PGE Resultado Final	0	-	-
13	Assinando o Contrato / Publicação	1	SEPLAG (64);	49.335,00
14	Projetos com Contratos em Execução	34	CGE(05,06,07,08); IPECE(12,15,17,18,19,20); SECITECE(25); SEDUC(28,29,30,31,34,35,36,43,44,45,47); SEMA(53,54); SEMACE(55); SEPLAG(60,61,63); SRH(65,66); COGERH(68,69); STDS(71); TCE(74);	13.908.776,53
15	Projetos com Contratos Finalizados	39	ARCE(01); CGE(02,03,04,09,10); FUNCEME(11); IPECE(13,14,16); SDE(22,23); SECITECE(26,27), SEDUC (32,33,37,39,40,41,42,46); SEMA(48,49,50,51,52); SEMACE (56); SEPLAG (57,58,59,62); SRH(67), COGERH (70); STDS(71,72); TCE(75,76,77).	6.658.598,23
Total		77		21.386.892,38

Execução dos Subprojetos de AT por Etapa

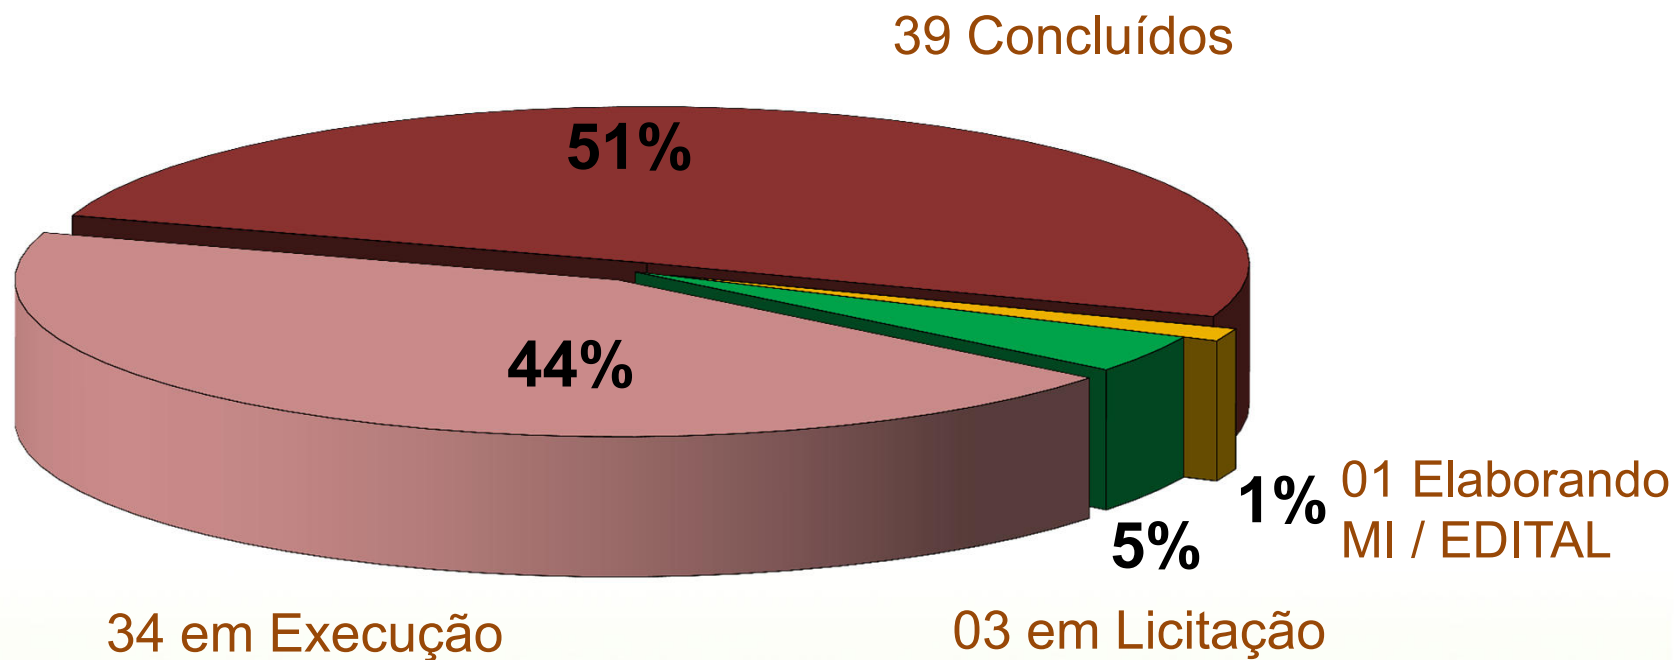

Subprojetos de Assistência Técnica

QTD.	Setoriais	Subprojeto	Status
1	IPECE	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização e realização de eventos e congressos.	Setorial está ajustando o TDR após comentários do Banco Mundial, com posterior elaboração do Edital.
2	SDE	Consultoria Especializada para a elaboração de um plano de desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.	Setorial está elaborando o Relatório Financeiro após recebimento da Ata de Aberturas das Propostas Financeiras em 16/11/2017.
3	SEDUC	Contratação de serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados.	Licitação ocorreu deserta no dia 13/12/2017. Seguindo os trâmites para o relançamento.
4	SEPLAG	Contratação de Consultor Individual - Plano Estratégico de Gestão das Frotas. (Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará).	Setorial encaminhou a Homologação e Adjudicação para publicação.



3. MONITORAMENTO CONTRATOS

Cronograma Assinatura dos Contratos AT (R\$)

Descrição	Ano										
	2014.1	2014.2	2015.1	2015.2	2016.1	2016.2	2017.1	2017.2	Previsão 2017.2	Previsão 2018.1	Total
Contratos Assinados	0	3	11	11	7	20	18	3	0	4	77
Valores R\$	-	490.352	1.165.551	8.606.866	4.821.785	29.306.762	13.350.108	1.453.830		2.822.357	62.017.612
% Financeiro dos Projetos Contratados		0,8%	1,9%	13,9%	7,8%	47,3%	21,5%	2,3%	0,0%	4,6%	100%




Contratos Assistência Técnica

Setorial	Nº de Contratos	Nº de Contratos em Andamento	Nº de Contratos Concluídos	Valor Contratado + Patronal (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo a Pagar (R\$)	% PAGO
ARCE	1	-	1	839.982,65	839.982,65	-	100%
CGE	9	4	5	7.883.945,04	4.898.597,84	2.985.347,20	62%
COGERH	3	2	1	4.419.133,06	3.394.098,29	1.025.034,77	77%
FUNCEME	1	-	1	1.666.842,98	1.666.842,98	-	100%
IPECE	9	6	3	5.116.923,49	3.310.990,50	1.805.932,99	65%
SDE	2	0	2	1.148.959,99	1.148.959,99	-	100%
SECITECE	3	1	2	1.400.260,31	1.241.839,27	158.421,04	89%
SEDUC	19	11	8	8.594.233,11	5.092.330,17	3.501.902,94	59%
SEMA	7	2	5	7.223.217,54	5.232.326,63	1.990.890,91	72%
SEMACE	2	1	1	1.744.961,99	1.639.804,89	105.157,10	94%
SEPLAG	7	3	4	10.636.571,29	6.582.708,14	4.053.863,15	62%
SRH	3	2	1	3.048.215,88	1.848.093,72	1.200.122,16	61%
STDS	3	1	2	2.307.050,00	1.120.141,00	1.186.909,00	49%
TCE	4	1	3	3.164.958,37	1.302.314,26	1.862.644,11	41%
TOTAL	73	34	39	59.195.255,69	39.319.030,33	19.876.225,36	66%


Cronograma Pagamentos AT(R\$)

Pago e Previsão de Pagamento da Assistência Técnica - PforR (R\$)							
Ano	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Previsão Dezembro 2017	Previsão 2018	Total
Valor	72.600	975.610	11.205.681	27.065.140	2.845.000	19.853.582	62.017.612

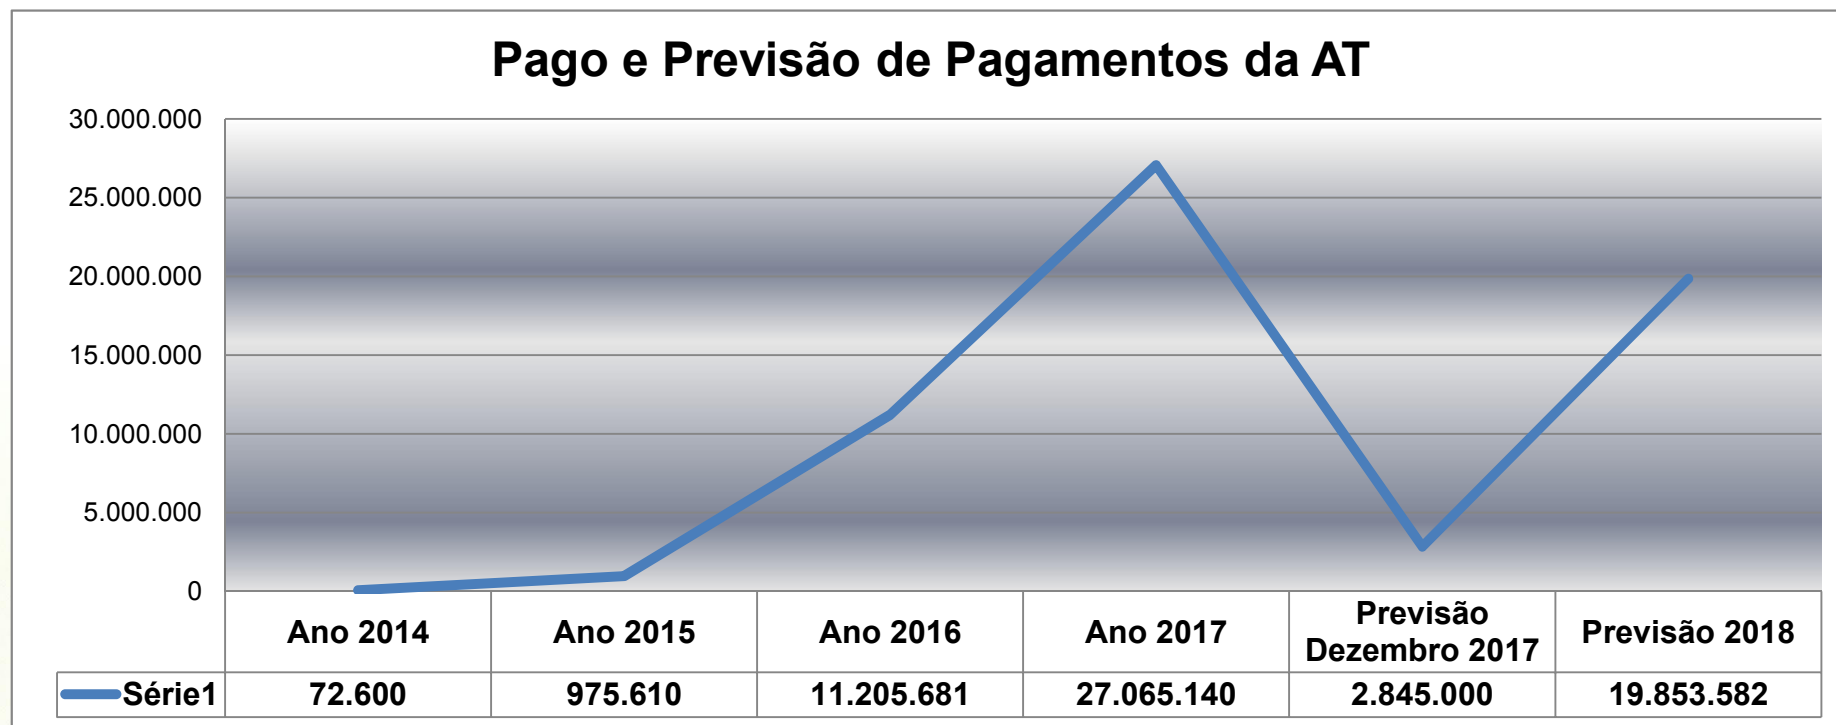

Situação dos Contratos – Aditivos de Prazo

Setorial	ARCE	CGE	COGERH	FUNCEME	SEMA	SEMACE	SEPLAG	SDE	SEDUC	STDS	SECITECE	IPECE	TCE	SRH	TOTAL
Nº Contratos	1	9	3	1	7	2	7	2	19	3	3	9	4	3	73
Aditivo de Prazo	0	1	0	1	2	0	4	0	8	5	1	11	3	2	38
%	0%	11%	0%	100%	29%	0%	57%	0%	42%	167%	33%	122%	75%	67%	52%

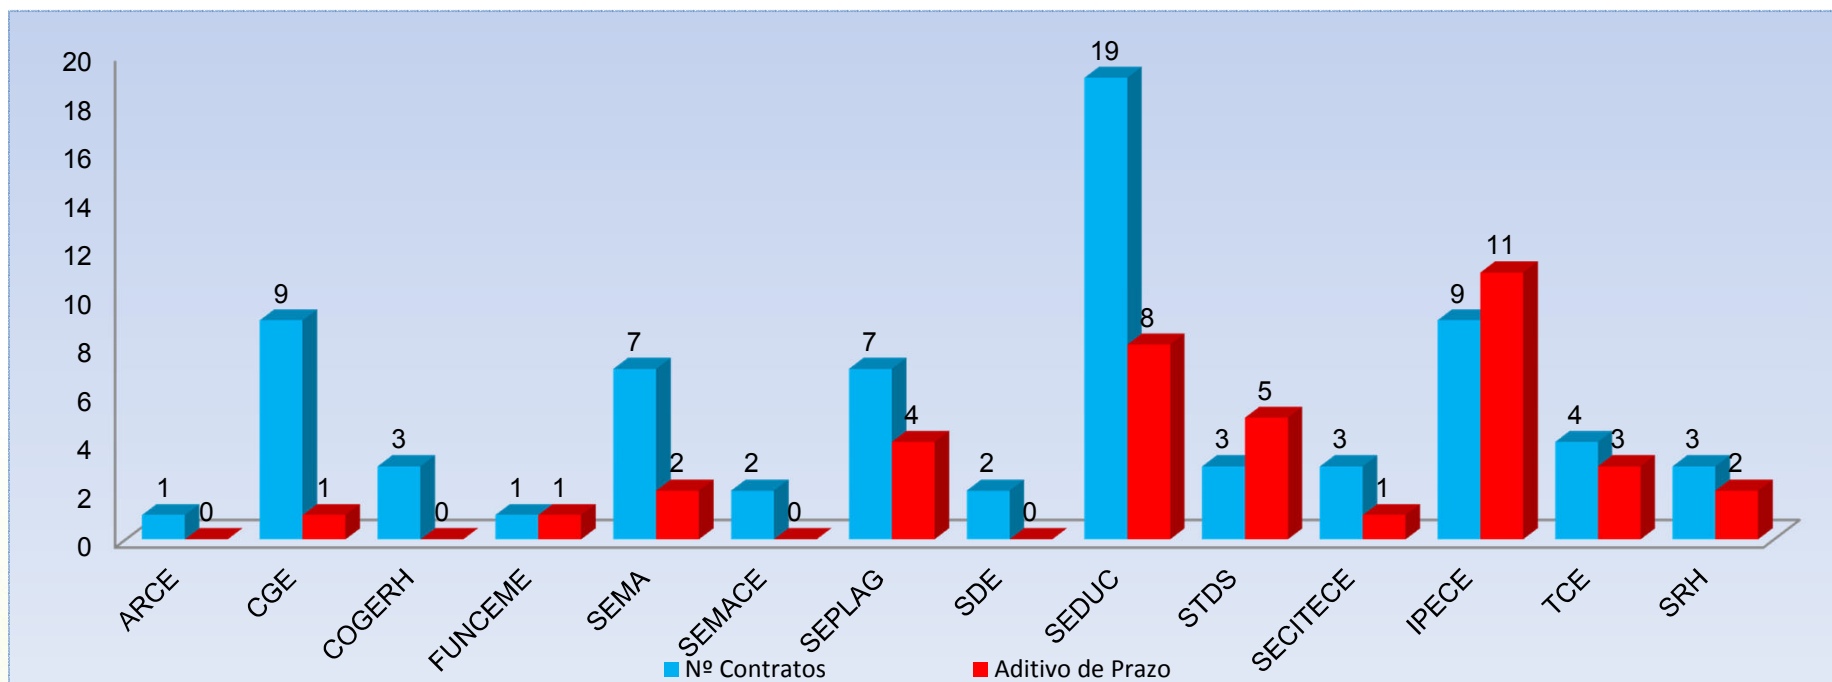

52% dos Contratos já foram elaborados Aditivos de Prazo



4. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR SETORIAL CONTRATADOS



ARCE

Subprojeto ARCE

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	ARCE	Desenvolvimento de modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

	Baixo - de 0 a 06 meses
	Médio - de 07 a 10 meses
	Alto - 11 mês
	Altíssimo - acima de 11 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

ARCE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 1: Desenvolvimento de modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Subprojeto:** US\$ 342.109,75
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Fevereiro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato nº 019/2016 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** RPG – Regulation, Performance and Governace Ltda.
- **Valor do Contrato + Taxas:** R\$ 839.982,65.



CGE

Subprojetos CGE

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	CGE	Auditoria Técnica dos Indicadores I.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
2	CGE	Auditoria Técnica dos Indicadores II.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	CGE	Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (NEGÓCIO SIEC).	Contrato Concluído Físico e Financeiro
4	CGE	Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SISTEMA SIEC).	Contrato em Execução
5	CGE	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	Contrato em Execução
6	CGE	Capacitação da população para o Controle Social.	Contrato em Execução
7	CGE	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	Contrato em Execução
8	CGE	Realização de treinamentos com foco no “apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público”.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
9	CGE	Consultoria individual especializada, em gestão documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

CGE- Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojetos 2 e 3: Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR. ¹

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 67.354,63
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévio
- **Início/Término:** Junho 2014 - Fevereiro 2016
- **Estágio Atual:** Contratos Concluídos Físico e Financeiro.
- **Consultores:** Marcelo Ponte Barbosa e Túlio Cravo.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 152.302,30.

Nota 1: Auditoria será realizada pela equipe da CGE a partir do semestre 16.1

CGE - Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 4: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Marcelo Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 284.089,71
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2015 – Junho 2017
- **Estágio Atual:** Contrato nº 08/2016 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** NTConsult Tecnologia e Consultoria LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 725.256,92

CGE - Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 5: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).

- **Responsável:** Carlos Jorge Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 658.560,58
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Dezembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 026/2016 - Assinado em 07/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** Ivia Serviços de Informática Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.130.443,48.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
2.130.443,48	916.090,68	1.214.352,80	11/20

CGE - Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 6: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.071.989,29
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 029/2016 – Assinado em 24/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** Caiena Desenvolvimento de Sistemas Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 3.467.885,35.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
3.467.885,35	1.768.621,50	1.699.263,85	10/15

CGE - Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 7: Capacitação da população para o Controle Social.

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 267.522,72
- **Método de Aquisição:** LPN
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 01/2017 – Assinado em 20/01/2017.
- **Consultora Vencedora:** Fundação Demócrito Rocha.
- **Valor do Contrato:** R\$ 865.436,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
865.436,00	173.087,20	692.348,80	16/17

CGE - Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 8: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na “Detecção de Casos de Fraude e Corrupção” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.

- **Responsável:** Denise Andrade Araújo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 89.644,51
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 07/2017, assinado em 13/06/2017.
- **Consultora Vencedora:** Deloitte Touche Tohatsu Consultores Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 290.000,00
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
290.000,00	185.600,00	104.400,00	05/06

Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 9: Realização de treinamentos com foco no “apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público”.

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 61.026,58
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato nº 025/2016 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** KPMG Assessores Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 197.421,00.

CGE - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 10: Consultoria individual especializada, em gestão documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE.

- **Responsável:** Aglaio Soares
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 24.411,82
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Março de 2016
- **Estágio Atual:** Contrato nº 012/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultor:** Fernando Braga.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 55.200,00.



FUNCEME

Subprojeto FUNCEME

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	FUNCEME	Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

	Baixo - de 0 a 06 meses
	Médio - de 07 a 10 meses
	Alto - 11 mês
	Altíssimo - acima de 11 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

FUNCEME - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 11: Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Francisco Hoilton
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Proposta Vencedora:** 679.677,00 (US\$ + €)
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Maio 2017
- **Estágio Atual:** Contrato nº 10/2015, Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Aqualogus / Azurit.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.666.864,98.




IPECE

Subprojetos IPECE

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	IPECE	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará - CONSULTORES PLENOS.	Contrato em Execução
2	IPECE	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará - CONSULTORES PLENOS.	Contrato Rescindido
3	IPECE	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. CONSULTOR JÚNIOR.	Contrato Rescindido
4	IPECE	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. ANALISTA LICITAÇÕES.	Contrato em Execução
5	IPECE	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. ANALISTA LICITAÇÕES.	Contrato Rescindido
6	IPECE	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. ANALISTA LICITAÇÕES.	Contrato em Execução
7	IPECE	Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR.	Contrato em Execução
8	IPECE	Desenvolvimento de sistemas de informação digital, para implementação e implantação de 02 (dois) sistemas denominados IPECEDATA e sistema de monitoramento e avaliação dos projetos e beneficiários do FECOP.	Contrato em Execução
9	IPECE	Desenvolvimento de metodologias para planejamento e avaliação dos projetos estratégicos de investimentos do poder executivo do Estado do Ceará.	Contrato em Execução
10	IPECE	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização e realização de eventos e congressos.	Em Atividades Preparatórias

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojetos 12 e 13: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.
CONSULTORES PLENOS

- **Responsável:** Viviane Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 308.277,81
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em execução. Sendo um contrato prestado os serviços na UGP da setorial e outro contrato rescindido.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 14: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.
CONSULTOR JÚNIOR

- **Responsável:** Viviane Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 21.227,67
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Maio 2015
- **Estágio Atual:** Contrato nº 07/2014 - Rescindido.
- **Consultora:** Viviane Ramos da Costa.
- **Valor do Contrato:** R\$ 48.000,00.

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojetos 15, 16 e 17: Contratação de 03 (três) **Analistas em Licitações** para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- **Responsável:** Viviane Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 247.994,30
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Janeiro 2019
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** 01 contrato rescindido e 02 Contratos em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 18: Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR.

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 120.504,68
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 10/2015, assinado em 01/09/2015. Serviços em execução.
- **Consultora:** Carlos Alberto Manso.
- **Valor do Contrato:** R\$ 246.787,20.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

IPECE - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 19: Desenvolvimento de sistemas de informação digital, para implementação e implantação de 02(dois) sistemas denominados IPECEDATA e sistema de monitoramento e avaliação dos projetos e beneficiários do FECOP.

- **Responsável:** Mário Aragão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 682.482,48
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 01/2017, assinado em 17/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** Nova Via Tecnologia e Mobilidade Ltda.
- **Valor do Contrato:** 2.187.903,10.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
2.187.903,10	1.422.136,95	765.766,15	17/20

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 20: Desenvolvimento de metodologias para planejamento e avaliação dos projetos estratégicos de investimentos do poder executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 425.894,52
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 04/2017, assinado em 28/04/2017.
- **Consultora Vencedora:** Quadrante Consultoria Econômica Ltda.
- **Valor do Contrato:** 1.377.768,77.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
1.377.768,77	482.219,08	895.549,69	06/09

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 21: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização e realização de eventos e congressos.

- **Responsável:** Flávio Ataliba
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 197.836,17
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2017 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Em Atividades Preparatórias
- **Estágio Atual:** Em Atividades Preparatórias – Setorial está ajustando o TDR após comentários do Banco Mundial e com posterior elaboração do Edital após recebimento da “não objeção” em 10/11/2017.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SDE / ADECE

Subprojetos SDE

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	SDE	Desenvolvimento do sistema FDI (Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas).	Contrato Concluído Físico e Financeiro
2	SDE	Impact Evaluation Workshop em Istambul.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	SDE	Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.	Em Licitação

	Baixo - de 0 a 06 meses
	Médio - de 07 a 10 meses
	Alto - 11 mês
	Altíssimo - acima de 11 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

SDE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 22: Desenvolvimento do sistema FDI (Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas).

- **Responsável:** Fernando Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 388.117,50
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 03/2016, assinado em 26/08/2016.
- **Consultora Vencedora:** Ivia Serviços de Informática Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.142.416,04.

SDE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 23: Impact Evaluation Workshop Istanbul

- **Responsável:** Inês Studart
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 2.894,02
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Maio 2015.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** Casa Blanca / Maria Inês Cavalcante Studart Menezes.
- **Valor do Contrato:** R\$ 6.543,95.

SDE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 24: Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Filipe Rabelo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 569.255,26
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2017 – Junho 2018
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Relatório Financeiro e o Combinado.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial está elaborando o Relatório Financeiro após recebimento da Ata de Aberturas das Propostas Financeiras em 16/11/2017.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SECITECE

Subprojetos SECITECE

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	SECITECE	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	Contrato em Execução
2	SECITECE	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	SECITECE	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

	Baixo - de 0 a 06 meses
	Médio - de 07 a 10 meses
	Alto - 11 mês
	Altíssimo - acima de 11 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 25: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.

- **Responsável:** Sandra Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 139.917,03
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 16/2017, assinado em 25/07/2017.
- **Consultora Vencedora:** Ferraro Projetos e Investimento Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 452.631,58
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
452.637,58	294.210,54	158.421,04	05/05

SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 26: Elaboração do plano estadual de ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Sandra Monteiro / Tarcísio Hilter
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 238.111,76
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Contrato nº 06/2016, Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** Macroplan Prospectivo, Estratégia e Gestão Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 770.291,53

SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 27: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

- **Responsável:** Sandra Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 57.428,61
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Abril 2017
- **Estágio Atual:** Contrato nº 16/2016, Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Maria Fatima Ludovico da Gama e Souza.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 177.593,20.



SEDUC

Subprojetos SEDUC

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	SEDUC	Elaborar as matrizes de referência e os itens para compor os testes da avaliação de desempenho dos estudantes do 3º ano de vinte cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais de educação profissional do Estado do Ceará.	Contrato em Execução
2	SEDUC	Formação Continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.	Contrato em Execução
3	SEDUC	Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará.	Contrato em Execução
4	SEDUC	Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará.	Contrato em Execução
5	SEDUC	Impact Evaluation Workshop em Istambul.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
6	SEDUC	CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
7	SEDUC	Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento.	Contrato em Execução
8	SEDUC	Desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.	Contrato em Execução
9	SEDUC	Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.	Contrato em Execução
10	SEDUC	Serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
11	SEDUC	Contratação de serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados.	Em Licitação

Subprojetos SEDUC

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
12	SEDUC	Especialista em Avaliação de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
13	SEDUC	Desenvolvimento Infantil, com foco na educação, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Contrato Concluído Físico e Financeiro
14	SEDUC	Desenvolvimento Infantil, com foco na saúde, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Contrato Concluído Físico e Financeiro
15	SEDUC	Empresa especializada para elaboração de arte gráfica/design, revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, da Secretaria da Educação.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
16	SEDUC	Apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.	Contrato em Execução
17	SEDUC	Empresa de Consultoria especializada em visitas domiciliares e para formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Contrato em Execução
18	SEDUC	Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN. (Coleta de Dados).	Contrato em Execução
19	SEDUC	Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
20	SEDUC	Contratação de Consultoria Individual para o desempenho da função de coordenadora de campo nas atividades de coletas de dados da Formação de Gestores da Educação Infantil.	Contrato em Execução

SEDUC- Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 28: Elaborar as matrizes de referência e os itens para compor os testes da avaliação de desempenho dos estudantes do 3º ano de vinte cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais de educação profissional do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 267.202,02
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Março 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 154/2017, assinado em 16/08/2017.
- **Consultora Vencedora:** Universidade Federal de Juiz de Fora – Centro de Políticas Públicas de Avaliação da Educação (UFJF/CAED).
- **Valor do Contrato:** R\$ 864.398,52
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
864.398,52	0,00	864.398,52	01/05

SEDUC - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 29: Formação Continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 81.757,64
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Dezembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 079/2017, assinado em 18/04/2017.
- **Consultora Vencedora:** Elos Orientação e Planejamento Educacional Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 261.624,46.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
261.624,46	65.406,12	196.218,34	02/06

SEDUC- Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojetos 30 e 31: Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará (02 Consultores).

- **Responsável:** Luciano Nery
- **Categoria de Licitação:** CI
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 49.101,56
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2016 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contratos em Execução – Assinados no dia 15/03/2017.
- **Consultores:** Antônio Jussier de Vasconcelos Ramos e Fernando Andrade de Alcântara.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 158.843,52.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
158.843,52	50.541,12	108.302,40	11/22

SEDUC- Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 32: Impact Evaluation Workshop Istanbul

- **Responsável:** Luciano Nery
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 3.154,13
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Maio 2015
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Andréa Araújo Rocha Nibon.
- **Valor do Contrato:** R\$ 7.132,11.

SEDUC- Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 33: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 4.466,03
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Julho 2015.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Maria Dagmar de Andrade Soares - Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER.
- **Valor do Contrato:** R\$ 10.098,59.

SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 34: Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento. WMS

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 16.506,96
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Setembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – N° 089/2017, assinado em 27/03/2017.
- **Consultor:** Samuel Simões Oliveira Franco.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 53.400,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
53.400,00	22.162,11	31.237,89	04/07

SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 35: Desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 254.128,36
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Fevereiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº105/2017 em Execução. Assinado em 20/04/2017.
- **Consultora Vencedora:** Instituto da Primeira Infância - IPREDE.
- **Valor do Contrato:** R\$ 822.105,26.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
822.105,26	328.842,10	493.263,16	09/11

SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 36: Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 116.608,86
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2016 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução - nº 028/2017 Assinado em 07/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** ECART Projetos e Gestão Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 377.229,65.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
377.229,65	302.768,43	74.461,22	07

SEDUC- Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 37: Serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 15.783,62
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2016 – junho 2017
- **Estágio Atual:** Contrato nº 021/2017, concluído físico financeiro.
- **Consultora Vencedora:** Expressão Gráfica e Editora Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 51.060,00.

SEDUC- Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 38: Contratação de serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 3.091,19
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2017 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Em Atividades Preparatórias
- **Estágio Atual:** Em Atividades Preparatórias – Licitação foi deserta no dia 13/12/2017. Seguindo os trâmites para o relançamento.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- **Sinalização em relação ao Prazo:**



SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 39: Especialista em **Avaliação** de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa.*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor Subprojeto:** US\$ 4.139,40
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2014 – Maio 2016
- **Estágio Atual:** Contrato nº 018/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultor:** Flávio Augusto Rezende Cunha.
- **Valor do contrato:** R\$ 9.360,00.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 40: Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 25.207,85
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Atual:** Contrato nº 017/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Fátima Maria Araújo Saboia Leitão.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 47.500,00.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 41: Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 29.188,04
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Atual:** Contrato nº 014/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Ana Cecília Silveira Lins Sucupira.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 55.000,00.

SEDUC - Assistência Técnica –Assistência à Família

*Subprojeto 42: Empresa Especializada para Elaboração de **Arte Gráfica/Design**, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 61.838,85
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Setembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 029/2016 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 139.830,00.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 43: Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 372.482,21
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – nº 214/2016, assinado em 12/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** VC Promoções e Eventos Ltda – EPP.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.204.979,94 .
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
1.204.979,94	709.990,23	494.989,71	09

SEDUC - Assistência Técnica –Assistência à Família

Subprojeto 44: Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 202.891,81
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Dezembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 236/2016, assinado em 30/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** CASAM – Centro de Apoio Social e de Animação Missionária.
- **Valor do Contrato:** R\$ 656.355,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
656.355,00	360.995,25	295.359,75	09/13

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 45: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN. (Coleta de Dados).

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 1.155.818,22
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Fevereiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 214/2016, assinado 28/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** Overview Serviços & Informação Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 3.739.071,95.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
3.739.071,95	2.093.879,94	1.645.192,01	07/11

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 46: Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 17.458,44
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Outubro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Rescindido – Contrato nº 253/2016, assinado 19/10/2016.
- **Consultora Vencedora:** Rafaela Martins Leite Monteiro.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 45.694,11.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 47: Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 21.653,79
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2016 – Março 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução, nº 30/2017 – Assinado no dia 20/07/2017.
- **Consultora Vencedora:** Patrícia Simões.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 70.050,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
70.050,00	10.828,63	59.221,37	03/06



SEMA

Subprojetos SEMA

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	SEMA	Elaboração do projeto “Avaliação do Impacto Econômico da Degradação Ambiental.”	Contrato Concluído Físico
2	SEMA	Desenvolvimento e execução de projeto em educação ambiental para a qualidade da água nas três bacias estratégicas.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	SEMA	Apoio Logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas três bacias estratégicas.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
4	SEMA	Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e programas do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
5	SEMA	Desenvolver projeto de lei que institui o programa de serviços ambientais no Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
6	SEMA	Elaboração do Plano de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto – 81 municípios.	Contrato em Execução
7	SEMA	Desenvolver Implementação da Coleta Seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	Contrato em Execução

	Baixo - de 0 a 06 meses
	Médio - de 07 a 10 meses
	Alto - 11 mês
	Altíssimo - acima de 11 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 48: Elaboração do projeto “Avaliação do Impacto Econômico da Degradação Ambiental.” (AIEDA)

- **Responsável:** Maria Dias / Magda Marinho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 376.432,70
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 18/2016 - Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Aquino – Mcrit SL – Barcelona Brasil Group.
- **Valor do Contrato + Taxa:** R\$ 851.841,63.

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 49: Desenvolvimento e execução de projeto em educação ambiental para a qualidade da água nas três bacias estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 266.182,85
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato nº 06/2016, Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Engesoft Engenharia / Quanta Consultoria Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 710.638,32.

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 50: Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicos.

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor Subprojeto:** US\$ 96.162,05
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Contrato nº 26/2016 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** Empresa MSV Multiserviços ME.
- **Valor do Contrato:** R\$ 242.557,52.

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 51: Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e programas do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Maria Dias / Francisco Leorne
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** 202.789,54
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2014 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Contrato nº 16/2016 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** Arcadis Logos S.A.
- **Valor do Contrato:** R\$ 563.157,73.

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 52: Desenvolver projeto de lei que institui o programa de serviços ambientais no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Maria Dias / Monica Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 215.404,39
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Dezembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato 08/2017, Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio STCP Engenharia de Projetos Ltda – Ludovino Lopes, Ricci e Santos Sociedade de Advogados.
- **Valor do Contrato:** R\$ 696.833,21.

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água


Subprojeto 53: Elaboração do Plano de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto – 81 municípios.

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 1.153.752,25
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Agosto 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 20/2016, assinado em 01/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** Bureau de Projetos e Consultoria Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.608.864,60.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
2.608.864,60	913.102,61	1.695.761,99	05/11

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 54: Desenvolver Implementação da Coleta Seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 478.827,98
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 19/2017, assinado em 20/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** I&T Informações e Técnicas em Construção Civil Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.549.008,53.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
1.549.008,53	774.504,27	774.504,26	05/05



SEMACE

Subprojetos SEMACE

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	SEMACE	Elaboração do planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.	Contrato em Execução
2	SEMACE	Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE	Contrato Concluído Físico e Financeiro

	Baixo - de 0 a 06 meses
	Médio - de 07 a 10 meses
	Alto - 11 mês
	Altíssimo - acima de 11 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

SEMACE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 55: Elaboração do planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.

- **Responsável:** Elizabeth Romão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 331.484,70
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 01/2017, assinado no dia 10/01/2017.
- **Consultora Vencedora:** Tramitty Serviços LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.072.352,99.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
1.072.352,99	689.506,35	382.846,64	23/25

SEMACE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 56: Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE.

- **Responsável:** Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 273.507,90
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 20/2016 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** MBS CONSULTING – MBS Estratégias e Sistemas Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 672.609,00.



SEPLAG

Subprojetos SEPLAG

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	SEPLAG	Concepção de Metodologia de Planejamento de Investimentos.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
2	SEPLAG	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	SEPLAG	Empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
4	SEPLAG	Empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do Ceará.	Contrato em Execução
5	SEPLAG	Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.	Contrato em Execução
6	SEPLAG	Desenvolvimento do projeto de Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
7	SEPLAG	Consultor Individual - Otimização das Rotas. (Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará). ROTEIRIZAÇÃO	Contrato em Execução
8	SEPLAG	Contratação de Consultor Individual - Plano Estratégico de Gestão das Frotas. (Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará).	Em fase de assinatura do contrato.

SEPLAG - Assistência Técnica - Gestão Pública

Subprojeto 57: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

- **Responsável:** Aduino Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 504.550,12
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2014 – Outubro 2016
- **Estágio Atual:** Contrato nº 17/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora vencedora:** Consórcio Macroplan e Transplan.
- **Valor do Contrato:** 1.140.888,73.

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 58: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial.

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.171.522,32
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Janeiro 2016
- **Estágio Atual:** Contrato nº 23/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora vencedora:** Macroplan Prospectiva, Estratégia e Gestão S/S Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ 2.667.519,34.

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 59: Empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Dominique Gomes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 366.027,15
- **Método de Aquisição:** SBQ
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Outubro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato nº 29/2016, Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora vencedora:** Consórcio IADH x DELOS.
- **Valor do contrato:** R\$ 1.025.662,05.

SEPLAG - Assistência Técnica - Gestão Pública

Subprojeto 60: Empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Fábio Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 693.972,18
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 25/2016, assinado em 16/09/2016.
- **Consultora vencedora:** Deloitte Touche Tohatsu Consultores Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ R\$ 2.245.000,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
2.245.000,00	738.000,00	1.507.000,00	08/14

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 61: Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Silvana Dourado
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 818.677,30
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 02/2017, assinado em 24/03/2017.
- **Consultora vencedora:** Elogroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ 2.648.421,05.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
2.648.421,05	158.905,27	2.489.515,78	03/34

SEPLAG - Assistência Técnica – Fiduciário

Subprojeto 62: Desenvolvimento do projeto de Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 238.726,47
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Contrato nº 32/2016, Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora vencedora:** NTConsult Tecnologia e Consultoria Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ 772.280,12.

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 63: Consultor Individual - Otimização das Rotas. (Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará). ROTEIRIZAÇÃO

- **Responsável:** André Theophilo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 42.287,47
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2017 – Abril 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 32/2017, assinado em 16/11/2017.
- **Consultor vencedor:** Gustavo Sampaio de Castro.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 136.800,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
136.800,00	0,00	136.800,00	02/04

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 64: Contratação de Consultor Individual - Plano Estratégico de Gestão das Frotas. (Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará).

- **Responsável:** André Theophilo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 49.335,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2017 – Abril 2018
- **Estágio Previsto:** Em fase de assinatura o contrato.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial encaminhou a Homologação e Adjudicação para publicação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SRH

Subprojetos SRH

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	SRH	Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga e Cobrança.	Contrato em Execução
2	SRH	Sistema de Informação de Gestão dos Recursos Hídricos (cadastro, fiscalização, outorga, monitoramento qualitativo, segurança de barragens e medição) com Integração com o Sistema Administrativo Financeiro PROTHEUS.	Contrato em Execução
3	SRH	Consultor Individual - Malha D'agua.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

	Baixo - de 0 a 06 meses
	Médio - de 07 a 10 meses
	Alto - 11 mês
	Altíssimo - acima de 11 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 65: Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.

- **Responsável:** Deborah Mithya e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 431.620,55
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 02/2016, assinado em 27/10/2016.
- **Consultora Vencedora:** IBI Engenharia Consultiva.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.396.292,47.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
1.396.292,47	1.189.501,55	206.790,92	21/24

SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 66: Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. **SIGERH***

- **Responsável:** Deborah Mithya e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 403.809,40
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 03/2016, assinado em 23/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** Capgemini Consulting Technology Outsourcing.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.306.323,41.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
1.306.323,41	287.391,15	1.018.932,26	04/16

SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 67: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - **Malha D'agua.***

- **Responsável:** Deborah Mithya e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do TOR:** US\$ 127.697,05
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Contrato 01/2016, Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Dorian Ponte Lima
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 345,600,00.



COGERH

Subprojetos COGERH

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	COGERH	Fortalecimento do Manejo Estadual de Recursos Hídricos.	Contrato em Execução
2	COGERH	Empresa para Elaborar o Plano de Segurança Hídrica.	Contrato em Execução
3	COGERH	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acaraú e Salgado).	Contrato Concluído Físico e Financeiro

	Baixo - de 0 a 06 meses
	Médio - de 07 a 10 meses
	Alto - 11 mês
	Altíssimo - acima de 11 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 68: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Quali-quantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 677.500,59
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 48/2015, assinado em 24/11/2015.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Água e Solo / Quanta / Engeplus.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.954.015,55.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
1.954.015,55	1.655.987,24	298.028,31	24/24

COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 69: Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 742.914,10
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 21/2016, assinado em 19/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Nippon Koei Latin America - Caribbean Co. Ltd. / Nippon Koei LAC do Brasil Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.403.327,11.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
2.403.327,11	1.580.187,57	823.139,54	13/19

COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 70: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor Subprojeto:** US\$ 27.326,28
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Outubro 2015
- **Estágio Atual:** Contrato nº 25/2015, Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Rosana Garjulli Sales Costa.
- **Valor do Contrato + Patronal :** R\$ 61.790,40.



STDS

Subprojetos STDS

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	STDS	Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias visando o Aprofundamento desse Referencial teórico operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
2	STDS	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	STDS	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.	Contrato em Execução

	Baixo - de 0 a 06 meses
	Médio - de 07 a 10 meses
	Alto - 11 mês
	Altíssimo - acima de 11 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 71: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 64.213,69
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Novembro 2016
- **Estágio Atual:** Contrato nº 22/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Maria Cílvia Queiroz.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 145.200,00.

STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 72: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 63.174,42
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Setembro 2015
- **Estágio Atual:** Contrato nº 17/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** Empresa Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 142.850,00.

STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 73: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 892.888,73
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico (NCB)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Março 2018
- **Estágio Previsto:** Em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução - Contrato nº 058/2016, assinado em 25/05/2016.
- **Consultora Vencedora:** Maestria Comunicação e Eventos LTDA - EPP.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.019.000,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
2.019.000,00	832.091,00	1.186.909,00	07



TCE

Subprojetos TCE

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	TCE	Desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.	Contrato em Execução
2	TCE	Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	TCE	Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).	Contrato Concluído Físico e Financeiro
4	TCE	Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem Como, o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De Direito Financeiro.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

	Baixo - de 0 a 06 meses
	Médio - de 07 a 10 meses
	Alto - 11 mês
	Altíssimo - acima de 11 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 74: Desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.

- **Responsável:** Glinton Ferreira / Delinda Almeida
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 834.461,49
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/ Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 21/2016 em Execução. Assinado em 28/07/2017.
- **Consultora Vencedora:** Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
- **Valor do Contrato:** 2.699.484,21.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos
2.699.484,21	836.840,10	1.862.644,11	05/16

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 74: Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 61.694,57
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Agosto 2016
- **Estágio Atual:** Contrato nº 15/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultor:** Roberto Vilela Resende.
- **Valor do Contrato + Despesas Reembolsáveis:** R\$ 139.503,76.

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 76: Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 100.915,62
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Atual:** Contrato nº 12/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultor:** Carlos Roberto Takao Yoshioka.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 228.190,40.

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 77: Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem Como, o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De Direito Financeiro.

- **Responsável:** Glinton Ferreira
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 30.225,66
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico (NCB)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2016 – Setembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato nº 06/2017 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** DF Turismo e Eventos Ltda-ME.
- **Valor do Contrato:** R\$ 97.780,00.



5. APROVAÇÃO DA ATA

46ª REUNIÃO COMITÊ *PforR* (30/11/2017)

Próxima Reunião do Comitê PforR

ANO 2018	
MÊS	DIA ¹
JANEIRO	25
FEVEREIRO	22
MARÇO	22 ²
ABRIL	26
MAIO	24 ³
JUNHO	28
JULHO	26
AGOSTO	30
SETEMBRO	27
OUTUBRO	25
NOVEMBRO	29
DEZEMBRO	20

1 Agendado para a última quinta-feira de cada mês.

2 Antecipado para a penúltima semana devido à Semana Santa

3 Antecipado para penúltima semana devido ao feriado de *Corpus Christi*

14h30m

IPECE



6. ENCERRAMENTO



*Que as comemorações do Natal sejam
marcadas pelo desejo de um novo
viver e de um novo caminhar
que nos conduza a um só objetivo:*

Semear o amor e a paz!



São os votos da equipe UGP/PforR

Unidade de Gerenciamento do Projeto PforR (UGP)
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora
Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N
Ed. SEPLAG, 2º andar- Fortaleza-CE
Tel.: (85) 3101.3499 e (85) 3101.3510
