



59ª REUNIÃO DO COMITÊ *PforR*
ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO
PROJETO *PforR*
21 DE DEZEMBRO DE 2018



PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

1. Abertura e apresentação dos participantes;
2. Indicadores, Programas e Assistência Técnica
 - 2.1. Indicadores Primários – Informações atualizadas
 - 2.2. Programas PforR
 - 2.3. Assistência Técnica – Estatísticas
 - 2.4. Pontos Principais de Aquisições / Contratos
3. Monitoramento Contratos
4. Projetos de assistência técnica por setorial contratados
5. Informações Importantes
6. Apresentação dos Resultados: Projetos de Assistência Técnica
7. Aprovação da Ata da 58ª Reunião (22/11/2018)
8. Encerramento



1. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES



2. INDICADORES, PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA



3.1. Indicadores

INDICADORES PRIMÁRIOS – Acompanhamento

| Nº | Setorial | Nome do Indicador |
|----|----------|--|
| 1 | SDE | DLI 1: aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação |
| 2 | SEDUC | DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP |
| 3 | SEDUC | DLI 3: número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos. |
| 4 | STDS | DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS |
| 5 | STDS | DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família. |
| 6 | SEPLAG | DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas |
| 7 | SRH | DLI 7: Estabelecimento de um comitê interagência de segurança hídrica |
| 8 | CAGECE | DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto. |
| 9 | SEMA | DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental. |
| 10 | FUNCEME | DLI 10: Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água. |
| 11 | SEPLAG | DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados. |
| 12 | SEPLAG | DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada |

INDICADORES PRIMÁRIOS – Acompanhamento (Status)

| Nº | Setorial | Nome do Indicador |
|----|----------|--|
| 1 | SDE | DLI 1: aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação |
| | Status | <ul style="list-style-type: none"> - Em setembro, a Secretaria esteve com o Cristian Quijada e na ocasião foi discutido sobre essa ação específica do Distrito Empreendedor e da sua ampliação para outros municípios, que atualmente está em Crateús, mas com outros municípios engatilhados. O polo de Crateus foi reformado e estão contemplando novas empresas. - Hubice não teve reunião desde a nossa última informação. |
| 2 | SEDUC | DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP |
| | Status | <ul style="list-style-type: none"> - A comissão de avaliação dos produtos do contrato 333/2018 aprovou o primeiro produto entregue pelo consultor referente ao Workshop e análise das funcionalidades da plataforma. - Sobre a produção de conteúdos (Vídeos) para a plataforma, os roteiros foram finalizados e a equipe começará as filmagens na primeira semana de janeiro. Esses vídeos farão parte de um seriado que se chamará Conexão: prepare-se! e trará dicas sobre postura profissional, preparação de currículo, apresentação pessoal, autoconhecimento dentre outros temas relevantes. - Com relação ao produto 2 do referido contrato, aguarda-se a entrega do mesmo pelo consultor para iniciarem as análises e implementações no sistema |
| 3 | SEPLAG | DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados. |
| | Status | <ul style="list-style-type: none"> - 17 acordos assinados (estão finalizando o 18º) - GTR funcionando (duas reuniões já realizadas) |
| 4 | SEPLAG | DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada |
| | Status | O projeto aguarda decisão superior para criação do grupo técnico e início dos trabalhos de implementação. |

INDICADORES SECUNDÁRIOS – Acompanhamento

| Nº | Setorial | Nome do Indicador |
|----|----------|--|
| 1 | STDS | Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas. |
| 2 | SEPLAG | Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT). |
| 3 | SEMA | Apresentação da Lei de Resíduos Sólidos revista. |
| 4 | IPECE | Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico). |
| 5 | COGERH | Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas. |
| 6 | COGERH | Apresentação da nova lei de proteção das bacias hidrográficas. |
| 7 | COGERH | Qualidade da água bruta na Região Metropolitana de Fortaleza. |

INDICADORES SECUNDÁRIOS – Acompanhamento (Status)

| Nº | Setorial | Nome do Indicador |
|----|---------------|--|
| 1 | COGERH | Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas. |
| | Status | Os Planos e as Atas foram entregues e serão submetidos ao Banco Mundial |
| 2 | COGERH | Apresentação da nova lei de proteção das bacias hidrográficas. |
| | Status | O Decreto Nº 32.851 de 01/11/2018 referente à Proteção das Bacias Hidrográficas foi publicado no DOE de 06 de novembro de 2018. |



3.2. Programas *PforR*

Posição dos Programas em 2017

| Meta 2014-2017 | Estipulada no Documento de Avaliação do Projeto | R\$ 728,00 | 100% |
|---|--|-------------------|-------------|
| Execução 2014 | Auditada pelo TCE | R\$ 223,36 | 30,68% |
| Execução 2015 | Auditada pelo TCE | R\$ 226,15 | 31,06% |
| Execução 2016 | Auditada pelo TCE | R\$ 275,39 | 37,83% |
| Execução 2017 | Auditada pelo TCE | R\$ 268,72 | 36,91% |
| Total Executado acumulado até 2017 | | R\$ 993,62 | 136% |

Execução Acumulada dos Programas – 2014 à 2017

| Setorial | EXECUÇÃO | | | | TOTAL |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| SEDUC | R\$ 208,91 | R\$ 213,00 | R\$ 263,25 | R\$ 257,87 | R\$ 943,04 |
| STDS | R\$ 7,21 | R\$ 7,24 | R\$ 7,36 | R\$ 7,32 | R\$ 29,13 |
| SRH/COGERH | R\$ 0,46 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,46 |
| CIDADES | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| SEMA | R\$ 0,39 | R\$ 1,11 | R\$ 0,24 | R\$ 0,69 | R\$ 2,43 |
| SEMACE | R\$ 4,60 | R\$ 2,43 | R\$ 2,71 | R\$ 1,32 | R\$ 11,06 |
| FUNCEME | R\$ 1,79 | R\$ 2,37 | R\$ 1,82 | R\$ 1,52 | R\$ 7,50 |
| TOTAL | R\$ 223,36 | R\$ 226,15 | R\$ 275,39 | R\$ 268,72 | R\$ 993,62 |

- ✓ Em 06 de dezembro de 2018, o TCE apresentou o Relatório de Auditoria referente às despesas do ano de 2017, confirmando o valor executado de R\$ 268,72 milhões.

Posição da Execução dos Programas - 2018

Capacitação Profissional

| SEDUC | Orcamento | Restos a Pagar | Total |
|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 020 - Ensino Integrado à Educação Profissional | R\$ 266.361.726,68 | R\$ 21.816.538,21 | R\$ 288.178.264,89 |
| 020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional. | R\$ 85.428.002,13 | R\$ 13.584.689,28 | R\$ 99.012.691,41 |
| 18802 - EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. | R\$ 85.340.180,13 | R\$ 12.919.453,28 | R\$ 98.259.633,41 |
| 18803 - EXPANSÃO E MELHORIA DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. | R\$ 87.822,00 | R\$ 665.236,00 | R\$ 753.058,00 |
| 020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional. | R\$ 130.215,63 | R\$ - | R\$ 130.215,63 |
| 18804 - EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. | R\$ 80.031,63 | R\$ - | R\$ 80.031,63 |
| 18805 - EXPANSÃO E MELHORIA DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. | R\$ 50.184,00 | R\$ - | R\$ 50.184,00 |
| 020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional. | R\$ 146.686.625,35 | R\$ 6.990.937,71 | R\$ 153.677.563,06 |
| 22668 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - APORTE. | R\$ 8.628.347,72 | R\$ 847.527,51 | R\$ 9.475.875,23 |
| 22669 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. | R\$ 134.912.538,20 | R\$ 5.095.810,65 | R\$ 140.008.348,85 |
| 22670 - GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. | R\$ 3.145.739,43 | R\$ 1.047.599,55 | R\$ 4.193.338,98 |
| 020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional. | R\$ - | R\$ 10.468,90 | R\$ 10.468,90 |
| 18807 - AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS. | R\$ - | R\$ 10.468,90 | R\$ 10.468,90 |
| 020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos. | R\$ 34.116.883,57 | R\$ 1.230.442,32 | R\$ 35.347.325,89 |
| 18815 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. | R\$ 34.116.883,57 | R\$ 1.230.442,32 | R\$ 35.347.325,89 |

Posição da Execução dos Programas - 2018

Assistência à Família

| STDS | Orçamento | Restos a Pagar | Total |
|--|------------------|----------------|------------------|
| 080 – Proteção Social Básica | R\$ 7.293.250,00 | R\$ - | R\$ 7.293.250,00 |
| 080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social. | R\$ 7.293.250,00 | R\$ - | R\$ 7.293.250,00 |
| 22874 - COFINANCIAMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | R\$ 7.293.250,00 | R\$ - | R\$ 7.293.250,00 |

Posição da Execução dos Programas - 2018

Qualidade da Água

| CIDADES | Orçamento | Restos a Pagar | Total |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana | R\$ 500.000,00 | R\$ - | R\$ 500.000,00 |
| 025.1.07 - Ampliação do serviço de esgotamento sanitário. | R\$ 500.000,00 | R\$ - | R\$ 500.000,00 |
| 18946 - AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - P4R | R\$ 500.000,00 | R\$ - | R\$ 500.000,00 |

Posição da Execução dos Programas - 2018

Qualidade da Água

| SEMA | Orçamento | Restos a Pagar | Total |
|--|------------------|-----------------------|----------------|
| 064 – Resíduos Sólidos | R\$ 172.545,26 | R\$ 166.400,00 | R\$ 338.945,26 |
| 064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos. | R\$ 172.545,26 | R\$ 166.400,00 | R\$ 338.945,26 |
| 18911 - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | R\$ 172.545,26 | R\$ 166.400,00 | R\$ 338.945,26 |
| 066 – Ceará Mais Verde | R\$ 145.203,10 | R\$ 532.692,86 | R\$ 532.692,86 |
| 066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas. | R\$ 145.203,10 | R\$ 532.692,86 | R\$ 532.692,86 |
| 17569 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS | R\$ 145.203,10 | R\$ 532.692,86 | R\$ 532.692,86 |

Posição da Execução dos Programas - 2018

Qualidade da Água

| SEMACE | Orçamento | Restos a Pagar | Total |
|---|------------------|-----------------------|------------------|
| 066 – Ceará Mais Verde | R\$ - | R\$ 2.000.846,93 | R\$ 2.000.846,93 |
| 066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais. | R\$ - | R\$ 2.000.846,93 | R\$ 2.000.846,93 |
| 18657 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS | R\$ - | R\$ 2.000.846,93 | R\$ 2.000.846,93 |
| 500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada | R\$ 47.197,50 | R\$ 268.119,91 | R\$ 315.317,41 |
| 500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas. | R\$ 47.197,50 | R\$ 268.119,91 | R\$ 315.317,41 |
| 17971 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - SEMACE | R\$ 21.197,50 | R\$ 220.619,91 | R\$ 241.817,41 |
| 17973 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TI - SEMACE | R\$ 26.000,00 | R\$ 47.500,00 | R\$ 73.500,00 |

Posição da Execução dos Programas - 2018

Qualidade da Água


| FUNCEME | Orçamento | Restos a Pagar | Total |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis | R\$ 1.671.233,71 | R\$ 207.355,44 | R\$ 1.878.589,15 |
| 018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias. | R\$ 1.671.233,71 | R\$ 207.355,44 | R\$ 1.878.589,15 |
| 22611 - PROMOÇÃO E SUPORTE AO MONITORAMENTO E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES HIDROAGROMETEOROLÓGIAS | R\$ 1.671.233,71 | R\$ 207.355,44 | R\$ 1.878.589,15 |

| PROGRAMAS EXECUÇÃO ACUMULADA 2018 | Execução Orçamentária | Execução Extraorçamentária | Total |
|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | R\$ 276.191.156,25 | R\$ 24.991.953,35 | R\$ 301.037.906,50 |



3.3. Assistência Técnica

Execução dos 84 Projetos de AT (U\$)

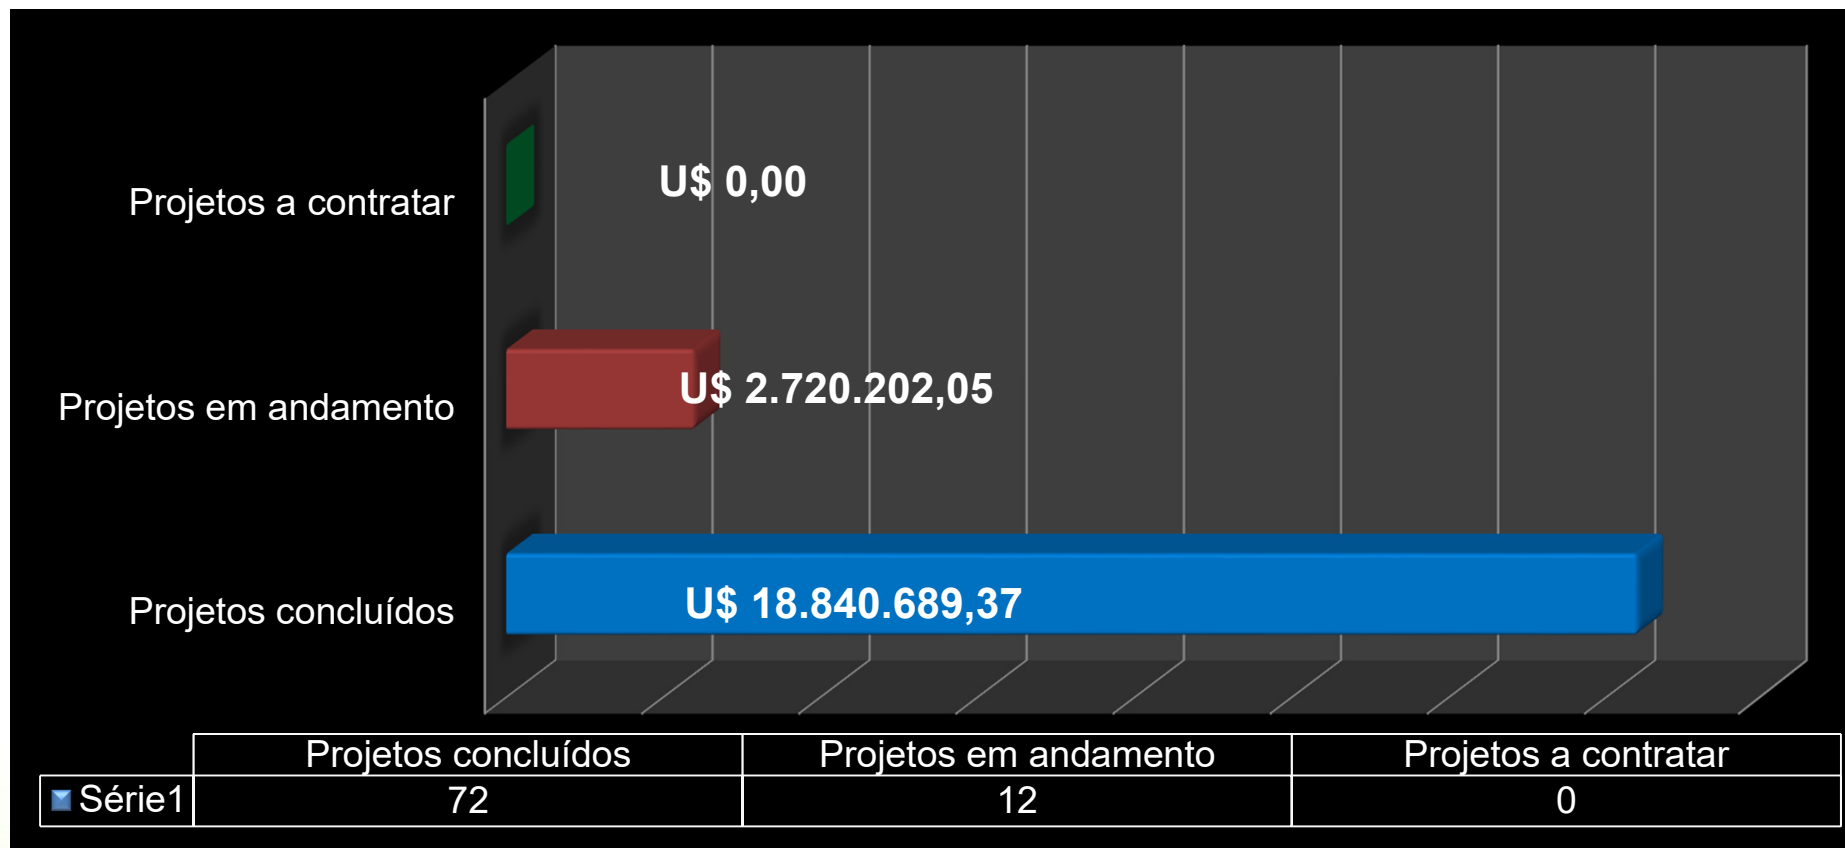


Fonte: UGP PforR

| Item | Quantidade | Valor (U\$) |
|---------------------------|------------|----------------------|
| Projetos Concluídos | 72 | 18.840.689,37 |
| Projetos em Andamento | 12 | 2.720.202,05 |
| Projetos a Contratar | 00 | 0,00 |
| Total dos Projetos | 84 | 21.560.891,42 |

Execução dos Subprojetos de AT por Etapa

| Total dos projetos | | Status | | % |
|--------------------|----|--------------|--------------------------|--------|
| 84 | 00 | Em Andamento | Atividades Preparatórias | 0,00% |
| | 00 | | Em Licitação | 0,00% |
| | 12 | | Em Execução | 15,00% |
| | 72 | Concluído | 85,00% | |

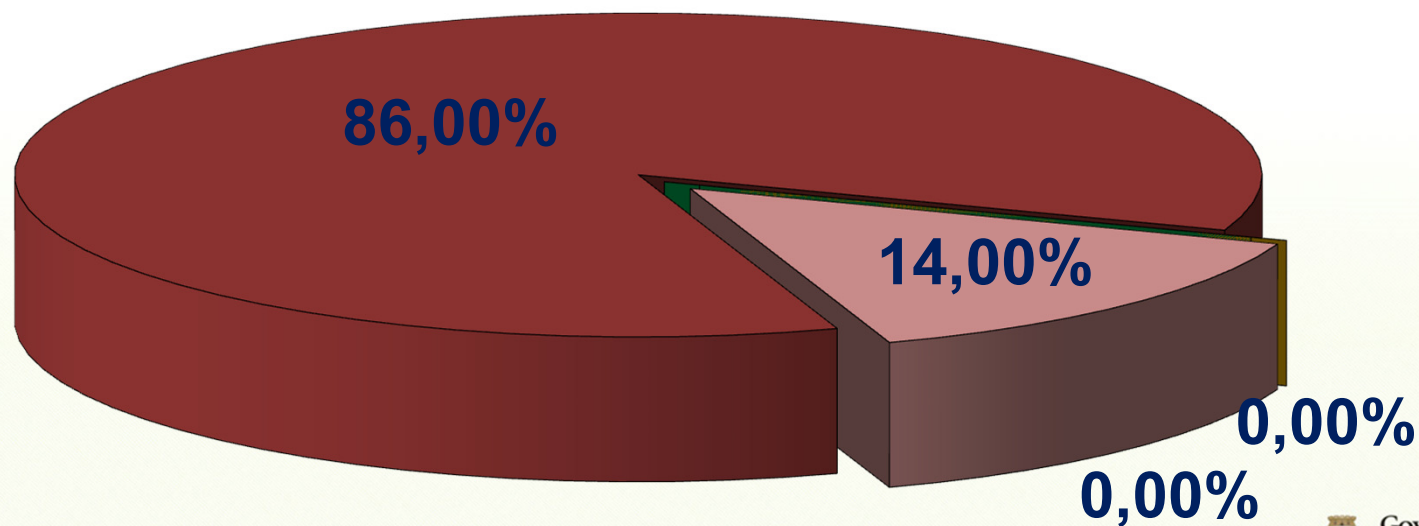



3.4 Pontos Principais de Aquisições / Contratos


Pontos Principais de Aquisições / Contratos

- Entrega dos Produtos e Atesto das Comissões devem ser realizadas dentro da vigência de cada Contrato e da vigência do Acordo de Empréstimo.



3. MONITORAMENTO CONTRATOS

Posição Geográfica das Empresas e dos Consultores Individuais contratados no escopo do PforR

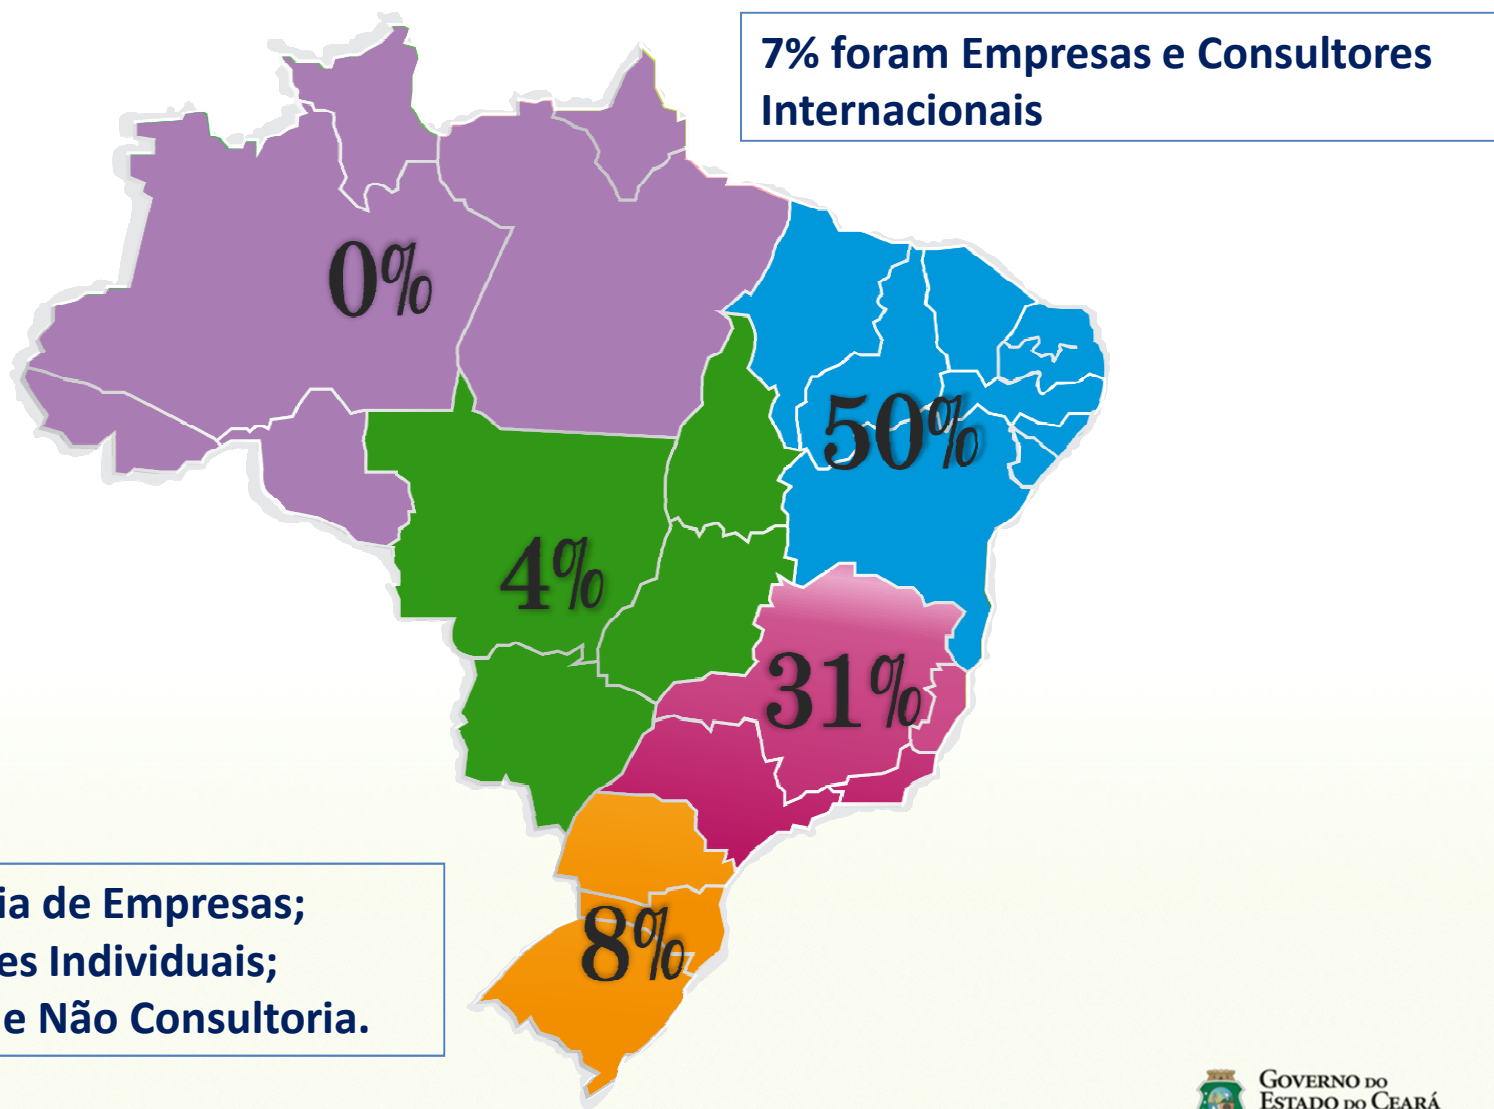


Contratos Assistência Técnica

| Resumo Financeiro dos Contratos | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| Setorial | Nº de Contratos | Nº de Contratos em Andamento | Nº de Contratos Concluídos | Valor Contratado + Patronal (R\$) | Valor Pago (R\$) | Saldo a Pagar (R\$) | % PAGO |
| ARCE | 1 | 0 | 1 | 839.982,65 | 839.982,65 | - | 100% |
| CGE | 9 | 0 | 9 | 7.883.944,98 | 7.883.944,98 | - | 100% |
| COGERH | 3 | 0 | 3 | 4.419.133,05 | 4.419.133,05 | - | 100% |
| FUNCEME | 1 | 0 | 1 | 1.666.842,98 | 1.666.842,98 | - | 100% |
| IPECE | 11 | 4 | 7 | 7.400.285,09 | 6.746.369,11 | 653.915,98 | 91% |
| SDE | 3 | 1 | 2 | 2.865.069,25 | 1.148.959,99 | 1.716.109,26 | 40% |
| SECITECE | 3 | 0 | 3 | 1.400.260,31 | 1.400.260,31 | - | 100% |
| SEDUC | 22 | 1 | 21 | 9.033.974,95 | 8.775.974,95 | 258.000,00 | 97% |
| SEMA | 7 | 0 | 7 | 7.234.534,13 | 7.234.534,13 | - | 100% |
| SEMACE | 2 | 0 | 2 | 1.639.804,89 | 1.639.804,89 | - | 100% |
| SEPLAG | 8 | 0 | 8 | 11.326.416,01 | 11.326.416,01 | - | 100% |
| SRH | 6 | 4 | 2 | 3.543.415,87 | 2.782.628,41 | 760.787,46 | 79% |
| STDS | 3 | 0 | 3 | 1.307.072,00 | 1.307.072,00 | - | 100% |
| TCE | 5 | 2 | 3 | 3.527.559,97 | 1.784.825,02 | 1.742.734,95 | 51% |
| TOTAL | 84 | 12 | 72 | 64.088.296,13 | 58.956.748,48 | 5.131.547,65 | 92% |


Cronograma Pagamentos dos 84 Subprojetos (R\$)

| Pago e Previsão de Pagamento da Assistência Técnica - PforR (R\$) | | | | | | | |
|---|-----------|------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| Ano | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Ano 2018 Pago até 14/12 | A pagar em Dez. 2018 e 2019 | Total |
| Valor | 72.600,00 | 975.610,02 | 11.205.680,55 | 30.812.910,71 | 15.889.947,50 | 5.131.547,41 | 64.088.296,19 |

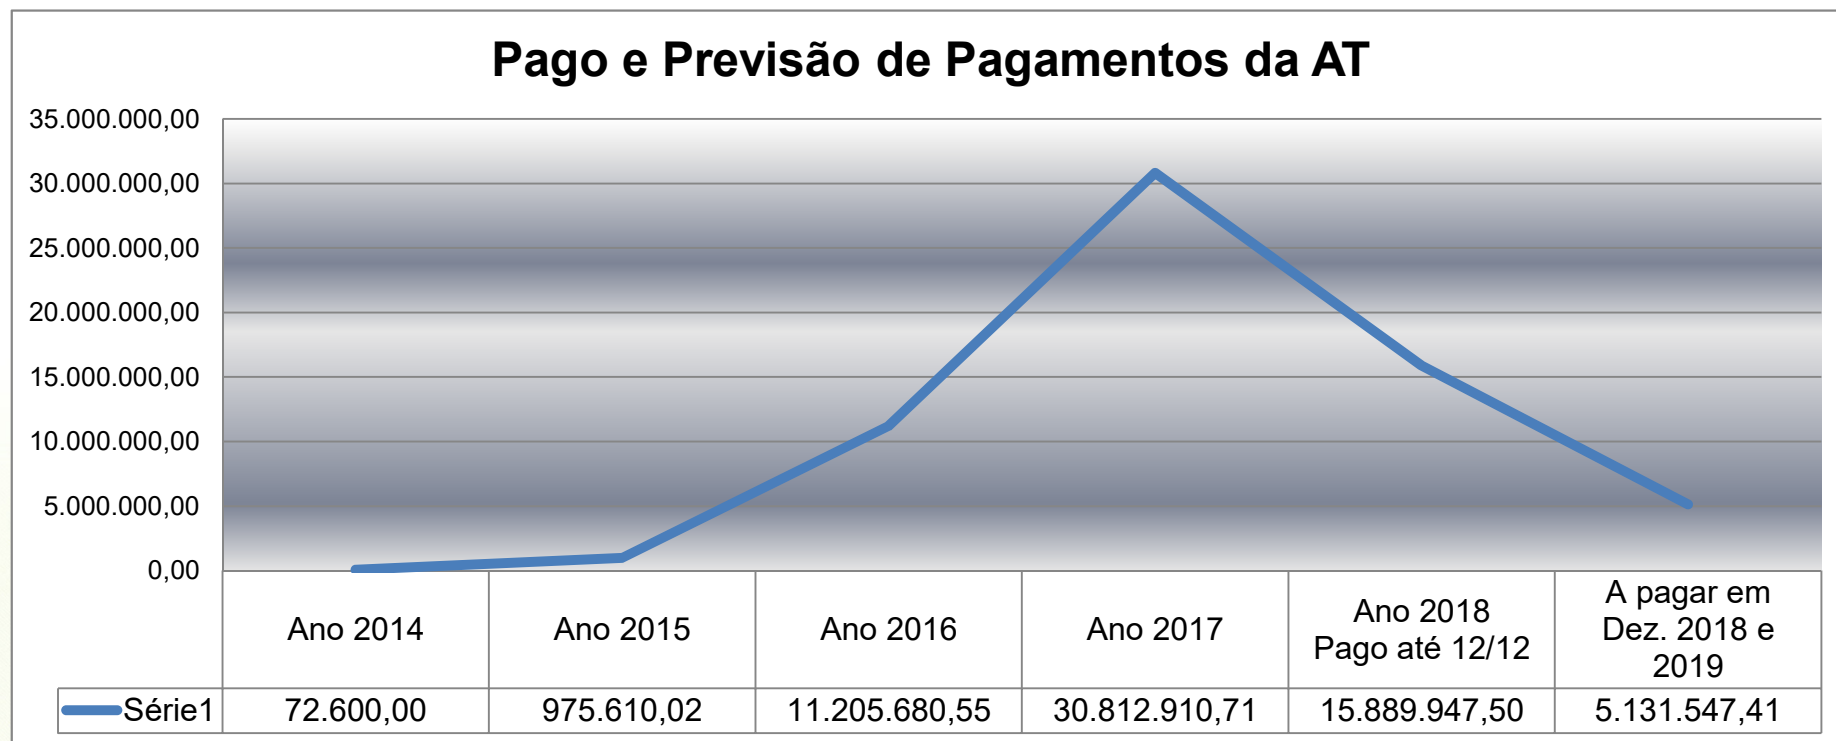

Situação dos Contratos – Aditivos de Prazo

| Setorial | ARCE | CGE | COGERH | FUNCEME | SEMA | SEMACE | SEPLAG | SDE | SEDUC | STDS | SECITECE | IPECE | TCE | SRH | TOTAL |
|------------------|------|-----|--------|---------|------|--------|--------|-----|-------|------|----------|-------|------|-----|-------|
| Nº Contratos | 1 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 22 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | 84 |
| Aditivo de Prazo | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 31 | 5 | 1 | 21 | 5 | 5 | 89 |
| % | 0% | 67% | 33% | 100% | 43% | 0% | 125% | 0% | 141% | 167% | 33% | 191% | 100% | 83% | 106% |

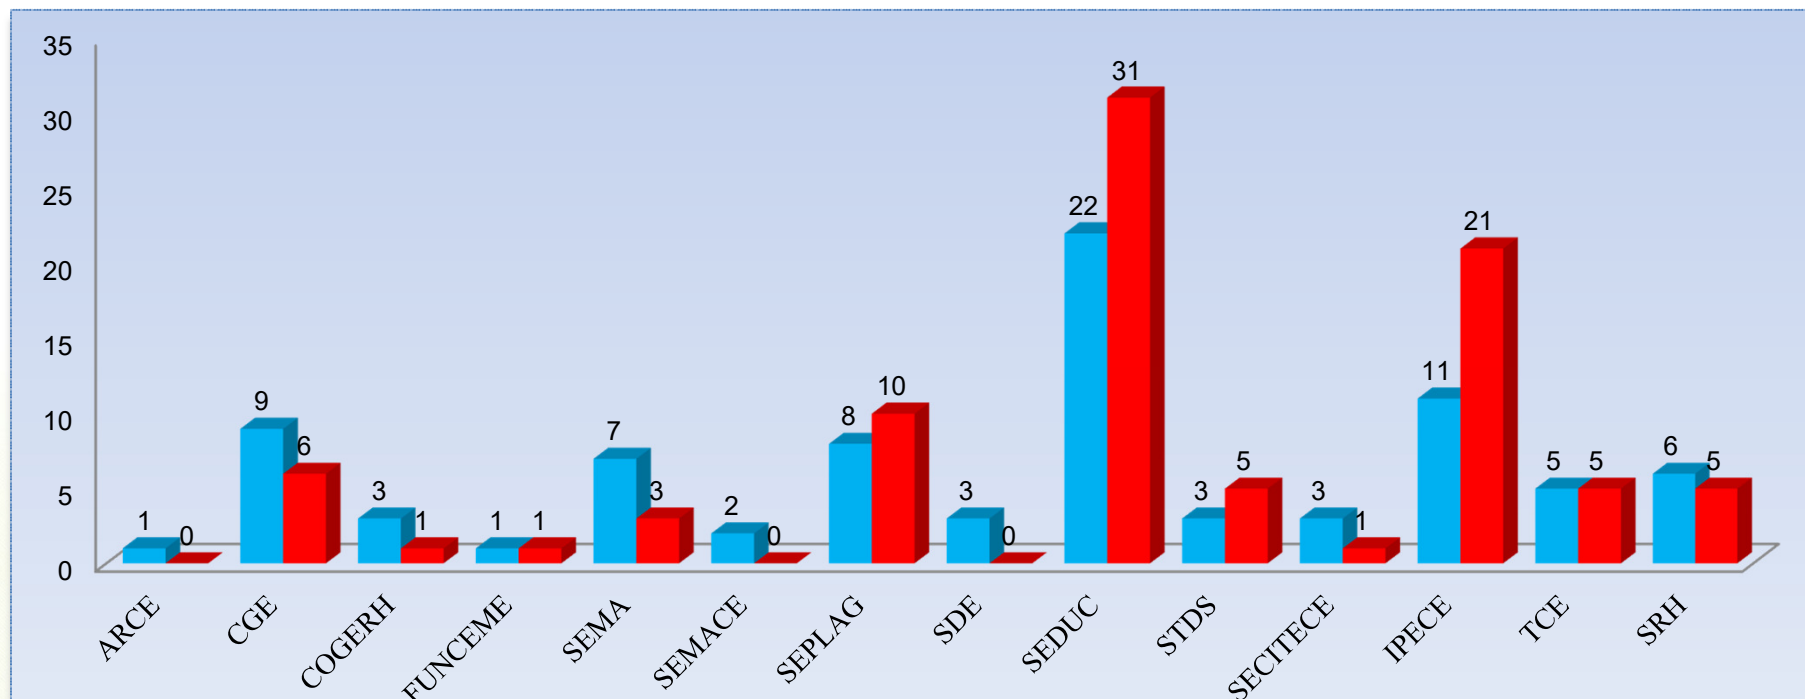



4. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR SETORIAL CONTRATADOS



ARCE

Subprojeto ARCE

| Nº | Órgão | Subprojetos | Risco |
|----|-------|--|--|
| 1 | ARCE | Desenvolvimento de modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Estado do Ceará. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |

ARCE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 1: Desenvolvimento de modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Subprojeto:** US\$ 342.109,75
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Fevereiro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 019/2016, assinado em 14/06/2016.
- **Consultora Vencedora:** RPG – Regulation, Performance and Governace Ltda.
- **Valor do Contrato + Taxas:** R\$ 839.982,65.



CGE

Subprojetos CGE

| Nº | Órgão | Subprojetos | Status |
|----|-------|--|--|
| 1 | CGE | Auditoria Técnica dos Indicadores I. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 2 | CGE | Auditoria Técnica dos Indicadores II. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 3 | CGE | Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (NEGÓCIO SIEC). | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 4 | CGE | Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SISTEMA SIEC). | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 5 | CGE | Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 6 | CGE | Capacitação da população para o Controle Social. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 7 | CGE | Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 8 | CGE | Realização de treinamentos com foco no “apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público”. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 9 | CGE | Consultoria individual especializada, em gestão documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |

CGE- Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojetos 2 e 3: Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR. ¹

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 67.354,63
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévio
- **Início/Término:** Junho 2014 - Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contratos Concluídos Físico e Financeiro. Contratos nº 01/2015 e 01/2016 e assinados em 13/01/2015 e 01/02/2016.
- **Consultores:** Marcelo Ponte Barbosa e Túlio Cravo.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 152.302,30.

Nota 1: Auditoria será realizada pela equipe da CGE a partir do semestre 16.1

CGE - Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 4: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Marcelo Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 284.089,71
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2015 – Junho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 08/2016, assinado em 15/06/2016.
- **Consultora Vencedora:** NTConsult Tecnologia e Consultoria LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 725.256,92

CGE - Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 5: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).

- **Responsável:** Marcos Henrique
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 685.651,75
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Maio 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 026/2016, assinado em 07/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** Ivia Serviços de Informática Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.130.443,48.

CGE - Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 6: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.071.989,29
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2015 – Dezembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 029/2016, assinado em 24/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** Caiena Desenvolvimento de Sistemas Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 3.467.885,35.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

CGE - Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 7: Capacitação da população para o Controle Social.

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 267.522,72
- **Método de Aquisição:** LPN
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 01/2017 – Assinado em 20/01/2017
- **Consultora Vencedora:** Fundação Demócrito Rocha.
- **Valor do Contrato:** R\$ 865.436,00.

CGE - Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 8: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na “Detecção de Casos de Fraude e Corrupção” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.

- **Responsável:** Denise Andrade Araújo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 89.644,51
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 07/2017, assinado em 13/06/2017.
- **Consultora Vencedora:** Deloitte Touche Tohatsu Consultores Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 290.000,00

Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 9: Realização de treinamentos com foco no “apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público”.

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 61.026,58
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 025/2016, assinado em 07/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** KPMG Assessores Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 197.421,00.

CGE - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 10: Consultoria individual especializada, em gestão documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE.

- **Responsável:** Aglaio Soares
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 24.411,82
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Março de 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 012/2015, assinado em 08/09/2015.
- **Consultor:** Fernando Braga.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 55.200,00.



FUNCEME

Subprojeto FUNCEME

| Nº | Órgão | Subprojetos | Risco |
|----|---------|--|--|
| 1 | FUNCEME | Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |

FUNCEME - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 11: Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Francisco Hoilton
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Proposta Vencedora:** 679.677,00 (US\$ + €)
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Maio 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 10/2015, assinado em 09/09/2015.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Aqualogus / Azurit.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.666.864,98.



IPECE

Subprojetos IPECE

| Nº | Órgão | Subprojetos | Status |
|----|-------|---|------------------------------|
| 1 | IPECE | Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará - CONSULTORES PLENOS. | Contrato em Execução |
| 2 | IPECE | Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará - CONSULTORES PLENOS. | Contrato Rescindido |
| 3 | IPECE | Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. CONSULTOR JÚNIOR. | Contrato Rescindido |
| 4 | IPECE | Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. ANALISTA LICITAÇÕES. | Contrato em Execução |
| 5 | IPECE | Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. ANALISTA LICITAÇÕES. | Contrato Rescindido |
| 6 | IPECE | Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. ANALISTA LICITAÇÕES. | Contrato em Execução |
| 7 | IPECE | Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR. | Contrato Físico e Financeiro |
| 8 | IPECE | Desenvolvimento de sistemas de informação digital, para implementação e implantação de 02 (dois) sistemas denominados IPECEDATA e sistema de monitoramento e avaliação dos projetos e beneficiários do FECOP. | Contrato Físico e Financeiro |
| 9 | IPECE | Desenvolvimento de metodologias para planejamento e avaliação dos projetos estratégicos de investimentos do poder executivo do Estado do Ceará. | Contrato Físico e Financeiro |
| 10 | IPECE | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização e realização de eventos e congressos. | Contrato Físico e Financeiro |
| 11 | IPECE | Consultoria para a formulação de ferramentas de gestão: Produtividade Setorial do Trabalho e Inflação Interna. | Contrato em Execução |

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojetos 12 e 13: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTORES PLENOS

- **Responsável:** Viviane Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 308.277,81
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2019
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 06/2014, assinado em 16/07/2014 (em execução) e Contrato nº 09/2015, assinado em 17/07/2015 (rescindido).
- **Consultora:** Giuseppe Furtado Nogueira e Viviane Ramos da Costa.
- **Valor dos Contratos + Patronal + Aditivos:** 691.644,21
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 14: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTOR JÚNIOR

- **Responsável:** Viviane Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 21.227,67
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato nº 07/2014, assinado em 14/07/2014 - Rescindido.
- **Consultora:** Viviane Ramos da Costa.
- **Valor do Contrato:** R\$ 48.000,00.

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojetos 15, 16 e 17: Contratação de 03 (três) **Analistas em Licitações** para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- **Responsável:** Viviane Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 247.994,30
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Janeiro 2019
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 08 /2015, assinado em 17/07/2015 (em execução), Contrato nº 09/2015, assinado em 17/07/2015 (rescindido) e Contrato nº 13/2015, assinado em 17/07/2015 (em execução).
- **Consultora:** Rodrigo José Almeida Rufino, Lívia Maria Oliveira de Castro e André Morel Gonzaga.
- **Valor dos Contratos + Patronal + Aditivos:** R\$ 578.569,50
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 18: Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR.

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 141.873,05
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Junho 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 10/2015, assinado em 01/09/2015.
- **Consultora:** Carlos Alberto Manso.
- **Valor do Contrato + Patronal + Aditivos:** R\$ 385.040,64.
-

IPECE - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 19: Desenvolvimento de sistemas de informação digital, para implementação e implantação de 02 (dois) sistemas denominados IPECEDATA e sistema de monitoramento e avaliação dos projetos e beneficiários do FECOP.

- **Responsável:** Mário Aragão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 736.757,76
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Outubro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído Físico e Financeiro
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 01/2017, assinado em 17/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** Nova Via Tecnologia e Mobilidade Ltda.
- **Valor do Contrato:** 2.407.307,70.

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 20: Consultoria Especializada (Pessoa Jurídica), para Desenvolvimento de Metodologias para Análise de Impactos Econômicos, no Estado Do Ceará.

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 519.266,58
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 04/2017, assinado em 28/04/2017.
- **Consultora Vencedora:** Quadrante Consultoria Econômica Ltda.
- **Valor do Contrato:** 1.720.136,97.

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 21: Empresa especializada na prestação de serviços de organização e realização de eventos e congressos.

- **Responsável:** Flávio Ataliba
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 95.878,66
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2017 – Dezembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído Físico e Financeiro
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 07/2018, assinado em 14/06/2018.
- **Consultoria Vencedora:** JR Alacrino Rocha Menezes.
- **Valor do Contrato:** R\$ 396.650,00.

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 22: Consultoria para a formulação de ferramentas de gestão: Produtividade Setorial do Trabalho e Inflação Interna.

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 315.378,67
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2018 – Janeiro 2019
- **Estágio Previsto:** Em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato nº 10/2018, assinado no dia 01/10/2018. Setorial elaborando Aditivo.
- **Consultora Vencedora:** Fundação Getúlio Vargas – FGV.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.020.250,00
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos | % Pago |
|--------------|------------|------------|----------|--------|
| 1.020.250,00 | 418.302,50 | 601.947,50 | 07/14 | 41,00% |



SDE / ADECE

Subprojetos SDE

| Nº | Órgão | Subprojetos | Status |
|----|-------|---|--|
| 1 | SDE | Desenvolvimento do sistema FDI (Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas). | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 2 | SDE | Impact Evaluation Workshop em Istambul. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 3 | SDE | Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará. | Contrato em Execução |

SDE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 23: Desenvolvimento do sistema FDI (Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas).

- **Responsável:** Fernando Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 388.117,50
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 03/2016, assinado em 26/08/2016.
- **Consultora Vencedora:** Ivia Serviços de Informática Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.142.416,04.

SDE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 24: Impact Evaluation Workshop Istanbul

- **Responsável:** Inês Studart
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 2.894,02
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Maio 2015.
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro. Contrato 02/2013 e assinado em 16/06/2015.
- **Consultora Vencedora:** Casa Blanca / Maria Inês Cavalcante Studart Menezes.
- **Valor do Contrato:** R\$ 6.543,95.

SDE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 25: Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Filipe Rabelo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 487.465,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2017 – Janeiro 2019
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 05/2018, assinado em 03/09/2018.
Consultora Vencedora: Consórcio Sociedade Portuguesa de Inovação - SPI / QUANTA Consultoria Ltda. Setorial elaborando o aditivo. Aguardando o pagamento do primeiro produto.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.716.109,26
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos | % Pago |
|------------------|----------|------------------|----------|--------|
| R\$ 1.716.109,26 | R\$ 0,00 | R\$ 1.716.109,26 | 01/10 | 0,00% |



SECITECE

Subprojetos SECITECE

| Nº | Órgão | Subprojetos | Status |
|----|----------|---|--|
| 1 | SECITECE | Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 2 | SECITECE | Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 3 | SECITECE | Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |

SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 26: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.

- **Responsável:** Flaviana Pereira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 139.917,03
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 16/2017, assinado em 25/07/2017.
- **Consultora Vencedora:** Ferraro Projetos e Investimento Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 452.631,58

SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 27: Elaboração do plano estadual de ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Flaviana Pereira / Tarcísio Hilter
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 238.111,76
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 06/2016, assinado em 20/04/2016.
- **Consultora Vencedora:** Macroplan Prospectivo, Estratégia e Gestão Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 770.291,53

SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 28: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

- **Responsável:** Flaviana Pereira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 57.428,61
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Abril 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 16/2016, assinado em 06/07/2016.
- **Consultora:** Maria Fatima Ludovico da Gama e Souza.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 177.593,20.



SEDUC

Subprojetos SEDUC

| Nº | Órgão | Subprojetos | Status |
|----|-------|---|--|
| 1 | SEDUC | Elaborar as matrizes de referência e os itens para compor os testes da avaliação de desempenho dos estudantes do 3º ano de vinte cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais de educação profissional do Estado do Ceará. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 2 | SEDUC | Formação Continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 3 | SEDUC | Serviço técnico de consultoria individual para apoiar na reestruturação de conteúdo e formato do portal conexão trabalho Ceará. | Contrato em Execução |
| 4 | SEDUC | Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 5 | SEDUC | Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 6 | SEDUC | Impact Evaluation Workshop em Istambul. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 7 | SEDUC | CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 8 | SEDUC | Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 9 | SEDUC | Desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 10 | SEDUC | Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 11 | SEDUC | Serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 12 | SEDUC | Contratação de serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |

Subprojetos SEDUC

| Nº | Órgão | Subprojetos | Status |
|----|-------|--|---|
| 12 | SEDUC | Especialista em Avaliação de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 13 | SEDUC | Desenvolvimento Infantil, com foco na educação, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN). | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 14 | SEDUC | Desenvolvimento Infantil, com foco na saúde, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN). | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 15 | SEDUC | Empresa especializada para elaboração de arte gráfica/design, revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, da Secretaria da Educação. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 16 | SEDUC | Apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 17 | SEDUC | Empresa de Consultoria especializada em visitas domiciliares e para formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN). | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 18 | SEDUC | Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN. (Coleta de Dados). | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 19 | SEDUC | Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 20 | SEDUC | Contratação de Consultoria Individual para o desempenho da função de coordenadora de campo nas atividades de coletas de dados da Formação de Gestores da Educação Infantil. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 21 | SEDUC | Aquisição de passagem aérea para participação de técnica que integra a equipe Coordenação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN no IV Simpósio – Luso-Brasileiro de Estudos da Criança – Por uma Luta sem Fronteiras na Defesa dos Direitos da Criança na cidade de Goiana – Goiás. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |

SEDUC- Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 29: Elaborar as matrizes de referência e os itens para compor os testes da avaliação de desempenho dos estudantes do 3º ano de vinte cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais de educação profissional do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 267.202,02
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Agosto 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 154/2017, assinado em 16/08/2017. 1º Aditivo de Prazo publicado, término em Agosto/2018.
- **Consultora Vencedora:** Universidade Federal de Juiz de Fora – Centro de Políticas Públicas de Avaliação da Educação (UFJF/CAED).
- **Valor do Contrato:** R\$ 864.398,52

SEDUC - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 30: Formação Continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 80.873,09
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Março 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 079/2017, assinado em 18/04/2017.
- **Consultora Vencedora:** Elos Orientação e Planejamento Educacional Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 261.624,46.

SEDUC - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 31: Serviço técnico de consultoria individual para apoiar na reestruturação de conteúdo e formato do portal conexão trabalho Ceará.

- **Responsável:** Josilene Dias e Victor Hugo
- **Categoria de Licitação:** Consultor Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 79.752,70
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2018 – Janeiro 2019
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 333/2018, assinado em 24/10/2018. Aguardando o pagamento do primeiro produto.
- **Consultor Vencedor:** Cláudio Carneiro de Mendonça.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 258.000,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos | % Pago |
|----------------|----------|----------------|----------|--------|
| R\$ 258.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 258.000,00 | 01/03 | 0,00% |

SEDUC- Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojetos 32 e 33: Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará (02 Consultores).

- **Responsável:** Luciano Nery
- **Categoria de Licitação:** CI
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 35.710,22
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2016 – Março 2018
- **Estágio Previsto:** Contratos Concluídos.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 83, assinado no dia 15/03/2017 e Concluído Físico e Financeiro; e Contrato nº 84, assinado em 15/03/2017 e rescindindo em 18/01/2018.
- **Consultores:** Antônio Jussier de Vasconcelos Ramos e Fernando Andrade de Alcântara.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 115.522,56

SEDUC- Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 34: Impact Evaluation Workshop Istanbul

- **Responsável:** Luciano Nery
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 3.154,13
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 565/2014, assinado em 28/11/2014.
- **Consultora:** Andréa Araújo Rocha Nibon.
- **Valor do Contrato:** R\$ 7.132,11.

SEDUC- Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 35: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 4.466,03
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Julho 2015.
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Maria Dagmar de Andrade Soares - Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER.
- **Valor do Contrato:** R\$ 10.098,59.

SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 36: Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento. WMS

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 6.850,73
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Setembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato N° 089/2017, assinado em 27/03/2017.
- **Consultor:** Samuel Simões Oliveira Franco.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 22.162,11.

SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 37: Desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 254.128,36
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Outubro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 105/2017, assinado em 20/04/2017. **Consultora Vencedora:** Instituto da Primeira Infância - IPREDE.
- **Valor do Contrato:** R\$ 822.105,26.

SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 38: Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 108.660,04
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2016 – Agosto 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 028/2017, assinado em 07/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** ECART Projetos e Gestão Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 351.515,22.

SEDUC- Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 39: Serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 15.783,62
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2016 – Junho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 021/2017, assinado em 07/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** Expressão Gráfica e Editora Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 51.060,00.

SEDUC- Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 40: Serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 1.185,63
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2017 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 43/2018, assinado em 01/03/2018.
- **Consultora Vencedora:** Expressão Gráfica e Editora Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 3.835,50.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 41: Especialista em **Avaliação** de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa.*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor Subprojeto:** US\$ 4.139,40
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2014 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 018/2015, assinado em 18/05/2015.
- **Consultor:** Flávio Augusto Rezende Cunha.
- **Valor do contrato:** R\$ 9.360,00.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 42: Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 25.207,85
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 017/2015, assinado em 23/03/2015.
- **Consultora:** Fátima Maria Araújo Saboia Leitão.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 57.000,00.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 43: Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 29.188,04
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 014/2015, assinado em 26/03/2015.
- **Consultora:** Ana Cecília Silveira Lins Sucupira.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 66.000,00.

SEDUC - Assistência Técnica –Assistência à Família

Subprojeto 44: Empresa Especializada para Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 61.838,85
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Setembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 029/2016, assinado em 11/02/2016.
- **Consultora Vencedora:** Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 139.830,00.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 45: Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US \$353.139,23
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Dezembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído Físico e Financeiro .
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 214/2016, assinado em 12/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** VC Promoções e Eventos Ltda – EPP.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.113.840,10.

SEDUC - Assistência Técnica –Assistência à Família

*Subprojeto 46: Empresa de Consultoria Especializada em **Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil** e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 278.645,92
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Dezembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 236/2016, assinado em 30/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** CASAM – Centro de Apoio Social e de Animação Missionária.
- **Valor do Contrato:** R\$ 820.855,00.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 47: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN. (Coleta de Dados).

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 1.336.765,46
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Outubro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 214/2016, assinado em 28/09/2016. Aguardando pagamento dos últimos produtos.
- **Consultora Vencedora:** Overview Serviços & Informação Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 3.739.071,95.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 48: Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 17.458,44
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Outubro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Rescindido – Contrato nº 253/2016, assinado em 19/10/2016.
- **Consultora Vencedora:** Rafaela Martins Leite Monteiro.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 45.694,11.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 49: Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 23.806,07
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2016 – Novembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 30/2017, assinado no dia 20/07/2017.
- **Consultora Vencedora:** Patrícia Simões.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 77.012,64.

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 50: Aquisição de passagem aérea para participação de técnica que integra a equipe Coordenação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN no IV Simpósio – Luso-Brasileiro de Estudos da Criança – Por uma Luta sem Fronteiras na Defesa dos Direitos da Criança na cidade de Goiânia – Goiás.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 655,38
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/ Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2018 – Dezembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído
- **Consultora Vencedora:** Casablanca Turismo e Viagens Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.120,14.



SEMA

Subprojetos SEMA

| Nº | Órgão | Subprojetos | Status |
|----|-------|--|--|
| 1 | SEMA | Elaboração do projeto “Avaliação do Impacto Econômico da Degradação Ambiental.” | Contrato Concluído Físico |
| 2 | SEMA | Desenvolvimento e execução de projeto em educação ambiental para a qualidade da água nas três bacias estratégicas. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 3 | SEMA | Apoio Logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas três bacias estratégicas. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 4 | SEMA | Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e programas do Estado do Ceará. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 5 | SEMA | Desenvolver projeto de lei que institui o programa de serviços ambientais no Estado do Ceará. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 6 | SEMA | Elaboração do Plano de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto – 81 municípios. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 7 | SEMA | Desenvolver Implementação da Coleta Seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 51: Elaboração do projeto “Avaliação do Impacto Econômico da Degradação Ambiental.” (AIEDA)

- **Responsável:** Maria Dias / Magda Marinho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 282.850,22
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 06/2016, assinado em 25/02/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Aquino – Mcrit SL – Barcelona Brasil Group.
- **Valor do Contrato + Taxa:** R\$ 851.841,63.

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 52: Desenvolvimento e execução de projeto em educação ambiental para a qualidade da água nas três bacias estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 266.182,85
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 06/2016, assinado em 25/02/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Engesoft Engenharia / Quanta Consultoria Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 710.638,32.

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 53: Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor Subprojeto:** US\$ 96.162,05
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 26/2016, assinado em 26/11/2015.
- **Consultora Vencedora:** Empresa MSV Multiserviços ME.
- **Valor do Contrato:** R\$ 242.557,52.

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 54: Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e programas do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Maria Dias / Francisco Leorne
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 202.789,54
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2014 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 16/2016, assinado em 05/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** Arcadis Logos S.A.
- **Valor do Contrato:** R\$ 563.157,73.

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 55: Desenvolver projeto de lei que institui o programa de serviços ambientais no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Maria Dias / Monica Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 215.404,39
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Dezembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 08/2017, assinado em 09/02/2017.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio STCP Engenharia de Projetos Ltda – Ludovino Lopes, Ricci e Santos Sociedade de Advogados.
- **Valor do Contrato:** R\$ 696.833,21.

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 56: Elaboração do Plano de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto – 81 municípios.

- **Responsável:** Maria Dias / Carla Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 843.903,71
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Dezembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 20/2016, assinado em 01/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** Bureau de Projetos e Consultoria Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.608.864,60.

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 57: Desenvolver Implementação da Coleta Seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 478.827,98
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 19/2017, assinado em 20/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** I&T Informações e Técnicas em Construção Civil Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.549.008,53.



SEMACE

Subprojetos SEMACE

| Nº | Órgão | Subprojetos | Status |
|----|--------|--|--|
| 1 | SEMACE | Elaboração do planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 2 | SEMACE | Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE | Contrato Concluído Físico e Financeiro |

SEMACE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 58: Elaboração do planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.

- **Responsável:** Elizabeth Romão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 298.978,64
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 01/2017, assinado em 10/01/2017.
- **Consultora Vencedora:** Tramitty Serviços LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 967.195,89

SEMACE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 59: Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE.

- **Responsável:** Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 273.507,90
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 20/2016, assinado em 13/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** MBS CONSULTING – MBS Estratégias e Sistemas Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 672.609,00.



SEPLAG

Subprojetos SEPLAG

| Nº | Órgão | Subprojetos | Status |
|----|--------|--|---|
| 1 | SEPLAG | Concepção de Metodologia de Planejamento de Investimentos. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 2 | SEPLAG | Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 3 | SEPLAG | Empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 4 | SEPLAG | Empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do Ceará. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 5 | SEPLAG | Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 6 | SEPLAG | Desenvolvimento do projeto de Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 7 | SEPLAG | Consultor Individual - Otimização das Rotas. (Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará). ROTEIRIZAÇÃO | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 8 | SEPLAG | Contratação de Consultor Individual - Plano Estratégico de Gestão das Frotas. (Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará). | Contrato Concluído Físico e Financeiro |

SEPLAG - Assistência Técnica - Gestão Pública

Subprojeto 60: Desenvolvimento de Metodologias para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Aduino Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 504.550,12
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2014 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 17/2015, assinado em 30/09/2015.
- **Consultora vencedora:** Consórcio Macroplan e Transplan.
- **Valor do Contrato:** 1.140.888,73.

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 61: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial.

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.171.522,32
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Março 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 23/2015, assinado em 10/11/2015.
- **Consultora vencedora:** Macroplan Prospectiva, Estratégia e Gestão S/S Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ 2.667.519,34.

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 62: Empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Dominique Gomes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 366.027,15
- **Método de Aquisição:** SBQ
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Outubro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 29/2016, assinado em 04/10/2016.
- **Consultora vencedora:** Consórcio IADH x DELOS.
- **Valor do contrato:** R\$ 1.025.662,05.

SEPLAG - Assistência Técnica - Gestão Pública

Subprojeto 63: Empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Fábio Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 705.416,77
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Junho 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 25/2016, assinado em 16/09/2016.
- **Consultora vencedora:** Deloitte Touche Tohatsu Consultores Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ R\$ 2.245.000,00.

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 64: Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Silvana Dourado
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 986.183,94
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Setembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 02/2017, assinado em 24/03/2017.
- **Consultora vencedora:** Elogroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda.
- **Valor do contrato + Aditivo:** R\$ 3.190.305,05.

SEPLAG - Assistência Técnica – Fiduciário

Subprojeto 65: Desenvolvimento do projeto de Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 238.726,47
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 32/2016, assinado em 23/11/2016.
- **Consultora vencedora:** NTConsult Tecnologia e Consultoria Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ 772.280,12.

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 66: Consultor Individual - Otimização das Rotas. (Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará). ROTEIRIZAÇÃO

- **Responsável:** André Theophilo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 42.287,47
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2017 – Junho 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 32/2017, assinado em 16/11/2017.
- **Consultor vencedor:** Gustavo Sampaio de Castro.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 136.800,00.

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 67: Contratação de Consultor Individual - Plano Estratégico de Gestão das Frotas. (Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará).

- **Responsável:** André Theophilo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 45.737,47
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2017 – Agosto 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 34/2017, assinado em 28/12/2017.
- **Consultor Vencedor:** Danilo Geraldo Ribeiro da Mota.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 151.584,00.



SRH

Subprojetos SRH

| Nº | Órgão | Subprojetos | Status |
|----|-------|--|--|
| 1 | SRH | Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga e Cobrança. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 2 | SRH | Sistema de Informação de Gestão dos Recursos Hídricos (cadastro, fiscalização, outorga, monitoramento qualitativo, segurança de barragens e medição) com Integração com o Sistema Administrativo Financeiro PROTHEUS. | Contrato em Execução |
| 3 | SRH | Consultor Individual - Malha D'agua. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 4 | SRH | Consultoria para avaliação socioambiental do projeto de apoio à melhoria da segurança hídrica e fortalecimento da inteligência na gestão pública do Estado do Ceará. | Contrato em Execução |
| 5 | SRH | Contratação de Consultoria pessoa física especializada para elaboração do Diagnóstico do Abastecimento de Água das Sedes Municipais e Distritos Contemplados pelo Projeto Malha D'água - Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central. | Contrato em Execução |
| 6 | SRH | Consultoria para a Avaliação das Condições de Segurança das Barragens Relacionadas ao Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará – PSHGP/CE. | Contrato em Execução |


SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 68: Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.

- **Responsável:** Heloísa Mota e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 490.799,80
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 02/2016, assinado em 27/10/2016.
- **Consultora Vencedora:** IBI Engenharia Consultiva.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.396.292,47.

SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 69: Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. **SIGERH***

- **Responsável:** Marcus Vinicius e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 403.809,40
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Dezembro 2018
- **Estágio Previsto:** Em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 03/2016, assinado em 23/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** Capgemini Consulting Technology Outsourcing.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.306.323,41.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos | % Pago |
|--------------|------------|------------|----------|--------|
| 1.306.323,41 | 836.046,99 | 470.276,42 | 15/24 | 64,00% |

SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 70: Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - **Malha D'agua.***

- **Responsável:** Heloísa Mota e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do TOR:** US\$ 127.697,05
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 01/2016, assinado em 18/05/2016.
- **Consultora:** Dorian Ponte Lima
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 345,600,00.

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 71: Avaliação socioambiental do projeto de apoio à melhoria da segurança hídrica e fortalecimento da inteligência na gestão pública do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Karine Machado
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 75.363,21
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2018 – Janeiro 2019
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 01/2018, assinado em 04/07/2018.
Aguardando o pagamento do último produto.
- **Consultora Vencedora:** NCA Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente SS LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 243.000,00
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos | % Pago |
|------------|------------|-----------|----------|--------|
| 243.000,00 | 170.660,00 | 73.140,00 | 04/04 | 70,00% |

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 72: Elaboração do Diagnóstico do Abastecimento de Água das Sedes Municipais e Distritos Contemplados pelo Projeto Malha D`água - Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central.

- **Responsável:** Karine Machado
 - **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
 - **Valor do Subprojeto :** US\$ 54.343,12
 - **Método de Aquisição:** CD
 - **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
 - **Início/Término:** Abril 2018 – Janeiro 2019
 - **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
 - **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 02/2018, assinado em 17/09/2018.
- Consultor Vencedor:** Dorian Ponte Lima
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 175.800,00
 - **Sinalização em relação ao Prazo:**

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos | % Pago |
|------------|------|------------|----------|--------|
| 175.800,00 | 0,00 | 175.800,00 | 02/04 | 0,00% |

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 73: Avaliação das Condições de Segurança das Barragens Relacionadas ao Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará – PSHGP/CE.

- **Responsável:** Karine Machado
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 18.274,11
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2018 – Dezembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 03/2018, assinado em 26/10/2018. Aguardando o pagamento do último produto.
- **Consultor Vencedor:** Antônio Nunes de Miranda
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 75.600,00
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos | % Pago |
|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 75.600,00 | 34.028,96 | 41.571,04 | 02/02 | 45,01% |



COGERH

Subprojetos COGERH

| Nº | Órgão | Subprojetos | Status |
|----|--------|---|---|
| 1 | COGERH | Fortalecimento do Manejo Estadual de Recursos Hídricos. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 2 | COGERH | Empresa para Elaborar o Plano de Segurança Hídrica. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 3 | COGERH | Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acaraú e Salgado). | Contrato Concluído Físico e Financeiro |

COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 74: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Quali-quantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 709.785,44
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 48/2015, assinado em 24/11/2015.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Água e Solo / Quanta / Engeplus.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.954.015,55.

COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 75: Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 848.780,06
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato 21/2016, assinado em 19/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Nippon Koei Latin America - Caribbean Co. Ltd. / Nippon Koei LAC do Brasil Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.403.327,11.

COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 76: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor Subprojeto:** US\$ 27.326,28
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Outubro 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato 28/2015, assinado em 23/06/2015.
- **Consultora:** Rosana Garjulli Sales Costa.
- **Valor do Contrato + Patronal :** R\$ 61.790,40.



STDS

Subprojetos STDS

| Nº | Órgão | Subprojetos | Status |
|----|-------|--|--|
| 1 | STDS | Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias visando o Aprofundamento desse Referencial teórico operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 2 | STDS | Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 3 | STDS | Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |

STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 77: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 64.213,69
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Novembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 22/2015, assinado em 06/05/2015.
- **Consultora:** Maria Cílvia Queiroz.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 145.200,00.

STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 78: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 63.174,42
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Setembro 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 17/2015, assinado em 07/04/2015.
- **Consultora Vencedora:** Empresa Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 142.850,00.

STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 79: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 354.604,28
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico (NCB)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Março 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 058/2016, assinado em 25/05/2016.
- **Consultora Vencedora:** Maestria Comunicação e Eventos LTDA - EPP.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.019.022,00.



TCE

Subprojetos TCE

| Nº | Órgão | Subprojetos | Status |
|----|-------|--|--|
| 1 | TCE | Desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE. | Contrato em Execução |
| 2 | TCE | Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 3 | TCE | Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE). | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 4 | TCE | Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem Como, o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De Direito Financeiro. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 5 | TCE | Consultoria individual especializada a fim de realizar um diagnóstico de governança no âmbito do tribunal de contas do estado do Ceará (TCE/CE). | Contrato em Execução |

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 80: Desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.

- **Responsável:** Delinda Almeida / Ricardo Araújo / Glinton Ferreira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 834.461,49
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/ Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Janeiro 2019
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 21/2016, assinado em 28/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
- **Valor do Contrato:** 2.699.484,21.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos | % Pago |
|--------------|--------------|--------------|----------|--------|
| 2.699.484,21 | 1.160.778,21 | 1.538.706,00 | 07/16 | 43,00% |

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 81: Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 61.694,57
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 15/2015, assinado em 11/05/2015
- **Consultor:** Roberto Vilela Resende.
- **Valor do Contrato + Despesas Reembolsáveis:** R\$ 139.503,76.

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 82: Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 100.915,62
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Junho 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 12/2015, assinado em 16/03/2015.
- **Consultor:** Carlos Roberto Takao Yoshioka.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 228.190,40.

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 83: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos.

- **Responsável:** Glinton Ferreira
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 30.225,66
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico (NCB)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2016 – Setembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 06/2017, assinado em 17/05/2017.
- **Consultora Vencedora:** DF Turismo e Eventos Ltda-ME.
- **Valor do Contrato:** R\$ 97.780,00.

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 84: Consultoria individual especializada a fim de realizar um diagnóstico de governança no âmbito do tribunal de contas do estado do Ceará (TCE/CE).

- **Responsável:** Glinton Ferreira
- **Categoria de Licitação:** Consultor Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 112.087,05
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/ Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2018 – Janeiro 2019
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 01/2018, assinado em 03/08/2018.
- **Consultor:** Humberto Falcão Martins.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 362.601,60.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos | % Pago |
|------------|------------|------------|----------|--------|
| 362.601,60 | 158.572,65 | 204.028,95 | 02/05 | 43,73% |



5. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Auditoria do Tribunal de Contas do Estado

- Reunião de Apresentação dos Achados de Auditoria foi realizado no dia 06/12/2018;
- Será enviado na próxima semana um e-mail para as setoriais solicitando o Plano de Ação.



6. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS: PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



SEMA -

ELABORAÇÃO DO PROJETO “PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS
ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) POR LIXÕES A CÉU ABERTO”



7. APROVAÇÃO DA ATA

58ª REUNIÃO COMITÊ *PforR* (22/11/2018)

Próxima Reunião do Comitê PforR

Última Reunião do Comitê PforR:

31/01/2019
14h30m – IPECE



8. ENCERRAMENTO

*Que as comemorações do Natal sejam
marcadas pelo desejo de um novo
viver e de um novo caminhar
que nos conduza a um só objetivo:*

Semear o amor e a paz!



São os votos da equipe UGP/PforR

Unidade de Gerenciamento do Projeto PforR (UGP)
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora
Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N
Ed. SEPLAG, Térreo, Fortaleza-CE
Tel.: (85) 3101.3502 e (85) 3101.3510
