



50ª REUNIÃO DO COMITÊ *PforR*
ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO
PROJETO *PforR*
22 DE MARÇO DE 2018



PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

1. Abertura e apresentação dos participantes;
2. Informações Importantes – **Laura Gonçalves / Viviane Costa**
3. Indicadores, Programas e Assistência Técnica
 - 3.1. Indicadores Primários 2017.2 e Desembolsos – **Laura Gonçalves**
 - 3.2. Programas PforR - **Thâmara Teixeira**
 - 3.3. Assistência Técnica – Estatísticas
 - 3.4 Tempo disponível até encerramento do PforR
 - 3.5. Pontos Principais de Aquisições / Contratos – **Giuseppe Nogueira**
4. Monitoramento Contratos – **André Morel**
5. Projetos de assistência técnica por setorial contratados
6. Apresentação dos Resultados de Assistência Técnica
 - ✓ COGERH
7. Aprovação da Ata da 49ª Reunião (22/02/2018) – **Viviane Costa**
8. Encerramento



1. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES



2. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Informações

➤ Lições Aprendidas PforR – Elaboração Relatório Final PforR -
Envio email setorial até 26 de fevereiro.

1 . Experiência adquirida no Projeto (Lições Aprendidas):

- ✓ Indicadores;
- ✓ Programas;
- ✓ Assistências Técnicas

2. Fortalecimento Institucional

➤ Envio das Informações pelas setoriais até **02 ABRIL**

Outras Informações

- **Plano de Ação referente às recomendações da Auditoria do TCE - exercício 2016 até 28/03/2018;**

SETORIAIS	PREVISÃO
SEMA	ENTREGUE
SEMACE	ENTREGUE
STDS	AGUARDANDO
SEDUC	AGUARDANDO
SRH	
COGERH	ENTREGUE
ARCE	ENTREGUE
SEPLAG	ENTREGUE



3. INDICADORES, PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA



3.1. Indicadores Primários 2017.2 e Desembolsos

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2017.2

Nº	Setorial	Nome do Indicador	Valor Desembolso US\$
1	SDE	DLI 1: aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação	3.120.000,00
2	SEDUC	DLI 3: número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.	3.120.000,00
3	STDS	DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS	3.120.000,00
4	SEPLAG	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	3.120.000,00
5	SRH	DLI 7: Estabelecimento de um comitê interagência de segurança hídrica	3.120.000,00
6	SEPLAG	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	4.500.000,00
Total de metas de 2017.2 atingidas (A)			20.100.000,00

SUMÁRIO DESEMBOLSO - Valores Previstos/Desembolsados

Categorias	Previsto US\$ (A)	Realizado US\$ (B)	Realizado R\$	Valor Disponível US\$ (A) - (B)	% Valor Desembolsado/ Total Previsto
CATEGORIA I e III	325.000.000,00	325.000.000,00	990.265.885,76	-	100%
CATEGORIA II	25.000.000,00	19.415.028,00	55.814.003,08	5.584.972,00	77,66%
Total	350.000.000,00	344.415.028,00	1.046.079.888,84	5.584.972,00	98,40%

Atualizado em 22/03/18



3.2. Programas *PforR*

Posição dos Programas em 2017

Meta 2014-2017	Estipulada no Documento de Avaliação do Projeto	R\$ 728,00	100%
Execução 2014	Auditada pelo TCE	R\$ 223,36	30,68%
Execução 2015	Auditada pelo TCE	R\$ 226,15	31,06%
Execução 2016	Auditada pelo TCE	R\$ 275,39	37,83%
Total Executado e auditado até 2016		R\$ 724,90	99,57%
Execução 2017	A ser auditada em 2018	R\$ 268,72	-
Total Executado		R\$ 993,62	-

Execução Acumulada dos Programas – 2014 à 2017

Setorial	EXECUÇÃO				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
SEDUC	R\$ 208,91	R\$ 213,00	R\$ 263,25	R\$ 257,87	R\$ 943,04
STDS	R\$ 7,21	R\$ 7,24	R\$ 7,36	R\$ 7,32	R\$ 29,13
SRH/COGERH	R\$ 0,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,46
CIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SEMA	R\$ 0,39	R\$ 1,11	R\$ 0,24	R\$ 0,69	R\$ 2,43
SEMACE	R\$ 4,60	R\$ 2,43	R\$ 2,71	R\$ 1,32	R\$ 11,06
FUNCEME	R\$ 1,79	R\$ 2,37	R\$ 1,82	R\$ 1,52	R\$ 7,50
TOTAL	R\$ 223,36	R\$ 226,15	R\$ 275,39	R\$ 268,72	R\$ 993,62

- ✓ Em 16 de fevereiro de 2018, foi enviado ao Banco Mundial e TCE o último Relatório Financeiro do Projeto – IFR que será auditado pelo TCE a partir de junho do mesmo ano.

Posição da Execução dos Programas - 2018

Capacitação Profissional

SEDUC	Orçamento	Restos a Pagar	Total
020 - Ensino Integrado à Educação Profissional	R\$ 27.085.639,36	R\$ 21.013.290,95	R\$ 48.098.930,31
020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 9.843.772,41	R\$ 13.386.373,85	R\$ 23.230.146,26
18802 - EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ 9.843.772,41	R\$ 12.916.521,85	R\$ 22.760.294,26
18803 - EXPANSÃO E MELHORIA DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ -	R\$ 469.852,00	R\$ 469.852,00
020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 13.017.852,82	R\$ 6.454.992,07	R\$ 19.472.844,89
22668 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - APORTE.	R\$ 243.538,28	R\$ 399.524,73	R\$ 643.063,01
22669 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ 12.640.171,02	R\$ 5.007.867,79	R\$ 17.648.038,81
22670 - GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ 134.143,52	R\$ 1.047.599,55	R\$ 1.181.743,07
020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.	R\$ -	R\$ 7.559,67	R\$ 7.559,67
18806 - ADEQUAÇÃO DA OFERTA E DOS CURRÍCULOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ -	R\$ -	R\$ -
18807 - AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS.	R\$ -	R\$ 7.559,67	R\$ 7.559,67
020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.	R\$ 4.224.014,13	R\$ 1.164.365,36	R\$ 5.388.379,49
18815 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ 4.224.014,13	R\$ 1.164.365,36	R\$ 5.388.379,49

Posição da Execução dos Programas - 2018

Qualidade da Água

SEMA	Orçamento	Restos a Pagar	Total
064 – Resíduos Sólidos	R\$ -	R\$ 83.200,00	R\$ 83.200,00
064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.	R\$ -	R\$ 83.200,00	R\$ 83.200,00
18911 - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$ -	R\$ 83.200,00	R\$ 83.200,00

Posição da Execução dos Programas - 2018

Qualidade da Água

SEMACE	Orçamento	Restos a Pagar	Total
066 – Ceará Mais Verde	R\$ -	R\$ 80.712,00	R\$ 80.712,00
066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais.	R\$ -	R\$ 80.712,00	R\$ 80.712,00
18657 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS	R\$ -	R\$ 80.712,00	R\$ 80.712,00
500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada	R\$ -	R\$ 240.307,00	R\$ 240.307,00
500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas.	R\$ -	R\$ 240.307,00	R\$ 240.307,00
17971 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - SEMACE	R\$ -	R\$ 192.807,00	R\$ 192.807,00
17973 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TI - SEMACE	R\$ -	R\$ 47.500,00	R\$ 47.500,00

Posição da Execução dos Programas - 2018

Qualidade da Água



FUNCEME	Orçamento	Restos a Pagar	Total
018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis	R\$ 122.940,81	R\$ 72.839,24	R\$ 195.780,05
018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias.	R\$ 122.940,81	R\$ 72.839,24	R\$ 195.780,05
22611 - PROMOÇÃO E SUPORTE AO MONITORAMENTO E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES HIDROAGROMETEOROLÓGIAS	R\$ 122.940,81	R\$ 72.839,24	R\$ 195.780,05

PROGRAMAS EXECUÇÃO ACUMULADA 2018	Execução Orçamentária	Execução Extraorçamentária	Total
	R\$ 27.208.580,17	R\$ 21.490.349,19	R\$ 48.698.929,36



3.3. Assistência Técnica

Execução dos Subprojetos de AT por Etapa – 78 Subprojetos

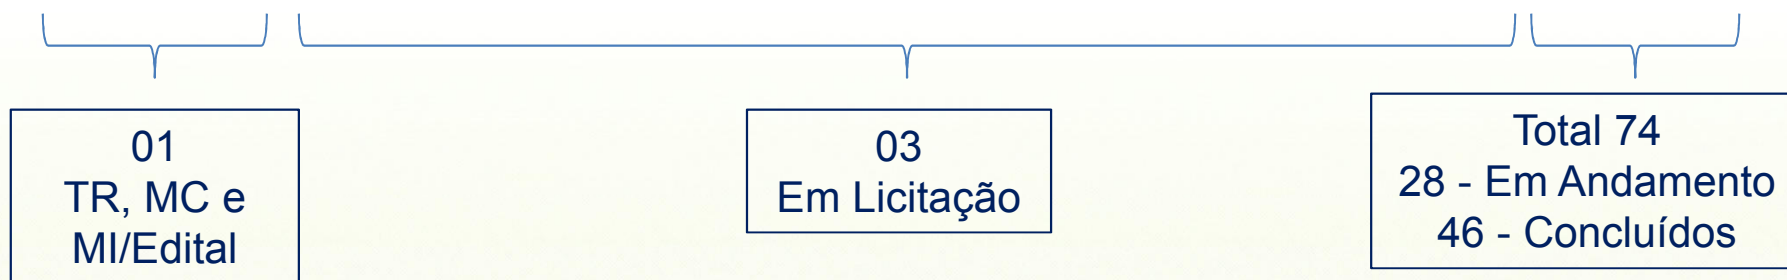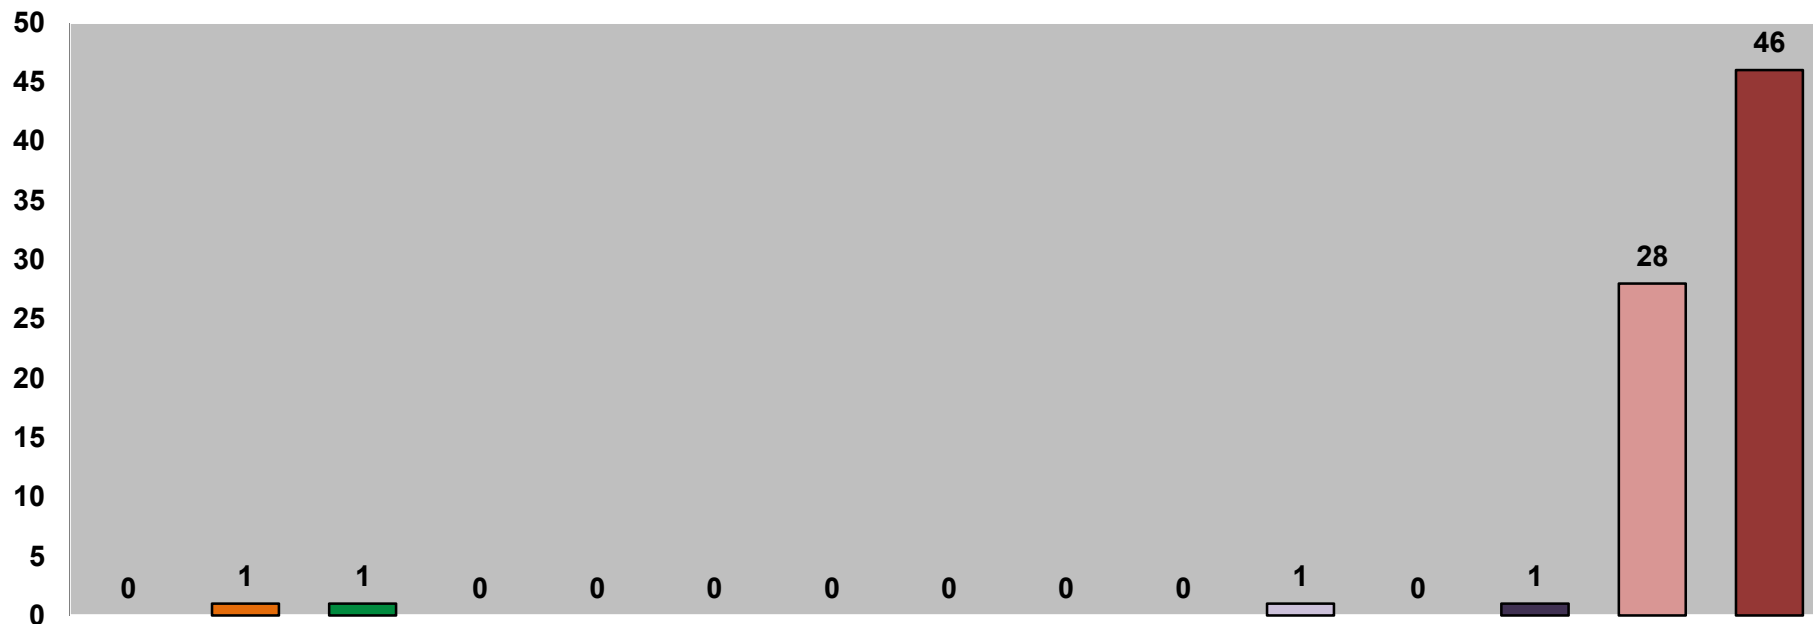


Subprojetos de Assistência Técnica por Etapa

Etapas			Setoriais com Subprojetos	Valor US\$
1	TDR e MC sendo elaborados para NO BM	0	-	-
2	TDR e MC aprovado pelo BM e elaborando MI	1	IPECE (21);	197.836,17
3	Manifestação de Interesse Publicada	0	IPECE (22);	408.865,77
4	Elaborando o Relatório Final da Lista Curta	0	-	-
5	Elaborando a Solicitação de Proposta	0	-	-
6	Solicitação de Proposta Lançada	0	-	-
7	Elaborando o Relatório Técnico ou Curricular	0	-	-
8	Elaborando o Relatório Financeiro e o Combinado	0	-	-
9	Não Objeção do BM à Avaliação Combinado / Avaliação Curricular	0	-	-
10	Divulgação da Avaliação Combinada / Ofício para Negociação	0	-	-
11	Negociação do Contrato	1	SDE (25);	569.255,26
12	Divulgação PGE Resultado Final	0	-	-
13	Assinando o Contrato / Publicação	1	SEDUC (39);	2.019,63
14	Projetos com Contratos em Execução	28	CGE(05,06); IPECE(12,15,17,18,19,20); SEDUC(29,30,31,35,36,37,44,45,46,48); SEMA(54); SEPLAG(61,62,64,65); SRH(66,67); COGERH(70); STDS(72); TCE(75);	12.281.422,73
15	Projetos com Contratos Finalizados	46	ARCE(01); CGE(02,03,04,07,08,09,10); FUNCEME(11); IPECE(13,14,16); SDE(23,24); SECITECE(26,27,28), SEDUC (32,33,34,38,40,41,42,43,47); SEMA(49,50,51,52,53,55); SEMACE (56,57); SEPLAG (58,59,60,61); SRH(68), COGERH (69,71); STDS(72,73); TCE(76,77,78).	8.560.851,51
Total		78		22.020.251,06

Execução dos Subprojetos de AT por Etapa

Total dos projetos		Status		%
78	1	Em Andamento	Atividades Preparatórias	1%
	3		Em Licitação	4%
	28		Em Execução	36%
	46	Concluído		59%

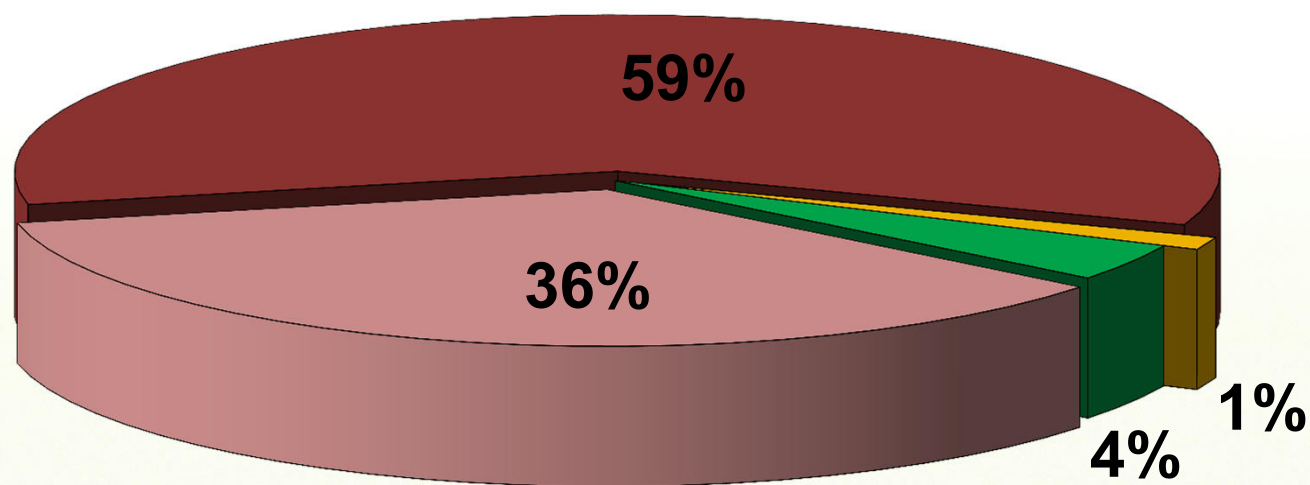



3.4 Tempo disponível até encerramento do *PforR*

Tempo disponível até encerramento do PforR = 31/01/2019

2º Sem 17 e 1º Sem de 18	1	2	3	4	5	6	06 Meses
	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	
1º e 2º Sem 2018 e Jan 2019	7	8	9	10	04 Meses		
	Set	Nov	Dez	Jan			

TOTAL	10 Meses
--------------	---------------------

	Baixo - de 0 a 05 meses
	Médio - de 06 e 07 meses
	Alto - 08 e 09 mês
	Altíssimo - acima de 10 meses - Inviabiliza o Projeto

Subprojetos de Assistência Técnica

QTD.	Setoriais	Subprojeto	Status
1	IPECE	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização e realização de eventos e congressos.	Edital Pregão Eletrônico em análise pelo na PGE para posterior lançamento.
2	IPECE	Consultoria para a formulação de ferramentas de gestão: Produtividade Setorial do Trabalho e Inflação Interna.	Manifestação de Interesse publicado com data de recebimento dos Portfolios em 05/04/2018 às 16:00 hrs.
3	SDE	Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.	Aguardando assinatura da Ata e o envio dos currículos dos especialistas substitutos para análise e posterior agendamento da 2ª reunião de negociação.
4	SEDUC	Contratação de serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados.	Divulgado o Resultado Final pela Cel04. Setorial está providenciando assinatura do contrato.



3.5 Pontos Principais de Aquisições / Contratos

Pontos Principais de Aquisições / Contratos

- **Orçamento dos Projetos (contratos) para o ano de 2018;**
- **Pagamentos dos Produtos/Serviços devem ser realizados em no máximo de 60 dias após entrega formal dos Produtos/Serviços.**



4. MONITORAMENTO CONTRATOS

Cronograma Assinatura dos Contratos AT (R\$)

Descrição	Ano									Total
	2014.1	2014.2	2015.1	2015.2	2016.1	2016.2	2017.1	2017.2	Previsão 2018.1	
Contratos Assinados	0	3	11	11	7	20	18	4	4	78
Valores R\$	-	557.865	1.165.551	8.716.477	4.821.785	29.514.252	13.543.998	1.605.414	3.876.670	63.802.013
% Financeiro dos Projetos Contratados	0,0%	0,9%	1,8%	13,7%	7,6%	46,3%	21,2%	2,5%	6,1%	100%




Contratos Assistência Técnica

Setorial	Nº de Contratos	Nº de Contratos em Andamento	Nº de Contratos Concluídos	Valor Contratado + Patronal (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo a Pagar (R\$)	% PAGO
ARCE	1	-	1	839.982,65	839.982,65	-	100%
CGE	9	2	7	7.883.945,04	5.871.268,81	2.012.676,23	74%
COGERH	3	1	2	4.419.133,06	3.842.334,53	576.798,53	87%
FUNCEME	1	-	1	1.666.842,98	1.666.842,98	-	100%
IPECE	9	6	3	5.636.414,90	4.223.285,82	1.413.129,08	75%
SDE	2	-	2	1.148.959,99	1.148.959,99	-	100%
SECITECE	3	-	3	1.400.260,31	1.400.260,31	-	100%
SEDUC	19	10	9	8.754.305,78	5.234.873,95	3.519.431,83	60%
SEMA	7	1	6	7.234.534,13	6.060.545,06	1.173.989,07	84%
SEMACE	2	-	2	1.639.804,89	1.639.804,89	-	100%
SEPLAG	8	4	4	10.788.155,29	7.866.017,60	2.922.137,69	73%
SRH	3	2	1	3.048.215,88	1.849.441,14	1.198.774,74	61%
STDS	3	1	2	2.307.050,00	1.120.141,00	1.186.909,00	49%
TCE	4	1	3	3.164.958,37	1.302.314,26	1.862.644,11	41%
TOTAL	74	28	46	59.932.563,27	44.066.072,99	15.866.490,28	74%


Cronograma Pagamentos AT(R\$)

Pago e Previsão de Pagamento da Assistência Técnica - PforR (R\$)							
Ano	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Pago 1º Trimestre 2018	A pagar em 2018	Total
Valor	72.600	975.610	11.205.681	30.816.267	999.272	19.732.584	63.802.013

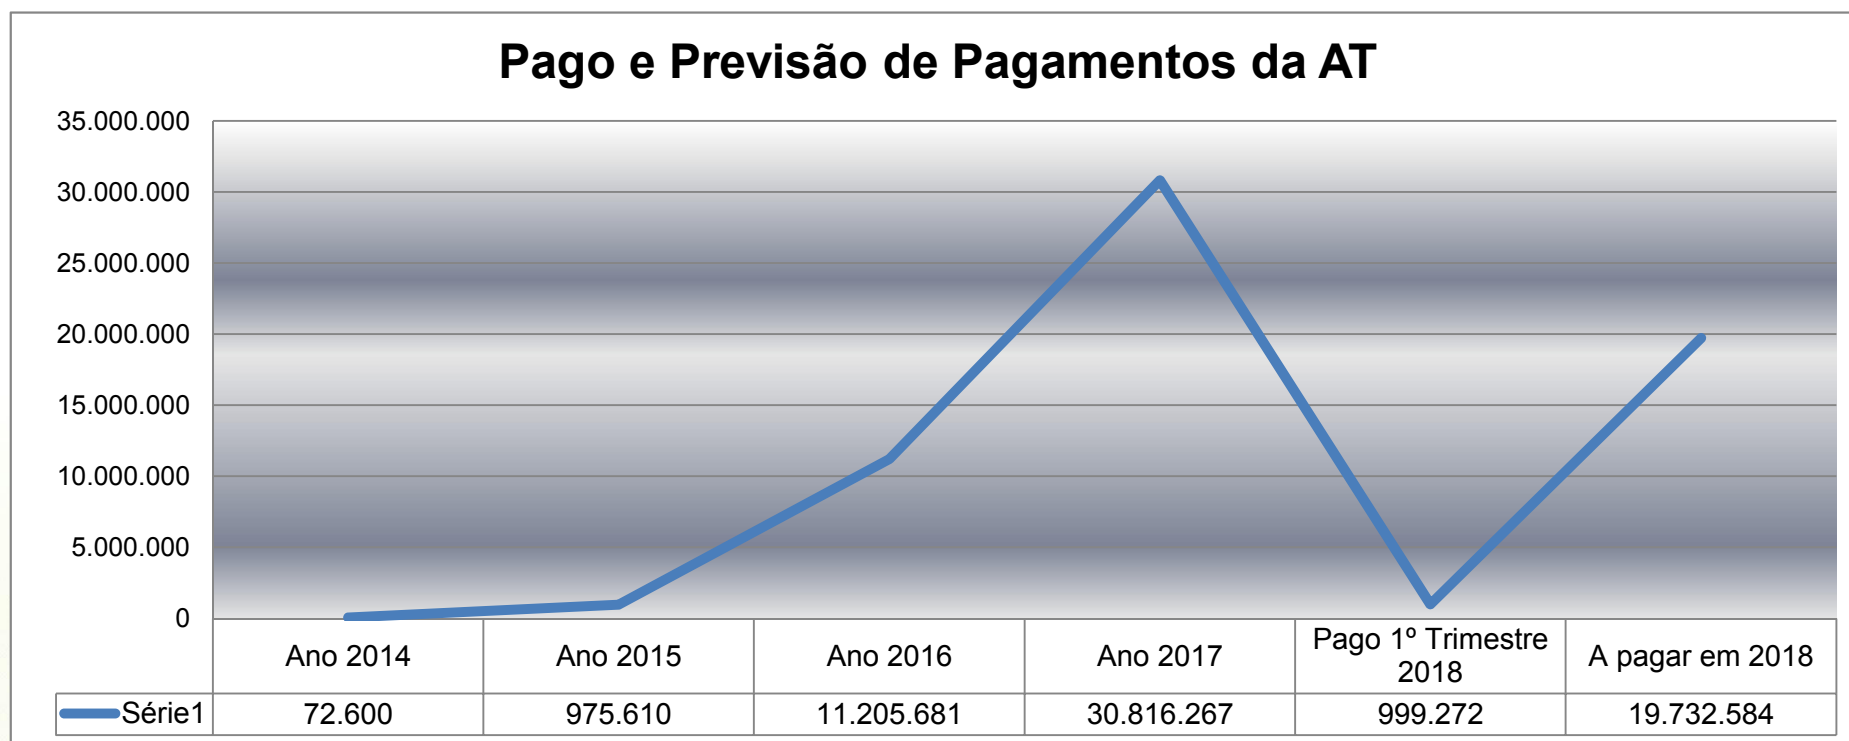

Situação dos Contratos – Aditivos de Prazo

Setorial	ARCE	CGE	COGERH	FUNCEME	SEMA	SEMACE	SEPLAG	SDE	SEDUC	STDS	SECITECE	IPECE	TCE	SRH	TOTAL
Nº Contratos	1	9	3	1	7	2	8	2	19	3	3	9	4	3	74
Aditivo de Prazo	0	3	1	1	2	0	6	0	18	5	1	16	4	4	61
%	0%	33%	33%	100%	29%	0%	75%	0%	95%	167%	33%	178%	100%	133%	82%

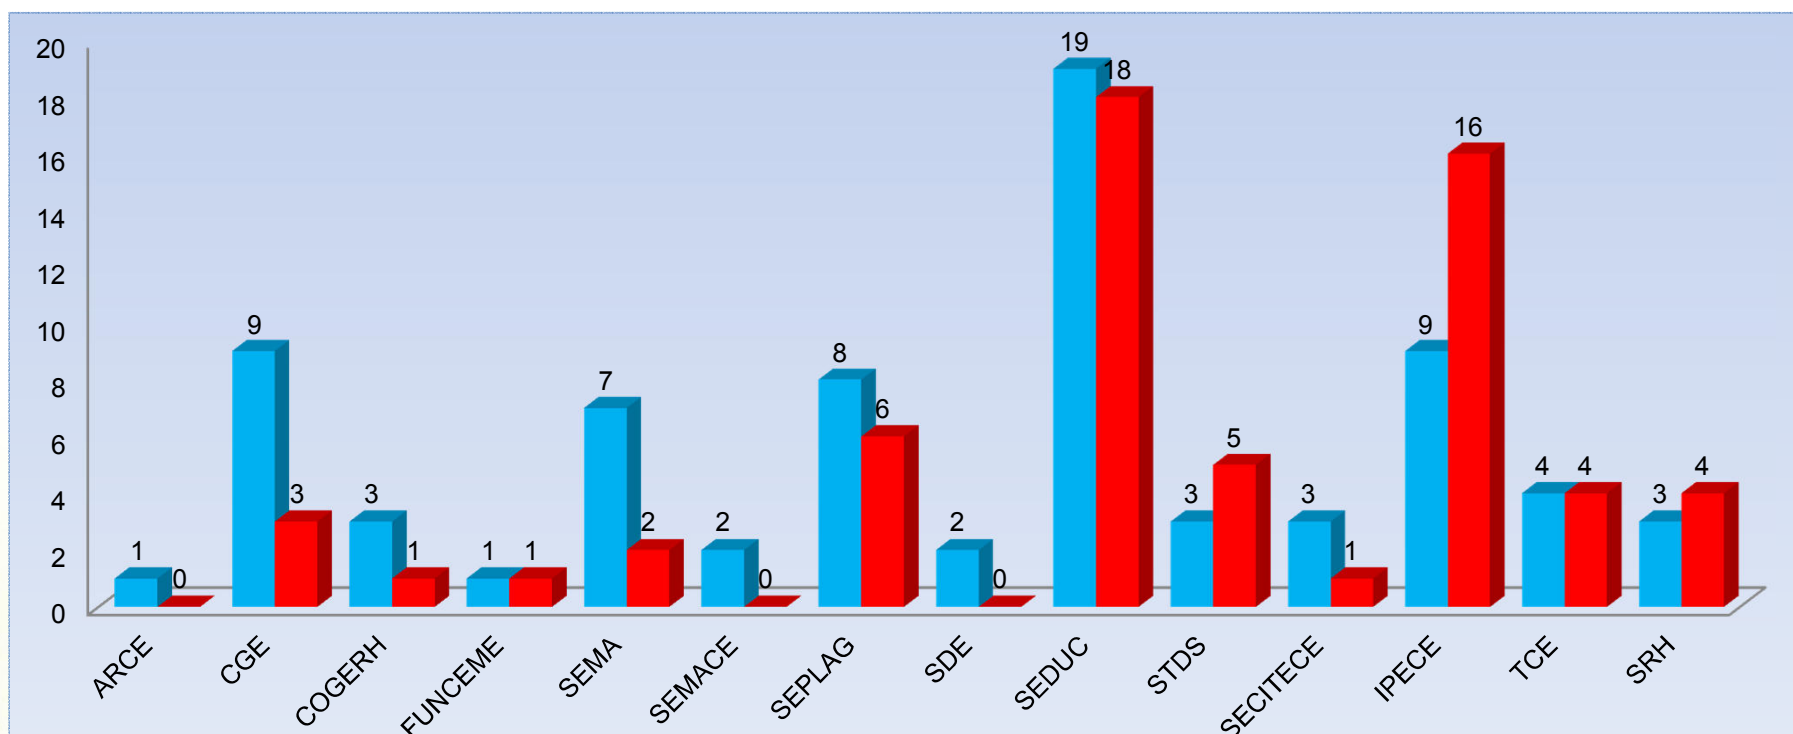

82% dos Contratos já foram elaborados Aditivos de Prazo



5. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR SETORIAL CONTRATADOS



ARCE

Subprojeto ARCE

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	ARCE	Desenvolvimento de modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

	Baixo - de 0 a 05 meses
	Médio - de 06 e 07 meses
	Alto - 08 e 09 mês
	Altíssimo - acima de 10 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

ARCE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 1: Desenvolvimento de modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Subprojeto:** US\$ 342.109,75
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Fevereiro 2017
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 019/2016, assinado em 14/06/2016.
- **Consultora Vencedora:** RPG – Regulation, Performance and Governace Ltda.
- **Valor do Contrato + Taxas:** R\$ 839.982,65.



CGE

Subprojetos CGE

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	CGE	Auditoria Técnica dos Indicadores I.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
2	CGE	Auditoria Técnica dos Indicadores II.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	CGE	Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (NEGÓCIO SIEC).	Contrato Concluído Físico e Financeiro
4	CGE	Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SISTEMA SIEC).	Contrato em Execução
5	CGE	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	Contrato em Execução
6	CGE	Capacitação da população para o Controle Social.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
7	CGE	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
8	CGE	Realização de treinamentos com foco no “apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público”.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
9	CGE	Consultoria individual especializada, em gestão documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

CGE- Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojetos 2 e 3: Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR. ¹

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 67.354,63
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévio
- **Início/Término:** Junho 2014 - Fevereiro 2016
- **Estágio Atual:** Contratos nº 01/2015 e 01/2016, Concluídos Físico e Financeiro.
- **Consultores:** Marcelo Ponte Barbosa e Túlio Cravo.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 152.302,30.

Nota 1: Auditoria será realizada pela equipe da CGE a partir do semestre 16.1

CGE - Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 4: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Marcelo Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 284.089,71
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2015 – Junho 2017
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 08/2016, assinado em 15/06/2016.
- **Consultora Vencedora:** NTConsult Tecnologia e Consultoria LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 725.256,92

CGE - Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 5: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).

- **Responsável:** Marcos Henrique
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 658.560,58
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Março 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 026/2016 - Assinado em 07/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** Ivia Serviços de Informática Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.130.443,48.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
2.130.443,48	1.331.527,16	798.916,32	14/20	62,50%

CGE - Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 6: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.071.989,29
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2015 – Maio 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 029/2016 – Assinado em 24/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** Caiena Desenvolvimento de Sistemas Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 3.467.885,35.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
3.467.885,35	2.254.125,44	1.213.759,91	10/15	65,00%

CGE - Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 7: Capacitação da população para o Controle Social.

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 267.522,72
- **Método de Aquisição:** LPN
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 01/2017 – Assinado em 20/01/2017.
- **Consultora Vencedora:** Fundação Demócrito Rocha.
- **Valor do Contrato:** R\$ 865.436,00.

CGE - Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 8: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na “Detecção de Casos de Fraude e Corrupção” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.

- **Responsável:** Denise Andrade Araújo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 89.644,51
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 07/2017, assinado em 13/06/2017.
- **Consultora Vencedora:** Deloitte Touche Tohatsu Consultores Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 290.000,00

Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 9: Realização de treinamentos com foco no “apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público”.

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 61.026,58
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 025/2016, assinado em 07/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** KPMG Assessores Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 197.421,00.

CGE - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 10: Consultoria individual especializada, em gestão documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE.

- **Responsável:** Aglaio Soares
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 24.411,82
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Março de 2016
- **Estágio Atual:** Contrato nº 012/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultor:** Fernando Braga.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 55.200,00.



FUNCEME

Subprojeto FUNCEME

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	FUNCEME	Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

	Baixo - de 0 a 05 meses
	Médio - de 06 e 07 meses
	Alto - 08 e 09 mês
	Altíssimo - acima de 10 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

FUNCEME - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 11: Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Francisco Hoilton
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Proposta Vencedora:** 679.677,00 (US\$ + €)
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Maio 2017
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 10/2015, assinado em 09/09/2015.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Aqualogus / Azurit.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.666.864,98.



IPECE

Subprojetos IPECE

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	IPECE	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará - CONSULTORES PLENOS.	Contrato em Execução
2	IPECE	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará - CONSULTORES PLENOS.	Contrato Rescindido
3	IPECE	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. CONSULTOR JÚNIOR.	Contrato Rescindido
4	IPECE	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. ANALISTA LICITAÇÕES.	Contrato em Execução
5	IPECE	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. ANALISTA LICITAÇÕES.	Contrato Rescindido
6	IPECE	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. ANALISTA LICITAÇÕES.	Contrato em Execução
7	IPECE	Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR.	Contrato em Execução
8	IPECE	Desenvolvimento de sistemas de informação digital, para implementação e implantação de 02 (dois) sistemas denominados IPECEDATA e sistema de monitoramento e avaliação dos projetos e beneficiários do FECOP.	Contrato em Execução
9	IPECE	Desenvolvimento de metodologias para planejamento e avaliação dos projetos estratégicos de investimentos do poder executivo do Estado do Ceará.	Contrato em Execução
10	IPECE	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização e realização de eventos e congressos.	Em Atividades Preparatórias
11	IPECE	Consultoria para a formulação de ferramentas de gestão: Produtividade Setorial do Trabalho e Inflação Interna.	Em Atividades Preparatórias

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojetos 12 e 13: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTORES PLENOS

- **Responsável:** Viviane Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 308.277,81
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2019
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 06/2014, assinado em 16/07/2014 (em execução) e Contrato nº 09/2015, assinado em 17/07/2015 (rescindido).
- **Consultora:** Giuseppe Furtado Nogueira e Viviane Ramos da Costa.
- **Valor dos Contratos + Patronal + Aditivos:** 691.644,21
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 14: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.
CONSULTOR JÚNIOR

- **Responsável:** Viviane Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 21.227,67
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Maio 2015
- **Estágio Atual:** Contrato nº 07/2014, assinado em 14/07/2014 - Rescindido.
- **Consultora:** Viviane Ramos da Costa.
- **Valor do Contrato:** R\$ 48.000,00.

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojetos 15, 16 e 17: Contratação de 03 (três) **Analistas em Licitações** para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- **Responsável:** Viviane Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 247.994,30
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Janeiro 2019
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 08 /2015, assinado em 17/07/2015 (em execução), Contrato nº 09/2015, assinado em 17/07/2015 (rescindido) e Contrato nº 13/2015, assinado em 17/07/2015 (em execução).
- **Consultora:** Rodrigo José Almeida Rufino, Lívia Maria Oliveira de Castro e André Morel Gonzaga.
- **Valor dos Contratos + Patronal + Aditivos:** 578.569,50
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 18: Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR.

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 141.873,07
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Junho 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 10/2015, assinado em 01/09/2015. Serviços em execução.
- **Consultora:** Carlos Alberto Manso.
- **Valor do Contrato + Patronal + Aditivos:** R\$ 385.040,64.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

IPECE - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 19: Desenvolvimento de sistemas de informação digital, para implementação e implantação de 02(dois) sistemas denominados IPECEDATA e sistema de monitoramento e avaliação dos projetos e beneficiários do FECOP.

- **Responsável:** Mário Aragão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 682.482,48
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 01/2017, assinado em 17/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** Nova Via Tecnologia e Mobilidade Ltda.
- **Valor do Contrato:** 2.187.903,10.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
2.187.903,10	1.750.322,40	437.580,70	14/20	80,00%

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP


Subprojeto 20: Desenvolvimento de metodologias para planejamento e avaliação dos projetos estratégicos de investimentos do poder executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 531.727,04
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Setembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 04/2017, assinado em 28/04/2017.
- **Consultora Vencedora:** Quadrante Consultoria Econômica Ltda.
- **Valor do Contrato:** 1.377.768,77.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
1.720.136,97	964.438,15	755.698,82	06/15	56,07%

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 21: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização e realização de eventos e congressos.

- **Responsável:** Flávio Ataliba
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 197.836,17
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2017 – Dezembro 2018
- **Estágio Previsto:** Em Atividades Preparatórias
- **Estágio Atual:** Em Atividades Preparatórias – Edital Pregão Eletrônico em análise pelo na PGE para posterior lançamento.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 22: Consultoria para a formulação de ferramentas de gestão: Produtividade Setorial do Trabalho e Inflação Interna.

- **Responsável:** Claudio André e Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ \$408.865,77
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2018 – Outubro 2018
- **Estágio Previsto:** Em Atividades Preparatórias
- **Estágio Atual:** Em Atividades Preparatórias – Manifestação de Interesse publicado com data de recebimento dos Portfolios em 05/04/2018 às 16:00 hrs.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SDE / ADECE

Subprojetos SDE

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	SDE	Desenvolvimento do sistema FDI (Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas).	Contrato Concluído Físico e Financeiro
2	SDE	Impact Evaluation Workshop em Istambul.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	SDE	Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.	Em Licitação

	Baixo - de 0 a 05 meses
	Médio - de 06 e 07 meses
	Alto - 08 e 09 mês
	Altíssimo - acima de 10 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

SDE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 23: Desenvolvimento do sistema FDI (Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas).

- **Responsável:** Fernando Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 388.117,50
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 03/2016, assinado em 26/08/2016.
- **Consultora Vencedora:** Ivia Serviços de Informática Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.142.416,04.

SDE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 24: Impact Evaluation Workshop Istanbul

- **Responsável:** Inês Studart
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 2.894,02
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Maio 2015.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** Casa Blanca / Maria Inês Cavalcante Studart Menezes.
- **Valor do Contrato:** R\$ 6.543,95.

SDE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 25: Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Filipe Rabelo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 569.255,26
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2017 – Outubro 2018
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Relatório Financeiro e o Combinado.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Aguardando assinatura da Ata e o envio dos currículos dos especialistas substitutos para análise e posterior agendamento da 2ª reunião de negociação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SECITECE

Subprojetos SECITECE

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	SECITECE	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
2	SECITECE	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	SECITECE	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

	Baixo - de 0 a 05 meses
	Médio - de 06 e 07 meses
	Alto - 08 e 09 mês
	Altíssimo - acima de 10 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 26: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.

- **Responsável:** Flaviana Pereira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 139.917,03
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 16/2017, assinado em 25/07/2017.
- **Consultora Vencedora:** Ferraro Projetos e Investimento Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 452.631,58

SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 27: Elaboração do plano estadual de ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Flaviana Pereira / Tarcísio Hilter
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 238.111,76
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Contrato nº 06/2016, Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** Macroplan Prospectivo, Estratégia e Gestão Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 770.291,53

SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 28: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

- **Responsável:** Flaviana Pereira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 57.428,61
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Abril 2017
- **Estágio Atual:** Contrato nº 16/2016, Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Maria Fatima Ludovico da Gama e Souza.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 177.593,20.



SEDUC

Subprojetos SEDUC

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	SEDUC	Elaborar as matrizes de referência e os itens para compor os testes da avaliação de desempenho dos estudantes do 3º ano de vinte cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais de educação profissional do Estado do Ceará.	Contrato em Execução
2	SEDUC	Formação Continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.	Contrato em Execução
3	SEDUC	Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará.	Contrato em Execução
4	SEDUC	Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
5	SEDUC	Impact Evaluation Workshop em Istambul.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
6	SEDUC	CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
7	SEDUC	Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento.	Contrato em Execução
8	SEDUC	Desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.	Contrato em Execução
9	SEDUC	Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.	Contrato em Execução
10	SEDUC	Serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
11	SEDUC	Contratação de serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados.	Em Licitação

Subprojetos SEDUC

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
12	SEDUC	Especialista em Avaliação de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
13	SEDUC	Desenvolvimento Infantil, com foco na educação, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Contrato Concluído Físico e Financeiro
14	SEDUC	Desenvolvimento Infantil, com foco na saúde, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Contrato Concluído Físico e Financeiro
15	SEDUC	Empresa especializada para elaboração de arte gráfica/design, revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, da Secretaria da Educação.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
16	SEDUC	Apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.	Contrato em Execução
17	SEDUC	Empresa de Consultoria especializada em visitas domiciliares e para formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Contrato em Execução
18	SEDUC	Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN. (Coleta de Dados).	Contrato em Execução
19	SEDUC	Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
20	SEDUC	Contratação de Consultoria Individual para o desempenho da função de coordenadora de campo nas atividades de coletas de dados da Formação de Gestores da Educação Infantil.	Contrato em Execução

SEDUC- Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 29: Elaborar as matrizes de referência e os itens para compor os testes da avaliação de desempenho dos estudantes do 3º ano de vinte cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais de educação profissional do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 267.202,02
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Março 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – nº 154/2017, assinado em 16/08/2017. Setorial está elaborando o 1º Aditivo de Prazo (03 meses).
- **Consultora Vencedora:** Universidade Federal de Juiz de Fora – Centro de Políticas Públicas de Avaliação da Educação (UFJF/CAED). **Valor do Contrato:** R\$ 864.398,52
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
864.398,52	216.099,63	648.298,89	02/05	25,00%

SEDUC - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 30: Formação Continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 81.757,64
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Março 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 079/2017, assinado em 18/04/2017. Setorial está elaborando o 2º Aditivo de Prazo.
- **Consultora Vencedora:** Elos Orientação e Planejamento Educacional Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 261.624,46.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
261.624,46	167.439,66	94.184,80	04/06	64,00%

SEDUC- Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojetos 31 e 32: Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará (02 Consultores).

- **Responsável:** Luciano Nery
- **Categoria de Licitação:** CI
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 49.101,56
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2016 – Março 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 83, assinado no dia 15/03/2017 e Contrato nº 84, rescindindo em 18/01/2018.
- **Consultores:** Antônio Jussier de Vasconcelos Ramos e Fernando Andrade de Alcântara.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 158.843,52.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
115.522,56	83.031,84	32.490,72	11/13	80,00%

SEDUC- Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 33: Impact Evaluation Workshop Istanbul

- **Responsável:** Luciano Nery
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 3.154,13
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Maio 2015
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Andréa Araújo Rocha Nibon.
- **Valor do Contrato:** R\$ 7.132,11.

SEDUC- Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 34: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 4.466,03
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Julho 2015.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Maria Dagmar de Andrade Soares - Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER.
- **Valor do Contrato:** R\$ 10.098,59.

SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 35: Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento. WMS

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 16.506,96
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Março 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Nº 089/2017, assinado em 27/03/2017. Setorial está elaborando o 3º Aditivo de Prazo.
- **Consultor:** Samuel Simões Oliveira Franco.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 53.400,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
53.400,00	22.162,11	31.237,89	04/07	41,50%

SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 36: Desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 254.128,36
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Maio 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº105/2017 em Execução. Assinado em 20/04/2017.
- **Consultora Vencedora:** Instituto da Primeira Infância - IPREDE.
- **Valor do Contrato:** R\$ 822.105,26.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
822.105,26	698.789,47	123.315,79	09/11	85,00%

SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 37: Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 116.608,86
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2016 – Maio 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução - nº 028/2017 Assinado em 07/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** ECART Projetos e Gestão Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 377.229,65.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
377.229,65	318.350,33	58.879,32	08	84,39%

SEDUC- Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 38: Serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 15.783,62
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2016 – junho 2017
- **Estágio Atual:** Concluído físico financeiro. Contrato nº 021/2017, assinado em 07/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** Expressão Gráfica e Editora Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 51.060,00.

SEDUC- Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 39: Contratação de serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 2.019,63
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2017 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Em Licitação
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Divulgado o Resultado Final pela Cel04. Setorial está providenciando assinatura do contrato.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 40: Especialista em **Avaliação** de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa.*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor Subprojeto:** US\$ 4.139,40
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2014 – Maio 2016
- **Estágio Atual:** Contrato nº 018/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultor:** Flávio Augusto Rezende Cunha.
- **Valor do contrato:** R\$ 9.360,00.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 41: Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 25.207,85
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 017/2015, assinado em 23/03/2015.
- **Consultora:** Fátima Maria Araújo Saboia Leitão.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 57.000,00.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 42: Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 29.188,04
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 014/2015, assinado em 26/03/2015.
- **Consultora:** Ana Cecília Silveira Lins Sucupira.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 66.000,00.

SEDUC - Assistência Técnica –Assistência à Família

Subprojeto 43: Empresa Especializada para Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 61.838,85
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Setembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 029/2016, assinado em 11/02/2016.
- **Consultora Vencedora:** Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 139.830,00.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 44: Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 372.482,21
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Abril 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – nº 214/2016, assinado em 12/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** VC Promoções e Eventos Ltda – EPP.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.204.979,94 .
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
1.204.979,94	739.670,23	465.309,71	10	61,38

SEDUC - Assistência Técnica –Assistência à Família

Subprojeto 45: Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 202.891,81
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Maio 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 236/2016, assinado em 30/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** CASAM – Centro de Apoio Social e de Animação Missionária.
- **Valor do Contrato:** R\$ 656.355,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
656.355,00	492.266,25	164.088,75	10/13	75,00%

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 46: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN. (Coleta de Dados).

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 1.363.854,33
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Outubro 2018
- **Estágio Previsto:** Contato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 214/2016, assinado em 28/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** Overview Serviços & Informação Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 3.739.071,95.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
3.935.245,42	2.093.879,94	1.841.365,48	08/11	53,21%

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 47: Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 17.458,44
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Outubro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Rescindido – Contrato nº 253/2016, assinado em 19/10/2016.
- **Consultora Vencedora:** Rafaela Martins Leite Monteiro.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 45.694,11.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 48: Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 21.653,79
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2016 – Junho 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução, nº 30/2017 – Assinado em 20/07/2017.
- **Consultora Vencedora:** Patrícia Simões.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 70.050,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
70.050,00	17.009,68	55.794,32	03/05	24,28%



SEMA

Subprojetos SEMA

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	SEMA	Elaboração do projeto “Avaliação do Impacto Econômico da Degradação Ambiental.”	Contrato Concluído Físico
2	SEMA	Desenvolvimento e execução de projeto em educação ambiental para a qualidade da água nas três bacias estratégicas.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	SEMA	Apoio Logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas três bacias estratégicas.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
4	SEMA	Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e programas do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
5	SEMA	Desenvolver projeto de lei que institui o programa de serviços ambientais no Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
6	SEMA	Elaboração do Plano de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto – 81 municípios.	Contrato em Execução
7	SEMA	Desenvolver Implementação da Coleta Seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

	Baixo - de 0 a 05 meses
	Médio - de 06 e 07 meses
	Alto - 08 e 09 mês
	Altíssimo - acima de 10 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 49: Elaboração do projeto “Avaliação do Impacto Econômico da Degradação Ambiental.” (AIEDA)

- **Responsável:** Maria Dias / Magda Marinho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 282.850,22
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 18/2016, assinado em 16/08/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Aquino – Mcrit SL – Barcelona Brasil Group.
- **Valor do Contrato + Taxa:** R\$ 851.841,63.

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 50: Desenvolvimento e execução de projeto em educação ambiental para a qualidade da água nas três bacias estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 266.182,85
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 06/2016, assinado em 25/02/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Engesoft Engenharia / Quanta Consultoria Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 710.638,32.

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 51: Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor Subprojeto:** US\$ 96.162,05
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 26/2016, assinado em 26/11/2015.
- **Consultora Vencedora:** Empresa MSV Multiserviços ME.
- **Valor do Contrato:** R\$ 242.557,52.

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 52: Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e programas do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Maria Dias / Francisco Leorne
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 202.789,54
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2014 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 16/2016, assinado em 05/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** Arcadis Logos S.A.
- **Valor do Contrato:** R\$ 563.157,73.

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 53: Desenvolver projeto de lei que institui o programa de serviços ambientais no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Maria Dias / Monica Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 215.404,39
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Dezembro 2017
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato 08/2017, assinado em 09/02/2017.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio STCP Engenharia de Projetos Ltda – Ludovino Lopes, Ricci e Santos Sociedade de Advogados.
- **Valor do Contrato:** R\$ 696.833,21.

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 54: Elaboração do Plano de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto – 81 municípios.

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 1.153.752,25
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Agosto 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 20/2016, assinado em 01/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** Bureau de Projetos e Consultoria Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.608.864,60.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
2.608.864,60	1.434.875,53	1.173.989,07	04/11	55,00%

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 55: Desenvolver Implementação da Coleta Seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 478.827,98
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro – Contrato 19/2017, assinado em 20/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** I&T Informações e Técnicas em Construção Civil Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.549.008,53.



SEMACE

Subprojetos SEMACE

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	SEMACE	Elaboração do planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
2	SEMACE	Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE	Contrato Concluído Físico e Financeiro

	Baixo - de 0 a 05 meses
	Médio - de 06 e 07 meses
	Alto - 08 e 09 mês
	Altíssimo - acima de 10 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

SEMACE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 56: Elaboração do planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.

- **Responsável:** Elizabeth Romão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 331.484,70
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 01/2017, assinado em 10/01/2017.
- **Consultora Vencedora:** Tramitty Serviços LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 967.195,89

SEMACE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 57: Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE.

- **Responsável:** Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 273.507,90
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 20/2016, assinado em 13/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** MBS CONSULTING – MBS Estratégias e Sistemas Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 672.609,00.



SEPLAG

Subprojetos SEPLAG

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	SEPLAG	Concepção de Metodologia de Planejamento de Investimentos.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
2	SEPLAG	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	SEPLAG	Empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
4	SEPLAG	Empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do Ceará.	Contrato em Execução
5	SEPLAG	Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.	Contrato em Execução
6	SEPLAG	Desenvolvimento do projeto de Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
7	SEPLAG	Consultor Individual - Otimização das Rotas. (Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará). ROTEIRIZAÇÃO	Contrato em Execução
8	SEPLAG	Contratação de Consultor Individual - Plano Estratégico de Gestão das Frotas. (Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará).	Contrato em Execução

SEPLAG - Assistência Técnica - Gestão Pública

Subprojeto 58: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

- **Responsável:** Aduino Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 504.550,12
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2014 – Outubro 2016
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 17/2015, assinado em 30/09/2015.
- **Consultora vencedora:** Consórcio Macroplan e Transplan.
- **Valor do Contrato:** 1.140.888,73.

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 59: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial.

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.171.522,32
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Março 2017
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 23/2015, assinado em 10/11/2015.
- **Consultora vencedora:** Macroplan Prospectiva, Estratégia e Gestão S/S Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ 2.667.519,34.

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 60: Empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Dominique Gomes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 366.027,15
- **Método de Aquisição:** SBQ
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Outubro 2017
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 29/2016, assinado em 04/10/2016.
- **Consultora vencedora:** Consórcio IADH x DELOS.
- **Valor do contrato:** R\$ 1.025.662,05.

SEPLAG - Assistência Técnica - Gestão Pública

Subprojeto 61: Empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Fábio Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 693.972,18
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Abril 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 25/2016, assinado em 16/09/2016.
- **Consultora vencedora:** Deloitte Touche Tohatsu Consultores Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ R\$ 2.245.000,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
2.245.000,00	1.278.000,00	967.000,00	08/14	56,93%

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 62: Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Silvana Dourado
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 818.677,30
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Maio 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 02/2017, assinado em 24/03/2017.
- **Consultora vencedora:** Elogroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ 2.648.421,05.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
2.648.421,05	926.947,36	1.721.473,69	16/34	35,00%

SEPLAG - Assistência Técnica – Fiduciário

Subprojeto 63: Desenvolvimento do projeto de Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 238.726,47
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 32/2016, assinado em 23/11/2016.
- **Consultora vencedora:** NTConsult Tecnologia e Consultoria Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ 772.280,12.

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 64: Consultor Individual - Otimização das Rotas. (Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará). ROTEIRIZAÇÃO

- **Responsável:** André Theophilo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 42.287,47
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2017 – Abril 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 32/2017, assinado em 16/11/2017.
- **Consultor vencedor:** Gustavo Sampaio de Castro.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 136.800,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
136.800,00	54.720,00	82.080,00	02/04	40,00%

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 65: Contratação de Consultor Individual - Plano Estratégico de Gestão das Frotas. (Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará).

- **Responsável:** André Theophilo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 49.335,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2017 – Maio 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 34/2017.
- **Consultor vencedor:** Danilo Geraldo Ribeiro da Mota.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 151.584,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
151.584,00	0,00	151.584,00	00/04	0,00%



SRH


Subprojetos SRH

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	SRH	Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga e Cobrança.	Contrato em Execução
2	SRH	Sistema de Informação de Gestão dos Recursos Hídricos (cadastro, fiscalização, outorga, monitoramento qualitativo, segurança de barragens e medição) com Integração com o Sistema Administrativo Financeiro PROTHEUS.	Contrato em Execução
3	SRH	Consultor Individual - Malha D'agua.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

	Baixo - de 0 a 05 meses
	Médio - de 06 e 07 meses
	Alto - 08 e 09 mês
	Altíssimo - acima de 10 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água


Subprojeto 66: Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.

- **Responsável:** Heloísa Mota e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 431.620,55
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 02/2016, assinado em 27/10/2016.
- **Consultora Vencedora:** IBI Engenharia Consultiva.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.396.292,47.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
1.396.292,47	1.216.449,99	179.842,48	21/24	87,12%

SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 67: Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. **SIGERH***

- **Responsável:** Marcus Vinicius e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 403.809,40
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 03/2016, assinado em 23/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** Capgemini Consulting Technology Outsourcing.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.306.323,41.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
1.306.323,41	287.391,15	1.018.932,26	06/16	22%

SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 68: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - **Malha D'agua.***

- **Responsável:** Heloísa Mota e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do TOR:** US\$ 127.697,05
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato 01/2016, assinado em 18/05/2016.
- **Consultora:** Dorian Ponte Lima
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 345,600,00.



COGERH

Subprojetos COGERH

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	COGERH	Fortalecimento do Manejo Estadual de Recursos Hídricos.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
2	COGERH	Empresa para Elaborar o Plano de Segurança Hídrica.	Contrato em Execução
3	COGERH	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acaraú e Salgado).	Contrato Concluído Físico e Financeiro

	Baixo - de 0 a 05 meses
	Médio - de 06 e 07 meses
	Alto - 08 e 09 mês
	Altíssimo - acima de 10 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 69: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Quali-quantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 709.785,44
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Concluído Físico e Financeiro.
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 48/2015, assinado em 24/11/2015.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Água e Solo / Quanta / Engeplus.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.954.015,55.

COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 70: Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 742.914,10
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 21/2016, assinado em 19/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Nippon Koei Latin America - Caribbean Co. Ltd. / Nippon Koei LAC do Brasil Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.403.327,11.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
2.403.327,11	1.754.428,78	648.898,33	13/19	76,00%

COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 71: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor Subprojeto:** US\$ 27.326,28
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Outubro 2015
- **Estágio Atual:** Contrato nº 25/2015, Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Rosana Garjulli Sales Costa.
- **Valor do Contrato + Patronal :** R\$ 61.790,40.



STDS

Subprojetos STDS

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	STDS	Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias visando o Aprofundamento desse Referencial teórico operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
2	STDS	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	STDS	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.	Contrato em Execução

	Baixo - de 0 a 05 meses
	Médio - de 06 e 07 meses
	Alto - 08 e 09 mês
	Altíssimo - acima de 10 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 72: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 64.213,69
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Novembro 2016
- **Estágio Atual:** Contrato nº 22/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Maria Cílvia Queiroz.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 145.200,00.

STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 73: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 63.174,42
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Setembro 2015
- **Estágio Atual:** Contrato nº 17/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** Empresa Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 142.850,00.

STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 74: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 892.888,73
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico (NCB)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Março 2018
- **Estágio Previsto:** Em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução - Contrato nº 058/2016, assinado em 25/05/2016.
- **Consultora Vencedora:** Maestria Comunicação e Eventos LTDA - EPP.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.019.000,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
2.019.000,00	832.091,00	1.186.909,00	07	41,21%



TCE

Subprojetos TCE

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	TCE	Desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.	Contrato em Execução
2	TCE	Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	TCE	Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).	Contrato Concluído Físico e Financeiro
4	TCE	Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem Como, o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De Direito Financeiro.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

	Baixo - de 0 a 05 meses
	Médio - de 06 e 07 meses
	Alto - 08 e 09 mês
	Altíssimo - acima de 10 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 75: Desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.

- **Responsável:** Glinton Ferreira / Delinda Almeida
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 834.461,49
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/ Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Novembro 2018
- **Estágio Previsto:** Em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 21/2016 em Execução. Assinado em 28/07/2017.
- **Consultora Vencedora:** Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
- **Valor do Contrato:** 2.699.484,21.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
2.699.484,21	836.840,10	1.862.644,11	05/16	31,00%

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 76: Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 61.694,57
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Agosto 2016
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 15/2015, assinado em 11/05/2015.
- **Consultor:** Roberto Vilela Resende.
- **Valor do Contrato + Despesas Reembolsáveis:** R\$ 139.503,76.

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 77: Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 100.915,62
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Junho 2015
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 12/2015, assinado em 16/03/2015.
- **Consultor:** Carlos Roberto Takao Yoshioka.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 228.190,40.

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 78: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos.

- **Responsável:** Glinton Ferreira
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 30.225,66
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico (NCB)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2016 – Setembro 2017
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 06/2017, assinado em 17/05/2017.
- **Consultora Vencedora:** DF Turismo e Eventos Ltda-ME.
- **Valor do Contrato:** R\$ 97.780,00.



6. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS: PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



COGERH

Contratos Encerrados – Consultoria de Empresa

QTD.	Setoriais	Subprojeto	Contrato	Apresentação
1	SEPLAG	Desenvolvimento do projeto de Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	Contrato N° 032/2016	26/04/2018
2	SECITECE	Criação de um observatório de políticas públicas estaduais de apoio a ciência, tecnologia e inovação no Ceará.	Contrato N° 016/2016	-
3	SECITECE	Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	Contrato N° 07/2017	-
4	SEMA	Desenvolver Implementação da Coleta Seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	Contrato N° 17/2017	26/04/2018
5	COGERH	Fortalecimento do Manejo Estadual de Recursos Hídricos.	Contrato N° 48/2015	22/03/2018



7. APROVAÇÃO DA ATA

49ª REUNIÃO COMITÊ *PforR* (22/02/2018)

Próxima Reunião do Comitê PforR

Próxima Reunião do Comitê PforR:

26/04/2018
14h30m – IPECE



8. ENCERRAMENTO

Unidade de Gerenciamento do Projeto PforR (UGP)
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora
Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N
Ed. SEPLAG, 2º andar- Fortaleza-CE
Tel.: (85) 3101.3499 e (85) 3101.3510
