



**58ª REUNIÃO DO COMITÊ *PforR***  
**ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO**  
**PROJETO *PforR***  
**22 DE NOVEMBRO DE 2018**



## PAUTA DA REUNIÃO

# Pauta da Reunião

1. Abertura e apresentação dos participantes;
2. Indicadores, Programas e Assistência Técnica
  - 2.1. Indicadores Primários – Informações atualizadas – Viviane Costa
  - 2.2. Programas PforR - Thâmara Teixeira
  - 2.3. Assistência Técnica – Estatísticas
  - 2.4. Pontos Principais de Aquisições / Contratos – Giuseppe Nogueira
3. Monitoramento Contratos – André Morel
4. Projetos de assistência técnica por setorial contratados
5. Informações Importantes – Giuseppe Nogueira / Thâmara Teixeira
6. Apresentação dos Resultados: Projetos de Assistência Técnica
7. Aprovação da Ata da 57ª Reunião (25/10/2018) – Viviane Costa
8. Encerramento



# 1. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES





## 2. INDICADORES, PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA



## 3.1. Indicadores

## INDICADORES PRIMÁRIOS – Acompanhamento

Nº	Setorial	Nome do Indicador
1	SDE	DLI 1: aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação
2	SEDUC	DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP
3	SEDUC	DLI 3: número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.
4	STDS	DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS
5	STDS	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.
6	SEPLAG	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas
7	SRH	DLI 7: Estabelecimento de um comitê interagência de segurança hídrica
8	CAGECE	DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.
9	SEMA	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.
10	FUNCEME	DLI 10: Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.
11	SEPLAG	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.
12	SEPLAG	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada

## INDICADORES PRIMÁRIOS – Acompanhamento (Status)

Nº	Setorial	Nome do Indicador
1	SDE	DLI 1: aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação
	Status	Na reunião anterior foi comentado sobre essa ação específica do Distrito Empreendedor e da sua ampliação para outros municípios, que atualmente está em Crateus, mas com outros municípios engatilhados. Quanto ao Hubice, apresentaremos o documento da Estratégia e Implementaremos um novo plano de ação para os próximos anos, principalmente voltados para inovação;
2	SEDUC	DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP
	Status	A comissão de avaliação dos Produtos foi designada. O contrato foi firmado entre a SEDUC e o consultor Cláudio Mendonça a fim de "Apoiar a reestruturação de Conteúdo e Formato do portal Conexão Trabalho Ceará. - A equipe está analisando as sugestões do consultor Cláudio Mendonça para melhoria da plataforma Conexão Trabalho Ceará. - Foi construído o cronograma de produção e filmagem dos vídeos que fará parte dos conteúdos disponibilizados pelo site. - Foi listado os principais RSS (Really Simple Syndication) que é um formato de distribuição de informações pela internet. Focamos nas notícias que a curadoria do site julgou interessante e pertinente para os usuários do site.
3	SEPLAG	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.
	Status	Foram finalizados 19 acordos de resultados ( <a href="http://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-gestao-para-resultados/acordos-de-resultados/">http://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-gestao-para-resultados/acordos-de-resultados/</a> ) e estão monitoramento mensalmente os mesmos. Estão em plena atividade de formulação de acordos de mais quatro secretarias: CGD, SPD, STDS e Sesporte, onde pretende-se concluir ainda neste ano.
4	SEPLAG	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada
	Status	Aguarda-se a criação do Grupo Técnico para focar a implementação do projeto.



# INDICADORES SECUNDÁRIOS – Acompanhamento

Nº	Setorial	Nome do Indicador
1	STDS	Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas.
2	SEPLAG	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).
3	SEMA	Apresentação da Lei de Resíduos Sólidos revista.
4	IPECE	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).
5	COGERH	Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.
6	COGERH	Apresentação da nova lei de proteção das bacias hidrográficas.
7	COGERH	Qualidade da água bruta na Região Metropolitana de Fortaleza.

## INDICADORES SECUNDÁRIOS – Acompanhamento (Status)

Nº	Setorial	Nome do Indicador
1	COGERH	Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.
	Status	Os resultados do projeto PSH foram apresentados ao Conerh, bem como foram criados grupos de trabalho nas bacias envolvidas. Até o fim do mês será enviado ofício à UGP/Ipece com a evidência do cumprimento.
2	COGERH	Apresentação da nova lei de proteção das bacias hidrográficas.
	Status	<b>O Decreto Nº 32.851 de 01/11/2018 referente à Proteção das Bacias Hidrográficas foi publicado no DOE de 06 de novembro de 2018.</b>



## 3.2. Programas *PforR*

## Posição dos Programas em 2017

<b>Meta 2014-2017</b>	<b>Estipulada no Documento de Avaliação do Projeto</b>	<b>R\$ 728,00</b>	<b>100%</b>
Execução 2014	Auditada pelo TCE	R\$ 223,36	30,68%
Execução 2015	Auditada pelo TCE	R\$ 226,15	31,06%
Execução 2016	Auditada pelo TCE	R\$ 275,39	37,83%
<b>Total Executado e auditado até 2016</b>		<b>R\$ 724,90</b>	<b>99,57%</b>
Execução 2017	A ser auditada em 2018	R\$ 268,72	-
<b>Total Executado</b>		<b>R\$ 993,62</b>	<b>-</b>



## Execução Acumulada dos Programas – 2014 à 2017

Setorial	EXECUÇÃO				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
SEDUC	R\$ 208,91	R\$ 213,00	R\$ 263,25	R\$ 257,87	R\$ 943,04
STDS	R\$ 7,21	R\$ 7,24	R\$ 7,36	R\$ 7,32	R\$ 29,13
SRH/COGERH	R\$ 0,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,46
CIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SEMA	R\$ 0,39	R\$ 1,11	R\$ 0,24	R\$ 0,69	R\$ 2,43
SEMACE	R\$ 4,60	R\$ 2,43	R\$ 2,71	R\$ 1,32	R\$ 11,06
FUNCEME	R\$ 1,79	R\$ 2,37	R\$ 1,82	R\$ 1,52	R\$ 7,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 223,36</b>	<b>R\$ 226,15</b>	<b>R\$ 275,39</b>	<b>R\$ 268,72</b>	<b>R\$ 993,62</b>

- ✓ Em 29 de agosto de 2018, foi enviado ao Banco Mundial e TCE o Relatório Financeiro do Projeto – IFR do 1º semestre de 2018.



# Posição da Execução dos Programas - 2018

## Capacitação Profissional

SEDUC	Orçamento	Restos a Pagar	Total
<b>020 - Ensino Integrado à Educação Profissional</b>	<b>R\$ 219.209.295,27</b>	<b>R\$ 21.816.538,21</b>	<b>R\$ 241.025.833,48</b>
<b>020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.</b>	<b>R\$ 74.087.622,82</b>	<b>R\$ 13.584.689,28</b>	<b>R\$ 87.672.312,10</b>
18802 - EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ 73.999.800,82	R\$ 12.919.453,28	R\$ 86.919.254,10
18803 - EXPANSÃO E MELHORIA DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ 87.822,00	R\$ 665.236,00	R\$ 753.058,00
<b>020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.</b>	<b>R\$ 109.749,24</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 109.749,24</b>
18804 - EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ 59.565,24	R\$ -	R\$ 59.565,24
18805 - EXPANSÃO E MELHORIA DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ 50.184,00	R\$ -	R\$ 50.184,00
<b>020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.</b>	<b>R\$ 119.579.379,04</b>	<b>R\$ 6.990.937,71</b>	<b>R\$ 126.570.316,75</b>
22668 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - APORTE.	R\$ 7.535.634,35	R\$ 847.527,51	R\$ 8.383.161,86
22669 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ 109.465.405,55	R\$ 5.095.810,65	R\$ 114.561.216,20
22670 - GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ 2.578.339,14	R\$ 1.047.599,55	R\$ 3.625.938,69
<b>020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.468,90</b>	<b>R\$ 10.468,90</b>
18807 - AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS.	R\$ -	R\$ 10.468,90	R\$ 10.468,90
<b>020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.</b>	<b>R\$ 25.432.544,17</b>	<b>R\$ 1.230.442,32</b>	<b>R\$ 26.662.986,49</b>
18815 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ 25.432.544,17	R\$ 1.230.442,32	R\$ 26.662.986,49

# Posição da Execução dos Programas - 2018

## Assistência à Família

STDS	Orçamento	Restos a Pagar	Total
080 – Proteção Social Básica	R\$ 6.083.612,20	R\$ -	R\$ 6.083.612,20
080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.	R\$ 6.083.612,20	R\$ -	R\$ 6.083.612,20
22874 - COFINANCIAMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	R\$ 6.083.612,20	R\$ -	R\$ 6.083.612,20

# Posição da Execução dos Programas - 2018

## Qualidade da Água

CIDADES	Orçamento	Restos a Pagar	Total
025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana	R\$ 450.547,94	R\$ -	R\$ 450.547,94
025.1.07 - Ampliação do serviço de esgotamento sanitário.	R\$ 450.547,94	R\$ -	R\$ 450.547,94
18946 - AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - P4R	R\$ 450.547,94	R\$ -	R\$ 450.547,94

# Posição da Execução dos Programas - 2018

## Qualidade da Água

<b>SEMA</b>	<b>Orçamento</b>	<b>Restos a Pagar</b>	<b>Total</b>
<b>064 – Resíduos Sólidos</b>	R\$ 172.545,26	R\$ 166.400,00	R\$ 338.945,26
<b>064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.</b>	R\$ 172.545,26	R\$ 166.400,00	R\$ 338.945,26
18911 - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$ 172.545,26	R\$ 166.400,00	R\$ 338.945,26
<b>066 – Ceará Mais Verde</b>	R\$ 82.973,20	R\$ 532.692,86	R\$ 532.692,86
<b>066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.</b>	R\$ 82.973,20	R\$ 532.692,86	R\$ 532.692,86
17569 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	R\$ 82.973,20	R\$ 532.692,86	R\$ 532.692,86



# Posição da Execução dos Programas - 2018

## Qualidade da Água

SEMACE	Orçamento	Restos a Pagar	Total
<b>066 – Ceará Mais Verde</b>	R\$ -	R\$ 2.000.846,93	R\$ 2.000.846,93
<b>066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais.</b>	R\$ -	R\$ 2.000.846,93	R\$ 2.000.846,93
18657 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS	R\$ -	R\$ 2.000.846,93	R\$ 2.000.846,93
<b>500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada</b>	R\$ 40.603,50	R\$ 268.119,91	R\$ 308.723,41
<b>500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas.</b>	R\$ 40.603,50	R\$ 268.119,91	R\$ 308.723,41
17971 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - SEMACE	R\$ 14.603,50	R\$ 220.619,91	R\$ 235.223,41
17973 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TI - SEMACE	R\$ 26.000,00	R\$ 47.500,00	R\$ 73.500,00



# Posição da Execução dos Programas - 2018

## Qualidade da Água


<b>FUNCEME</b>	<b>Orçamento</b>	<b>Restos a Pagar</b>	<b>Total</b>
<b>018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis</b>	<b>R\$ 1.144.131,45</b>	<b>R\$ 207.355,44</b>	<b>R\$ 1.351.486,89</b>
<b>018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias.</b>	<b>R\$ 1.144.131,45</b>	<b>R\$ 207.355,44</b>	<b>R\$ 1.351.486,89</b>
22611 - PROMOÇÃO E SUPORTE AO MONITORAMENTO E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES HIDROAGROMETEOROLÓGIAS	R\$ 1.144.131,45	R\$ 207.355,44	R\$ 1.351.486,89

<b>PROGRAMAS EXECUÇÃO ACUMULADA 2018</b>	<b>Execução Orçamentária</b>	<b>Execução Extraorçamentária</b>	<b>Total</b>
	<b>R\$ 227.183.708,82</b>	<b>R\$ 24.991.953,35</b>	<b>R\$ 252.092.688,97</b>



### 3.3. Assistência Técnica

## Execução dos 84 Projetos de AT (U\$)

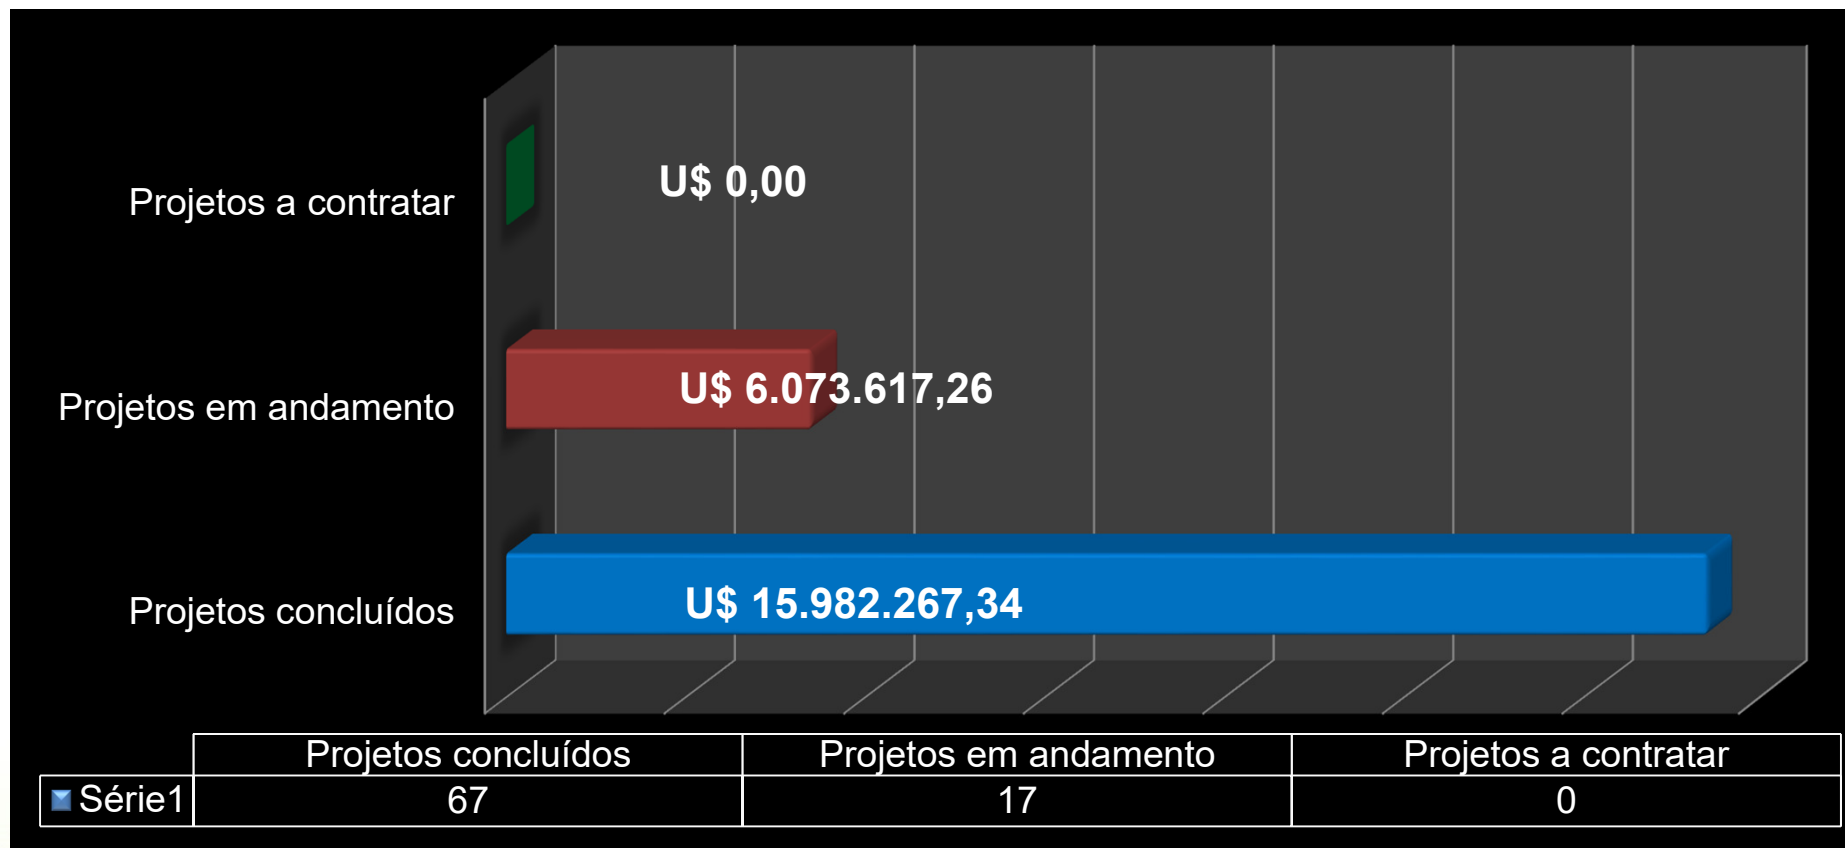


Fonte: UGP PforR

Item	Quantidade	Valor (U\$)
Projetos Concluídos	67	15.982.267,34
Projetos em Andamento	17	6.073.617,26
Projetos a Contratar	00	0,00
<b>Total dos Projetos</b>	<b>84</b>	<b>22.055.884,60</b>

## Execução dos Subprojetos de AT por Etapa

Total dos projetos		Status		%
84	00	Em Andamento	Atividades Preparatórias	0,00%
	00		Em Licitação	0,00%
	17		Em Execução	20,00%
	67	Concluído	80,00%	

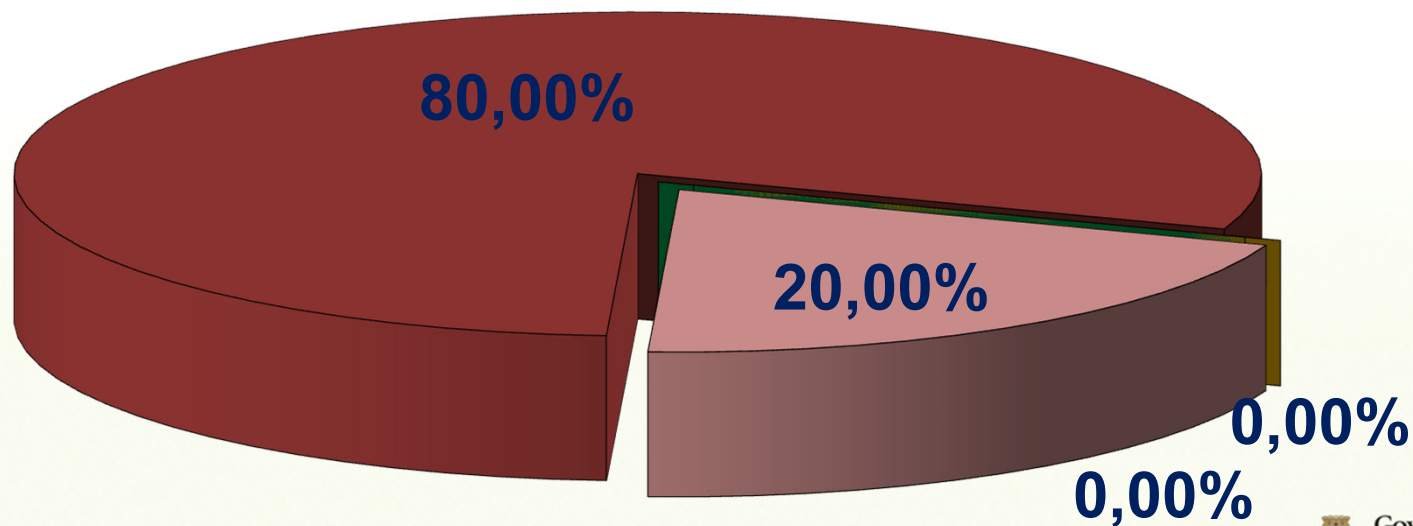



## 3.4 Pontos Principais de Aquisições / Contratos



## Pontos Principais de Aquisições / Contratos


- **OFÍCIO CIRCULAR IPECE/UGP N°. 29/2018** - Enviado para Setoriais solicitando empenho das despesas ainda esta ano e que a entrega dos Produtos e Atesto das Comissões devem ser realizadas dentro da vigência de cada Contrato e da vigência do Acordo de Empréstimo.
- **OFÍCIO CIRCULAR IPECE/UGP N°. 30/2018** - Enviado para Setoriais ressaltando a importância de apresentar os resultados obtidos com os contratos de Assistência Técnica (fonte 48) quando forem convidados por este Comitê.
- Setoriais arquivem toda a documentação (Processo licitatório, Contrato, Produtos e Pagamentos) dos Projetos para futuras auditorias do Tribunal de Contas do Ceará e do Banco Mundial.




### 3. MONITORAMENTO CONTRATOS

## Cronograma Assinatura dos Contratos AT (R\$)

Descrição						
	2014	2015	2016	2017	2018	Total
<b>Contratos Assinados</b>	3	22	27	22	10	<b>84</b>
<b>Valores R\$</b>	636.753	9.941.539	33.500.123	15.847.087	4.206.024	64.131.526
<b>% Financeiro dos Projetos Contratados</b>	1,0%	15,5%	52,2%	24,7%	6,6%	<b>100%</b>

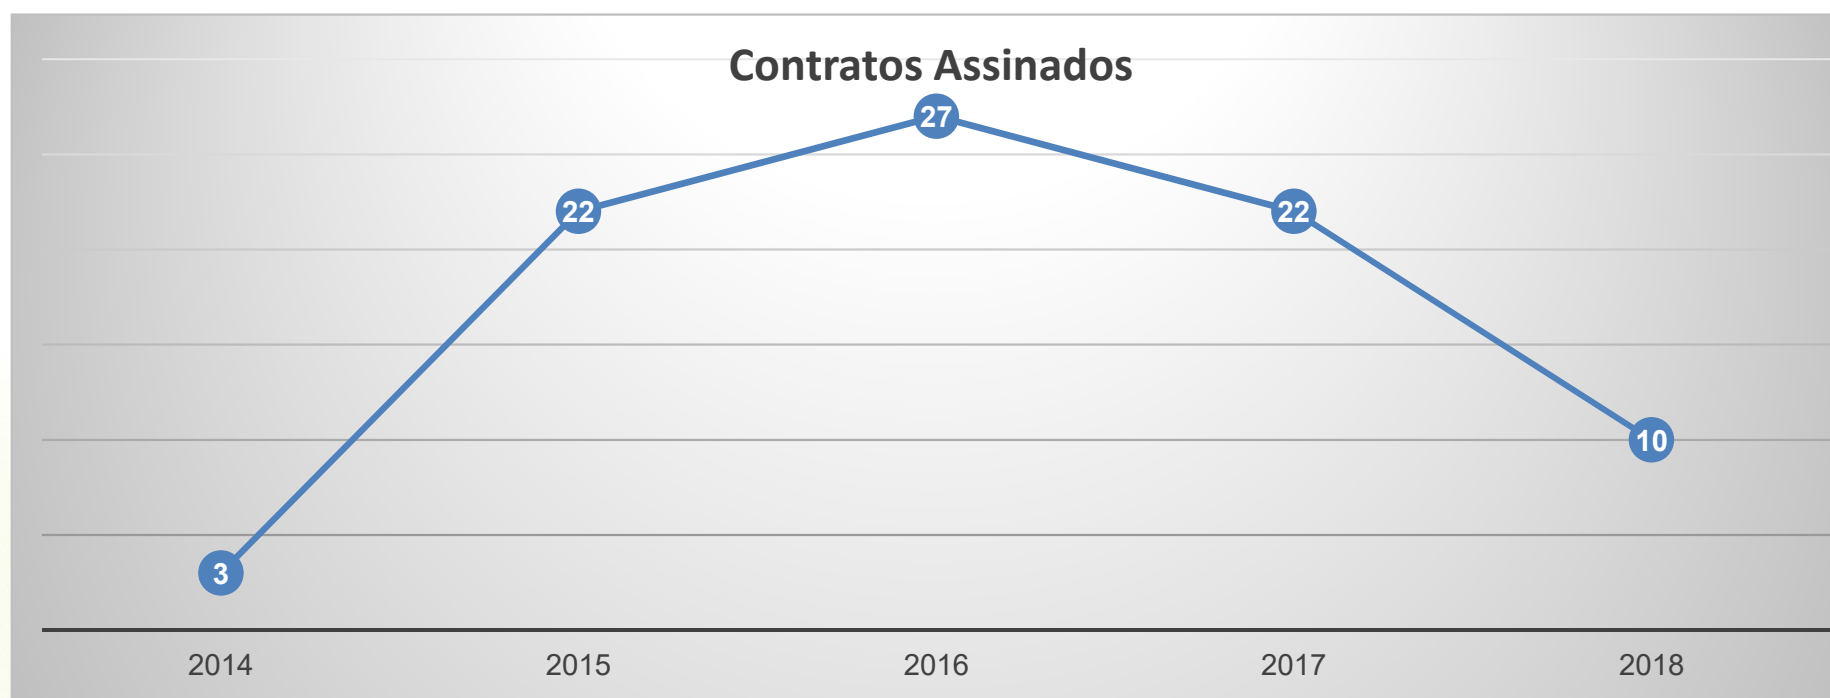

## Posição Geográfica das Empresas e dos Consultores Individuais contratados no escopo do PforR

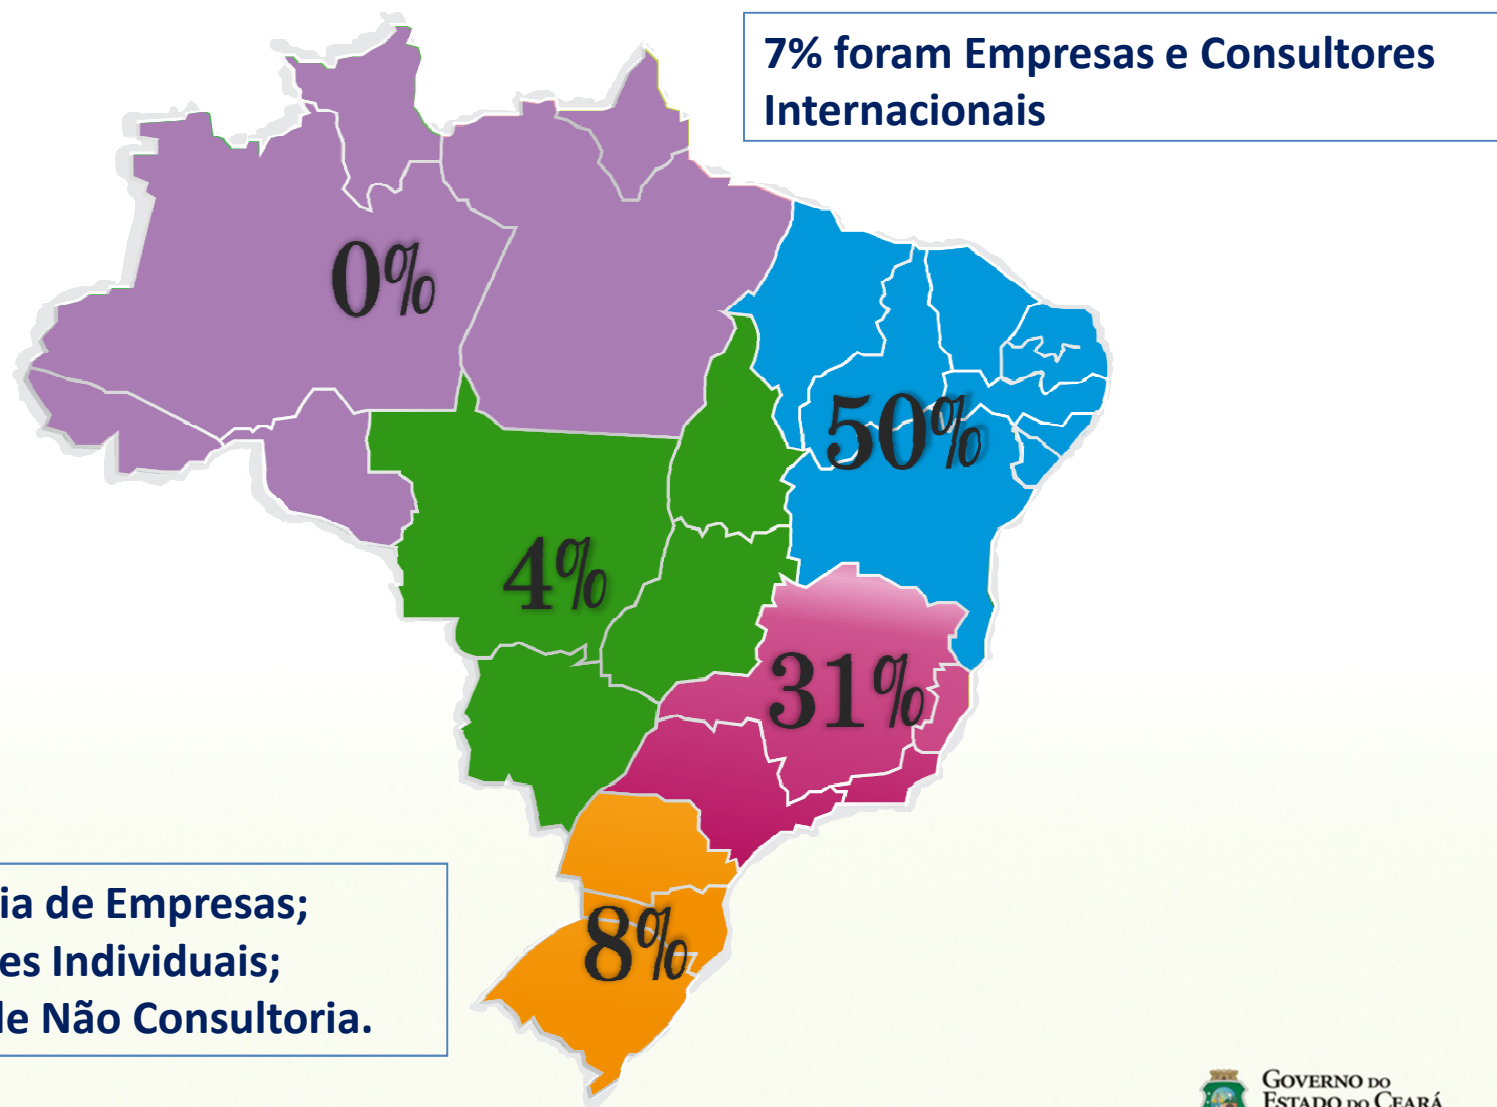




# Contratos Assistência Técnica

Resumo Financeiro dos Contratos							
Setorial	Nº de Contratos	Nº de Contratos em Andamento	Nº de Contratos Concluídos	Valor Contratado + Patronal (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo a Pagar (R\$)	% PAGO
ARCE	1	0	1	839.982,65	839.982,65	-	100%
CGE	9	1	8	7.883.945,04	6.912.937,10	971.007,94	88%
COGERH	3	0	3	4.419.133,05	4.419.133,05	-	100%
FUNCEME	1	0	1	1.666.842,98	1.666.842,98	-	100%
IPECE	11	6	5	7.491.535,09	5.792.788,74	1.698.746,35	77%
SDE	3	1	2	2.725.909,25	1.148.959,99	1.576.949,26	42%
SECITECE	3	0	3	1.400.260,31	1.400.260,31	-	100%
SEDUC	22	2	20	9.125.114,81	8.745.074,95	380.039,86	96%
SEMA	7	1	6	7.234.534,13	7.051.913,61	182.620,52	97%
SEMACE	2	0	2	1.639.804,89	1.639.804,89	-	100%
SEPLAG	8	0	8	11.326.416,01	11.326.416,01	-	100%
SRH	6	4	2	3.543.415,88	2.485.623,58	1.057.792,30	70%
STDS	3	0	3	1.307.072,00	1.307.072,00	-	100%
TCE	5	2	3	3.527.559,97	1.667.756,59	1.859.803,38	47%
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>	<b>17</b>	<b>67</b>	<b>64.131.526,06</b>	<b>56.404.566,45</b>	<b>7.726.959,61</b>	<b>88%</b>




## Cronograma Pagamentos dos 84 Subprojetos (R\$)

Pago e Previsão de Pagamento da Assistência Técnica - PforR (R\$)							
Ano	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Ano 2018 Pago até 16/11	A pagar em 2018 e 2019	Total
Valor	72.600	975.610	11.205.681	30.812.911	13.781.015	7.283.709	64.131.526

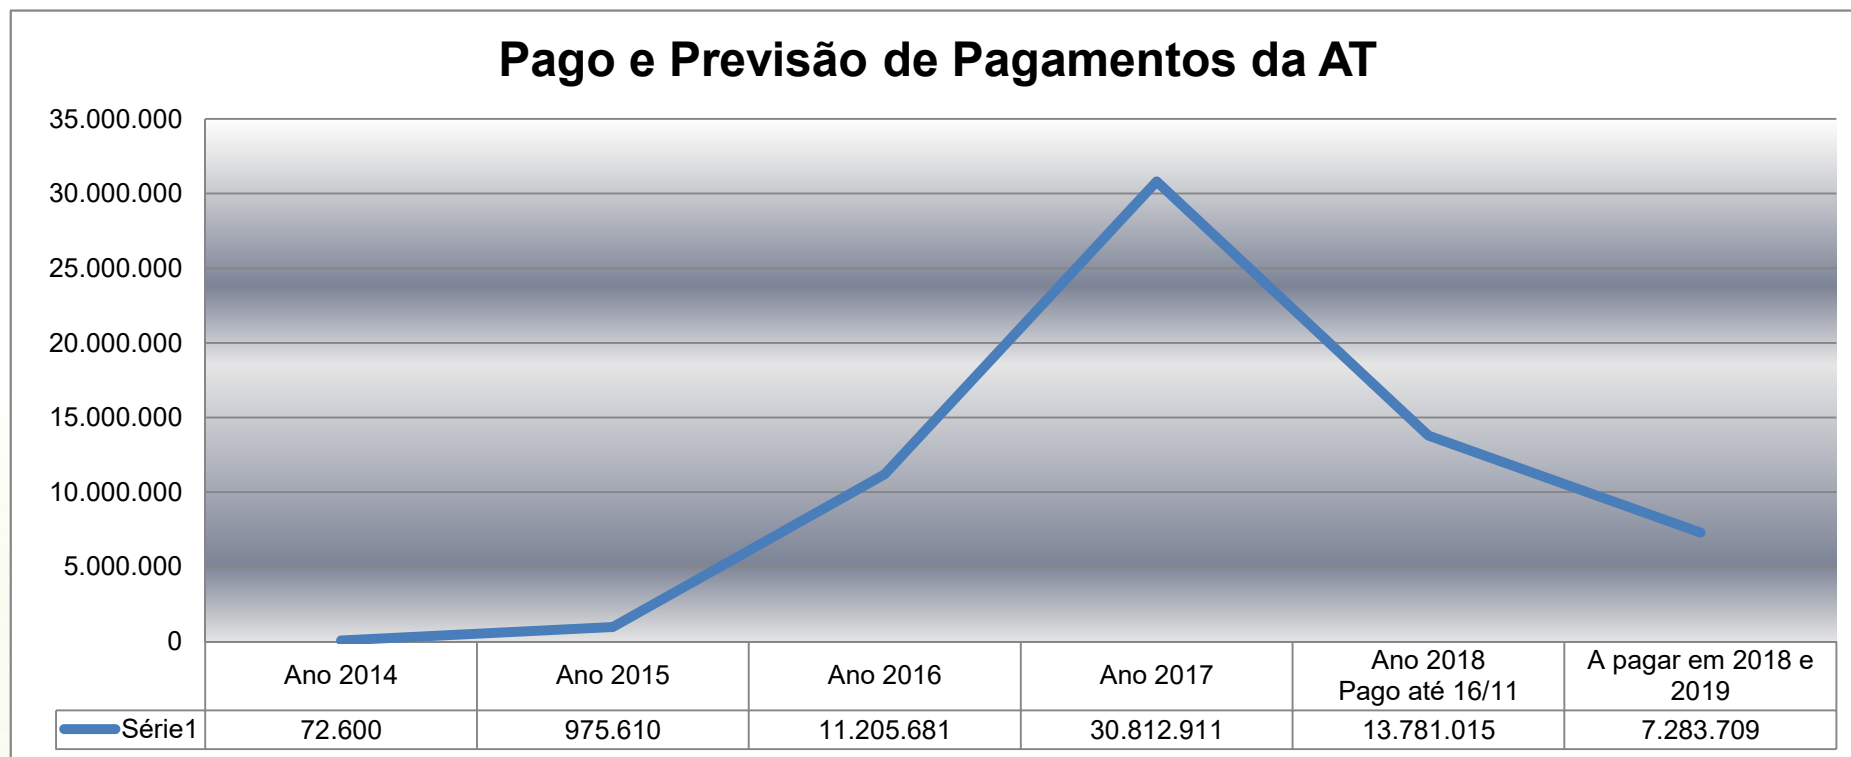

## Situação dos Contratos – Aditivos de Prazo

Setorial	ARCE	CGE	COGERH	FUNCEME	SEMA	SEMACE	SEPLAG	SDE	SEDUC	STDS	SECITECE	IPECE	TCE	SRH	TOTAL
Nº Contratos	1	9	3	1	7	2	8	3	22	3	3	11	5	6	84
Aditivo de Prazo	0	5	1	1	3	0	10	0	31	5	1	20	4	5	86
%	0%	56%	33%	100%	43%	0%	125%	0%	141%	167%	33%	180%	80%	83%	102%

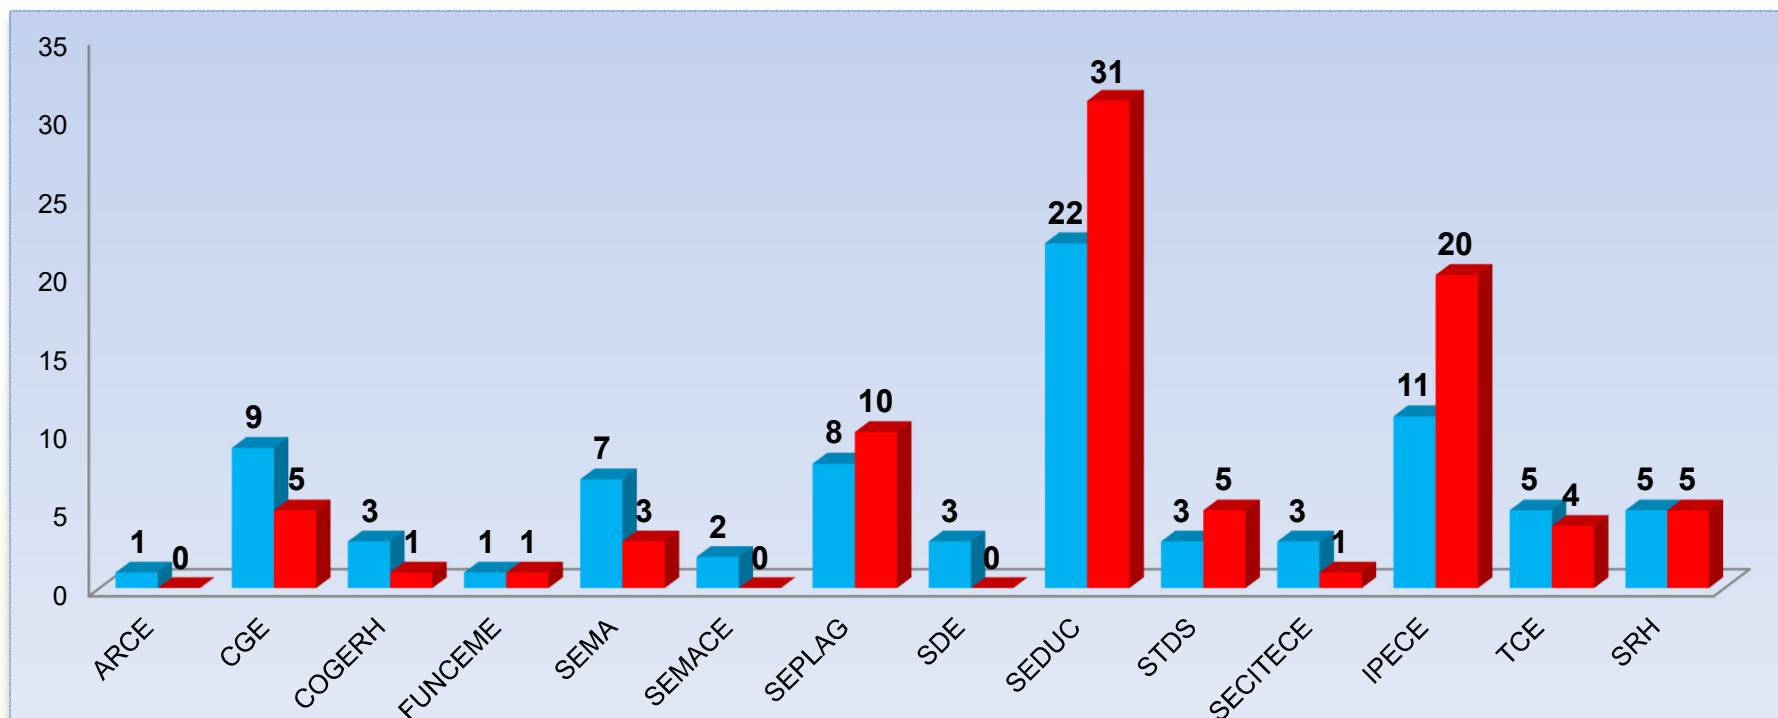



## 4. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR SETORIAL CONTRATADOS



# ARCE

## Subprojeto ARCE

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	ARCE	Desenvolvimento de modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro



# ARCE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 1: Desenvolvimento de modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Subprojeto:** US\$ 342.109,75
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Fevereiro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 019/2016, assinado em 14/06/2016.
- **Consultora Vencedora:** RPG – Regulation, Performance and Governace Ltda.
- **Valor do Contrato + Taxas:** R\$ 839.982,65.



# CGE

## Subprojetos CGE

Nº	Órgão	Subprojetos	Status
1	CGE	Auditoria Técnica dos Indicadores I.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
2	CGE	Auditoria Técnica dos Indicadores II.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	CGE	Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (NEGÓCIO SIEC).	Contrato Concluído Físico e Financeiro
4	CGE	Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SISTEMA SIEC).	Contrato Concluído Físico e Financeiro
5	CGE	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	Contrato em Execução
6	CGE	Capacitação da população para o Controle Social.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
7	CGE	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
8	CGE	Realização de treinamentos com foco no “apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público”.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
9	CGE	Consultoria individual especializada, em gestão documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

## CGE- Assistência Técnica – Gestão Pública

*Subprojetos 2 e 3: Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR. <sup>1</sup>*

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 67.354,63
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévio
- **Início/Término:** Junho 2014 - Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contratos Concluídos Físico e Financeiro. Contratos nº 01/2015 e 01/2016 e assinados em 13/01/2015 e 01/02/2016.
- **Consultores:** Marcelo Ponte Barbosa e Túlio Cravo.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 152.302,30.

***Nota 1: Auditoria será realizada pela equipe da CGE a partir do semestre 16.1***



## CGE - Assistência Técnica - Gestão Financeira

*Subprojeto 4: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Marcelo Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 284.089,71
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2015 – Junho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 08/2016, assinado em 15/06/2016.
- **Consultora Vencedora:** NTConsult Tecnologia e Consultoria LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 725.256,92



## CGE - Assistência Técnica - Gestão Financeira

*Subprojeto 5: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).*

- **Responsável:** Marcos Henrique
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 685.651,75
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Maio 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 026/2016, assinado em 07/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** Ivia Serviços de Informática Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.130.443,48.

## CGE - Assistência Técnica - Gestão Financeira

*Subprojeto 6: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.*

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.071.989,29
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2015 – Dezembro 2018
- **Estágio Previsto:** Em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 029/2016, assinado em 24/11/2016.  
**Consultora Vencedora:** Caiena Desenvolvimento de Sistemas Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 3.467.885,35.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
3.467.885,35	2.496.877,41	971.007,94	12/15	72,00%

# CGE - Assistência Técnica – Gestão Financeira

*Subprojeto 7: Capacitação da população para o Controle Social.*

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 267.522,72
- **Método de Aquisição:** LPN
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 01/2017 – Assinado em 20/01/2017
- **Consultora Vencedora:** Fundação Demócrito Rocha.
- **Valor do Contrato:** R\$ 865.436,00.

## CGE - Assistência Técnica – Gestão Financeira

*Subprojeto 8: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na “Detecção de Casos de Fraude e Corrupção” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.*

- **Responsável:** Denise Andrade Araújo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 89.644,51
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 07/2017, assinado em 13/06/2017.
- **Consultora Vencedora:** Deloitte Touche Tohatsu Consultores Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 290.000,00



## Assistência Técnica – Gestão Financeira

*Subprojeto 9: Realização de treinamentos com foco no “apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público”.*

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 61.026,58
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 025/2016, assinado em 07/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** KPMG Assessores Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 197.421,00.



## CGE - Assistência Técnica – Gestão Pública

*Subprojeto 10: Consultoria individual especializada, em gestão documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE.*

- **Responsável:** Aglaio Soares
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 24.411,82
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Março de 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 012/2015, assinado em 08/09/2015.
- **Consultor:** Fernando Braga.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 55.200,00.



# FUNCEME

## Subprojeto FUNCEME

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	FUNCEME	Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

# FUNCEME - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 11: Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Francisco Hoilton
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Proposta Vencedora:** 679.677,00 (US\$ + €)
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Maio 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 10/2015, assinado em 09/09/2015.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Aqualogus / Azurit.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.666.864,98.





# IPECE

## Subprojetos IPECE

Nº	Órgão	Subprojetos	Status
1	IPECE	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará - CONSULTORES PLENOS.	Contrato em Execução
2	IPECE	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará - CONSULTORES PLENOS.	Contrato Rescindido
3	IPECE	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. CONSULTOR JÚNIOR.	Contrato Rescindido
4	IPECE	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. ANALISTA LICITAÇÕES.	Contrato em Execução
5	IPECE	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. ANALISTA LICITAÇÕES.	Contrato Rescindido
6	IPECE	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. ANALISTA LICITAÇÕES.	Contrato em Execução
7	IPECE	Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR.	Contrato Físico e Financeiro
8	IPECE	Desenvolvimento de sistemas de informação digital, para implementação e implantação de 02 (dois) sistemas denominados IPECEDATA e sistema de monitoramento e avaliação dos projetos e beneficiários do FECOP.	Contrato Físico e Financeiro
9	IPECE	Desenvolvimento de metodologias para planejamento e avaliação dos projetos estratégicos de investimentos do poder executivo do Estado do Ceará.	Contrato em Execução
10	IPECE	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização e realização de eventos e congressos.	Contrato em Execução
11	IPECE	Consultoria para a formulação de ferramentas de gestão: Produtividade Setorial do Trabalho e Inflação Interna.	Contrato em Execução

## IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojetos 12 e 13: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTORES PLENOS*

- **Responsável:** Viviane Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 308.277,81
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2019
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 06/2014, assinado em 16/07/2014 (em execução) e Contrato nº 09/2015, assinado em 17/07/2015 (rescindido).
- **Consultora:** Giuseppe Furtado Nogueira e Viviane Ramos da Costa.
- **Valor dos Contratos + Patronal + Aditivos:** 691.644,21
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

## IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojeto 14: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTOR JÚNIOR*

- **Responsável:** Viviane Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 21.227,67
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato nº 07/2014, assinado em 14/07/2014 - Rescindido.
- **Consultora:** Viviane Ramos da Costa.
- **Valor do Contrato:** R\$ 48.000,00.



## IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojetos 15, 16 e 17: Contratação de 03 (três) **Analistas em Licitações** para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- **Responsável:** Viviane Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 247.994,30
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Janeiro 2019
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 08 /2015, assinado em 17/07/2015 (em execução), Contrato nº 09/2015, assinado em 17/07/2015 (rescindido) e Contrato nº 13/2015, assinado em 17/07/2015 (em execução).
- **Consultora:** Rodrigo José Almeida Rufino, Lívia Maria Oliveira de Castro e André Morel Gonzaga.
- **Valor dos Contratos + Patronal + Aditivos:** R\$ 578.569,50
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

## IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojeto 18: Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR.*

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 141.873,05
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Junho 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 10/2015, assinado em 01/09/2015.
- **Consultora:** Carlos Alberto Manso.
- **Valor do Contrato + Patronal + Aditivos:** R\$ 385.040,64.
-

## IPECE - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 19: Desenvolvimento de sistemas de informação digital, para implementação e implantação de 02 (dois) sistemas denominados IPECEDATA e sistema de monitoramento e avaliação dos projetos e beneficiários do FECOP.*

- **Responsável:** Mário Aragão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 736.757,76
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Outubro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído Físico e Financeiro
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 01/2017, assinado em 17/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** Nova Via Tecnologia e Mobilidade Ltda.
- **Valor do Contrato:** 2.407.307,70.

# IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojeto 20:* Consultoria Especializada (Pessoa Jurídica), para Desenvolvimento de Metodologias para Análise de Impactos Econômicos, no Estado Do Ceará.


- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 531.727,04
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 04/2017, assinado em 28/04/2017.
- **Consultora Vencedora:** Quadrante Consultoria Econômica Ltda.
- **Valor do Contrato:** 1.720.136,97.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
1.720.136,97	R\$ 1.607.245,48	R\$ 112.891,49	13/15	93,44%



# IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojeto 21: Empresa especializada na prestação de serviços de organização e realização de eventos e congressos.*

- **Responsável:** Flávio Ataliba
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 150.819,17
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2017 – Dezembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução nº 07/2018, assinado em 14/06/2018.
- **Consultoria Vencedora:** JR Alacrino Rocha Menezes.
- **Valor do Contrato:** R\$ 487.900,00
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
R\$ 487.900,00	R\$ 0,00	R\$ 487.900,00	-	0,00%

# IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojeto 22: Consultoria para a formulação de ferramentas de gestão: Produtividade Setorial do Trabalho e Inflação Interna.*

- **Responsável:** Claudio André e Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 315.378,67
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2018 – Janeiro 2019
- **Estágio Previsto:** Em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato assinado no dia 01/10, aguardando a publicação.
- **Consultora Vencedora:** Fundação Getúlio Vargas – FGV.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.020.250,00
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
1.020.250,00	0,00	1.020.250,00	-	0,00%



# SDE / ADECE

## Subprojetos SDE

Nº	Órgão	Subprojetos	Status
1	SDE	Desenvolvimento do sistema FDI (Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas).	Contrato Concluído Físico e Financeiro
2	SDE	Impact Evaluation Workshop em Istambul.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	SDE	Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.	Contrato em Execução



# SDE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 23: Desenvolvimento do sistema FDI (Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas).*

- **Responsável:** Fernando Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 388.117,50
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 03/2016, assinado em 26/08/2016.
- **Consultora Vencedora:** Ivia Serviços de Informática Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.142.416,04.

# SDE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

## *Subprojeto 24: Impact Evaluation Workshop Istanbul*

- **Responsável:** Inês Studart
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 2.894,02
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Maio 2015.
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro. Contrato 02/2013 e assinado em 16/06/2015.
- **Consultora Vencedora:** Casa Blanca / Maria Inês Cavalcante Studart Menezes.
- **Valor do Contrato:** R\$ 6.543,95.

## SDE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 25: Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Filipe Rabelo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 487.465,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2017 – Janeiro 2019
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 05/2018, assinado em 03/09/2018.  
**Consultora Vencedora:** Consórcio Sociedade Portuguesa de Inovação - SPI / QUANTA Consultoria Ltda. Setorial elaborando o aditivo.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.576.949,26
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
R\$ 1.576.949,26	R\$ 0,00	R\$ 1.576.949,26	-	0,00%



# SECITECE



## Subprojetos SECITECE

Nº	Órgão	Subprojetos	Status
1	SECITECE	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
2	SECITECE	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	SECITECE	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

# SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 26: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.*

- **Responsável:** Flaviana Pereira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 139.917,03
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 16/2017, assinado em 25/07/2017.
- **Consultora Vencedora:** Ferraro Projetos e Investimento Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 452.631,58

# SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 27: Elaboração do plano estadual de ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Flaviana Pereira / Tarcísio Hilter
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 238.111,76
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 06/2016, assinado em 20/04/2016.
- **Consultora Vencedora:** Macroplan Prospectivo, Estratégia e Gestão Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 770.291,53

# SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 28:* Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

- **Responsável:** Flaviana Pereira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 57.428,61
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Abril 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 16/2016, assinado em 06/07/2016.
- **Consultora:** Maria Fatima Ludovico da Gama e Souza.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 177.593,20.





# SEDUC

# Subprojetos SEDUC

Nº	Órgão	Subprojetos	Status
1	SEDUC	Elaborar as matrizes de referência e os itens para compor os testes da avaliação de desempenho dos estudantes do 3º ano de vinte cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais de educação profissional do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
2	SEDUC	Formação Continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	SEDUC	Serviço técnico de consultoria individual para apoiar na reestruturação de conteúdo e formato do portal conexão trabalho Ceará.	Contrato em Execução
4	SEDUC	Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
5	SEDUC	Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
6	SEDUC	Impact Evaluation Workshop em Istambul.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
7	SEDUC	CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
8	SEDUC	Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
9	SEDUC	Desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
10	SEDUC	Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
11	SEDUC	Serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
12	SEDUC	Contratação de serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

## Subprojetos SEDUC

Nº	Órgão	Subprojetos	Status
12	SEDUC	Especialista em Avaliação de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
13	SEDUC	Desenvolvimento Infantil, com foco na educação, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Contrato Concluído Físico e Financeiro
14	SEDUC	Desenvolvimento Infantil, com foco na saúde, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Contrato Concluído Físico e Financeiro
15	SEDUC	Empresa especializada para elaboração de arte gráfica/design, revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, da Secretaria da Educação.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
16	SEDUC	Apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.	Contrato em Execução
17	SEDUC	Empresa de Consultoria especializada em visitas domiciliares e para formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Contrato Concluído Físico e Financeiro
18	SEDUC	Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN. (Coleta de Dados).	Contrato Concluído Físico e Financeiro
19	SEDUC	Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
20	SEDUC	Contratação de Consultoria Individual para o desempenho da função de coordenadora de campo nas atividades de coletas de dados da Formação de Gestores da Educação Infantil.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
21	SEDUC	Aquisição de passagem aérea para participação de técnica que integra a equipe Coordenação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN no IV Simpósio – Luso-Brasileiro de Estudos da Criança – Por uma Luta sem Fronteiras na Defesa dos Direitos da Criança na cidade de Goiana – Goiás.	Contrato Concluído Físico e Financeiro



## SEDUC- Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 29:* Elaborar as matrizes de referência e os itens para compor os testes da avaliação de desempenho dos estudantes do 3º ano de vinte cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais de educação profissional do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 267.202,02
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Agosto 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 154/2017, assinado em 16/08/2017. 1º Aditivo de Prazo publicado, término em Agosto/2018.
- **Consultora Vencedora:** Universidade Federal de Juiz de Fora – Centro de Políticas Públicas de Avaliação da Educação (UFJF/CAED).
- **Valor do Contrato:** R\$ 864.398,52



# SEDUC - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 30:* Formação Continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 80.873,09
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Março 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 079/2017, assinado em 18/04/2017.
- **Consultora Vencedora:** Elos Orientação e Planejamento Educacional Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 261.624,46.

# SEDUC - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 31: Serviço técnico de consultoria individual para apoiar na reestruturação de conteúdo e formato do portal conexão trabalho Ceará.*

- **Responsável:** Josilene Dias e Victor Hugo
- **Categoria de Licitação:** Consultor Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 79.752,70
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2018 – Janeiro 2019
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 333/2018, assinado em 24/10/2018. **Consultor Vencedor:** Cláudio Carneiro de Mendonça.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 258.000,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
R\$ 258.000,00	R\$ 0,00	R\$ 258.000,00	-	0,00%

# SEDUC- Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojetos 32 e 33: Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará (02 Consultores).*

- **Responsável:** Luciano Nery
- **Categoria de Licitação:** CI
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 35.710,22
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2016 – Março 2018
- **Estágio Previsto:** Contratos Concluídos.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 83, assinado no dia 15/03/2017 e Concluído Físico e Financeiro; e Contrato nº 84, assinado em 15/03/2017 e rescindindo em 18/01/2018.
- **Consultores:** Antônio Jussier de Vasconcelos Ramos e Fernando Andrade de Alcântara.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 115.522,56

# SEDUC- Assistência Técnica – Capacitação Profissional

## *Subprojeto 34: Impact Evaluation Workshop Istanbul*

- **Responsável:** Luciano Nery
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 3.154,13
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 565/2014, assinado em 28/11/2014.
- **Consultora:** Andréa Araújo Rocha Nibon.
- **Valor do Contrato:** R\$ 7.132,11.



## SEDUC- Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 35: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 4.466,03
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Julho 2015.
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Maria Dagmar de Andrade Soares - Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER.
- **Valor do Contrato:** R\$ 10.098,59.

## SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 36: Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento. WMS*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 6.850,73
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Setembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato N° 089/2017, assinado em 27/03/2017.
- **Consultor:** Samuel Simões Oliveira Franco.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 22.162,11.

## SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 37: Desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 254.128,36
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Outubro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 105/2017, assinado em 20/04/2017. **Consultora Vencedora:** Instituto da Primeira Infância - IPREDE.
- **Valor do Contrato:** R\$ 822.105,26.

## SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 38: Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 108.660,04
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2016 – Agosto 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 028/2017, assinado em 07/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** ECART Projetos e Gestão Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 351.515,22.



## SEDUC- Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 39: Serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 15.783,62
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2016 – Junho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 021/2017, assinado em 07/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** Expressão Gráfica e Editora Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 51.060,00.

## SEDUC- Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 40: Serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados.*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 1.185,63
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2017 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 43/2018, assinado em 01/03/2018.
- **Consultora Vencedora:** Expressão Gráfica e Editora Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 3.835,50.

## SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 41: Especialista em **Avaliação** de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa.*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor Subprojeto:** US\$ 4.139,40
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2014 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 018/2015, assinado em 18/05/2015.
- **Consultor:** Flávio Augusto Rezende Cunha.
- **Valor do contrato:** R\$ 9.360,00.

## SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 42: Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 25.207,85
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 017/2015, assinado em 23/03/2015.
- **Consultora:** Fátima Maria Araújo Saboia Leitão.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 57.000,00.



## SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 43: Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 29.188,04
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 014/2015, assinado em 26/03/2015.
- **Consultora:** Ana Cecília Silveira Lins Sucupira.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 66.000,00.

## SEDUC - Assistência Técnica –Assistência à Família

*Subprojeto 44: Empresa Especializada para Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 61.838,85
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Setembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 029/2016, assinado em 11/02/2016.
- **Consultora Vencedora:** Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 139.830,00.

## SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 45: Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 372.482,21
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Dezembro 2018
- **Estágio Previsto:** Em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução - Contrato nº 214/2016, assinado em 12/09/2016.  
Aguardando pagamento do produto final.
- **Consultora Vencedora:** VC Promoções e Eventos Ltda – EPP.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.204.979,94.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
1.204.979,94	1.050.470,10	154.509,84	14	87,18

## SEDUC - Assistência Técnica –Assistência à Família

*Subprojeto 46: Empresa de Consultoria Especializada em **Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil** e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 278.645,92
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Dezembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 236/2016, assinado em 30/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** CASAM – Centro de Apoio Social e de Animação Missionária.
- **Valor do Contrato:** R\$ 820.855,00.



## SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 47: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN. (Coleta de Dados).*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 1.336.765,46
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Outubro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 214/2016, assinado em 28/09/2016. Aguardando pagamento dos últimos produtos.
- **Consultora Vencedora:** Overview Serviços & Informação Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 3.739.071,95.

# SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 48: Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN.*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 17.458,44
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Outubro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Rescindido – Contrato nº 253/2016, assinado em 19/10/2016.
- **Consultora Vencedora:** Rafaela Martins Leite Monteiro.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 45.694,11.

## SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 49: Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 23.806,07
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2016 – Novembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 30/2017, assinado no dia 20/07/2017.
- **Consultora Vencedora:** Patrícia Simões.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 77.012,64.

## TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

*Subprojeto 50: Aquisição de passagem aérea para participação de técnica que integra a equipe Coordenação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN no IV Simpósio – Luso-Brasileiro de Estudos da Criança – Por uma Luta sem Fronteiras na Defesa dos Direitos da Criança na cidade de Goiânia – Goiás.*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 655,38
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/ Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2018 – Dezembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído
- **Consultora Vencedora:** Casablanca Turismo e Viagens Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.120,14.





# SEMA

## Subprojetos SEMA

Nº	Órgão	Subprojetos	Status
1	SEMA	Elaboração do projeto “Avaliação do Impacto Econômico da Degradação Ambiental.”	Contrato Concluído Físico
2	SEMA	Desenvolvimento e execução de projeto em educação ambiental para a qualidade da água nas três bacias estratégicas.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	SEMA	Apoio Logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas três bacias estratégicas.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
4	SEMA	Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e programas do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
5	SEMA	Desenvolver projeto de lei que institui o programa de serviços ambientais no Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
6	SEMA	Elaboração do Plano de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto – 81 municípios.	Contrato em Execução
7	SEMA	Desenvolver Implementação da Coleta Seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

# SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 51: Elaboração do projeto “Avaliação do Impacto Econômico da Degradação Ambiental.” (AIEDA)*

- **Responsável:** Maria Dias / Magda Marinho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 282.850,22
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 06/2016, assinado em 25/02/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Aquino – Mcrit SL – Barcelona Brasil Group.
- **Valor do Contrato + Taxa:** R\$ 851.841,63.

# SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 52: Desenvolvimento e execução de projeto em educação ambiental para a qualidade da água nas três bacias estratégicas.*

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 266.182,85
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 06/2016, assinado em 25/02/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Engesoft Engenharia / Quanta Consultoria Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 710.638,32.



# SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 53: Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor Subprojeto:** US\$ 96.162,05
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 26/2016, assinado em 26/11/2015.
- **Consultora Vencedora:** Empresa MSV Multiserviços ME.
- **Valor do Contrato:** R\$ 242.557,52.

# SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 54: Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e programas do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Maria Dias / Francisco Leorne
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 202.789,54
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2014 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 16/2016, assinado em 05/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** Arcadis Logos S.A.
- **Valor do Contrato:** R\$ 563.157,73.

# SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 55: Desenvolver projeto de lei que institui o programa de serviços ambientais no Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Maria Dias / Monica Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 215.404,39
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Dezembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 08/2017, assinado em 09/02/2017.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio STCP Engenharia de Projetos Ltda – Ludovino Lopes, Ricci e Santos Sociedade de Advogados.
- **Valor do Contrato:** R\$ 696.833,21.

## SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 56: Elaboração do Plano de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto – 81 municípios.*

- **Responsável:** Maria Dias / Carla Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 1.153.752,25
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Dezembro 2018
- **Estágio Previsto:** Em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 20/2016, assinado em 01/09/2016. Aguardando o pagamento do produto final.
- **Consultora Vencedora:** Bureau de Projetos e Consultoria Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.608.864,60.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
2.608.864,60	2.426.244,08	182.620,52	11/11	93%



# SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 57: Desenvolver Implementação da Coleta Seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 478.827,98
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 19/2017, assinado em 20/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** I&T Informações e Técnicas em Construção Civil Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.549.008,53.



# SEMACE

## Subprojetos SEMACE

Nº	Órgão	Subprojetos	Status
1	SEMACE	Elaboração do planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
2	SEMACE	Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE	Contrato Concluído Físico e Financeiro

# SEMACE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 58:* Elaboração do planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.

- **Responsável:** Elizabeth Romão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 298.978,64
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 01/2017, assinado em 10/01/2017.
- **Consultora Vencedora:** Tramitty Serviços LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 967.195,89



# SEMACE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 59: Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE.*

- **Responsável:** Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 273.507,90
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 20/2016, assinado em 13/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** MBS CONSULTING – MBS Estratégias e Sistemas Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 672.609,00.



# SEPLAG

# Subprojetos SEPLAG

Nº	Órgão	Subprojetos	Status
1	SEPLAG	Concepção de Metodologia de Planejamento de Investimentos.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
2	SEPLAG	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	SEPLAG	Empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
4	SEPLAG	Empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
5	SEPLAG	Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
6	SEPLAG	Desenvolvimento do projeto de Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
7	SEPLAG	Consultor Individual - Otimização das Rotas. (Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará). ROTEIRIZAÇÃO	Contrato Concluído Físico e Financeiro
8	SEPLAG	Contratação de Consultor Individual - Plano Estratégico de Gestão das Frotas. (Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará).	Contrato Concluído Físico e Financeiro

## SEPLAG - Assistência Técnica - Gestão Pública

*Subprojeto 60: Desenvolvimento de Metodologias para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Aduino Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 504.550,12
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2014 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 17/2015, assinado em 30/09/2015.
- **Consultora vencedora:** Consórcio Macroplan e Transplan.
- **Valor do Contrato:** 1.140.888,73.



## SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

*Subprojeto 61: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial.*

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.171.522,32
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Março 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 23/2015, assinado em 10/11/2015.
- **Consultora vencedora:** Macroplan Prospectiva, Estratégia e Gestão S/S Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ 2.667.519,34.

## SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

*Subprojeto 62: Empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Dominique Gomes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 366.027,15
- **Método de Aquisição:** SBQ
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Outubro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 29/2016, assinado em 04/10/2016.
- **Consultora vencedora:** Consórcio IADH x DELOS.
- **Valor do contrato:** R\$ 1.025.662,05.

## SEPLAG - Assistência Técnica - Gestão Pública

*Subprojeto 63: Empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Fábio Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 705.416,77
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Junho 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 25/2016, assinado em 16/09/2016.
- **Consultora vencedora:** Deloitte Touche Tohatsu Consultores Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ R\$ 2.245.000,00.

# SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

*Subprojeto 64:* Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Silvana Dourado
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 986.183,94
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Setembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 02/2017, assinado em 24/03/2017.
- **Consultora vencedora:** Elogroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda.
- **Valor do contrato + Aditivo:** R\$ 3.190.305,05.



## SEPLAG - Assistência Técnica – Fiduciário

*Subprojeto 65: Desenvolvimento do projeto de Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.*

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 238.726,47
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 32/2016, assinado em 23/11/2016.
- **Consultora vencedora:** NTConsult Tecnologia e Consultoria Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ 772.280,12.

## SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

*Subprojeto 66: Consultor Individual - Otimização das Rotas. (Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará). ROTEIRIZAÇÃO*

- **Responsável:** André Theophilo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 42.287,47
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2017 – Junho 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 32/2017, assinado em 16/11/2017.
- **Consultor vencedor:** Gustavo Sampaio de Castro.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 136.800,00.

## SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

*Subprojeto 67: Contratação de Consultor Individual - Plano Estratégico de Gestão das Frotas. (Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará).*

- **Responsável:** André Theophilo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 45.737,47
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2017 – Agosto 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído .
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 34/2017, assinado em 28/12/2017.
- **Consultor Vencedor:** Danilo Geraldo Ribeiro da Mota.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 151.584,00.



# SRH



## Subprojetos SRH

Nº	Órgão	Subprojetos	Status
1	SRH	Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga e Cobrança.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
2	SRH	Sistema de Informação de Gestão dos Recursos Hídricos (cadastro, fiscalização, outorga, monitoramento qualitativo, segurança de barragens e medição) com Integração com o Sistema Administrativo Financeiro PROTHEUS.	Contrato em Execução
3	SRH	Consultor Individual - Malha D'agua.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
4	SRH	Consultoria para avaliação socioambiental do projeto de apoio à melhoria da segurança hídrica e fortalecimento da inteligência na gestão pública do Estado do Ceará.	Contrato em Execução
5	SRH	Contratação de Consultoria pessoa física especializada para elaboração do Diagnóstico do Abastecimento de Água das Sedes Municipais e Distritos Contemplados pelo Projeto Malha D'água - Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central.	Contrato em Execução
6	SRH	Consultoria para a Avaliação das Condições de Segurança das Barragens Relacionadas ao Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará – PSHGP/CE.	Contrato em Execução

# SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 68: Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.*

- **Responsável:** Heloísa Mota e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 490.799,80
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 02/2016, assinado em 27/10/2016.
- **Consultora Vencedora:** IBI Engenharia Consultiva.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.396.292,47.

## SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 69: Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. **SIGERH***

- **Responsável:** Marcus Vinicius e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 403.809,40
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Dezembro 2018
- **Estágio Previsto:** Em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 03/2016, assinado em 23/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** Capgemini Consulting Technology Outsourcing.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.306.323,41.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
1.306.323,41	731.541,12	574.782,29	12/24	56,00%

# SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água


*Subprojeto 70: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - **Malha D'agua.***

- **Responsável:** Heloísa Mota e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do TOR:** US\$ 127.697,05
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 01/2016, assinado em 18/05/2016.
- **Consultora:** Dorian Ponte Lima
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 345,600,00.



# IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojeto 71: Consultoria para avaliação socioambiental do projeto de apoio à melhoria da segurança hídrica e fortalecimento da inteligência na gestão pública do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Karine Machado
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 75.363,21
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2018 – Janeiro 2019
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 01/2018, assinado em 04/07/2018.
- **Consultora Vencedora:** NCA Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente SS LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 243.000,00
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
243.000,00	12.190,00	231.610,00	01/04	5,00%

## IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojeto 72:* Consultoria pessoa física especializada para elaboração do Diagnóstico do Abastecimento de Água das Sedes Municipais e Distritos Contemplados pelo Projeto Malha D'água - Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central.

- **Responsável:** Karine Machado
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 54.343,12
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2018 – Janeiro 2019
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 02/2018, assinado em 17/09/2018.
- **Consultor Vencedor:** Dorian Ponte Lima
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 175.800,00
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

## IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojeto 73:* Consultoria para a Avaliação das Condições de Segurança das Barragens Relacionadas ao Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará – PSHGP/CE.

- **Responsável:** Karine Machado
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 18.274,11
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2018 – Dezembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 03/2018, assinado em 26/10/2018.
- **Consultor Vencedor:** Antônio Nunes de Miranda
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 75.600,00
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████



# COGERH



## Subprojetos COGERH

Nº	Órgão	Subprojetos	Status
1	COGERH	Fortalecimento do Manejo Estadual de Recursos Hídricos.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
2	COGERH	Empresa para Elaborar o Plano de Segurança Hídrica.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	COGERH	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acaraú e Salgado).	Contrato Concluído Físico e Financeiro

## COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 74: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Quali-quantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.*

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 709.785,44
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 48/2015, assinado em 24/11/2015.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Água e Solo / Quanta / Engeplus.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.954.015,55.

# COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 75: Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.*

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 848.780,06
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato 21/2016, assinado em 19/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Nippon Koei Latin America - Caribbean Co. Ltd. / Nippon Koei LAC do Brasil Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.403.327,11.

# COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 76: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas*

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor Subprojeto:** US\$ 27.326,28
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Outubro 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato 28/2015, assinado em 23/06/2015.
- **Consultora:** Rosana Garjulli Sales Costa.
- **Valor do Contrato + Patronal :** R\$ 61.790,40.





# STDS

## Subprojetos STDS

Nº	Órgão	Subprojetos	Status
1	STDS	Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias visando o Aprofundamento desse Referencial teórico operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
2	STDS	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	STDS	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

## STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 77: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.*

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 64.213,69
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Novembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 22/2015, assinado em 06/05/2015.
- **Consultora:** Maria Cílvia Queiroz.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 145.200,00.

## STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 78: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.*

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 63.174,42
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Setembro 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 17/2015, assinado em 07/04/2015.
- **Consultora Vencedora:** Empresa Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 142.850,00.



## STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 79: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará*

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 354.604,28
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico (NCB)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Março 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 058/2016, assinado em 25/05/2016.
- **Consultora Vencedora:** Maestria Comunicação e Eventos LTDA - EPP.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.019.022,00.



# TCE

## Subprojetos TCE

Nº	Órgão	Subprojetos	Status
1	TCE	Desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.	Contrato em Execução
2	TCE	Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	TCE	Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).	Contrato Concluído Físico e Financeiro
4	TCE	Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem Como, o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De Direito Financeiro.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
5	TCE	Consultoria individual especializada a fim de realizar um diagnóstico de governança no âmbito do tribunal de contas do estado do Ceará (TCE/CE).	Contrato em Execução

# TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

*Subprojeto 80: Desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.*

- **Responsável:** Delinda Almeida / Ricardo Araújo / Glinton Ferreira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 834.461,49
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/ Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Novembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 21/2016, assinado em 28/07/2016. Setorial elaborando o Aditivo de prazo.
- **Consultora Vencedora:** Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
- **Valor do Contrato:** 2.699.484,21.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
2.699.484,21	1.160.778,21	1.538.706,00	07/16	43,00%



# TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

*Subprojeto 81: Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 61.694,57
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 15/2015, assinado em 11/05/2015
- **Consultor:** Roberto Vilela Resende.
- **Valor do Contrato + Despesas Reembolsáveis:** R\$ 139.503,76.

## TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

*Subprojeto 82: Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).*

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 100.915,62
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Junho 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 12/2015, assinado em 16/03/2015.
- **Consultor:** Carlos Roberto Takao Yoshioka.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 228.190,40.

## TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

*Subprojeto 83: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos.*

- **Responsável:** Glinton Ferreira
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 30.225,66
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico (NCB)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2016 – Setembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 06/2017, assinado em 17/05/2017.
- **Consultora Vencedora:** DF Turismo e Eventos Ltda-ME.
- **Valor do Contrato:** R\$ 97.780,00.

## TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

*Subprojeto 84: Consultoria individual especializada a fim de realizar um diagnóstico de governança no âmbito do tribunal de contas do estado do Ceará (TCE/CE).*

- **Responsável:** Glinton Ferreira
- **Categoria de Licitação:** Consultor Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 112.087,05
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/ Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2018 – Janeiro 2019
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 01/2018, assinado em 03/08/2018.
- **Consultor:** Humberto Falcão Martins.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 362.601,60.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
362.601,60	41.504,22	321.097,38	01/05	11,45%





## 5. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

## Workshop PforR Ceará: Aprendizados e Novos Desafios

**Data: 26 a 30 de novembro de 2018**

**Horário: A partir de 8h**

**Local: Centro de Eventos do Ceará - Pavilhão Oeste - Mezanino 2 - Salas 01 e 02**

**<http://agenda.ipece.ce.gov.br/pforr/>**

WORKSHOP	DIA
1. PIONEIRISMO DO PforR CEARÁ: LIÇÕES APRENDIDAS PARA GESTÃO PARA RESULTADOS	26/11/2018
2. EXPERIÊNCIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE POLITICAS PÚBLICAS DE SUPERAÇÃO À POBREZA	27/11/2018
3. NOVOS DESAFIOS PARA AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE REGIONAL	28/11/2018
4. PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS PARA MELHORIA DA EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	29/11/2018
5. GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA	30/11/2018



## 6. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS: PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



# COGERH





# SEDUC

# APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

QTD.	Setoriais	Subprojeto	Contrato	Apresentação
1	SEPLAG	Desenvolvimento do projeto de Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	Contrato Nº 032/2016	-
2	SEPLAG	Consultoria especializada para desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de gestão de pessoas que impactam na Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará.	Contrato Nº 025/2016	-
3	SEPLAG	Consultoria Pessoa Física especializada para elaboração do novo plano de rotas para os ônibus de transporte dos servidores do Centro Administrativo Governador Virgílio Távora – Cambeba.	Contrato Nº 32/2017	-
4	SEPLAG	Consultoria pessoa física especializada para elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará.	Contrato Nº 34/2017	-
5	SEDUC	Elaborar as matrizes de referência e os itens para compor os testes da avaliação de desempenho dos estudantes do 3º ano de vinte cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais de educação profissional do Estado do Ceará.	Contrato Nº 154/2017	22/11/2018
6	SEDUC	Formação Continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.	Contrato Nº 079/2017	22/11/2018
8	COGERH	Plano de Segurança Hídrica das Bacias Hidrográficas Estratégicas do Acaraú, Metropolitanas e da sub-bacia do Salgado – Programa para Resultados (PforR)	Contrato Nº 21/2016	22/11/2018
9	SEDUC	Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará (02 Consultores).	Contratos Nº 83 e 84/2017	22/11/2018



## 7. APROVAÇÃO DA ATA

### 57ª REUNIÃO COMITÊ *PforR* (25/10/2018)

## Próxima Reunião do Comitê PforR

*Próxima Reunião do Comitê PforR:*

**20/12/2018**  
**14h30m – IPECE**





## 8. ENCERRAMENTO

Unidade de Gerenciamento do Projeto PforR (UGP)  
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)  
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora  
Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N  
Ed. SEPLAG, Térreo, Fortaleza-CE  
Tel.: (85) 3101.3502 e (85) 3101.3510
