



**6ª REUNIÃO DO COMITÊ *PforR***  
**ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO**  
**PROJETO *PforR***  
**24 DE JULHO DE 2014**



## PAUTA DA REUNIÃO

## Pauta da Reunião

1. Abertura e apresentação dos participantes;
2. Assuntos Relevantes informados pela UGP:
  - ✓ Plano de Ação e as Reuniões Setoriais;
3. Monitoramento dos Programas, Indicadores e Projetos de Assistência Técnica por Setorial - Posição em Junho 2014;
  - ✓ Sumário do cumprimento dos Indicadores;
  - ✓ Sumário da execução Orçamentária dos Programas;
  - ✓ Sumário da realização dos Projetos de Assistência Técnica;
4. Regimento Interno do Comitê PforR;
5. Encaminhamentos.



# 1. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES



## 2. ASSUNTOS RELEVANTES INFORMADOS PELA UGP



## Plano de Ação e Reuniões Setoriais

## Plano de Ação e Reuniões Setoriais

1. Reunião realizada no dia 18/07/2014 com o Especialista Alberto Costa para esclarecimentos sobre o Plano de Ação (PA) no Anexo 8 do PAD com 25 representantes da SEDUC, STDS, PGE, SRH, GABGOV, COGERH, CONPAM, SEMACE, CAGECE e IPECE.
2. Alberto incluiu coluna de Riscos no PA (entregue a todos) e validou que a entrega dos itens do PA:
  - ✓ (a), (b), (c) e (d) = até final do ano de 2014;
  - ✓ (e)=propor novo prazo, em função do atraso no Plano Segurança Hídrica;
  - ✓ (f) = até final de 2015;
3. Acordou-se realizar quatro reuniões, e envio das suas respectivas atas para a Coordenação do PforR submeter ao Banco, com objetivo de discutir e nivelar o conhecimento, planejar a execução de cada ação e garantir a entrega ao Banco Mundial nas datas previstas no PA:
  - ✓ Reunião no dia 23/07 às 9H30M na SEDUC sobre **Ação (a)** do PA, com presença da SEDUC, PGE e SEMACE, coordenado por Joízia (SEDUC);
  - ✓ Reunião no dia 28/07 à tarde na SEDUC sobre a **Ação (b)** do PA, com presença da STDS, SEDUC e GABGOV, coordenado por Sebastião (STDS);
  - ✓ Reunião no dia 29/07 às 9H na SEDUC sobre **Ação (c) e (d)** do PA, com presença Da SEDUC e GABGOV, coordenado por Andréa (SEDUC);
  - ✓ Reunião no dia 29/07 às 9h30m no CONPAM Ação **(e) e (f)** do PA, com presença do COMPAM, SEMACE, SRH, COGERH e CAGECE, coordenado por Tereza Farias.



**3. MONITORAMENTO DOS  
INDICADORES, PROGRAMAS E PROJETOS DE  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
POSIÇÃO EM 30 DE JUNHO 2014**



# Legendas

## Indicadores:



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

## Assistência Técnica:



Realização do projeto dentro do Plano de Licitações



Realização do projeto com atraso de um dia



Realização projeto com atraso de mais de 3 meses

## Programas:



Execução do previsto orçado no período, conforme critérios acordados com Setorial



Execução de menos do previsto orçado no período, conforme critérios acordados



Nenhuma Execução



## Sumário da Posição dos Indicadores

# METAS CUMPRIDAS: 1º Semestre 2014

| Tema                       | Nome do Indicador  | Setorial | Meta                           | Responsável                   | Status                          | Valor Desembolso US\$ |
|----------------------------|--|----------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Crescimento Econômico      | Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação | CEDE     | Comitê instituído pelo decreto | Marilda Rocha                 | Decreto publicado em 16/06/2014 | 4.462.500,00          |
| Sustentabilidade Ambiental | Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto   | CAGECE   | 83.8%                          | Carlos Rossas                 | 84,22%                          | 5.250.000,00          |
|                            | Índice de qualidade da fiscalização ambiental  | CONPAM   | 28%                            | Tereza Farias / Ulisses Rolim | 96,60%                          | 5.250.000,00          |
| <b>TOTAL</b>               |  |          |                                |                               |                                 | <b>14.962.500,00</b>  |

# METAS: 2º Semestre 2014 – INDICADOR PRIMÁRIO

| Tema                       | Nº | Nome do Indicador  | Setorial | Responsável                 | Meta  | Status  | Valor Desembolso US\$ Milhões |
|----------------------------|----|--|----------|-----------------------------|---|---|-------------------------------|
| Gestão Pública             | 1  | Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos                         | SEPLAG   | Avilton Júnior              | Aprovação de modelo para o alinhamento dos incentivos | TR revisado e enviado ao BM em 22/07/2014               | 6,198                         |
|                            | 2  | Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada   |          | Adauto Oliveira             | Aprovação da metodologia                              | TR sendo elaborado e Manifestação publicada em 16/07/14 | 6,198                         |
| Crescimento Econômico      | 3  | Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação | CEDE     | Marilda Rocha               | Documento de estratégia finalizado                    | Comitê Criado discutindo Documento da Estratégia        | 6,198                         |
| Sustentabilidade Ambiental | 4  | Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto   | CAGECE   | Carlos Rossas               | 84.3%   | 84,41%  | 6,198                         |
|                            | 5  | Índice de qualidade da fiscalização ambiental.   | CONPAM   | Tereza Farias Ulisses Rolim | 40%   | 96,60%  | 6,198                         |
| <b>TOTAL</b>               |    |  |          |                             |   |   | <b>30,99</b>                  |

## Valores 2º Semestre 2014 – INDICADOR SECUNDÁRIO

| Tema                       | Nº | Nome do Indicador   | Setorial      | Responsável             | Meta                            | Status   |
|----------------------------|----|---|---------------|-------------------------|---------------------------------|--|
| Crescimento Econômico      | 1  | Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico). | <b>IPECE</b>  | Victor Hugo             | 27,8                            | As informações da RAIS de 2013 ainda não foram disponibilizadas                                    |
| Redução da Pobreza         | 2  | Criação e funcionamento do multisetorial do Comitê Consultivo ECD (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE)                 | <b>SEPLAG</b> | Lara Costa              | Duas resoluções publicadas      | Uma resolução publicada em 03/04/2014  |
| Sustentabilidade Ambiental | 3  | Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza   | <b>COGERH</b> | Fábio Lima/Sarah Freire | 62.7                            | 67,81  |
|                            | 4  | Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas                                   |               | Adahil Sena             | Termos de referência elaborados | No aguardo da liberação do MAPP para ser dada continuidade ao processo licitatório.                |
|                            | 5  | Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.   |               | Adahil Sena             | Proposta e consultas completos  | A lei de proteção de bacias hidrográficas é decorrente da elaboração do Plano de Segurança Hídrica |



## Sumário da Posição dos Programas PforR

# Posição dos Programas

| Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Junho 2014 |                 |   |                        |       |               |               |                          |              |               |   |
|---|-----------------|---|------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|---|
| Setorial  | Programa        | Iniciativa  | Previsão (R\$ milhões) |       |               | Realizado     | Realizado / Previsto (%) | Farol        |               |   |
|   |                 |   | Projeto                | 2014  | jun/14        | 30/06/14      |                          |              |               |   |
| 1   | SEDUC           | 014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional               | 1                      | 00328 | 327,53        | 105,78        | 48,08                    | 43,24        | 90%           |   |
|   |                 |   | 2                      | 00771 | 156,87        | 25,30         | 10,55                    | 18,07        | 171%          |   |
|   |                 |   | 3                      | 00834 | 126,28        | 1,70          | 0,71                     | 4,81         | 677%          |   |
| 2   | STDS            | 050 - Assistência Social (*)  | 4                      | 03180 | 28,99         | 9,04          | 4,11                     | 2,80         | 68%           |   |
| 3   | COGERH          | 041 - Gestão dos Recursos Hídricos (**)                             | 5                      | 05310 | 19,60         | 0,00          | -                        | 0,00         | 0,00%         | - |
|   | COGERH          |   | 6                      | 05311 | 14,04         | 0,76          | 0,35                     | 0,00         | 0,00%         |   |
|   | SRH / COGERH    |   | 7                      | 05273 | 18,84         | 0,00          | -                        | 0,00         | 0,00%         | - |
| 4   | CIDADES/ CAGECE | 032 - Saneamento Ambiental (***)                                    | 8                      | 02617 | 53,71         | 33,79         | 15,36                    | 0,00         | 0,00%         |   |
| 5   | CONPAM          | 082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais (****) | 9                      | 03104 | 15,12         | 0,00          | -                        | 0,00         | 0,00%         | - |
|   | SEMACE          |   | 10                     | 04815 | 14,59         | 0,40          | 0,13                     | 0,00         | 0,00%         |   |
|   | SEMACE          |   | 11                     | 02466 | 13,89         | 0,40          | 0,13                     | 0,00         | 0,00%         |   |
|   | SEMACE          |   | 12                     | 05170 | 20,62         | 6,95          | 1,74                     | 0,00         | 0,00%         |   |
|   | SEMACE          |   | 13                     | 05155 | 13,39         | 0,15          | 0,04                     | 0,00         | 0,00%         |   |
| 6   | FUCEME          | 079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará.              | 14                     | 02846 | 15,93         | 1,10          | 0,46                     | 0,51         | 110,87%       |   |
|   | FUCEME          |   | 15                     | 02847 | 13,69         | 0,09          | 0,09                     | 0,00         | 0,00%         |   |
| <b>Total</b>  |                 |   | <b>15</b>              |       | <b>853,09</b> | <b>185,46</b> | <b>81,75</b>             | <b>69,43</b> | <b>84,92%</b> |   |

# Posição dos Programas

1. **IFR Semestral (01/01/14 a 30/06/14)** – sendo elaborado e será submetido a análise das setoriais no começo de agosto. Prazo de entrega ao BM= 30/08/14
2. **Lembrete:** Regras Programas

A execução dos programas deve observar as seguintes restrições:

- Devem excluir despesas que são financiadas pelo próprio BIRD ou por outras operações de crédito, ou seja, não é permitido a alocação de recursos do BIRD ou outras operações de crédito para custear despesas dos programas e iniciativas do componente
- Verificar a lista negra do BIRD a cada licitação, antes de assinar contrato. Para atender o Art. 42 da Lei 8.666/93 a SEPLAG incluiu no orçamento de cada ação um valor na fonte 69;
- Não podem apresentar impacto sócio ambiental negativo;
- Os valores dos contratos não podem exceder os limites abaixo:
  - Obras – inferior a US\$ 50 milhões
  - Bens – inferior a US\$ 30 milhões
  - Sistemas de TIC – inferior a US\$ 20 milhões
  - Consultorias – inferior a US\$ 15 milhões.

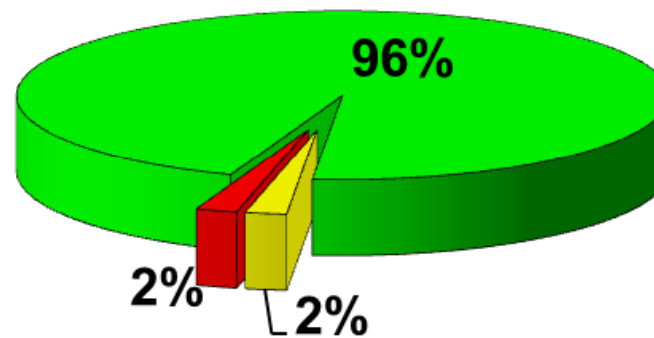







## Sumário da Posição dos Projetos Assistência Técnica

# Posição dos Projetos Assistência Técnica

## 49 PROJETOS NO PLANO DE LICITAÇÃO

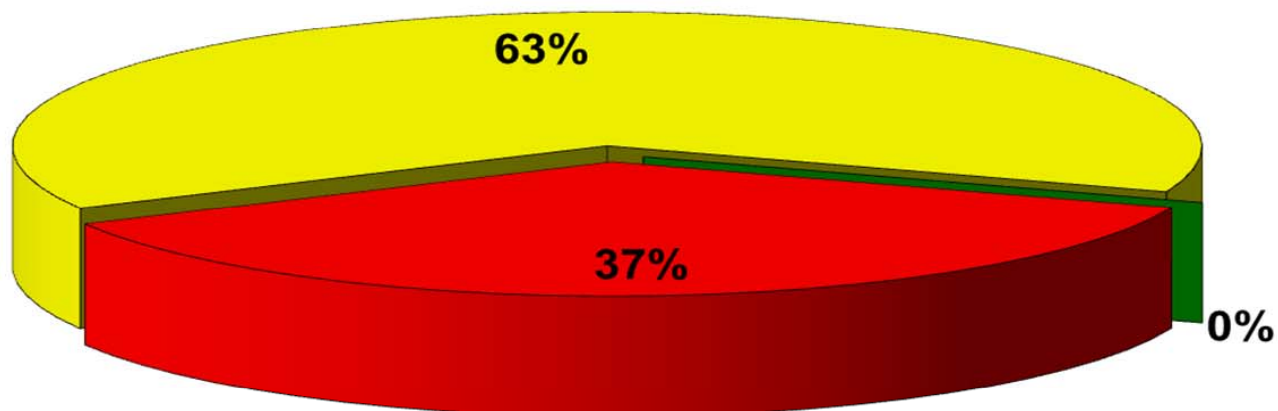


|            |   |
|------------|---|
| ■ Verde    | - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações |
| ■ Amarelo  | - Realização do projeto com atraso de um dia          |
| ■ Vermelho | - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses    |



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações</b> | <b>47 PROJETOS:</b><br>ARCE (1), CEDE (2), CGE (3,4,5,6,7), CONPAM (8,9,10,11,12,13), FUNCEME (14), IPECE (14,16,17,18,19,20), PGE (21), SECITECE (22,23,24,25,26), SEPLAG (27,28,30,31,32,33,34,35) SEDUC (36,37,38,39,40,41,42), SEMACE (43), , SESA (44), SRH (45,46), STDS (48), TCE (49) |
|  | <b>Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia</b>        | <b>1 PROJETO:</b><br>SRH (47)   |
|  | <b>Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses</b> | <b>1 PROJETO</b><br>SEPLAG (29)   |

# Posição dos Projetos Assistência Técnica

## 31 PROJETOS EM EXECUÇÃO

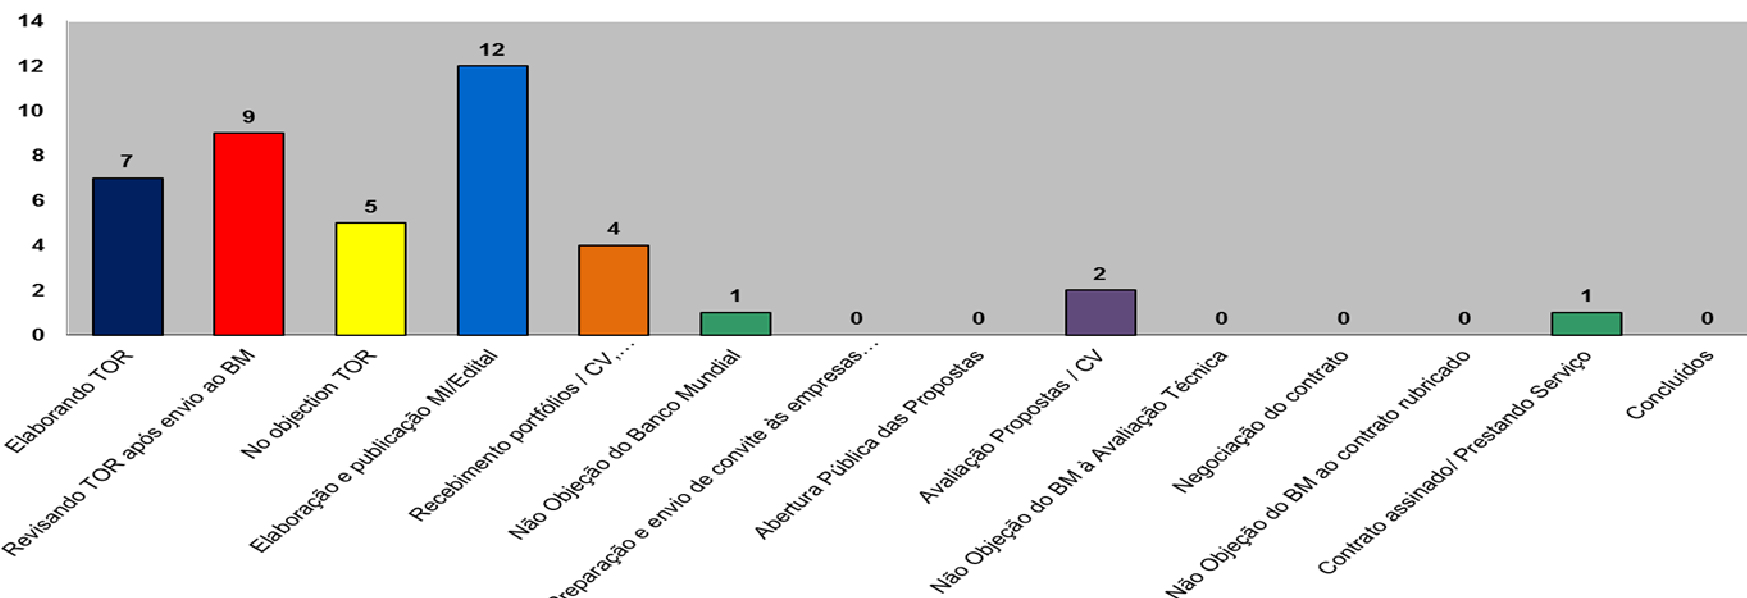


■ Não iniciado      ■ Em andamento      ■ Concluído

|  |   |
|--|---|
|  Não iniciado | <b>18 PROJETOS:</b><br>CEDE (2), CGE (4,5,6,7), IPECE (16,18,20), SECITECE (25), SEPLAG (27,28,32,33,34), SEDUC (37,38,39,40)   |
|  Em andamento | <b>31 PROJETOS:</b><br>ARCE (1), CGE(3), CONPAM(8,9,10,11,12,13), FUNCEME (14), IPECE (15,17,19), PGE (21), SECITECE (22,23,24,26), SEPLAG (29,30,31,35), SEDUC (36,41,42), SEMACE (43), SESA (44), SRH (45,46,47), STDS (48), TCE (49) |

# Posição dos Projetos Assistência Técnica

## Processo de Licitação em Andamento (31 PROJETOS = 41 TR)



| Etapas |   | Setoriais   |
|--------|---|---|
| 1      | Elaborando TR   | SECITECE (22,24), SEPLAG (35), SEDUC (41,42), SESA (44), SRH (47)                 |
| 2      | Revisando TR após envio ao BM                             | CONPAM (9,11), IPECE (19), PGE (21), SECITECE (23,26), SEDUC (36,41), SEMACE (43) |
| 3      | No objection TR   | CONPAM (13 - com 3 TdR), SEPLAG (31), SEMACE (43)                                 |
| 4      | Elaboração e publicação MI/Edital                         | CGE (1), CONPAM (1,3), SEPLAG (3), STDS (com 2 TdR), TCE (com 2 TdR)              |
| 5      | Recebimento portfólios / CV, Preparação Lista Curta e SDP | ARCE (1), CGE (3), CONPAM (8,10)  |
| 6      | Não Objeção do Banco Mundial (SDP)                        | SRH (45)  |
| 6      | Avaliação Propostas / CV                                  | SEDUC (42 - com 2TdR)   |
| 7      | Contrato assinado/ Prestando Serviço                      | IPECE (15)  |

## Cronograma de Reuniões – Visita dos Consultores

| PREVISÃO DE VISITAS |            | SETORIAL     | RESPONSÁVEIS  | SITUAÇÃO                        |
|---------------------|------------|--------------|---|---------------------------------|
| 1                   | 17/07/2014 | PGE          | Fernando Grangeiro e Valéria Rodrigues  | Realizada                       |
| 2                   | 18/07/2014 | ARCE         | Alexandre Caetano   | Realizada                       |
| 3                   | 18/07/2014 | SEPLAG       | Avilton Júnior, Adauto Oliveira, Dominique Gomes  | Realizada                       |
| 4                   | 21/07/2014 | CONPAM       | Ulisses Rolim e Tereza Farias   | Realizada                       |
| 5                   | 22/07/2014 | SECITECE     | Almir Bittencourt, Luiz Carlos Dolt, Lene Simone de Queiroz, Tarcísio Hilter, Edgar Monte | Realizada                       |
| 6                   | 23/07/2014 | STDS         | Sebastião Lopes, Eileen Holanda, Rosilene Ribeiro e Cristiano Ribeiro                     | Realizada                       |
| 7                   | 29/07/2014 | SEDUC        | Andréa Rocha e Lucidalva Bacelar  | a confirmar                     |
| 8                   | 30/07/2014 | SRH / COGERH | Paulo Miranda, Adahil Sena, João Lúcio de Oliveira  | a confirmar                     |
| 9                   | 31/07/2014 | SEMACE       | Maurício Gifonni  | a confirmar                     |
| 10                  | 01/08/2014 | CGE          | Paulo Roberto, Marcelo Monteiro, Carlos Eduardo, Denise Andrade e Marconi Lemos           | a confirmar                     |
| 11                  | 01/08/2014 | IPECE        | Mário Aragão, Jymmi Oliveira, Victor Hugo e Nicolino                                      | a confirmar                     |
| 12                  | 04/08/2014 | ADECE        | Claúdio Frota   | a confirmar                     |
| 13                  | 05/08/2014 | FUCEME       | Francisco Hoilton   | a confirmar                     |
| 14                  | 06/08/2014 | TCE          | Auriço Oliveira   | a confirmar                     |
| 15                  | 07/08/2014 | SESA         | Cícera Machado  | a confirmar : se for necessário |

## Cronograma de Reuniões – Contato dos Consultores

|  | Contato           | Telefone  | Celular   | Endereço eletrônico  |
|--|-------------------|-----------|-----------|--|
| 1.                                       | Giuseppe Nogueira | 3101 3504 | 8610 7542 | <a href="mailto:giuseppe.nogueira@ipece.ce.gov.br">giuseppe.nogueira@ipece.ce.gov.br</a> |
| <i>Especialista em Licitações Pleno</i>  |                   |           |           |  |
| 2.                                       | Viviane Ramos     | 3101 3504 | 9993 6727 | <a href="mailto:viviane.costa@ipece.ce.gov.br">viviane.costa@ipece.ce.gov.br</a>         |
| <i>Especialista em Licitações Júnior</i> |                   |           |           |  |



# DETALHAMENTO POR SETORIAL



# CEDE / ADECE






# INDICADOR PRIMÁRIO

## Indicadores – Capacitação Profissional

**Indicador Primário** - Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação

**Responsável** - Marilda dos Santos


- **Meta 2014:**  
1º semestre - Comitê instituído pelo decreto;  
2º semestre - Documento de estratégia finalizado
- **Posição em 30/06:** O Decreto foi publicado em 16/06/2014
- **Posição em 30/06 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** META 1º SEMESTRE CUMPRIDA



# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

# Assistência Técnica - Capacitação Profissional

## Projeto: *Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas*

- **Responsável:** Marilda Rocha, Francisco Soares e Fernando Barreto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 200.000,00
- **Valor do TOR:**
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Maio de 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Elaborando Manifestação de Interesse
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



# CIDADES



# PROGRAMAS

# Programas – Qualidade da Água

## Programa: 032 - SANEAMENTO AMBIENTAL

- Setoriais envolvidas: Cidades/CAGECE
- PPA Iniciativa: 02617 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário – CAGECE
- Ação: 19849 - Estruturação de Esgotamento Sanitário em Localidades Urbanas
- Total Previsto para 2014 - 2017: R\$ 15,82 (\*)
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 5,65(\*)
- Periodicidade da execução: Os processos licitatórios para contratação dos serviços ainda estão em andamento. Provavelmente a execução terá início no final do ano.
- Realizado até 30/06/14: R\$ 0,00
- Farol:

(\*) valor sendo reconsiderado após a Missão do BM de 02 de Junho de 2014



# CAGECE





# INDICADOR PRIMÁRIO

## Indicadores – Qualidade da Água

**Indicador Primário** - Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.

**Responsável** - Carlos Rossas

- **Meta 2014:**

1º semestre - 83.8%

2º semestre - 84.3%

- **Posição em 30/06:** 84,41%

- **Posição em 30/06 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Existe a possibilidade do cumprimento da meta

- **Justificativa:** Existe a possibilidade do cumprimento da meta



# CGE




# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

# Assistência Técnica - Gestão Transversal - Auditoria

## Projeto 1: Auditoria Técnica dos Indicadores

Termo: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 400.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 368.279,25
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Abril 2014 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Avaliação Curricular pelo Comitê
- **Estágio Atual:** Documentação (MIs apresentadas) em análise na CEL 04 -  
22/07/2014
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

### Projeto 2: *Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos*

- **Responsável:** Marcelo Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 625.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Julho 2014 – Março 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 


## Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

### Projeto 3: *Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social*

- **Responsável:** Carlos Eduardo G. Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 600.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Junho 2014 – Março 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## Assistência Técnica - Sistema Fiduciário


### Projeto 4: *Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção*

- **Responsável:** Denise Andrade Araújo
- **Categoria de Licitação:** Serviço de Não Consultoria
- **Valor:** US\$ 300.000,00
- **Método de Aquisição:** NCB
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Fevereiro 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



## Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

### **Projeto 5: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.**

- **Responsável:** Marconi Lemos
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Março 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



# CONPAM



# INDICADOR PRIMÁRIO

## Indicadores – Qualidade da Água

**Indicador Primário** - Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.

**Responsável** - Tereza Farias e Ulisses Rolim

- **Envolvidos:** SRH, COGERH e SEMACE

- **Meta 2014:**

1º semestre - 28%

2º semestre - 40%

- **Posição em 30/06:** 96,60%

- **Posição em 30/06 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta




# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

# Assistência Técnica - Qualidade da Água

## **Projeto 1: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.**

Termo I: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto “AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.”

- **Responsável:** Tereza Farias e Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 450.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 416.854,24
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Portfólios em análise na setorial desde 09/07/14
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

# Assistência Técnica - Qualidade da Água

## Projeto 2: Capacitação para o pessoal técnico municipal.

Termo I: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para A Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas

- **Responsável:** Tereza Farias e Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 720.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 719.989,07
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Enviado à Setorial para alterações sugeridas pelo BM em 10/06/2014
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Qualidade da Água

### **Projeto 3: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.**

Termo I: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.


- **Responsável:** Tereza Farias e Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 540.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 225.006,01
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Portfólios em análise na setorial desde 18/07/14
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



## Assistência Técnica - Qualidade da Água

### **Projeto 4: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.**


Termo I - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Tereza Farias e Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 224.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 221.437,94
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Enviado à Setorial para alterações sugeridas pelo BM em 13/06/2014
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Qualidade da Água

### Projeto 5: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.

Termo I: Contratação de Serviços de Consultoria especializada que irá desenvolver projeto elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de Serviços Ambientais no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Tereza Farias e Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.345.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 1.344.963,40
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** NO enviada à Setorial no dia 25/06/14.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Qualidade da Água

### Projeto 6: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.


Termo I: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Tereza Farias e Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Serviço de Não Consultoria
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 2.242.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 1.120.935,31
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Enviado ao Banco para Não Objeção em 26/02/2014
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## Assistência Técnica - Qualidade da Água

### Projeto 6: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

Termo II: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver plano de comunicação para implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Tereza Farias e Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 2.242.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 339.011,15
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Outubro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Enviado ao Banco para Não Objeção em 18/03/2014
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Qualidade da Água

### Projeto 6: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

Termo III: Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas (Equipamentos)


- **Responsável:** Tereza Farias e Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Serviço de Não Consultoria
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 2.242.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 459.318,18
- **Método de Aquisição:** NCB
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Janeiro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Enviado ao Banco para Não Objeção em 29/04/2014
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



# PROGRAMAS

## Programas – Qualidade da Água

### Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- Setoriais envolvidas: CONPAM
- PPA Iniciativa: 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.
- Ação: 14190 - Elaboração dos Planos de Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,12
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 00,00
- Realizado até 30/06/14: R\$ 00,00
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: 



# SEMACE





# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

# Assistência Técnica - Qualidade da Água

## Projeto 1: *Fortalecimento da gestão ambiental estadual*

Termo I: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.

- **Responsável:** Maurício Giffoni
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.054.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 285.232,19
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Maio 2014 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TR enviado para NO do BM em 09/06/14
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

# Assistência Técnica - Qualidade da Água

## Projeto 1: *Fortalecimento da gestão ambiental estadual*

Termo II: Contratação de Consultoria especializada que irá ministrar Cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente

- **Responsável:** Maurício Giffoni
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.054.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Fevereiro 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Aguardando Termo da setorial após revisão do Banco Mundial
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



# PROGRAMAS


## Programas – Qualidade da Água

### Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- Setoriais envolvidas: SEMACE
- PPA Iniciativa: 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.
- Ação I: 19861 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 14,59
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 0,40
- Realizado até 30/06/14: R\$ 00,00
- Realizado/Previsto (%): 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol:

## Programas – Qualidade da Água

### Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- Setoriais envolvidas: SEMACE
- PPA Iniciativa: 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.
- Ação I: 21570 - Monitoramento da Poluição / Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 13,89
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 0,40
- Realizado até 30/06/14: R\$ 00,00
- Realizado/Previsto (%): 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: 

## Programas – Qualidade da Água

### Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- Setoriais envolvidas: SEMACE
- PPA Iniciativa: 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.
- Ação I: 21317 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 20,62
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 6,95
- Realizado até 30/06/14: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto (%): 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol:

## Programas – Qualidade da Água

### Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- Setoriais envolvidas: SEMACE
- PPA Iniciativa: 05155 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação das praias do litoral cearense.
- Ação I: 21571 - Monitoramento da Poluição / Contaminação das Praias do Litoral Cearense
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 13,39
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 0,15
- Realizado até 30/06/14: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto (%): 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol:





# PGE



# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

### **Projeto 1: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.**

Termo I: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Valéria Rodrigues
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 525.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 524.818,44
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Abril 2014 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Aguardando a validação do TOR pela Coordenação para envio ao IPECE.



# ARCE



# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## Assistência Técnica - Qualidade da Água

### **Projeto 1: *Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.***

Termo I: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.

- **Responsável:** Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 400.000,00
- **Valor TOR:** US\$ 398.839,82
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Março 2014 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Preparação da Lista Curta
- **Estágio Atual:** Relatório de Lista Curta concluído e Minuta de SDP enviada à UGP para análise em 22/07/2014.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



# SECITECE



# ASSISTÊNCIA TÉCNICA



## Assistência Técnica – Capacitação Profissional

**Projeto 1: Definir e estabelecer um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas de apoio à inovação.**


Termo I: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para Estabelecer um Sistema de Monitoramento e Avaliação para Coletar dados e Informações Relacionadas com Programas e Iniciativas de Apoio a Inovação.

- **Responsável:** Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 450.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 353.140,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Maio 2014 – Outubro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Aguardando contratação de Consultoria Individual para auxiliar conclusão do TOR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## Assistência Técnica – Capacitação Profissional

### **Projeto 2: Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.**


Termo I: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto :** US\$ 200.000,00
- **Valor TOR:** US\$ 212.900,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Abril 2014 – Outubro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo.
- **Estágio Atual:** Aguardando contratação de Consultoria Individual para auxiliar conclusão do TOR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica – Capacitação Profissional


**Projeto 3: Avaliação do desempenho e impacto de REDENIT-CE no que diz respeito à sua missão de gestão da inovação e propriedade intelectual e apoiar a transferência de tecnologias para o mercado.**

Termo I: Termo de Referência para Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para Avaliação de Desempenho e Impacto da REDENIT no que diz respeito à sua Missão de Gestão da Inovação e Propriedade Intelectual e Apoio à Transferência de Tecnologias para o Mercado.

- **Responsável:** Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 225.000,00
- **Valor do Termo:** US\$ 246.340,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Maio 2014 – Outubro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Aguardando contratação de Consultoria Individual para auxiliar conclusão do TOR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica – Capacitação Profissional

**Projeto 4: *Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.***

- **Responsável:** Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 75.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Julho 2014 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica – Capacitação Profissional

### **Projeto 5: Assistência na elaboração de uma avaliação de impacto para o projeto Tecnova (FINEP / SECITECE).**

Termo I: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para assistência na elaboração de uma Avaliação de Impacto para o Projeto Tecnova (FINEP/SECITECE).

- **Responsável:** Edgar Monte Mariano Neto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 50.000,00
- **Valor do Processo:** US\$ 36.440,00
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Abril 2014 – Abril 2017
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Aguardando contratação de Consultoria Individual para auxiliar conclusão do TOR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



# FUNCEME



# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

# Assistência Técnica - Qualidade da Água

## Projeto 1: *Metodologia de modelagem de qualidade da água.*

Termo I: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.

- **Responsável:** Francisco Hoilton
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 630.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 591.313,55
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Julho 2014 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** MI publicada pela Cel 04 e UNDB em 15/07, data limite para recebimento até 04/08.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 






# PROGRAMAS


## Programas – Qualidade da Água

### Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ

- Setoriais envolvidas: FUNCEME
- PPA Iniciativa: 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.
- Ação 1: 13973 - Modernização e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.
- Ação 2: 21421 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de Informações Hidroagrometeorológicas.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,93
- Previsto para o Ano de 2014 em milhões: R\$ 1,10
- Realizado até 30/06/14 em milhões: R\$ 0,51
- Realizado/Previsto (%): 110,87%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: 

## Programas – Qualidade da Água

### Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ

- Setoriais envolvidas: FUNCEME
- PPA Iniciativa: 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará. (2)
- Ação 1: 14037 - Mapeamento Hidroambiental do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 13,69
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 1,10
- Realizado até 30/06/14: R\$ 00,00
- Realizado/Previsto (%) abril: 0%
- Periodicidade: Frequência da execução Anual (previsão de execução de 100% do valor nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.
- Farol: 



# SEDUC




# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## Assistência Técnica - Capacitação Profissional


**Projeto 1: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.**

Termo I: Termo de Referencia para contratação de serviços de Consultoria para Avaliação do Desempenho Acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Andréa Rocha
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 250.000,00
- **Valor do TOR:** U\$ 249.984,27
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Maio 2014 – Fevereiro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Em razão da alteração no termo para atender os 53 cursos técnicos, ao invés de considerar somente as áreas selecionadas pelo banco. Elaboração o da memória de calculo com previsão de conclusão para inicio de agosto.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 


## Assistência Técnica - Capacitação Profissional

**Projeto 2: Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos. Áreas a serem avaliadas, entre outras: gestão administrativa, gestão de recursos humanos, desenho de currículo, serviços de apoio aos estudantes.**

- **Responsável:** Andréa Rocha
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Julho 2014 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Capacitação Profissional


**Projeto 3: Avaliação de Marco institucional e estrutura de governança do sistema de escolas secundárias estaduais de educação profissional, com recomendações de melhoramento, ajuste ou mudanças necessárias.**

- **Responsável:** Andréa Rocha
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 100.000,00
- **Método de Aquisição:** SOF/SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Abril 2014
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 




## Assistência Técnica - Capacitação Profissional

**Projeto 4: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.**

- **Responsável:** Andréa Rocha
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 100.000,00
- **Método de Aquisição:** SOF/SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Janeiro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaborando o Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Capacitação Profissional


**Projeto 5: Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.**

- **Responsável:** Andréa Rocha e Francisco Soares
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 75.000,00
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Julho 2014 – Março 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Redução da Pobreza

### Projeto 6: *Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.*


Termo I - Contratação de Consultoria de Empresa para o Desenvolvimento das Ações de Formação para o núcleo gestor das creches e pré-escolas dos municípios e regionais de Fortaleza participantes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN – CURSO DE GESTÃO PARA DIRETORES.

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 500.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** TR encontra-se na Setorial após revisão da UGP
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Redução da Pobreza

### Projeto 6: *Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.*

Termo II - Contratação de Consultoria e Assessoria de Empresa de Treinamento para o Desenvolvimento das Ações de Formação ofertadas aos Diretores e Coordenadores Pedagógicos de Creches e Pré-Escolas dos Municípios e Regionais de Fortaleza através do Fortalecimento Institucional da Educação Infantil. – CURSO COACHING.

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 500.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Maio 2014 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** TR encontra-se na Setorial após revisão da UGP
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Redução da Pobreza

### **Projeto 7: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

Termo I: Contratação de Consultor Individual Especialista em **Avaliação de Programas para Identificar o Impacto** do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do Projeto:** US\$ 14.932,38
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Janeiro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Encaminhando pela SEDUC o Relatório de Avaliação Curricular para CEL 04 em 18/07/14 para análise.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Redução da Pobreza

### **Projeto 7: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

Termo II: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 36.810,29
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Fevereiro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Encaminhado pela SEDUC o Relatório de Avaliação Curricular encaminhado à CEL 04 em 11/07/14 para análise.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Redução da Pobreza

### **Projeto 7: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

Termo III: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 25.719,15
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Fevereiro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Republicação do aviso de solicitação da MI com recebimento dos Portfólios até as 16:00 do dia 02/08/14
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## Assistência Técnica - Redução da Pobreza

### **Projeto 7: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

Termo IV: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em **Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil** e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN


- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 547.920,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Fevereiro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** O Processos encontra-se na Setorial para ajustes sugeridos pela PGE.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



## Assistência Técnica - Redução da Pobreza

### **Projeto 7: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

Termo V: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN


- **Responsável:** Lucidalva Bacelar
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 78.198,09
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Aguardando retorno da setorial sobre a modalidade da licitação desde 30/05/14.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



# PROGRAMAS


## Programas – Capacitação Profissional

### Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

- Setoriais envolvidas: SEDUC
- PPA Iniciativa: 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional (1)
- Ação I: 28685 - Manutenção e Funcionamento das Unidades Escolares de Educação Profissional
- Ação II: 28686 - Garantia do funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 327,53
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 105,78
- Realizado até 30/06/14: R\$ 43,24
- Realizado/Previsto (%) Maio: 90 %
- Periodicidade: Execução iniciando em Março 2014 - Frequência Bimestral;
- Farol: 


## Programas – Capacitação Profissional

### Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

- Setoriais envolvidas: SEDUC
- PPA Iniciativa: 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação I: 19475 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação II: 19482 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 156,87
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 25,30
- Realizado até 30/06/14: R\$ 18,07
- Realizado/Previsto (%) Maio: 171%
- Periodicidade: Execução iniciando em Março 2014 - Frequência Bimestral;
- Farol: 

# Programas – Capacitação Profissional

## Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

- Setoriais envolvidas: SEDUC
- PPA Iniciativa: 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio.
- Ação I: 19483 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,12
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 1,70
- Realizado até 30/06/14: R\$ 4,81
- Realizado/Previsto (%) Maio: 677%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral
- Farol: 



# SEPLAG



# INDICADORES PRIMÁRIOS

## Indicadores – Gestão por Resultado

**Indicador Primário - *Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.***

**Responsável – Avilton Júnior**

- **Meta 2014:**
- 2º semestre - Aprovação de modelo para o alinhamento dos incentivos
- **Posição em 30/06:** Termo de Referência enviado para NO do BM em 21/07/14
- **Posição em 30/06 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade intermediária de atingir a meta
- **Justificativa:** o indicador Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos, depende de contratação de consultoria cujo TR está no BM para NO. Conforme informação da Seplag esse indicador será cumprido provavelmente no 1º semestre de 2015.



## Indicadores – Gestão por Resultado

**Indicador Primário - *Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparados com metodologia aprovada.***

**Responsável -** Aduino Oliveira

- **Meta 2014:**

2º semestre - Aprovação da metodologia

- **Posição em 30/06:** - Publicação da MI em 16/07/14 com data final para 05/08/14
- **Posição em 30/06 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade intermediária de atingir a meta
- **Justificativa:** A meta "Aprovação da metodologia" prevista para o 2o. semestre de 2014 para o indicador "Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada" deverá ser cumprida apenas no 1o. semestre 2015. Essa alteração decorre no novo cronograma elaborado para o cumprimento de todas as etapas do processo licitatório e execução do trabalho pela consultoria.



# INDICADOR SECUNDÁRIO


## Indicadores – Assistência à Família

### Indicador Secundário - *Criação e funcionamento do multisetorial do Comitê Consultivo ECD (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE)*

Responsável - Lara Costa

- **Meta 2014:**

2º semestre - Duas resoluções publicadas

- **Posição em 30/06:** A 1º Resolução foi publicada e o Plano está em fase de elaboração para a conclusão da 2ª Resolução
- **Posição em 30/06 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

**Justificativa:** O Comitê do Desenvolvimento Infantil reuniu-se extraordinariamente no dia 18/06 para dar seguimento à consolidação do Plano de Ação do CPDI. A reunião técnica de retorno que estava agendada para o dia 15/07 foi adiada para o dia 23/07, quando prevemos concluir esse trabalho para posteriormente apresentarmos na próxima reunião ordinária do CPDI, com a presença de demais parceiros do Comitê, do que deve resultar a 2º Resolução.




# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## Assistência Técnica - Gestão por Resultado

### **Projeto 1: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento .**


Termo I: Desenvolvimento de Metodologia para previsão de receitas tributárias e Outras Receitas Correntes.

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Junho 2014 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Termo de Referência em elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Gestão por Resultado

### Projeto 1: *Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.*


*Termo II: Metodologias para a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará.*

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima/ Nicolino Trompieri (IPECE)
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 300.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Março 2016
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Termo de Referência em elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Gestão por Resultado


### Projeto 1: *Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.*

*Termo III: Desenvolvimento de Metodologia para elaboração e execução do Orçamento Estadual*

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 300.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Junho 2015 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Termo de Referência em elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Gestão por Resultado

### Projeto 2: *Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.*

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto :** US\$ 800.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



## Assistência Técnica - Gestão por Resultado


### **Projeto 3: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.**

- **Responsável:** Fábio Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 4.400.000,00
- **Valor:** US\$ 3.590.613.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 540.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Conforme informação da COGEP o projeto teve alteração no escopo e a MC está sendo elaborada.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

## Assistência Técnica - Gestão por Resultado

### **Projeto 4: *Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.***


Termo I: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Adauto Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.300.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 500.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Junho 2014 – Julho 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** MI publicada em 16/07/14 com prazo até 05/08/14
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Gestão por Resultado

### Projeto 4: *Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.*


Termo II: Implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

- **Responsável:** Adauto Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.300.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 500.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Junho 2015 – Abril 2016
- **Estágio Previsto:** Elaborando Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaborando Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Gestão por Resultado

### Projeto 4: *Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.*


Termo III: Capacitação e viagens técnicas para a equipe da SEPLAG

- **Responsável:** Adauto Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.300.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 300.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Julho 2014 – Janeiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaborando Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaborando Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Gestão por Resultado

**Projeto 5: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.**


Termo I: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 1.460.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Julho 2014 – Janeiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TOR aguardando NO desde 22/07/14
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Gestão por Resultado


### **Projeto 5: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersectorial.**

Termo II: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial (2a. Etapa)

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 540.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Novembro 2016 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaborando o Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Gestão por Resultado

### **Projeto 6: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.**

- **Responsável:** Dominique Gomes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.800.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Julho 2014 – Julho 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica – Capacitação Profissional


**Projeto 7: Avaliação da Estrutura de Governança para os programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo.**

- **Responsável:** à definir
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Julho 2014 – Março 2015
- **Estágio Previsto:** Elaborando Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Termo de Referência e Memória de Cálculo em elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



## Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

### Projeto 8: *Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).*

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.000.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Julho 2014 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Elaboração do Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

### Projeto 9: *Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.*

Termo: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Julho 2014 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** TOR encontra-se na setorial para ajustes na MC conforme orientação da UGP desde 22/07/14.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



# IPECE



# INDICADOR SECUNDÁRIO


## Indicadores – Capacitação Profissional

**Indicador Secundário - *Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).***

**Responsável - Victor Hugo**

- **Meta 2014:**

2º semestre - 27,8

- **Posição em 30/06:** O indicador permanece inalterado de acordo com os dados disponibilizados pela RAIS. Ou seja, o último dado continua sendo 2012.
- **Posição em 30/06 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta
- **Justificativa:** A RAIS informou que o número de trabalhadores de nível técnico formalmente empregados no mercado de trabalho cearense é de 24.992 em 2012. A estatística para o ano de 2013 ainda não foi disponibilizada.




# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP


### **Projeto 1: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.**

Termo I: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 500.000,00
- **Valor do Projeto:** US\$ 296.225,77
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Abril 2014 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Não objeção ao Relatório Final
- **Estágio Atual:** Processo Licitatório finalizado. Serviços sendo prestados na setorial
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

### **Projeto 2: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Sistema Informatizado de Monitoramento.**

- **Responsável:** Mário Aragão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 500.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Fevereiro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaborando o Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



## Assistência Técnica – Capacitação Profissional


### **Projeto 3: Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.**

Termo I: Contratação de Serviço Técnico de Consultoria de Empresa Especializada para a definição e estabelecimento de um Sistema de Inserção e Monitoramento de Egressos da Educação Profissional no Mercado de Trabalho.

- **Responsável:** Victor Hugo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 700.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 692.436,15
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Julho 2014 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Processo Licitatório em andamento na setorial.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

# Assistência Técnica – Capacitação Profissional

## Projeto 4: *Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.*

- **Responsável:** Victor Hugo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 300.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Novembro 2014 – Junho 2015
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaborando o Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica – Capacitação Profissional

**Projeto 5: *Elaborar mapeamento dos programas e entidades envolvidas na educação profissional, capacitação e treinamento técnico e tecnológico, para identificar complementaridades e áreas de possível sobreposição de esforços.***


Termo I: Termo de Referência para contratação de Serviço Técnico de consultoria de Empresa Especializada para a Elaboração de um Diagnóstico e estabelecimento de Diretrizes para a Política de Educação Profissional no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Victor Hugo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 75.000,00
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Fevereiro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração de Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Em discussão com as Setoriais envolvidas e o Banco Mundial

**Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica – Redução da Pobreza

### Projeto 6: *Criação do Sistema de Monitoramento e Avaliação (M&A) dos projetos financiados pelo FECOP.*

- **Responsável:** Jimmy Oliveira e Mário Aragão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 800.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Dezembro 2014
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** A parte técnica do TR está feita, faltando apenas a concepção do Sistema.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



# SESA



# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## Assistência Técnica – Redução da Pobreza

### **Projeto 1: *Qualificação da análise de situação de saúde para a tomada de decisão visando a redução das desigualdades sociais.***

Termo I: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada para realizar estudos Epidemiológicos e capacitar equipes técnicas da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará e Secretarias Municipais de Saúde visando a qualificação das Equipes de Vigilância para melhor utilização das informações em saúde na redução das desigualdades sociais.

- **Responsável:** Cícera Borges Machado
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 1.000.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 982.360,34
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Julho 2014 – Agosto 2017
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** Oficializado (Ofício 2562/2014) em 21/07/14 impossibilidade de prosseguir com o Projeto
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



# SRH





# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## Assistência Técnica - Qualidade da Água

### **Projeto 1: *Recomendações para melhorar o quadro institucional para a gestão da água.***

Termo I: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica para Solução Integrada de Reestruturação Organizacional e Mapeamento de Perfil de Competências para a Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH

- **Responsável:** Paulo Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 370.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 216.403,50
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Julho 2015
- **Estágio Previsto:** Não Objeção da SDP do Banco Mundial
- **Estágio Atual:** A SDP foi enviada para Não Objeção em 02/07/2014, entretanto foi oficializada em 17/07/14 através de ofício para a PGE a solicitação de suspensão do Projeto.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Qualidade da Água

### **Projeto 2: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos.**

Termo I: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Qualiquantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

- **Responsável:** João Lúcio de Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 670.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 670.722,51
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Abril 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** NO do BM enviada à Setorial no dia 03/07/14
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Qualidade da Água

### **Projeto 3: *Enquadramento dos açudes das bacias estratégicas.***

Termo I: Termos de Referência para Contratação de Consultoria para a Execução do “Projeto de Desenvolvimento e Implantação do Enquadramento dos Açudes Pacoti, Riachão e Gavião”.

- **Responsável:** Adahil Sena
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 670.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Abril 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** TOR encontra-se na setorial para incorporação de sugestões da UGP desde 14/02/14.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**



# PROGRAMAS

# Programas – Qualidade da Água

## Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

- Setoriais envolvidas: SRH
- PPA Iniciativa: 05311 - Implantação do Plano de Segurança Hídrica para as Bacias Hidrográficas Metropolitanas.
- Ação I: 15777 - Elaboração de Estudos para enquadramento dos Açudes das Bacias Estratégicas
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 14,04
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 0,76
- Realizado até 30/06/14: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto (%): 0,00%
- Periodicidade: Execução iniciando em Março 2014 - Frequência mensal
- Farol:

# Programas – Qualidade da Água

## Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

- Setoriais envolvidas: SRH
- PPA Iniciativa: 05310 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.
- Ação I: 15690 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 19,60
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ -
- Realizado até 30/06/14: R\$ -
- Realizado/Previsto (%): -
- Periodicidade: -
- Farol: -

# Programas – Qualidade da Água

## Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

- Setoriais envolvidas: SRH
- PPA Iniciativa: 05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.
- Ação I: 14926 - Aquisição, Instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade)
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 18,84
- Previsto para o Ano de 2014: R\$ 00,00
- Realizado até 30/06/14: R\$ -
- Realizado/Previsto (%): -
- Periodicidade: -
- Farol:





# COGERH



# INDICADORES SECUNDÁRIOS

## Indicadores – Qualidade da Água

**Indicador Secundário - *Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.***

**Responsável - Adahil Sena**

- **Meta 2014:**

2º semestre - Termos de referência elaborados

- **Posição em 31/06:** Elaboração dos Termos

- **Posição em 31/06 em relação à meta:**

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade intermediária de atingir a meta

- **Justificativa:** No aguardo da liberação do MAPP para ser dada continuidade ao processo licitatório.

## Indicadores – Qualidade da Água

**Indicador Secundário - *Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.***

**Responsável - Adahil Sena**

- **Meta 2014:**

2º semestre - Proposta e consultas completos

- **Posição em 30/06:** Em elaboração

- **Posição em 30/06 em relação à meta:**

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade intermediária de atingir a meta

- **Justificativa:** A lei de proteção de bacias hidrográficas é decorrente da elaboração do Plano de Segurança Hídrica.

## Indicadores – Qualidade da Água

### Indicador Secundário - *Qualidade da água bruta, na Região Metropolitana de Fortaleza.*

Responsável - Fabio Lima

- Envolvidos: SRH

- Meta 2014:

2º semestre - 62.7

- Posição em 30/06: 67,81

- Posição em 30/06 em relação à meta: 

- Perspectiva de Cumprimento: Probabilidade alta de atingir a meta

- Justificativa: Esse resultado corresponde à medição do mês de fevereiro.



# STDS



# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

# Assistência Técnica - Redução da Pobreza

## Projeto 1: *Monitoramento e capacitação dos CRAS.*

*Termo 1:* Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 900.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 174.600,00
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Maio 2014 – Abril 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** A PGE irá encaminhar processo à setorial para substituição da modalidade Pregão para modalidade Shopping.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



# Assistência Técnica - Redução da Pobreza

## Projeto 1: *Monitoramento e capacitação dos CRAS.*

Termo II: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 900.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 117.055,35
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Maio 2014 – Abril 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** O processo encontra-se na PGE em análise na CEL 04 desde 10/07/14.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



# PROGRAMAS

## Programas – Redução da Pobreza

**Programa:** 050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Setoriais envolvidas:** STDS/SDA

**PPA Iniciativa:** 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS. (1)

**Ação I:** 14330 - Cofinanciamento dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF

**Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 28,99

**Previsto para o Ano de 2014 em milhões:** R\$ 9,04

**Realizado até 31/06/14 em milhões:** R\$ 2,80

**Realizado/Previsto (%):** 68%

**Periodicidade:** Frequência da execução mensal, com a execução iniciando em Abril.

**Farol:** 



# TCE




# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

### Projeto 1: *Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)*

Termo I: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 1.000.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 149.096,50
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Maio 2014 – Fevereiro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** MI publicada em 21/07/14
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

### Projeto 1: *Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)*


Termo II: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 1.000.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 149.096,50
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Maio 2014 – Fevereiro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Processo
- **Estágio Atual:** MI publicada em 21/07/14
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

### Projeto 1: *Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)*

Termo III: TOR - Reformulação do Processo eletrônico do TCE

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.000.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Elaborando Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaborando Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 





## 4. REVISÃO PARA APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO COMITÊ *PforR*

# Revisão para Aprovação Regimento Interno Comitê PforR

1. Sugestões da última reunião incorporadas na minuta, conforme cópia entregue;
2. Minuta revisada enviada Setoriais = nenhum recebimento proposta de melhoria;
3. Leitura da Minuta por todos e Votação – um voto por setorial:

1. ADECE
2. ARCE
3. CAGECE
4. CEDE
5. CGE
6. CIDADES
7. COGERH
8. CONPAM
9. FUNCEME
10. IPECE
11. PGE

12. SECITECE
13. SEDUC
14. SEMACE
15. SEPLAG
16. SESA
17. SRH
18. STDS
19. TCE



## 5. ENCAMINHAMENTOS

## Encaminhamentos

1. Setoriais SEDUC, STDS, PGE, SRH, GABGOV, COGERH, CONPAM, SEMACE, CAGECE e IPECE reunir sobre itens do Plano de Ação, conforme acordado;
2. Setoriais (CEDE, CAGECE, CONPAM, SEMACE, SRH/COGERH) preparar informações para visita do Auditor contratado pela CGE para validação do cumprimento dos indicadores do primeiro semestre de 2014;
3. PGE (Célula 04) revisar o fluxo das etapas da licitação;
4. Reunião extraordinária do Comitê de Segurança Hídrica no CONPAM em 12/08/2014 para discutir o TR do Plano de Segurança Hídrica;
5. VC com área de Sustentabilidade com o Banco Mundial prevista para segunda (28/07) ou terça (29/07) para discutir alguns pontos levantados na missão.

# Obrigada!

**Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE**  
**Unidade de Gerenciamento de Projeto – UGP *PforR* Ceará**  
**Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N - 2º Andar – SEPLAG – Cambé**  
**Contatos: 3101 3502 / 3101 3499 / 3101 3510**
