



48ª REUNIÃO DO COMITÊ *PforR*
ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO
PROJETO *PforR*
25 DE JANEIRO DE 2018



PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

1. Abertura e apresentação dos participantes;
2. Algumas Informações – **Viviane Costa**
3. Indicadores, Programas e Assistência Técnica
 - 3.1. Indicadores Primários e Desembolsos – **Laura Gonçalves**
 - 3.2. Indicadores Secundários – **Laura Gonçalves**
 - 3.3. Programas PforR - **Thâmara Teixeira**
 - 3.4. Assistência Técnica: Estatísticas – **Giuseppe Nogueira**
 - 3.5 Pontos Principais de Aquisições / Contratos – **Giuseppe Nogueira**
4. Monitoramento Contratos – **André Morel**
5. Projetos de Assistência Técnica por setorial contratados – **Giuseppe Nogueira**
6. Apresentação dos Resultados dos Projeto de Assistência Técnica:
SEMA
7. Aprovação da Ata da 47ª Reunião (21/12/2017) – **Viviane Costa**
8. Encerramento



1. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES



2. ALGUMAS INFORMAÇÕES

Outras Informações

- 1. Plano de Ação referente as recomendações da Auditoria do TCE - exercício 2016 até 28/03/2018;**
- 2. Workshop sobre o PforR e lições aprendidas – previsão agosto/2018;**
- 3. Lições aprendidas sobre o PforR das setoriais – previsão , à partir 19/02/2018.**



Aprovação da Carta Consulta do projeto IPF - Ceará pela COFIEEX em 18/01/2018

PROJETO IPF CEARÁ, APROVADO EM 18/01/2018.

| Projeto | Mutuário | Agência | Empréstimo US\$ |
|---|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| Programa de Linha de Crédito do Banco Mundial - CAIXA Econômica Federal de Financiamento a Investimentos a Infraestrutura Sustentável e Produtos para Eficiência Energética | Caixa Econômica Federal - CEF | BIRD | 200.000.000 |
| | | GCF | 200.000.000 |
| Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará | Estado do Ceará | BIRD | 200.000.000 |
| Projeto de Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal de Pernambuco | Estado de Pernambuco | BID | 37.000.000 |
| Programa de Apoio à Gestão de Integração dos Fiscos do Brasil - PROFISCO II SP | Estado de São Paulo | BID | 87.120.000 |
| Projeto de Modernização Fiscal do Estado do Espírito Santo | Estado do Espírito Santo | BID | 37.800.000 |
| Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e Melhorias de Infraestrutura Municipal - Paraná Urbano III | Estado do Paraná | BID | 118.370.100 |
| Programa Corredor de Transporte e Integração Sul Norte do Maranhão Primeira Etapa | Estado do Maranhão | CAF | 77.652.392 |
| | | NDB | 70.806.056 |
| Aprimoramento do Modelo de Atenção na Rede de Saúde | Estado da Paraíba | BID | 45.197.310 |
| Empreendimento de Rede Metroferroviária de São Paulo Linha 17 - Ouro Trecho 1 Estação Jardim Aeroporto Congonhas a Estação Morumbi CPTM Sistema Monotrilho | Estado de São Paulo | CAF | 296.000.000 |
| Refinanciamento da Dívida com Sustentabilidade Fiscal e Ambiental no Estado de Mato Grosso | Estado de Mato Grosso | BIRD | 332.610.000 |
| Fortalecimento do monitoramento, da fiscalização e do licenciamento ambiental para prevenção e controle de desmatamento no estado do Pará | Estado do Pará | KfW (Doação) | 14.691.450 |
| Itajaí 2040: Moderna e Sustentável | Município de Itajaí | FONPLATA | 62.500.000 |
| Sistema Integrado de Mobilidade de Contagem | Município de Contagem | CAF | 42.000.000 |
| Projeto de modernização e melhoria da qualidade das redes de Atenção em Saúde em Belo Horizonte | Município de Belo Horizonte | BID | 56.000.000 |
| Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais da Cidade de São Paulo - Avança Saúde SP | Município de São Paulo | BID | 100.000.000 |
| TOTAL | | | 1.977.747.308,09 |

BIRD – U\$ 200.000.000,00

ESTADO (Contrapartida) – U\$ 50.000.000,00

TOTAL DE U\$ 250 MILHÕES



3. INDICADORES, PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA



3.1. Indicadores Primários 2017.2 e Desembolsos

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2017.1

| Nº | Setorial | Nome do Indicador | Valor Desembolso US\$ |
|---|----------|--|-----------------------|
| 1 | SDE | DLI 1: aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação | 3.120.000,00 |
| 2 | SEDUC | DLI 3: número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos. | 3.120.000,00 |
| 3 | STDS | DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS | 3.120.000,00 |
| 4 | SEPLAG | DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas | 3.120.000,00 |
| 5 | SRH | DLI 7: Estabelecimento de um comitê interagência de segurança hídrica | 3.120.000,00 |
| 6 | SEPLAG | DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados. | 4.500.000,00 |
| Total de metas de 2017.2 atingidas e ainda não desembolsadas (A) | | | 20.100.000,00 |

INDICADORES PRIMÁRIOS – RESULTADO FINAL

| nº | Setorial Responsável | Indicadores | | Meta | Realizado |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|---|---|---|
| | | nº DLI | Nome | | |
| Metas de 2017.2 Evidenciadas | | | | | |
| 1 | SDE | DLI 1 | Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação. | Mais uma Ação do Plano de Ação implementada | O Comitê apresentou a Ação "Distrito Empreendedor" |
| 2 | SEDUC | DLI 3 | Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso. | 18 Acordos publicados | 18º Acordo publicado |
| 3 | STDS | DLI 4 | Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS | 10,0% | 11% (A STDS visitou 5.014 famílias, do universo de 45.697) |
| 4 | SEPLAG | DLI 6 | Percentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas. | 95,0% | 95,24% (81 projetos de um total de 84) |
| 5 | SRH | DLI 7 | Estabelecimento de comitê multisetorial de Segurança Hídrica. | Atas de pelo menos duas reuniões | Duas Atas de reuniões do CONERH realizadas no segundo semestre de 2017. |
| 6 | SEPLAG | DLI 11 | Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados. | 6 Secretarias | O 6º Acordo foi assinado pela SEMA (5 Acordos de resultados já foram auditados anteriormente) |

INDICADORES PRIMÁRIOS - RESULTADO FINAL

| nº | Setorial Responsável | Indicadores | | Meta | Realizado |
|--|----------------------|-------------|---|--|--|
| | | nº DLI | Nome | | |
| Metas de 2017 cumpridas, já auditadas e desembolsadas | | | | | |
| 7 | SEDUC | DLI 2 | Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP. | Segundo relatório de acompanhamento publicado | A SEDUC apresentou o 2º Relatório do Sistema em forma de Boletim, alcançando assim a meta de 2017.1. |
| 8 | STDS | DLI 5 | Porcentagem de equipes técnicas em CRAS que recebem treinamento em apoio à família. | 95% | 100% |
| 9 | CAGECE | DLI 8 | Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto. | 85,90% | 87,27% (resultado de outubro) |
| 10 | SEMA | DLI 9 | Índice de qualidade da fiscalização ambiental. | 80% | 97,94% (resultado de dezembro) |
| 11 | FUNCEME | DLI 10 | Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água. | Metodologia implementada em mais dois reservatórios estratégicos | A Metodologia foi implementada no Açude Araras e no Olho d' Água. |
| 12 | SEPLAG | DLI 12 | Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada. | 20% + Publicação do Decreto. | 20% + Decreto publicado em 10/05/2017 |

SUMÁRIO DESEMBOLSO - Valores Previstos/Desembolsados

| Categorias | Previsto US\$ (A) | Realizado US\$ (B) | Realizado R\$ | Valor Disponível US\$ (A) - (B) | % Valor Desembolsado/ Total Previsto |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| CATEGORIA I e III | 325.000.000,00 | 304.900.000,00 | 924.052.945,76 | 20.100.000,00 | 93,82% |
| CATEGORIA II | 25.000.000,00 | 19.415.028,00 | 55.814.003,08 | 5.584.972,00 | 77,66% |
| Total | 350.000.000,00 | 267.214.400,00 | 800.285.473,78 | 82.785.600,00 | 92,66% |



3.2. Indicadores Secundários 2017.2

INDICADORES SECUNDÁRIOS – RESULTADO FINAL

| Nº | Nome | Setorial | 2017.2 | | |
|----|--|----------|--|--|--|
| | | | Metas | Realizado / Status | |
| 1 | Número de técnicos com ensino médio completo absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico). | IPECE | 31.600 | Até 2016: 23.457 técnicos foram absorvidos. Os dados referentes a 2017 serão disponibilizados em meados de setembro de 2018. | |
| 2 | Criação e funcionamento do Comitê Consultivo multissetorial ECD (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT) | SEPLAG | Outras duas resoluções publicadas e relatório sobre as atividades do Comitê publicado | Foram publicadas 2 Resoluções e Apresentação Relatório | |
| 3 | Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas. | STDS | 10% | 11% | |
| 4 | Apresentação de nova lei de proteção das bacias hidrográficas. | COGERH | Encaminhamento do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa - PGE | A minuta do Decreto foi enviada à PGE. | |
| 5 | Qualidade da água bruta na região metropolitana de Fortaleza. | | 67,5 | 81,7 | |
| 6 | Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas. | | Plano Segurança Hídrica elaborados e apresentados ao CONERH. Resolução do CONERH criando GT para acompanhamento da execução dos Planos | A elaboração dos Planos ocorrerá somente em 2018, dessa forma a meta não será atingida em 2017.2. | |
| 7 | Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista. | SEMA | Implementação e monitoramento | Relatório de Monitoramento apresentado. | |



3.3. Programas *PforR*

Posição dos Programas em 2017

| EIXO | SETORIAL | PROGRAMAS | Previsão | Execução | FAROL 2017 (B)/(A) |
|---------------------------------------|-----------------|---|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | 2017 (A) | Até 31/12/2017 (B) | |
| CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | SEDUC | 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional; | R\$ 170,78 | R\$ 261,35 | 153% |
| TOTAL CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | | | R\$ 170,78 | R\$ 261,35 | 153% |
| ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA | STDS | 080 – Proteção Social Básica; | R\$ 7,30 | R\$ 7,32 | 100% |
| TOTAL ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA | | | R\$ 7,30 | R\$ 7,32 | 100% |
| QUALIDADE DA ÁGUA | CIDADES | 025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana; | R\$ 5,00 | R\$ 5,70 | 114% |
| | SEMA/ SEMACE | 064 – Resíduos Sólidos; | R\$ 1,10 | R\$ 0,17 | 15% |
| | | 066 – Ceará Mais Verde; | R\$ 2,92 | R\$ 1,76 | 60% |
| | | 067 – Ceará no Clima; | R\$ 0,65 | R\$ 0,10 | 16% |
| | SEMACE | 500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada; | R\$ 0,76 | R\$ 0,05 | 7% |
| | FUNCEME | 018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis. | R\$ 1,50 | R\$ 1,52 | 102% |
| TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA | | | R\$ 11,93 | R\$ 9,31 | 78% |
| TOTAL EXECUÇÃO DE 2017 | | | R\$ 190,01 | R\$ 277,97 | 146,29% |

Execução Acumulada dos Programas – 2014 à 2017

| Setorial | EXECUÇÃO | | | | TOTAL |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| SEDUC | R\$ 208,91 | R\$ 213,00 | R\$ 263,25 | R\$ 261,35 | R\$ 946,52 |
| STDS | R\$ 7,21 | R\$ 7,24 | R\$ 7,36 | R\$ 7,32 | R\$ 29,13 |
| SRH/ COGERH | R\$ 0,46 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,46 |
| CIDADES | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5,70 | R\$ 5,70 |
| SEMA | R\$ 0,39 | R\$ 1,11 | R\$ 0,24 | R\$ 0,69 | R\$ 2,43 |
| SEMACE | R\$ 4,60 | R\$ 2,43 | R\$ 2,71 | R\$ 1,39 | R\$ 11,13 |
| FUNCEME | R\$ 1,79 | R\$ 2,37 | R\$ 1,82 | R\$ 1,52 | R\$ 7,50 |
| TOTAL | R\$ 223,36 | R\$ 226,15 | R\$ 275,39 | R\$ 277,97 | R\$ 1.002,87 |

- ✓ Ao final do ano de 2017, foi realizada auditoria do TCE relacionada ao exercício de 2016, o que resultou na Glosa de despesas no valor de R\$ 34,67 milhões.

Posição da Execução dos Programas

| | | | |
|--|--|------------|-----------------|
| Meta 2014-2017 | Estipulada no Documento de Avaliação do Projeto | R\$ | 728,00 |
| Execução 2014 | Auditada pelo TCE | R\$ | 223,36 |
| Execução 2015 | Auditada pelo TCE | R\$ | 226,15 |
| Execução 2016 | Auditada pelo TCE | R\$ | 275,39 |
| Total Executado e auditado até 2016 | | R\$ | 724,90 |
| Execução 2017 | A ser auditado em 2018 | R\$ | 277,97 |
| Total Executado acumulado até 2017 | | R\$ | 1.002,87 |

Posição dos Programas

✓ **Lembrete:** Regras Programas


A execução dos programas deve observar as seguintes restrições:

- Devem excluir despesas que são financiadas pelo próprio BIRD ou por outras operações de crédito, ou seja, não é permitido a alocação de recursos do BIRD ou outras operações de crédito para custear despesas dos programas e iniciativas do componente
- Verificar a lista negra do BIRD a cada licitação, antes de assinar contrato. Para atender o Art. 42 da Lei 8.666/93 a SEPLAG incluiu no orçamento de cada ação um valor na fonte 69;
- Não podem apresentar impacto sócio ambiental negativo;
- Os valores dos contratos não podem exceder os limites abaixo:
 - Obras = US\$ 50 milhões
 - Bens = US\$ 30 milhões
 - Sistemas de TIC = US\$ 20 milhões
 - Consultorias = US\$ 15 milhões.



3.4. Assistência Técnica – Estatísticas

Execução dos Subprojetos de AT por Etapa – 77 Subprojetos

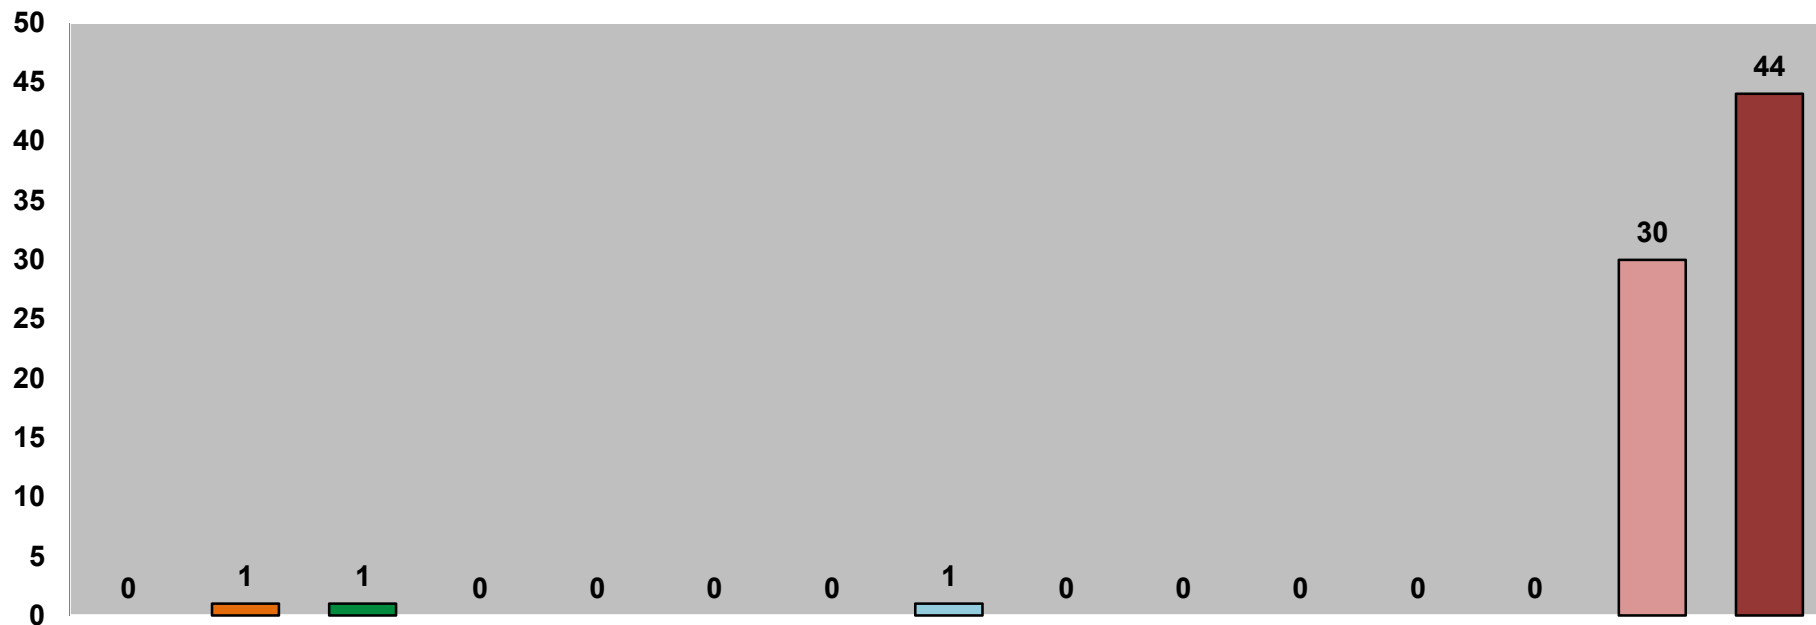

01
TR, MC e
MI/Edital


02
Em Licitação

Total 74
30 - Em Andamento
44 - Concluídos

Subprojetos de Assistência Técnica por Etapa

| Etapas | | | Setoriais com Subprojetos | Valor US\$ |
|--------------|--|-----------|--|----------------------|
| 1 | TDR e MC sendo elaborados para NO BM | 0 | - | - |
| 2 | TDR e MC aprovado pelo BM e elaborando MI | 1 | IPECE (21); | 197.836,17 |
| 3 | Manifestação de Interesse Publicada | 1 | SEDUC (38); | 3.091,19 |
| 4 | Elaborando o Relatório Final da Lista Curta | 0 | - | - |
| 5 | Elaborando a Solicitação de Proposta | 0 | - | - |
| 6 | Solicitação de Proposta Lançada | 0 | - | - |
| 7 | Elaborando o Relatório Técnico ou Curricular | 0 | - | - |
| 8 | Elaborando o Relatório Financeiro e o Combinado | 1 | SDE (24); | 569.255,26 |
| 9 | Não Objeção do BM à Avaliação Combinado / Avaliação Curricular | 0 | - | - |
| 10 | Divulgação da Avaliação Combinada / Ofício para Negociação | 0 | - | - |
| 11 | Negociação do Contrato | 0 | - | - |
| 12 | Divulgação PGE Resultado Final | 0 | - | - |
| 13 | Assinando o Contrato / Publicação | 0 | - | - |
| 14 | Projetos com Contratos em Execução | 30 | CGE(05,06); IPECE(12,15,17,18,19,20); SEDUC(28,29,30,31,34,35,36,43,44,45,47); SEMA(53); SEPLAG(60,61,63,64); SRH(65,66); COGERH(68,69); STDS(71); TCE(74); | 12.648.237,09 |
| 15 | Projetos com Contratos Finalizados | 44 | ARCE(01); CGE(02,03,04,07,08,09,10); FUNCEME(11); IPECE(13,14,16); SDE(22,23); SECITECE(25,26,27), SEDUC (32,33,37,39,40,41,42,46); SEMA(48,49,50,51,52,54); SEMACE (55,56); SEPLAG (57,58,59,62); SRH(67), COGERH (70); STDS(71,72); TCE(75,76,77). | 7.933.489,11 |
| Total | | 77 | | 21.351.908,82 |

Execução dos Subprojetos de AT por Etapa

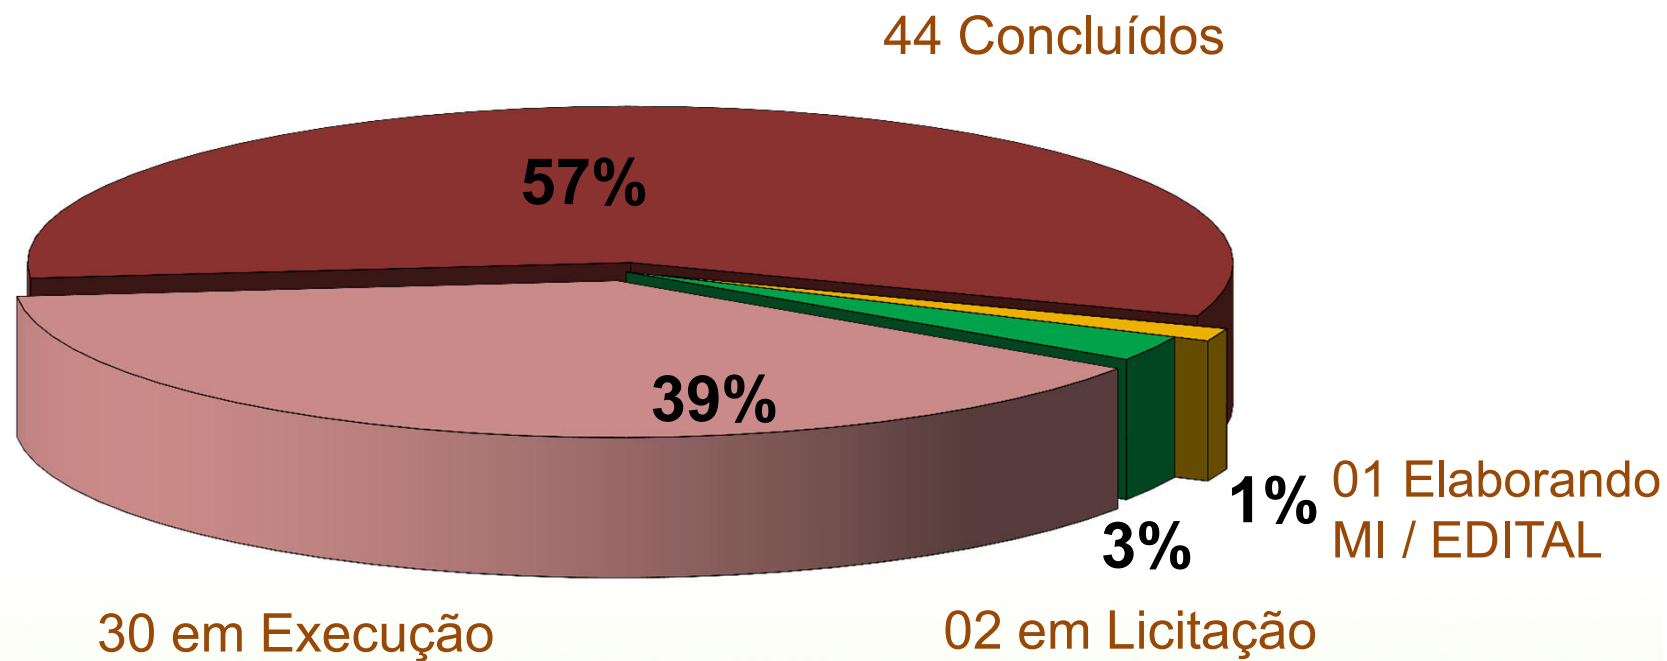



4.5 Tempo disponível até encerramento do *PforR*

Tempo disponível até encerramento do PforR = 31/01/2019

| | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 2º Sem 17 e 1º Sem de 18 1º e 2º Sem 2018 e Jan 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 06 Meses |
| | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 06 Meses |
| | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | |

| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | 12 Meses |
|--------------|---------------------|

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 06 meses |
| | Médio - de 07 a 09 meses |
| | Alto - 10 e 11 mês |
| | Altíssimo - acima de 11 meses - Inviabiliza o Projeto |

Subprojetos de Assistência Técnica

| QTD. | Setoriais | Subprojeto | Status |
|------|-----------|---|---|
| 1 | IPECE | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização e realização de eventos e congressos. | Setorial está ajustando o TDR após comentários do Banco Mundial e com posterior elaboração do Edital após recebimento da “não objeção”. |
| 2 | SDE | Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará. | Aguardando reunião com o Secretário Maia Júnior, em articulação com o Secretário César Ribeiro, da SDE. |
| 3 | SEDUC | Contratação de serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados. | Licitação relançada no dia 23/01/2018, com recebimento de 03 propostas. SEDUC aguarda o envio por parte da Cel04. |



3.5 Pontos Principais de Aquisições / Contratos

Pontos Principais de Aquisições / Contratos

- **Enviado Ofício Circular IPECE/UGP nº 02/2018 para todas as setoriais solicitando que “envide esforços para promover a adequada gestão documental, no sentido de proporcionar o tempestivo acesso aos documentos e evitar extravios”;**
- **Incluir a especificação dos produtos nas descrição dos serviços contidas nas Notas de Empenho e Notas Fiscais;**
- **Participação da equipe de especialistas principais nos produtos entregues;**
- **Prazo de execução condizente com a vigência contratual.**



4. MONITORAMENTO CONTRATOS

Cronograma Assinatura dos Contratos AT (R\$)

| Descrição | Ano | | | | | | | | | Total |
|--|--------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|-------------------|
| | 2014.1 | 2014.2 | 2015.1 | 2015.2 | 2016.1 | 2016.2 | 2017.1 | 2017.2 | Previsão 2018.1 | |
| Contratos Assinados | 0 | 3 | 11 | 11 | 7 | 20 | 18 | 4 | 3 | 77 |
| Valores R\$ | - | 490.352 | 1.165.551 | 8.606.866 | 4.821.785 | 29.306.762 | 13.350.108 | 1.573.830 | 2.603.196 | 61.918.452 |
| % Financeiro dos Projetos Contratados | 0,0% | 0,8% | 1,9% | 13,9% | 7,8% | 47,3% | 21,6% | 2,5% | 4,2% | 100% |




Contratos Assistência Técnica

| Setorial | Nº de Contratos | Nº de Contratos em Andamento | Nº de Contratos Concluídos | Valor Contratado + Patronal (R\$) | Valor Pago (R\$) | Saldo a Pagar (R\$) | % PAGO |
|--------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| ARCE | 1 | - | 1 | 839.982,65 | 839.982,65 | - | 100% |
| CGE | 9 | 2 | 7 | 7.883.945,04 | 5.626.267,81 | 2.257.677,23 | 71% |
| COGERH | 3 | 2 | 1 | 4.419.133,06 | 3.472.206,42 | 946.926,64 | 79% |
| FUNCEME | 1 | - | 1 | 1.666.842,98 | 1.666.842,98 | - | 100% |
| IPECE | 9 | 6 | 3 | 5.116.923,49 | 3.941.176,78 | 1.175.746,71 | 77% |
| SDE | 2 | 0 | 2 | 1.148.959,99 | 1.148.959,99 | - | 100% |
| SECITECE | 3 | 0 | 3 | 1.400.260,31 | 1.400.260,31 | - | 100% |
| SEDUC | 19 | 11 | 8 | 8.594.233,11 | 5.132.840,41 | 3.461.392,70 | 60% |
| SEMA | 7 | 1 | 6 | 7.223.217,54 | 6.063.901,26 | 1.159.316,28 | 84% |
| SEMACE | 2 | 0 | 2 | 1.639.804,89 | 1.639.804,89 | - | 100% |
| SEPLAG | 8 | 4 | 4 | 10.613.771,29 | 7.866.017,60 | 2.747.753,69 | 74% |
| SRH | 3 | 2 | 1 | 3.048.215,88 | 1.849.441,14 | 1.198.774,74 | 61% |
| STDS | 3 | 1 | 2 | 2.307.050,00 | 1.120.141,00 | 1.186.909,00 | 49% |
| TCE | 4 | 1 | 3 | 3.164.958,37 | 1.302.314,26 | 1.862.644,11 | 41% |
| TOTAL | 74 | 30 | 44 | 59.067.298,59 | 43.070.157,50 | 15.997.141,10 | 73% |


Cronograma Pagamentos AT(R\$)

| Pago e Previsão de Pagamento da Assistência Técnica - PforR (R\$) | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Ano | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Previsão 2018.1 | Previsão 2018.2 | Total |
| Valor | 72.600 | 975.610 | 11.205.681 | 30.816.267 | 13.500.000 | 5.348.294 | 61.918.452 |

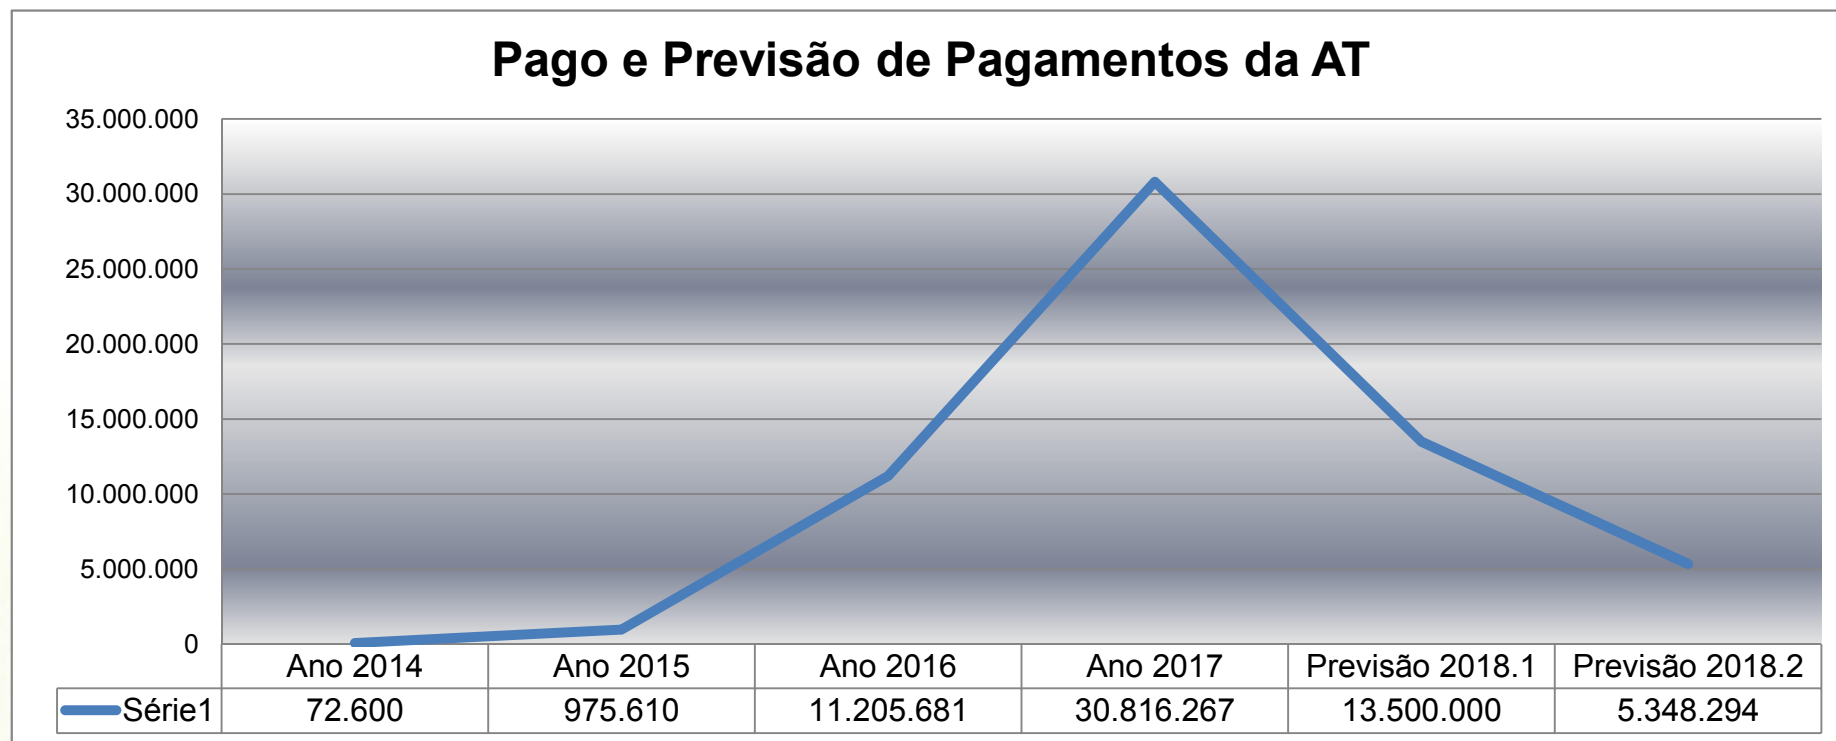

Situação dos Contratos – Aditivos de Prazo

| Setorial | ARCE | CGE | COGERH | FUNCEME | SEMA | SEMACE | SEPLAG | SDE | SEDUC | STDS | SECITECE | IPECE | TCE | SRH | TOTAL |
|------------------|------|-----|--------|---------|------|--------|--------|-----|-------|------|----------|-------|------|------|------------|
| Nº Contratos | 1 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 19 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 74 |
| Aditivo de Prazo | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 5 | 1 | 14 | 4 | 3 | 52 |
| % | 0% | 22% | 33% | 100% | 29% | 0% | 63% | 0% | 74% | 167% | 33% | 156% | 100% | 100% | 70% |

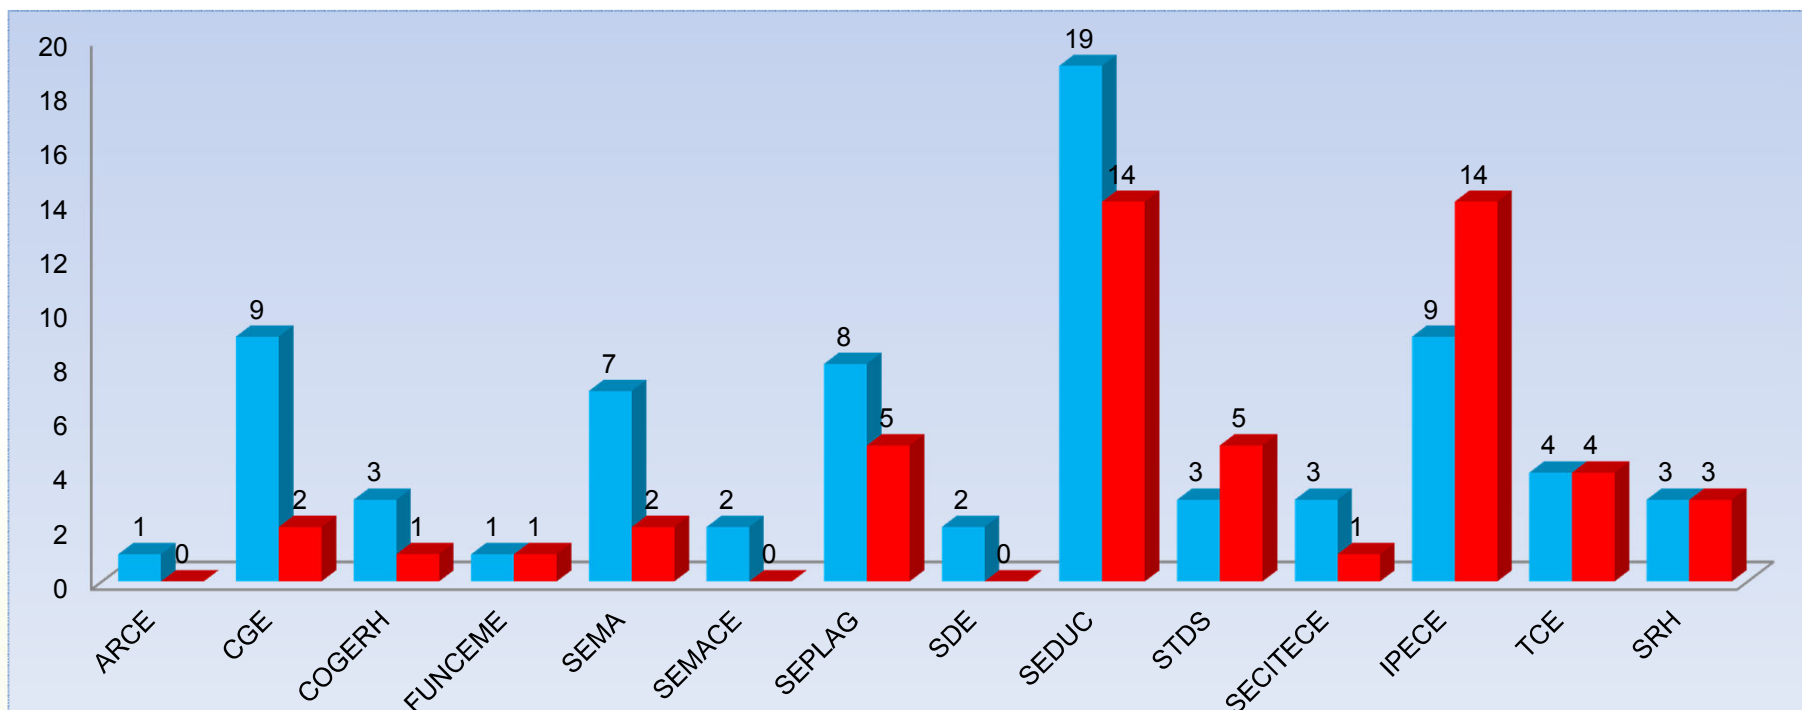

70% dos Contratos já foram elaborados Aditivos de Prazo



5. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR SETORIAL CONTRATADOS



ARCE

Subprojeto ARCE

| Nº | Órgão | Subprojetos | Risco |
|----|-------|--|--|
| 1 | ARCE | Desenvolvimento de modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Estado do Ceará. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 06 meses |
| | Médio - de 07 a 09 meses |
| | Alto - 10 e 11 mês |
| | Altíssimo - acima de 11 meses - Inviabiliza o Projeto |
| | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| | Contratos em Execução |

ARCE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 1: Desenvolvimento de modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Subprojeto:** US\$ 342.109,75
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Fevereiro 2017
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 019/2016, assinado em 14/06/2016.
- **Consultora Vencedora:** RPG – Regulation, Performance and Governace Ltda.
- **Valor do Contrato + Taxas:** R\$ 839.982,65.



CGE

Subprojetos CGE

| Nº | Órgão | Subprojetos | Risco |
|----|-------|--|---|
| 1 | CGE | Auditoria Técnica dos Indicadores I. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 2 | CGE | Auditoria Técnica dos Indicadores II. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 3 | CGE | Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (NEGÓCIO SIEC). | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 4 | CGE | Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SISTEMA SIEC). | Contrato em Execução |
| 5 | CGE | Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão. | Contrato em Execução |
| 6 | CGE | Capacitação da população para o Controle Social. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 7 | CGE | Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 8 | CGE | Realização de treinamentos com foco no “apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público”. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 9 | CGE | Consultoria individual especializada, em gestão documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |

CGE- Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojetos 2 e 3: Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR. ¹

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 67.354,63
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévio
- **Início/Término:** Junho 2014 - Fevereiro 2016
- **Estágio Atual:** Contratos Concluídos Físico e Financeiro.
- **Consultores:** Marcelo Ponte Barbosa e Túlio Cravo.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 152.302,30.

Nota 1: Auditoria será realizada pela equipe da CGE a partir do semestre 16.1

CGE - Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 4: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Marcelo Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 284.089,71
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2015 – Junho 2017
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 08/2016, assinado em 15/06/2016.
- **Consultora Vencedora:** NTConsult Tecnologia e Consultoria LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 725.256,92

CGE - Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 5: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).

- **Responsável:** Carlos Jorge Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 658.560,58
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Março 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 026/2016 - Assinado em 07/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** Ivia Serviços de Informática Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.130.443,48.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|--------------|--------------|--------------|----------|
| 2.130.443,48 | 1.086.526,16 | 1.043.917,32 | 11/20 |

CGE - Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 6: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.071.989,29
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 029/2016 – Assinado em 24/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** Caiena Desenvolvimento de Sistemas Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 3.467.885,35.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|--------------|--------------|--------------|----------|
| 3.467.885,35 | 2.254.125,44 | 1.213.759,91 | 10/15 |

CGE - Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 7: Capacitação da população para o Controle Social.

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 267.522,72
- **Método de Aquisição:** LPN
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 01/2017 – Assinado em 20/01/2017.
- **Consultora Vencedora:** Fundação Demócrito Rocha.
- **Valor do Contrato:** R\$ 865.436,00.

CGE - Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 8: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na “Detecção de Casos de Fraude e Corrupção” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.

- **Responsável:** Denise Andrade Araújo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 89.644,51
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 07/2017, assinado em 13/06/2017.
- **Consultora Vencedora:** Deloitte Touche Tohatsu Consultores Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 290.000,00

Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 9: Realização de treinamentos com foco no “apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público”.

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 61.026,58
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 025/2016, assinado em 07/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** KPMG Assessores Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 197.421,00.

CGE - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 10: Consultoria individual especializada, em gestão documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE.

- **Responsável:** Aglaio Soares
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 24.411,82
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Março de 2016
- **Estágio Atual:** Contrato nº 012/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultor:** Fernando Braga.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 55.200,00.



FUNCEME

Subprojeto FUNCEME

| Nº | Órgão | Subprojetos | Risco |
|----|---------|--|--|
| 1 | FUNCEME | Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 06 meses |
| | Médio - de 07 a 09 meses |
| | Alto - 10 e 11 mês |
| | Altíssimo - acima de 11 meses - Inviabiliza o Projeto |
| | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| | Contratos em Execução |

FUNCEME - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 11: Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Francisco Hoilton
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Proposta Vencedora:** 679.677,00 (US\$ + €)
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Maio 2017
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 10/2015, assinado em 09/09/2015.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Aqualogus / Azurit.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.666.864,98.




IPECE

Subprojetos IPECE

| Nº | Órgão | Subprojetos | Risco |
|----|-------|---|-----------------------------|
| 1 | IPECE | Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará - CONSULTORES PLENOS. | Contrato em Execução |
| 2 | IPECE | Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará - CONSULTORES PLENOS. | Contrato Rescindido |
| 3 | IPECE | Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. CONSULTOR JÚNIOR. | Contrato Rescindido |
| 4 | IPECE | Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. ANALISTA LICITAÇÕES. | Contrato em Execução |
| 5 | IPECE | Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. ANALISTA LICITAÇÕES. | Contrato Rescindido |
| 6 | IPECE | Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. ANALISTA LICITAÇÕES. | Contrato em Execução |
| 7 | IPECE | Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR. | Contrato em Execução |
| 8 | IPECE | Desenvolvimento de sistemas de informação digital, para implementação e implantação de 02 (dois) sistemas denominados IPECEDATA e sistema de monitoramento e avaliação dos projetos e beneficiários do FECOP. | Contrato em Execução |
| 9 | IPECE | Desenvolvimento de metodologias para planejamento e avaliação dos projetos estratégicos de investimentos do poder executivo do Estado do Ceará. | Contrato em Execução |
| 10 | IPECE | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização e realização de eventos e congressos. | Em Atividades Preparatórias |

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojetos 12 e 13: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.
CONSULTORES PLENOS

- **Responsável:** Viviane Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 308.277,81
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em execução. Sendo um contrato prestado os serviços na UGP da setorial e outro contrato rescindido.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 14: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.
CONSULTOR JÚNIOR

- **Responsável:** Viviane Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 21.227,67
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Maio 2015
- **Estágio Atual:** Contrato nº 07/2014 - Rescindido.
- **Consultora:** Viviane Ramos da Costa.
- **Valor do Contrato:** R\$ 48.000,00.

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojetos 15, 16 e 17: Contratação de 03 (três) **Analistas em Licitações** para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- **Responsável:** Viviane Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 247.994,30
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Janeiro 2019
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** 01 contrato rescindido e 02 Contratos em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 18: Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR.

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 120.504,68
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 10/2015, assinado em 01/09/2015. Serviços em execução.
- **Consultora:** Carlos Alberto Manso.
- **Valor do Contrato:** R\$ 246.787,20.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

IPECE - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 19: Desenvolvimento de sistemas de informação digital, para implementação e implantação de 02(dois) sistemas denominados IPECEDATA e sistema de monitoramento e avaliação dos projetos e beneficiários do FECOP.

- **Responsável:** Mário Aragão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 682.482,48
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 01/2017, assinado em 17/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** Nova Via Tecnologia e Mobilidade Ltda.
- **Valor do Contrato:** 2.187.903,10.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|--------------|--------------|------------|----------|
| 2.187.903,10 | 1.531.532,10 | 656.371,00 | 14/20 |

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 20: Desenvolvimento de metodologias para planejamento e avaliação dos projetos estratégicos de investimentos do poder executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 425.894,52
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 04/2017, assinado em 28/04/2017.
- **Consultora Vencedora:** Quadrante Consultoria Econômica Ltda.
- **Valor do Contrato:** 1.377.768,77.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|--------------|------------|------------|----------|
| 1.377.768,77 | 964.438,15 | 413.330,62 | 06/09 |

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 21: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização e realização de eventos e congressos.

- **Responsável:** Flávio Ataliba
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 197.836,17
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2017 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Em Atividades Preparatórias
- **Estágio Atual:** Em Atividades Preparatórias – Setorial está ajustando o TDR após comentários do Banco Mundial e com posterior elaboração do Edital após recebimento da “não objeção” em 10/11/2017.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SDE / ADECE

Subprojetos SDE

| Nº | Órgão | Subprojetos | Risco |
|----|-------|---|--|
| 1 | SDE | Desenvolvimento do sistema FDI (Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas). | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 2 | SDE | Impact Evaluation Workshop em Istambul. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 3 | SDE | Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará. | Em Licitação |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 06 meses |
| | Médio - de 07 a 09 meses |
| | Alto - 10 e 11 mês |
| | Altíssimo - acima de 11 meses - Inviabiliza o Projeto |
| | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| | Contratos em Execução |

SDE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 22: Desenvolvimento do sistema FDI (Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas).

- **Responsável:** Fernando Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 388.117,50
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 03/2016, assinado em 26/08/2016.
- **Consultora Vencedora:** Ivia Serviços de Informática Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.142.416,04.

SDE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 23: Impact Evaluation Workshop Istanbul

- **Responsável:** Inês Studart
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 2.894,02
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Maio 2015.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** Casa Blanca / Maria Inês Cavalcante Studart Menezes.
- **Valor do Contrato:** R\$ 6.543,95.

SDE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 24: Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Filipe Rabelo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 569.255,26
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2017 – Junho 2018
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Relatório Financeiro e o Combinado.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Aguardando reunião com o Secretário Maia Júnior, em articulação com o Secretário César Ribeiro, da SDE.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SECITECE

Subprojetos SECITECE

| Nº | Órgão | Subprojetos | Risco |
|----|----------|---|--|
| 1 | SECITECE | Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 2 | SECITECE | Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 3 | SECITECE | Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 06 meses |
| | Médio - de 07 a 09 meses |
| | Alto - 10 e 11 mês |
| | Altíssimo - acima de 11 meses - Inviabiliza o Projeto |
| | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| | Contratos em Execução |

SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 25: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.

- **Responsável:** Sandra Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 139.917,03
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 16/2017, assinado em 25/07/2017.
- **Consultora Vencedora:** Ferraro Projetos e Investimento Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 452.631,58

SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 26: Elaboração do plano estadual de ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Sandra Monteiro / Tarcísio Hilter
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 238.111,76
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Contrato nº 06/2016, Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** Macroplan Prospectivo, Estratégia e Gestão Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 770.291,53

SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 27: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

- **Responsável:** Sandra Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 57.428,61
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Abril 2017
- **Estágio Atual:** Contrato nº 16/2016, Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Maria Fatima Ludovico da Gama e Souza.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 177.593,20.



SEDUC

Subprojetos SEDUC

| Nº | Órgão | Subprojetos | Risco |
|----|-------|---|--|
| 1 | SEDUC | Elaborar as matrizes de referência e os itens para compor os testes da avaliação de desempenho dos estudantes do 3º ano de vinte cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais de educação profissional do Estado do Ceará. | Contrato em Execução |
| 2 | SEDUC | Formação Continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado. | Contrato em Execução |
| 3 | SEDUC | Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará. | Contrato em Execução |
| 4 | SEDUC | Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará. | Contrato em Execução |
| 5 | SEDUC | Impact Evaluation Workshop em Istambul. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 6 | SEDUC | CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 7 | SEDUC | Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento. | Contrato em Execução |
| 8 | SEDUC | Desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil. | Contrato em Execução |
| 9 | SEDUC | Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto. | Contrato em Execução |
| 10 | SEDUC | Serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 11 | SEDUC | Contratação de serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados. | Em Licitação |

Subprojetos SEDUC

| Nº | Órgão | Subprojetos | Risco |
|----|-------|--|---|
| 12 | SEDUC | Especialista em Avaliação de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 13 | SEDUC | Desenvolvimento Infantil, com foco na educação, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN). | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 14 | SEDUC | Desenvolvimento Infantil, com foco na saúde, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN). | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 15 | SEDUC | Empresa especializada para elaboração de arte gráfica/design, revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, da Secretaria da Educação. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 16 | SEDUC | Apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios. | Contrato em Execução |
| 17 | SEDUC | Empresa de Consultoria especializada em visitas domiciliares e para formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN). | Contrato em Execução |
| 18 | SEDUC | Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN. (Coleta de Dados). | Contrato em Execução |
| 19 | SEDUC | Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 20 | SEDUC | Contratação de Consultoria Individual para o desempenho da função de coordenadora de campo nas atividades de coletas de dados da Formação de Gestores da Educação Infantil. | Contrato em Execução |

SEDUC- Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 28: Elaborar as matrizes de referência e os itens para compor os testes da avaliação de desempenho dos estudantes do 3º ano de vinte cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais de educação profissional do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 267.202,02
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Março 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 154/2017, assinado em 16/08/2017.
- **Consultora Vencedora:** Universidade Federal de Juiz de Fora – Centro de Políticas Públicas de Avaliação da Educação (UFJF/CAED).
- **Valor do Contrato:** R\$ 864.398,52
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|------------|------------|------------|----------|
| 864.398,52 | 216.099,63 | 648.298,89 | 01/05 |

SEDUC - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 29: Formação Continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 81.757,64
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Março 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 079/2017, assinado em 18/04/2017.
- **Consultora Vencedora:** Elos Orientação e Planejamento Educacional Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 261.624,46.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|------------|-----------|------------|----------|
| 261.624,46 | 65.406,12 | 196.218,34 | 04/06 |

SEDUC- Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojetos 30 e 31: Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará (02 Consultores).

- **Responsável:** Luciano Nery
- **Categoria de Licitação:** CI
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 49.101,56
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2016 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contratos em Execução – Contratos nº 83 e 84/2017, assinados no dia 15/03/2017.
- **Consultores:** Antônio Jussier de Vasconcelos Ramos e Fernando Andrade de Alcântara.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 1.000.000,00.
- **Sinalização em relação ao Projeto:**

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 158.843,52 | 83.031,84 | 75.811,68 | 11/22 |

SEDUC- Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 32: Impact Evaluation Workshop Istanbul

- **Responsável:** Luciano Nery
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 3.154,13
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Maio 2015
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Andréa Araújo Rocha Nibon.
- **Valor do Contrato:** R\$ 7.132,11.

SEDUC- Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 33: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 4.466,03
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Julho 2015.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Maria Dagmar de Andrade Soares - Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER.
- **Valor do Contrato:** R\$ 10.098,59.

SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 34: Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento. WMS

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 16.506,96
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Março 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – N° 089/2017, assinado em 27/03/2017.
- **Consultor:** Samuel Simões Oliveira Franco.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 53.400,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 53.400,00 | 22.162,11 | 31.237,89 | 04/07 |

SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 35: Desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 254.128,36
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Maio 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº105/2017 em Execução. Assinado em 20/04/2017.
- **Consultora Vencedora:** Instituto da Primeira Infância - IPREDE.
- **Valor do Contrato:** R\$ 822.105,26.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|------------|------------|------------|----------|
| 822.105,26 | 698.789,47 | 123.315,79 | 09/11 |

SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 36: Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 116.608,86
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2016 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução - nº 028/2017 Assinado em 07/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** ECART Projetos e Gestão Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 377.229,65.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|------------|------------|-----------|----------|
| 377.229,65 | 318.350,33 | 58.879,32 | 07 |

SEDUC- Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 37: Serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 15.783,62
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2016 – junho 2017
- **Estágio Atual:** Concluído físico financeiro. Contrato nº 021/2017, assinado em 07/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** Expressão Gráfica e Editora Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 51.060,00.

SEDUC- Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 38: Contratação de serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 3.091,19
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2017 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Em Atividades Preparatórias
- **Estágio Atual:** Em Atividades Preparatórias – Licitação relançada no dia 23/01/2018, com recebimento de 03 propostas. SEDUC aguarda o envio por parte da Cel04.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 39: Especialista em **Avaliação** de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa.*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor Subprojeto:** US\$ 4.139,40
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2014 – Maio 2016
- **Estágio Atual:** Contrato nº 018/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultor:** Flávio Augusto Rezende Cunha.
- **Valor do contrato:** R\$ 9.360,00.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 40: Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 25.207,85
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 017/2015, assinado em 23/03/2015.
- **Consultora:** Fátima Maria Araújo Saboia Leitão.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 57.000,00.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 41: Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Saúde, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 29.188,04
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 014/2015, assinado em 26/03/2015.
- **Consultora:** Ana Cecília Silveira Lins Sucupira.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 66.000,00.

SEDUC - Assistência Técnica –Assistência à Família

Subprojeto 42: Empresa Especializada para Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 61.838,85
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Setembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 029/2016, assinado em 11/02/2016.
- **Consultora Vencedora:** Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 139.830,00.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 43: Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 372.482,21
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – nº 214/2016, assinado em 12/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** VC Promoções e Eventos Ltda – EPP.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.204.979,94 .
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|--------------|------------|------------|----------|
| 1.204.979,94 | 739.670,23 | 465.309,71 | 09 |

SEDUC - Assistência Técnica –Assistência à Família

Subprojeto 44: Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 202.891,81
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Maio 201787
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 236/2016, assinado em 30/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** CASAM – Centro de Apoio Social e de Animação Missionária.
- **Valor do Contrato:** R\$ 656.355,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|------------|------------|------------|----------|
| 656.355,00 | 492.266,25 | 164.088,75 | 10/13 |

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 45: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN. (Coleta de Dados).

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 1.155.818,22
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Fevereiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 214/2016, assinado em 28/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** Overview Serviços & Informação Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 3.739.071,95
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|--------------|--------------|--------------|----------|
| 3.739.071,95 | 2.093.879,94 | 1.645.192,01 | 08/11 |

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 46: Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 17.458,44
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Outubro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Rescindido – Contrato nº 253/2016, assinado em 19/10/2016.
- **Consultora Vencedora:** Rafaela Martins Leite Monteiro.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 45.694,11.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 47: Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 21.653,79
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2016 – Março 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução, nº 30/2017 – Assinado em 20/07/2017.
- **Consultora Vencedora:** Patrícia Simões.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 70.050,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 70.050,00 | 17.009,68 | 55.794,32 | 03/05 |



SEMA

Subprojetos SEMA

| Nº | Órgão | Subprojetos | Risco |
|----|-------|--|--|
| 1 | SEMA | Elaboração do projeto “Avaliação do Impacto Econômico da Degradação Ambiental.” | Contrato Concluído Físico |
| 2 | SEMA | Desenvolvimento e execução de projeto em educação ambiental para a qualidade da água nas três bacias estratégicas. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 3 | SEMA | Apoio Logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas três bacias estratégicas. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 4 | SEMA | Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e programas do Estado do Ceará. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 5 | SEMA | Desenvolver projeto de lei que institui o programa de serviços ambientais no Estado do Ceará. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 6 | SEMA | Elaboração do Plano de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto – 81 municípios. | Contrato em Execução |
| 7 | SEMA | Desenvolver Implementação da Coleta Seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 06 meses |
| | Médio - de 07 a 09 meses |
| | Alto - 10 e 11 mês |
| | Altíssimo - acima de 11 meses - Inviabiliza o Projeto |
| | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| | Contratos em Execução |

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 48: Elaboração do projeto “Avaliação do Impacto Econômico da Degradação Ambiental.” (AIEDA)

- **Responsável:** Maria Dias / Magda Marinho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 282.850,22
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 18/2016, assinado em 16/08/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Aquino – Mcrit SL – Barcelona Brasil Group.
- **Valor do Contrato + Taxa:** R\$ 851.841,63.

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 49: Desenvolvimento e execução de projeto em educação ambiental para a qualidade da água nas três bacias estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 266.182,85
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 06/2016, assinado em 25/02/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Engesoft Engenharia / Quanta Consultoria Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 710.638,32.

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 50: Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor Subprojeto:** US\$ 96.162,05
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 26/2016, assinado em 26/11/2015.
- **Consultora Vencedora:** Empresa MSV Multiserviços ME.
- **Valor do Contrato:** R\$ 242.557,52.

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 51: Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e programas do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Maria Dias / Francisco Leorne
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** 202.789,54
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2014 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 16/2016, assinado em 05/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** Arcadis Logos S.A.
- **Valor do Contrato:** R\$ 563.157,73.

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 52: Desenvolver projeto de lei que institui o programa de serviços ambientais no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Maria Dias / Monica Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 215.404,39
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Dezembro 2017
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato 08/2017, assinado em 09/02/2017.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio STCP Engenharia de Projetos Ltda – Ludovino Lopes, Ricci e Santos Sociedade de Advogados.
- **Valor do Contrato:** R\$ 696.833,21.

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 53: Elaboração do Plano de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto – 81 municípios.

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 1.153.752,25
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Agosto 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 20/2016, assinado em 01/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** Bureau de Projetos e Consultoria Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.608.864,60.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|--------------|--------------|--------------|----------|
| 2.608.864,60 | 1.434.875,53 | 1.173.989,07 | 04/11 |

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 54: Desenvolver Implementação da Coleta Seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 478.827,98
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro – Contrato 19/2017, assinado em 20/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** I&T Informações e Técnicas em Construção Civil Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.549.008,53.



SEMACE

Subprojetos SEMACE

| Nº | Órgão | Subprojetos | Risco |
|----|--------|--|--|
| 1 | SEMACE | Elaboração do planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 2 | SEMACE | Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE | Contrato Concluído Físico e Financeiro |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 06 meses |
| | Médio - de 07 a 09 meses |
| | Alto - 10 e 11 mês |
| | Altíssimo - acima de 11 meses - Inviabiliza o Projeto |
| | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| | Contratos em Execução |

SEMACE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 55: Elaboração do planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.

- **Responsável:** Elizabeth Romão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 331.484,70
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 01/2017, assinado em 10/01/2017.
- **Consultora Vencedora:** Tramitty Serviços LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 967.195,89

SEMACE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 56: Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE.

- **Responsável:** Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 273.507,90
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Concluído.
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 20/2016, assinado em 13/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** MBS CONSULTING – MBS Estratégias e Sistemas Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 672.609,00.



SEPLAG

Subprojetos SEPLAG

| Nº | Órgão | Subprojetos | Risco |
|----|--------|--|---|
| 1 | SEPLAG | Concepção de Metodologia de Planejamento de Investimentos. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 2 | SEPLAG | Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 3 | SEPLAG | Empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 4 | SEPLAG | Empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do Ceará. | Contrato em Execução |
| 5 | SEPLAG | Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará. | Contrato em Execução |
| 6 | SEPLAG | Desenvolvimento do projeto de Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 7 | SEPLAG | Consultor Individual - Otimização das Rotas. (Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará). ROTEIRIZAÇÃO | Contrato em Execução |
| 8 | SEPLAG | Contratação de Consultor Individual - Plano Estratégico de Gestão das Frotas. (Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará). | Contrato em Execução |

SEPLAG - Assistência Técnica - Gestão Pública

Subprojeto 57: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

- **Responsável:** Aduino Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 504.550,12
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2014 – Outubro 2016
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 17/2015, assinado em 30/09/2015.
- **Consultora vencedora:** Consórcio Macroplan e Transplan.
- **Valor do Contrato:** 1.140.888,73.

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 58: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial.

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.171.522,32
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Março 2017
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 23/2015, assinado em 10/11/2015.
- **Consultora vencedora:** Macroplan Prospectiva, Estratégia e Gestão S/S Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ 2.667.519,34.

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 59: Empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Dominique Gomes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 366.027,15
- **Método de Aquisição:** SBQ
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Outubro 2017
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 29/2016, assinado em 04/10/2016.
- **Consultora vencedora:** Consórcio IADH x DELOS.
- **Valor do contrato:** R\$ 1.025.662,05.

SEPLAG - Assistência Técnica - Gestão Pública

Subprojeto 60: Empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Fábio Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 693.972,18
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Abril 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 25/2016, assinado em 16/09/2016.
- **Consultora vencedora:** Deloitte Touche Tohatsu Consultores Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ R\$ 2.245.000,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|--------------|--------------|------------|----------|
| 2.245.000,00 | 1.278.000,00 | 967.000,00 | 08/14 |

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 61: Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Silvana Dourado
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 818.677,30
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Março 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 02/2017, assinado em 24/03/2017.
- **Consultora vencedora:** Elogroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ 2.648.421,05.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|--------------|------------|--------------|----------|
| 2.648.421,05 | 926.947,36 | 1.721.473,69 | 16/34 |

SEPLAG - Assistência Técnica – Fiduciário

Subprojeto 62: Desenvolvimento do projeto de Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 238.726,47
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 32/2016, assinado em 23/11/2016.
- **Consultora vencedora:** NTConsult Tecnologia e Consultoria Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ 772.280,12.

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 63: Consultor Individual - Otimização das Rotas. (Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará). ROTEIRIZAÇÃO

- **Responsável:** André Theophilo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 42.287,47
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2017 – Abril 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 32/2017, assinado em 16/11/2017.
- **Consultor vencedor:** Gustavo Sampaio de Castro.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 136.800,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 136.800,00 | 54.720,00 | 82.080,00 | 02/04 |

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 64: Contratação de Consultor Individual - Plano Estratégico de Gestão das Frotas. (Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará).

- **Responsável:** André Theophilo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 49.335,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2017 – Maio 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 34/2017.
- **Consultor vencedor:** Danilo Geraldo Ribeiro da Mota.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 151.584,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|------------|------|------------|----------|
| 151.584,00 | 0,00 | 151.584,00 | 00/04 |



SRH

Subprojetos SRH

| Nº | Órgão | Subprojetos | Risco |
|----|-------|---|--|
| 1 | SRH | Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga e Cobrança. | Contrato em Execução |
| 2 | SRH | Sistema de Informação de Gestão dos Recursos Hídricos (cadastro, fiscalização, outorga, monitoramento qualitativo, segurança de barragens e medição) com Integração com o Sistema Administrativo Financeiro PROTHEUS. | Contrato em Execução |
| 3 | SRH | Consultor Individual - Malha D'agua. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 06 meses |
| | Médio - de 07 a 09 meses |
| | Alto - 10 e 11 mês |
| | Altíssimo - acima de 11 meses - Inviabiliza o Projeto |
| | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| | Contratos em Execução |

SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 65: Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.

- **Responsável:** Deborah Mithya e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 431.620,55
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Março 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 02/2016, assinado em 27/10/2016.
- **Consultora Vencedora:** IBI Engenharia Consultiva.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.396.292,47.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|--------------|--------------|------------|----------|
| 1.396.292,47 | 1.216.449,99 | 179.842,48 | 21/24 |

SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 66: Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. **SIGERH***

- **Responsável:** Deborah Mithya e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 403.809,40
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 03/2016, assinado em 23/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** Capgemini Consulting Technology Outsourcing.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.306.323,41.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|--------------|------------|--------------|----------|
| 1.306.323,41 | 287.391,15 | 1.018.932,26 | 04/16 |

SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 67: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - **Malha D'agua.***

- **Responsável:** Deborah Mithya e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do TOR:** US\$ 127.697,05
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato 01/2016, assinado em 18/05/2016.
- **Consultora:** Dorian Ponte Lima
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 345,600,00.



COGERH

Subprojetos COGERH

| Nº | Órgão | Subprojetos | Risco |
|----|--------|---|--|
| 1 | COGERH | Fortalecimento do Manejo Estadual de Recursos Hídricos. | Contrato em Execução |
| 2 | COGERH | Empresa para Elaborar o Plano de Segurança Hídrica. | Contrato em Execução |
| 3 | COGERH | Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acaraú e Salgado). | Contrato Concluído Físico e Financeiro |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 06 meses |
| | Médio - de 07 a 09 meses |
| | Alto - 10 e 11 mês |
| | Altíssimo - acima de 11 meses - Inviabiliza o Projeto |
| | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| | Contratos em Execução |

COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 68: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Quali-quantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 677.500,59
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 48/2015, assinado em 24/11/2015.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Água e Solo / Quanta / Engeplus.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.954.015,55.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|--------------|--------------|------------|----------|
| 1.954.015,55 | 1.655.987,24 | 298.028,31 | 24/24 |

COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 69: Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 742.914,10
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 21/2016, assinado em 19/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Nippon Koei Latin America - Caribbean Co. Ltd. / Nippon Koei LAC do Brasil Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.403.327,11.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|--------------|--------------|------------|----------|
| 2.403.327,11 | 1.754.428,78 | 648.898,33 | 13/19 |

COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 70: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor Subprojeto:** US\$ 27.326,28
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Outubro 2015
- **Estágio Atual:** Contrato nº 25/2015, Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Rosana Garjulli Sales Costa.
- **Valor do Contrato + Patronal :** R\$ 61.790,40.



STDS

Subprojetos STDS

| Nº | Órgão | Subprojetos | Risco |
|----|-------|--|--|
| 1 | STDS | Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias visando o Aprofundamento desse Referencial teórico operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 2 | STDS | Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 3 | STDS | Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará. | Contrato em Execução |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 06 meses |
| | Médio - de 07 a 09 meses |
| | Alto - 10 e 11 mês |
| | Altíssimo - acima de 11 meses - Inviabiliza o Projeto |
| | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| | Contratos em Execução |

STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 71: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 64.213,69
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Novembro 2016
- **Estágio Atual:** Contrato nº 22/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Maria Cílvia Queiroz.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 145.200,00.

STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 72: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 63.174,42
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Setembro 2015
- **Estágio Atual:** Contrato nº 17/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** Empresa Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 142.850,00.

STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 73: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 892.888,73
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico (NCB)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Março 2018
- **Estágio Previsto:** Em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução - Contrato nº 058/2016, assinado em 25/05/2016.
- **Consultora Vencedora:** Maestria Comunicação e Eventos LTDA - EPP.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.019.000,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|--------------|------------|--------------|----------|
| 2.019.000,00 | 832.091,00 | 1.186.909,00 | 07 |



TCE

Subprojetos TCE

| Nº | Órgão | Subprojetos | Risco |
|----|-------|--|--|
| 1 | TCE | Desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE. | Contrato em Execução |
| 2 | TCE | Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 3 | TCE | Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE). | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| 4 | TCE | Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem Como, o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De Direito Financeiro. | Contrato Concluído Físico e Financeiro |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 06 meses |
| | Médio - de 07 a 09 meses |
| | Alto - 10 e 11 mês |
| | Altíssimo - acima de 11 meses - Inviabiliza o Projeto |
| | Contrato Concluído Físico e Financeiro |
| | Contratos em Execução |

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 74: Desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.

- **Responsável:** Glinton Ferreira / Delinda Almeida
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 834.461,49
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/ Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Outubro 2018
- **Estágio Previsto:** Em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 21/2016 em Execução. Assinado em 28/07/2017.
- **Consultora Vencedora:** Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
- **Valor do Contrato:** 2.699.484,21.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

| Contrato | Pago | Saldo | Produtos |
|--------------|------------|--------------|----------|
| 2.699.484,21 | 836.840,10 | 1.862.644,11 | 05/16 |

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 74: Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 61.694,57
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Agosto 2016
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 15/2015, assinado em 11/05/2015.
- **Consultor:** Roberto Vilela Resende.
- **Valor do Contrato + Despesas Reembolsáveis:** R\$ 139.503,76.

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 76: Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 100.915,62
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 12/2015, assinado em 16/03/2015.
- **Consultor:** Carlos Roberto Takao Yoshioka.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 228.190,40.

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 77: Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem Como, o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De Direito Financeiro.

- **Responsável:** Glinton Ferreira
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 30.225,66
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico (NCB)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2016 – Setembro 2017
- **Estágio Atual:** Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 06/2017, assinado em 17/05/2017.
- **Consultora Vencedora:** DF Turismo e Eventos Ltda-ME.
- **Valor do Contrato:** R\$ 97.780,00.



6. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS: PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



SEMA

Contratos Encerrados – Consultoria de Empresa

| QTD. | Setoriais | Subprojeto | Contrato | Apresentação |
|------|-----------|---|----------------------|--------------|
| 1 | SEPLAG | Desenvolvimento do projeto de Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços. | Contrato Nº 032/2016 | - |
| 2 | SECITECE | Criação de um observatório de políticas públicas estaduais de apoio a ciência, tecnologia e inovação no Ceará. | Contrato Nº 016/2016 | - |
| 3 | SECITECE | Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará. | Contrato Nº 07/2017 | - |
| 4 | SEMA | Elaboração do projeto “Avaliação do Impacto Econômico da Degradação Ambiental.” | Contrato Nº 018/2016 | 25/01/2018 |
| 5 | SEMA | Desenvolver projeto de lei que institui o programa de serviços ambientais no Estado do Ceará. | Contrato Nº 08/2017 | 25/01/2018 |
| 6 | SEMA | Desenvolver Implementação da Coleta Seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas. | Contrato Nº 17/2017 | - |
| 8 | SEMACE | Elaboração do planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente | Contrato Nº 01/2017 | - |



7. APROVAÇÃO DA ATA

47ª REUNIÃO COMITÊ *PforR* (21/12/2017)

Próxima Reunião do Comitê PforR

Próxima Reunião do Comitê PforR:

22/02/2018
14h30m – IPECE



8. ENCERRAMENTO

Unidade de Gerenciamento do Projeto PforR (UGP)
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora
Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N
Ed. SEPLAG, 2º andar- Fortaleza-CE
Tel.: (85) 3101.3499 e (85) 3101.3510
