



25ª REUNIÃO DO COMITÊ *PforR*
ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO
PROJETO *PforR*
25 DE FEVEREIRO DE 2016



PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

1. Abertura e apresentação dos participantes (14h30-14h40)
2. Algumas Informações:
 - 2.1 Plano de Ação - Relatório de Auditoria do TCE – Laura Gonçalves (14h40-14h45)
3. Indicadores, Plano de Ação, Programas e Assistência Técnica (14h45 - 16h)
 - 3.1. Desembolsos – Laura Gonçalves
 - 3.2. Indicadores Primários 2016.1 e Desembolsos - Laura Gonçalves
 - 3.3. Indicadores Secundários 2016.1 - Laura Gonçalves
 - 3.4. Plano de Ação de Mitigação de Riscos – Laura Gonçalves
 - 3.5. Programas PforR - Laura Gonçalves
 - 3.6. Assistência Técnica: Estatísticas – Lívia Castro e Rodrigo Almeida
 - 3.7. Situação Atual Aquisições dos Projetos de Assistência Técnica - Giuseppe Nogueira
4. Aprovação da Ata da 24ª Reunião (28/01/2016)) (16h - 16h10m)
5. Encaminhamentos (16h10m - 16h20m)
6. Encerramento (16h20m)



1. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES



2. ALGUMAS INFORMAÇÕES



2.1 Plano de Ação - Relatório de Auditoria do TCE

Plano de Ação - Relatório de Auditoria do TCE

- ✓ Elaboração do Plano de Ação para atender as recomendações do TCE, cuja entrega para UGP ficou acordada para o dia **31/03/16** até meio dia, para submeter ao TCE e ao Banco Mundial;
- ✓ Para ajudar as setoriais, foi encaminhado no dia 18/02/2016 um modelo de Plano de Ação, que pode ser melhorado;
- ✓ As setoriais que precisam elaborar o Plano de Ação são:
 - ✓ IPECE (Recomendação 1);
 - ✓ SEDUC e DAE (Recomendações 2 a 9 e 11 a 27);
 - ✓ PGE (Recomendações 10);
 - ✓ STDS (Recomendações 28 a 30);
 - ✓ SEMACE (Recomendações 31 a 35)

FUNCEME e COGERH

✓ Foram auditadas e obtiveram o seguinte comentário do TCE na apresentação:

"Foram analisados as despesas da FUNCEME e COGERH, observando os procedimentos de aquisição, contratação e pagamentos, por amostragem na extensão julgada suficiente para concluir que não há fatos merecedores de destaque."



3. Indicadores, Plano de Ação, Programas, Assistência Técnica



3.1. Desembolsos

INDICADORES PRIMÁRIOS 2º SEMESTRE 2015: Realizado

INDICADORES PRIMÁRIOS COM META PARA DESEMBOLSO EM MARÇO 2016							
nº	DLI	Setorial	Período	META	REALIZADO	VALOR US\$	FAROL
1	DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS	STDS	2015.2	10% ¹	5,11%	1.739.316	
2	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar	STDS	2015.2	30%	65,45%	3.403.750	
3	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar	STDS	2016.1	42.5%	65,45%	3.444.000	
4	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar	STDS	2016.2	55%	65,45%	3.438.000	
5	DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.	SEDUC	2015.2	12	12	3.403.750	
6	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	SEPLAG	2015.2	45%	45,36%	3.403.750	
7	DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	CAGECE	2015.2	84.9%	86,05%	3.403.750	
8	DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	CAGECE	2016.1	85.2%	86,05%	3.444.000	
9	DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	CAGECE	2016.2	85.5%	86,05%	3.438.000	
10	DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	CAGECE	2017.1	85.7%	86,05%	3.444.000	
11	DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	CAGECE	2017.2	85.9%	86,05%	3.120.000	
12	DLI 9: Índice da qualidade da fiscalização ambiental	SEMA	2015.2	60%	62,54%	3.403.750	
13	DLI 10: Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME	2015.1	Metodologia de monitoramento definida e adotada.	Metodologia de monitoramento definida e adotada.	2.744.444	
14	DLI 10: Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME	2015.2	Protocolo de coleta de dados definido e adotado.	Protocolo de coleta de dados definido e adotado.	3.403.750	
Valor solicitado para ser desembolsado em março 2016						45.234.260	

¹ A STDS sinalizou o cumprimento de apenas 5,11% da meta, logo o recurso a ser desembolsado será de US\$ 1.739.316,00 (50,11% do recurso total).



3.2. Indicadores Primários 2016.1




INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2016

n°	SETORIAL RESPONSÁVEL	Indicadores			Metas	
		N°	DLI	Nome	2016	
					1°Semestre	2°Semestre
1	SDE	1	DLI1	Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação	Uma ação do plano de ação implementado	-
2	SEDUC	2	DLI2	Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	-
		3	DLI3	Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso.	13	15
3	STDS	4	DLI4	Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS.	-	15.0%
		5	DLI5	Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	42.5%	55%
4	SEPLAG	6	DLI6	Percentual de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com Marco Lógico implementado.	55%	70%
5	SRH	7	DLI7	Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	Minutas de pelo menos duas reuniões
6	CAGECE	8	DLI8	Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	85.2%	85.5%
7	SEMA/SEMACE/COGERH	9	DLI9	Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	65%	70%
8	FUNCEME	10	DLI10	Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	-	Metodologia implementada em um reservatório estratégico
9	SEPLAG	11	DLI11	Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.	3	4
		12	DLI12	Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	5%	10%
Total de Indicadores em 2016: 12 Indicadores						
Total de Indicadores com metas para o 1º Semestre: 10 Indicadores						

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 1º Semestre de 2016

Nº	Setorial	Responsável	Tema	Indicador	Metas/Valor US\$	Status
1	SDE	Filipe Rabelo Inês Studart	Crescimento Econômico	DLI 1: Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação.	Uma ação do plano de ação implementado US\$ 3.444.000,00	Na última reunião do Comitê ocorrida em 04/02 foi discutida, mais uma vez, a ação que será implementada e a elaboração da sua ligação com as estratégias elaboradas no Primeiro documento. Tal atividade será realizada pelo Witalo Paiva e Andrea Rocha. A resposta deverá ser enviada até a próxima semana para a SDE.




Legenda:

-  Probabilidade alta de atingir a meta
-  Probabilidade intermediária de atingir a meta
-  Probabilidade baixa de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 1º Semestre de 2016

Nº	Setorial	Responsável	Tema	Indicador	Metas/Valor US\$	Status
2	SEDUC	Marta Emília Andréa Rocha	Crescimento Econômico	DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	Primeiro relatório de acompanhamento publicado Valor: U\$S 3.444.000,00	O sistema está em fase de Desenvolvimento. O Cristian do BM solicitou que a Setorial elaborasse uma apresentação do Sistema para a Missão de abril. Além disso, a SEDUC irá realizar uma revisão no Protocolo do Indicador e enviará para a NO do Banco.




Legenda:

-  Probabilidade alta de atingir a meta
-  Probabilidade intermediária de atingir a meta
-  Probabilidade baixa de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 1º Semestre de 2016

Nº	Setorial	Responsável	Tema	Indicador	Metas/Valor US\$	Status
3	SEDUC	Marta Emília Andréa Rocha	Crescimento Econômico	DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.	13 Valor: U\$S 3.444.000,00	A SEDUC concluiu o ano de 2015 com 12 acordos firmados, restando para o cumprimento da meta de 2016.1 mais um contrato que já está em fase de negociação.

Legenda:

-  Probabilidade alta de atingir a meta
-  Probabilidade intermediária de atingir a meta
-  Probabilidade baixa de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 1º Semestre de 2016

Nº	Setorial	Responsável	Tema	Indicador	Metas/Valor US\$	Status
4	STDS	Sebastião Lopes	Redução da Pobreza	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.	42.5%	Até 2015 foram capacitadas equipes técnicas de 36 de CRAS em 23 municípios, do total de 55 CRAS dos 36 municípios mais pobres do Estado, o equivalente a 65,45% do total de CRAS (55 CRAS), cumprindo-se, portanto, as metas referentes ao 2º semestre de 2015 e 1º e 2º Semestre de 2016.
					Valor: U\$S 3.444.000,00	Sobre o Processo Licitatório: O início do acolhimento das propostas será a partir do dia 26/02/2016 e a data de abertura das propostas, bem como, o início de disputa de preços ocorrerá no dia 09/03/2016 às 8h30min.

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 1º Semestre de 2016

Nº	Setorial	Responsável	Tema	Indicador	Metas/Valor US\$	Status
5	SEPLAG	José Freitas	Redução da Pobreza	DLI6: Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	55% Valor: US\$ 3.444.000,00	Foram realizadas duas atividades, a saber: 1) composição da Equipe, constante de 03. 2) fixação de Cronograma de Atividades: a) primeira quinzena de março - Levantamento dos Projetos e Análise Preliminar dos mesmos junto às Setoriais envolvidas; b) segunda quinzena de março: Agendamento e realização das primeiras Oficinas.



INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 1º Semestre de 2016

Nº	Setorial	Responsável	Tema	Indicador	Metas/Valor US\$	Status
6	SRH	Carlos Campelo	Sustentabilidade Ambiental	DLI 7: Estabelecimento do Comitê multisetorial de Segurança da Água.	<p>Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas</p> <hr/> <p>Valor: U\$S 3.444.000,00</p>	A SRH já realizou uma reunião esse ano (26/01) e está com a ata para ser aprovada na próxima (01/03), estando a terceira proposta para 07 de junho, quando espera-se aprovar a ata da segunda reunião, e assim, como duas atas devidamente aprovadas, a meta do Projeto será alcançada.



INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 1º Semestre de 2016

Nº	Setorial	Responsável	Tema	Indicador	Metas/Valor US\$	Status
7	CAGECE	Carlos Rossas	Sustentabilidade Ambiental	DLI Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	85.2% Valor: US\$ 3.444.000,00	86,15% (As metas do Projeto já foram atingidas conforme Relatório de Auditoria do Projeto.)

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

Nº	Setorial	Responsável	Tema	Indicador	Metas/Valor US\$	Status
8	SEMA/SEMACE/ COGERH	Maria Dias	Sustentabilidade Ambiental	DLI 9: Índice de qualidade de fiscalização ambiental.	65%	62,79% (referente a 31/01/16)
					Valor: U\$S 3.444.000,00	

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 1º Semestre de 2016

Nº	Setorial	Responsável	Tema	Indicador	Metas/Valor US\$	Status	
9	SEPLAG	Avilton Júnior	Gestão Pública	DLI11:Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos	2014.2		Conforme o cronograma de execução das atividades do projeto junto à empresa Macroplan, a primeira meta deste indicador, relativa à aprovação do modelo de GPR, com modelo de incentivos, será alcançada na segunda quinzena do mês de maio. E a segunda meta, uma secretaria utilizando o modelo de GPR, com modelo de incentivos, será alcançada em julho.
					Aprovação do Modelo para alinhamento dos Incentivos	\$6.198.000,00	
					2015.1		
					1 Secretaria	\$ 2.744.444,00	
					2015.2		
					2 Secretarias	\$ 3.403.750,00	
					2016.1		
3 Secretarias	\$ 3.444.000,00						

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 1º Semestre de 2016

Nº	Setorial	Responsável	Tema	Indicador	Metas/Valor US\$	Status
10	SEPLAG	Adauto Oliveira	Gestão Pública	DLI12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada	2014.2	O Consórcio Macroplan/Transplan entregou no dia 25/02/16 o Produto 2 do contrato - Diagnóstico e análise da Sistemática de Planejamento. O 3º produto é a Metodologia de Investimentos a qual após aprovada possibilitará o cumprimento da 1ª meta do indicador.
					Aprovação da Metodologia	
					Valor: US\$ 6.198.000,00	
					2016.1	
					5% dos Projetos	
					Valor: \$ 3.444.000,00	





3.3. Indicadores Secundários 2016.2

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2016

n°	Setorial Responsável	N°	Indicadores	Metas 2016	
				1°Semestre	2°Semestre
1	IPECE	1	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	-	30.300
2	SEPLAG	2	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	-	Outras duas resoluções publicadas
3	STDS	3	Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada	-	15%
4	COGERH	4	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	-	Plano adotado e em fase de implantação
		5	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	-	Divulgação da lei
		6	Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	-	65.9
5	SEMA	7	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	-	Implementação e monitoramento
Total de Indicadores Secundários: 7 Indicadores					

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

Nº	Setorial	Responsável	Tema	Nome do Indicador	Metas 2ª semestre	Status
1	IPECE	Victor Hugo	Crescimento Econômico	PDO1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	30.300	As informações da RAIS ainda não foram disponibilizadas.



INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

Nº	Setorial	Responsável	Tema	Nome do Indicador	Metas 2ª semestre	Status
2	STDS	Sebastião Lopes	Redução da Pobreza	PDO2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.	5%	Este Indicador será substituído. Aguardando a STDS enviar retorno sobre a proposta do Banco.

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

Nº	Setorial	Responsável	Tema	Nome do Indicador	Metas 2ª semestre	Status
3	COGERH	Denilson Fidelis	Sustentabilidade Ambiental	PDO3:Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	65,9	72,6 (IQARce: 4,50 – Criticamente degradado a poluído)

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

Nº	Setorial	Responsável	Tema	Nome do Indicador	Metas 2ª semestre	Status
4	SEPLAG	Lara Maria Silva Costa	Redução da Pobreza	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	Outras duas resoluções publicadas	O reinício das atividades do Comitê ocorrerá apenas na segunda semana de março, conforme agenda definida com a Primeira-dama do Estado, presidente do CPDI.



INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

Nº	Setorial	Responsável	Tema	Nome do Indicador	Metas 2ª semestre	Status
5	COGERH	Zulene Almada	Sustentabilidade Ambiental	Apresentação de planos de segurança água para bacias hidrográficas estratégicas.	de de de três Plano adotado e em fase de implantação	A Setorial enviou uma Nota Técnica informando ao Banco o não cumprimento da meta de 2015.2 e solicitando a revisão das metas posteriores. Sobre o processo licitatório: O prazo foi prorrogado em função de solicitações das consultoras da lista curta, passando para o dia 29/02/16.






INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

Nº	Setorial	Responsável	Tema	Nome do Indicador	Metas 2ª semestre	Status
6	COGERH	Inah Abreu	Sustentabilidade Ambiental	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	Divulgação da lei	Aguando retorno do Banco Mundial quanto a NT enviada para análise. Aguardando agendamento e inclusão da pauta (apresentação do projeto).

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

Nº	Setorial	Responsável	Tema	Nome do Indicador	Metas 2ª semestre	Status
7	SEMA	Marias Dias	Sustentabilidade Ambiental	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	Implementação e monitoramento	O Projeto de Lei estava na PGE, e foi encaminhado dia 16/02/16 para a SEMA para ajustes. Dia 18/02/16 ele voltou para PGE para em seguida ser encaminhado ao Governador e de lá para a Assembleia.

Legenda:

-  Probabilidade alta de atingir a meta
-  Probabilidade intermediária de atingir a meta
-  Probabilidade baixa de atingir a meta



3.4. Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental

Posição do Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental- PforR

Risco	Descrição da Ação	Responsável	Indicador	Posição
1	A. Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar	STDS - Sebastião Lopes com SEDUC, e Gabinete do Governador	Aumento do número de crianças indígenas e quilombolas atendidas em creches ou recebem atenção domiciliar (proporcional às metas gerais do projeto).	O início das atividades ocorrerá em 2016 seguindo o cronograma da SEDUC.
	B. Inclusão de um módulo de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas de ensino) no programa de treinamento de professores dos cursos de capacitação profissional	SEDUC e Gabinete do Governador	Módulo desenvolvido em colaboração com a FUNAI, Associações Quilombolas e Coordenadoria para a Igualdade Racial.	Durante os meses de dezembro/2015 e janeiro/2016, serão realizados encontros regionais com lideranças indígenas para discutir o currículo das escolas. Durante esses encontros, serão apresentadas novamente as etapas da formação e a proposta de finalização da mesma.

Posição do Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental - PforR

	Descrição da Ação	Responsável	Período	Indicador	Posição
2	<p>C. Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).</p>	SEDUC	Durante o primeiro ano	Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.	A PGE e a SEDUC ainda estão finalizando o processo de busca por informações sobre os métodos de aquisição dos terrenos que foram doados pelas prefeituras.
<p>D. Exclusão das áreas em que a execução das obras civis venha a requerer o reassentamento involuntário ou a relocação de famílias (com ou sem título de propriedade)</p>					

Posição do Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental- PforR

Descrição da Ação	Responsável	Indicador	Posição
<p>E. Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água</p>	<p>COGERH e SEMA, SRH (em consulta junto à FUNAI)</p>	<p>Os planos de segurança hídrica para as três microbacias estratégicas incluem medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (definidas em consulta junto às comunidades afetadas – inclusive os povos indígenas). Documentar de maneira efetiva o apoio da comunidade indígena à sua elaboração.</p>	<p>Sobre o processo licitatório após a apreciação, validação, impressão e assinatura, foi enviado à CEL-04, o Edital da SDP. O prazo para as empresas - da lista curta - entregarem as propostas (técnica e financeira) é 17/02/2016. O TOR do Plano contempla a ação para a mitigação deste risco.</p>
<p>F. Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água</p>	<p>SEMA, SEMACE, CAGECE, COGERH, SRH</p>	<p>Campanha de comunicação estabelecida e sob execução.</p>	<p>Em reunião com o BM e a Casa Civil foi apresentada a campanha publicitária que foca na conscientização no uso da água, mas ficou acordado que o Gunars irá avaliar o cumprimento da Meta em Janeiro de 2016 quando ocorrerá a implantação da 4ª fase da Campanha de Comunicação que trata do tema Qualidade da água de maneira mais direta.</p>

Pendências do Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental-PforR

Descrição da Ação	Responsável	Prazo	Posição
<p>1 A. Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar.</p>	STDS	1 Semestre de 2016	Em janeiro de 2016 houve a primeira Reunião com as principais lideranças das comunidades indígenas e quilombolas e representantes do governo e sociedade civil para apresentação das ações realizadas pela STDS e SEDUC no âmbito do Projeto, bem como para a apreciação e aprovação dos materiais utilizados nas capacitações e acompanhamentos às famílias.
<p>2 C. Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terras dependentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).</p>	SEDUC	1 Semestre de 2016	O Relatório Final está em elaboração pela SEDUC e pela PGE.
<p>3 F. Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água.</p>	SEMA	Janeiro de 2016	A Casa Civil informou que em Janeiro iria lançar a 3º fase da campanha sobre a água. A referida campanha será analisada pelo Especialista Gunars.



3.5. Programas *PforR*

Posição dos Programas

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Posição 31 de janeiro de 2016																	
Programa	Setorial	Iniciativa	PREVISÃO (R\$ milhões)					EXECUÇÃO (R\$ milhões)				EXECUÇÃO/PREVISÃO (%)					
			2014-2017	2014 (A)	2015 (B)	2016 (C)	Acumulado (D)	2014 (E)	2015 (F)	2016 (G)	Acumulado 2014/2015 (H)	2016 (G)/(C)	Acumulado (H)/(D)	Farol (H)/(D)			
Capacitação Profissional																	
1	014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional	SEDUC ¹	1	00328	327,53	132,40	138,58	0,00	270,98	121,58	134,16	0,00	255,73	0,0%	94,4%		
			2	00771	368,90	168,02	71,03	0,00	239,05	77,26	55,88	0,00	133,14	0,0%	55,7%		
			3	00834	126,28	36,66	33,97	0,00	70,63	30,06	29,95	0,00	60,01	0,0%	85,0%		
	Total				822,71	337,08	243,58	0,00	580,66	228,90	219,98	0,00	448,88	0,0%	77,3%		
Assistência à Família																	
2	050 - Assistência Social	STDS ²	4	03180	34,57	7,30	7,30	0,00	14,60	7,21	7,24	0,00	14,45	0,0%	99,0%		
Qualidade da Água																	
3	041 - Gestão dos Recursos Hídricos	SRH / COGERH ³	5	05273	0,46	0,46	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,46	0,0%	100,0%		
4	032 - Saneamento Ambiental	CIDADES/ CAGECE	6	05384	15,83	5,65	0,20	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
5	082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais	SEMA ⁴	7	03104	15,12	0,00	2,59	0,00	2,59	0,39	1,11	0,00	1,50	0,0%	58,0%		
			8	04815	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,02	0,00	0,00	0,52	0,0%	103,4%	
			9	02840	0,62	0,62	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,0%	100,0%	
			10	02466 ⁶	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,0%	100,0%	
6	500 - Gestão e Manutenção do CONPAM e vinculada	SEMACE	11	05170 ⁶	9,47	2,75	1,92	0,00	4,67	1,97	1,34	0,00	3,31	0,0%	70,9%		
			12	00001 ⁷	2,56	1,29	1,01	0,00	2,30	1,52	1,68	0,00	3,20	0,0%	139,0%		
Total				44,58	11,27	5,74	0,00	17,01	5,45	4,17	0,00	9,62	0,0%	56,58%			
7	079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará	FUNCEME ⁸	13	02846 ⁹	7,16	1,79	1,79	0,00	3,58	1,80	2,27	0,00	4,08	0,0%	113,9%		
			14	02847	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,09	0,11	0,00	0,20	0,0%	222,0%		
	Total				7,25	1,79	1,88	0,00	3,67	1,89	2,38	0,00	4,28	0,0%	116,52%		
Total			14		909,11	357,44	258,50	0,00	615,94	243,46	233,78	0,00	477,23	0,00%	77,48%		

Legenda dos faróis

80% a 100% de execução
 51% a 79% de execução
 0% a 50% de execução

Posição dos Programas

Execução com Detalhe de Restos a Pagar até 31.01.2016					
Setorial	Previsão	Execução	RPP	Total	%
CAGECE	R\$ 0,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
SEDUC	R\$ 243,58	R\$ 182,94	R\$ 37,60	R\$ 220,54	91%
STDS	R\$ 7,30	R\$ 7,20	R\$ 0,04	R\$ 7,24	99%
SEMA	R\$ 2,59	R\$ 1,11	R\$ -	R\$ 1,11	43%
SEMACE	R\$ 2,95	2,04	R\$ 1,01	R\$ 3,06	104%
FUNCEME	R\$ 1,88	1,97	R\$ 0,41	R\$ 2,38	127%

Execução Acumulada Projeto até 31.01.2016		
Meta 2014-2017	R\$ 909,11	100%
Executado 2014	R\$ 243,46	27%
Executado 2015	R\$ 233,78	26%
Total Executado	R\$ 477,23	52%
2016-2017	R\$ 431,88	48%

O Estado do Ceará tem suas atividades financeiras retomadas somente em meados de janeiro. Isso acontece devido aos ajustes técnicos por conta da virada de cada ano e também por conta da Lei Orçamentária somente estar disponível após a aprovação da Assembleia Legislativa, que se dá também no mesmo período.

Posição dos Programas

✓ **Lembrete:** Regras Programas

A execução dos programas deve observar as seguintes restrições:


- Devem excluir despesas que são financiadas pelo próprio BIRD ou por outras operações de crédito, ou seja, não é permitido a alocação de recursos do BIRD ou outras operações de crédito para custear despesas dos programas e iniciativas do componente
- Verificar a lista negra do BIRD a cada licitação, antes de assinar contrato. Para atender o Art. 42 da Lei 8.666/93 a SEPLAG incluiu no orçamento de cada ação um valor na fonte 69;
- Não podem apresentar impacto sócio ambiental negativo;
- Os valores dos contratos não podem exceder os limites abaixo:
 - Obras = US\$ 50 milhões
 - Bens = US\$ 30 milhões
 - Sistemas de TIC = US\$ 20 milhões
 - Consultorias = US\$ 15 milhões.



3.6. Assistência Técnica - Estatísticas

Execução Subprojetos de AT em Relação ao Plano de Licitação

68% dos subprojetos em Atraso em Relação ao Plano de Licitação

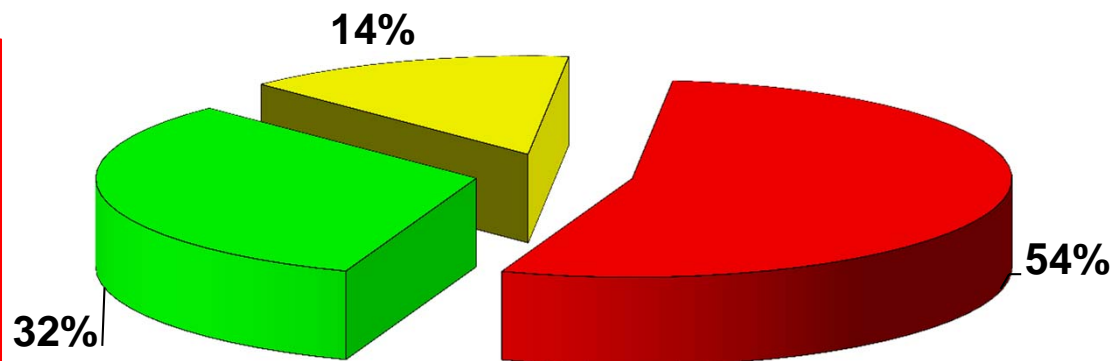

- Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
- Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia
- Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses


78	25	Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações	CGE(02,09,10,11); IPECE(14,15,16,17); SEDE(23); SEMA(48); FUNCEME(13); SEDUC(32,33,36,37,38); COGERH(68,70); TCE(77,78); SEPLAG(57,58); STDS (71,72) SRH(67);
	11	Amarelo - Realização do projeto com atraso de 01 a 90 dias	CGE(06,12); IPECE(19); SDE(24); SECITECE(25); SEDUC(35); SEMA(53); SRH(64,65,66); STDS(74);
	42	Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 90 dias	ARCE(01); CGE(03,04,05,07,08); IPECE(18,20); PGE(21); SDE(22); SECITECE(26,27); SEMA(46,47,49,50,51,52); SEMACE(54,55); SEDUC(28,29,30,31,34,39,40,41,42,43,44,45); COGERH(69); TCE(76); SEPLAG(56,59,60,61,62,63); STDS(73,75).

Execução dos Subprojetos de AT por Setorial


ARCE (01)




SDE (03)

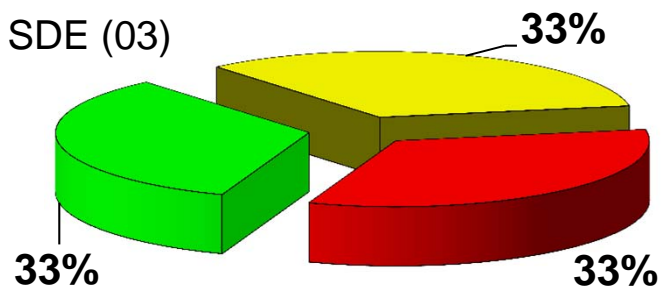

SEMA (08)

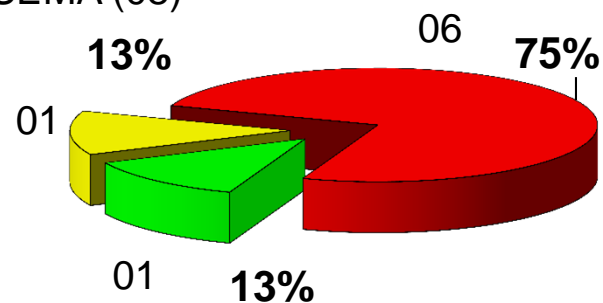


FUNCEME (01)



SEMACE (02)




SEDUC (18)

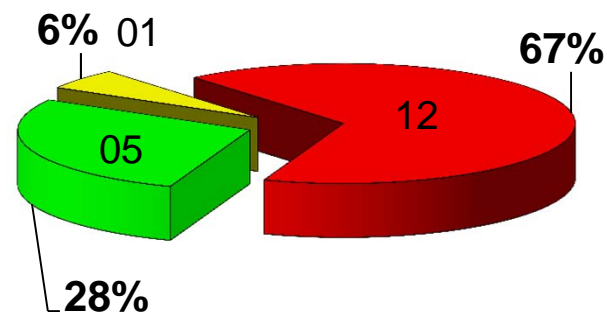


- Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
- Amarelo - Realização do projeto com atraso de 01 a 90 dias
- Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 90 dias

Execução dos Subprojetos de AT por Setorial


COGERH (03)




TCE (03)




SRH (04)




CGE (11)

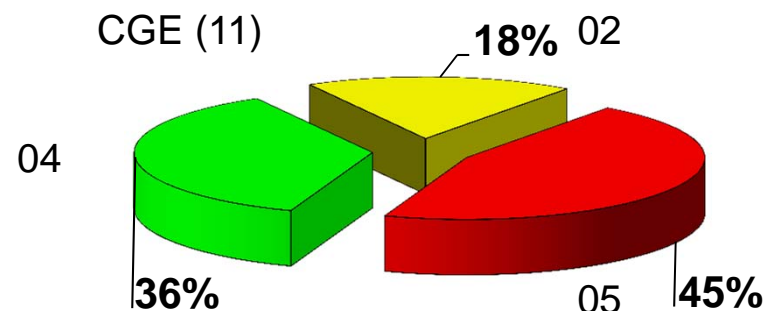

IPECE (07)

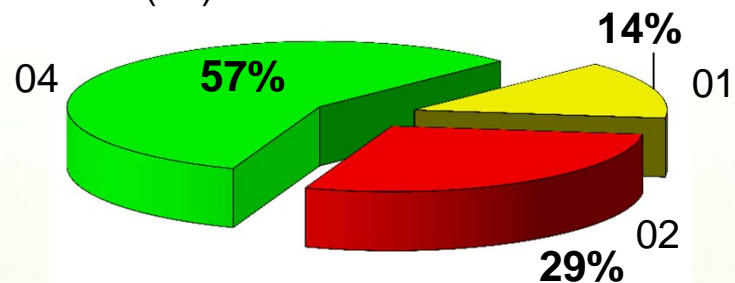


PGE (01)




- Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
- Amarelo - Realização do projeto com atraso de 01 a 90 dias
- Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 90 dias

Execução dos Subprojetos de AT por Setorial


SEPLAG (08)

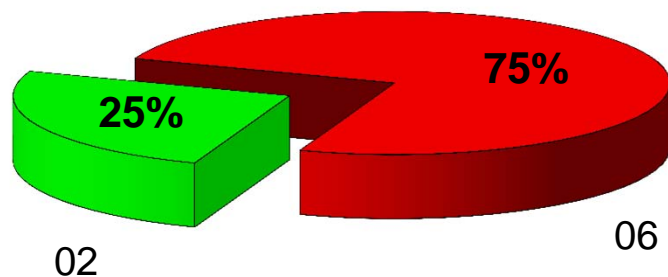

STDS (05)

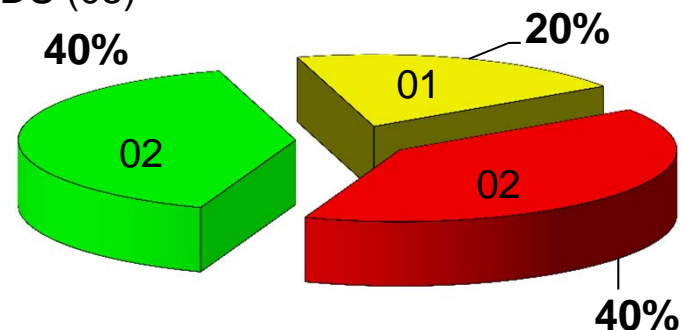


SECITECE (03)




- Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
- Amarelo - Realização do projeto com atraso de 01 a 90 dias
- Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 90 dias

Histórico da Execução Subprojetos de AT em Relação ao Plano

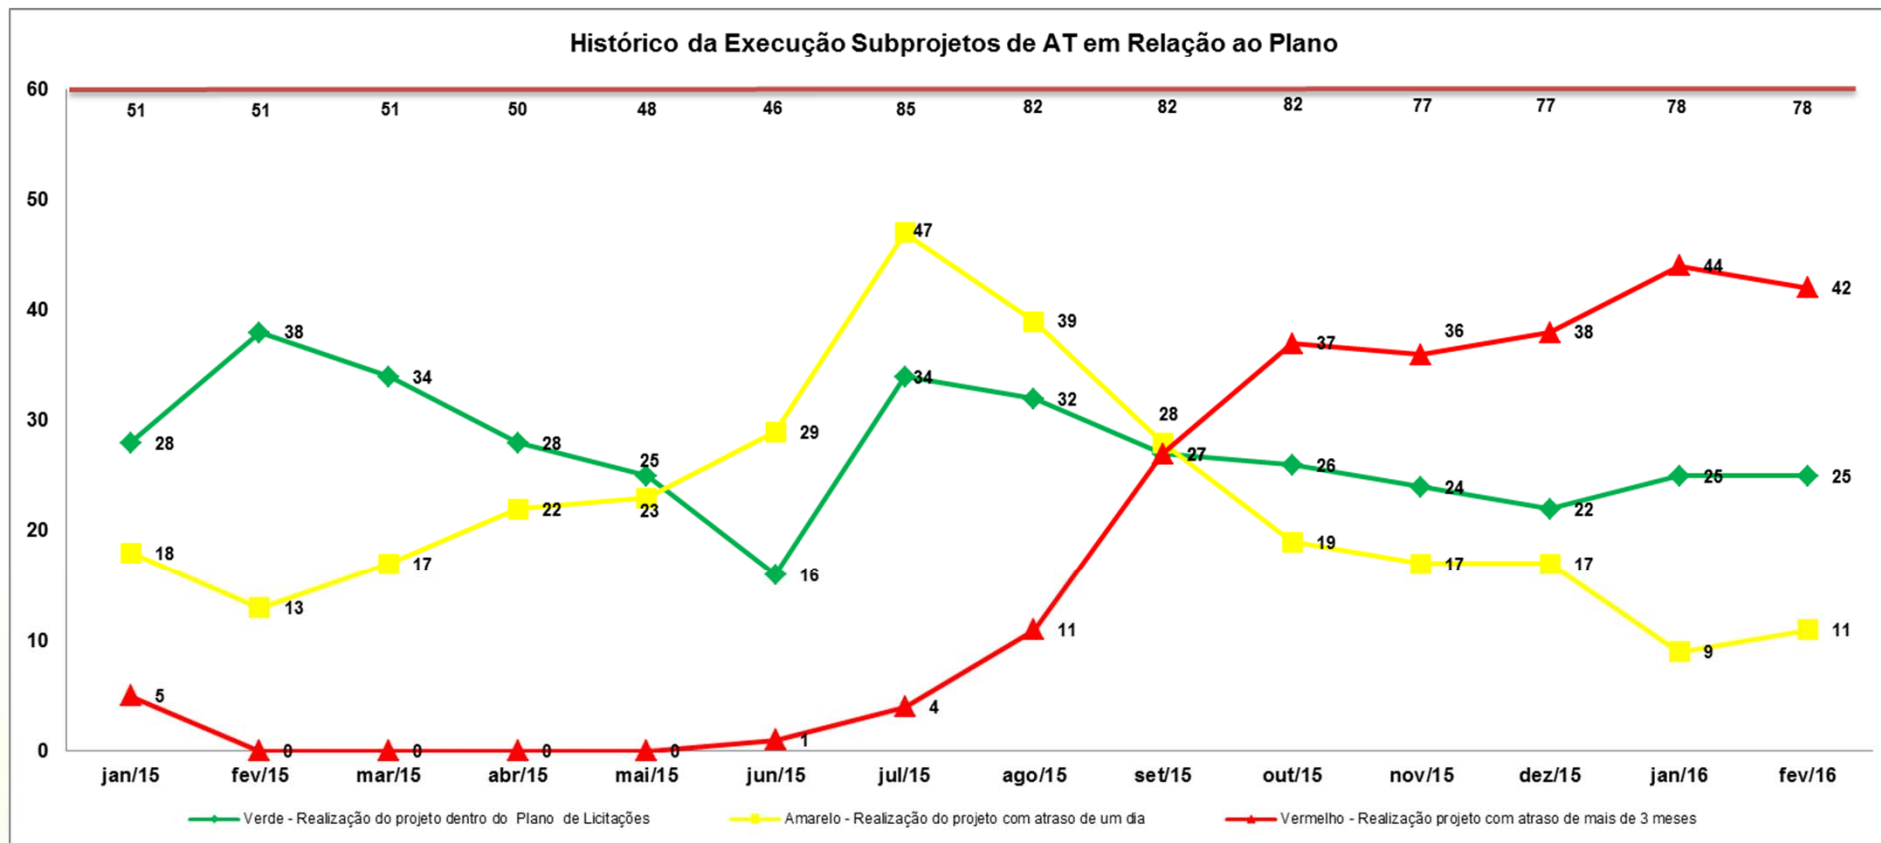


Execução dos Subprojetos de AT por Atividade

26% dos Subprojetos estão em Atividades Preparatórias

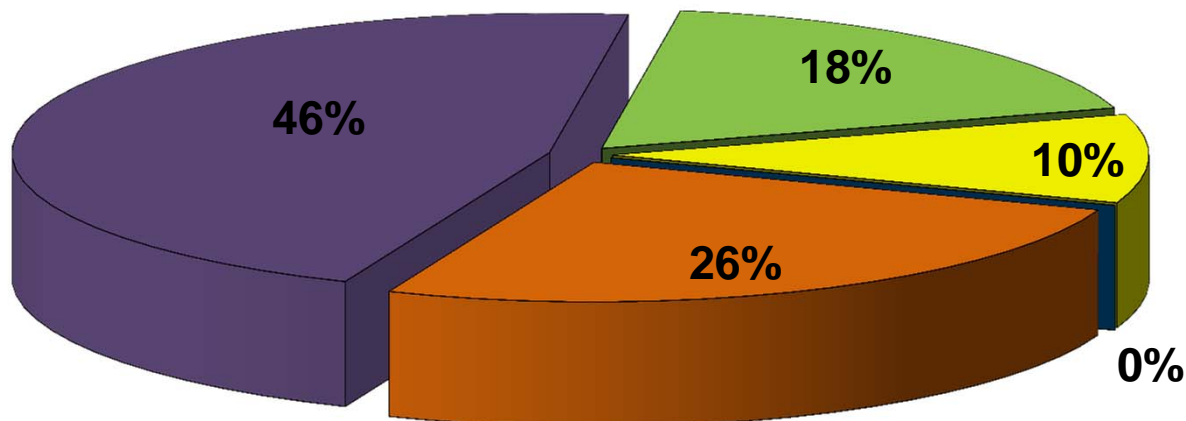


78	00	Atividades não iniciadas conforme Plano de Licitação	-
	20	Preparatórias	CGE(06,09,10,12); IPECE(18,19); SDE(24); SECITECE(25); SEDUC(29,30,31,34,41,42,43); SEMA(53); SEPLAG(56,61); SRH(66); STDS(74).
	36	Em Licitação	ARCE(01); CGE(03,04,05,07,08); IPECE(20); PGE(21); SDE(22); SECITECE(26,27); SEDUC(28,35,39,40,44,45); SEMA(46,47,49,50,51,52); SEMACE(54,55); SEPLAG(59,60,62,63); SRH(64,65,67); COGERH(69); STDS(73,75); TCE(76).
	14	Em Execução	CGE(02,11); FUNCEME(13); IPECE(14,16,17); SEDUC(36); SEMA(48); SEPLAG(57,58); COGERH(68); STDS(71,72); TCE(77).
	08	Concluídas	IPECE(15); SDE(23); SEDUC(32,33,37,38); COHERH(70); TCE(78).

Histórico da Execução dos Subprojetos de AT por Atividade

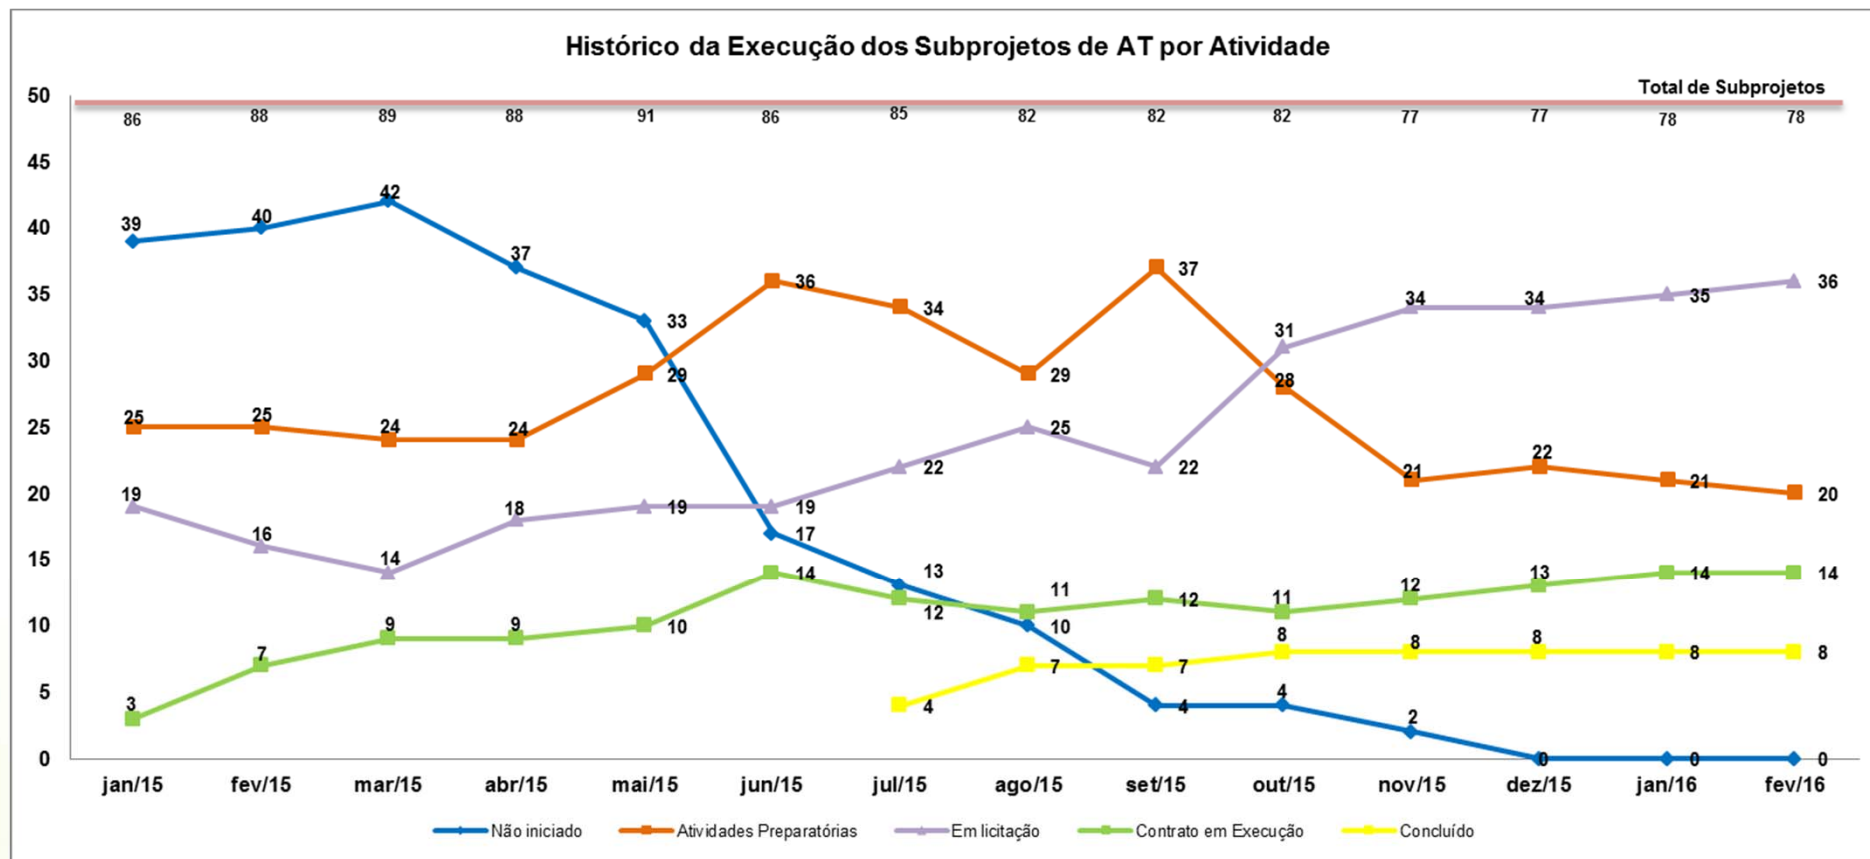

Subprojetos Com Atividades Iniciadas por Etapa

74% dos Subprojetos em Licitação

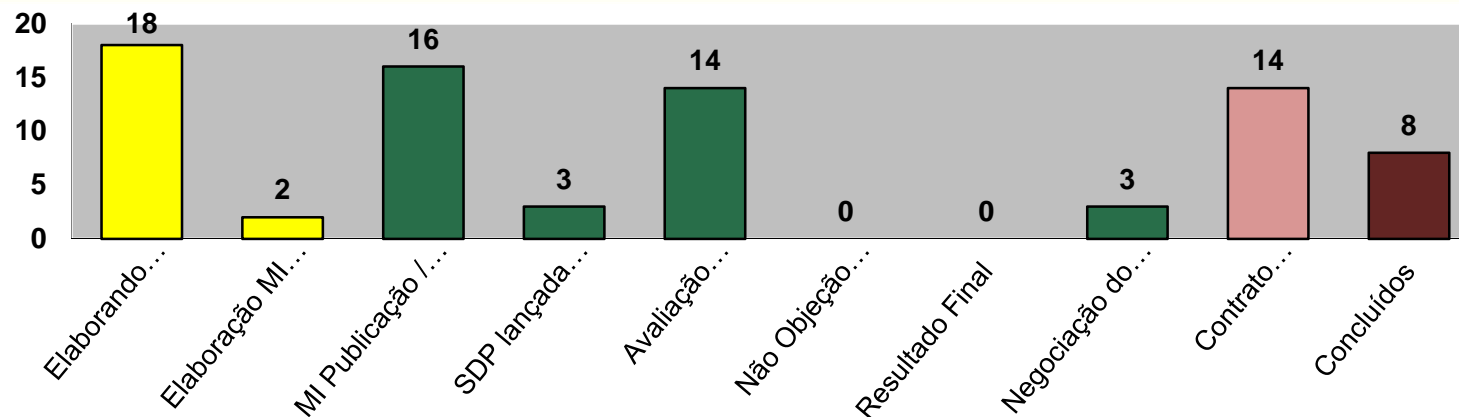


Etapas		Setoriais	
78	18	Elaborando TOR e No Objeção do TDR	CGE(06,09,10,12); IPECE(19); SDE(24); SECITECE(25); SEDUC(29,30,31,34,42,43); SEMA (53); SEPLAG(56,61); SRH(66); STDS(74);
	2	Elaboração MI / Edital	IPECE (18); SEDUC (41);
	16	MI Publicação / Recebimento Portfólios ou Currículos / Preparação Lista Curta / Elaborando SDP	CGE(04,05,07,08); IPECE(20); SECITECE(26); SEDUC(28,35,45); SEMA(50); SEMACE(54); SEPLAG(62); SRH(64,67); STDS(73); TCE(76);
	3	SDP / Edital lançada (Aguardando Propostas)	SRH (65); COGERH (69); STDS (75);
	14	Avaliação Propostas / Currículos (Técnicos e Financeiros)	CGE(03); PGE(21); SDE(22); SECITECE(27); SEDUC(40,44); SEMA(46;49, 51,52); SEMACE(55); SEPLAG (59,60,63);
	0	Não Objeção do BM à RFLC/SDP/Avaliação Técnica/Curricular	-
	0	Resultado Final	
	3	Negociação do contrato	ARCE (01); SEDUC (39); SEMA (47);
	14	Contrato assinado / Prestando Serviço	CGE(02,11); FUNCEME(13); IPECE(14,16,17); SEDUC(36); SEMA(48); SEPLAG(57,58); COGERH(68); STDS(71,72); TCE(77);
	8	Concluídos	IPECE(15); SDE(23); SEDUC(32,33,37,38); COGERH(70); TCE(78).

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais

Sumário dos valores dos Projetos de Assistência Técnica em 20/01/16		
Projetos com contratos Finalizados	8	\$ 219.845,01
Projetos com contratos em Execução	14	\$ 3.670.633,81
Projetos em fase de Licitação (MI publicada)	35	\$ 13.991.524,12
Projetos Iniciados (TDR e MC remetidos a UGP)	15	\$ 5.539.759,14
Projetos ainda não iniciados	0	\$ -
Projetos de Aquisições	6	\$ 1.948.437,02
Total (A)	78	\$ 25.370.199,09

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais

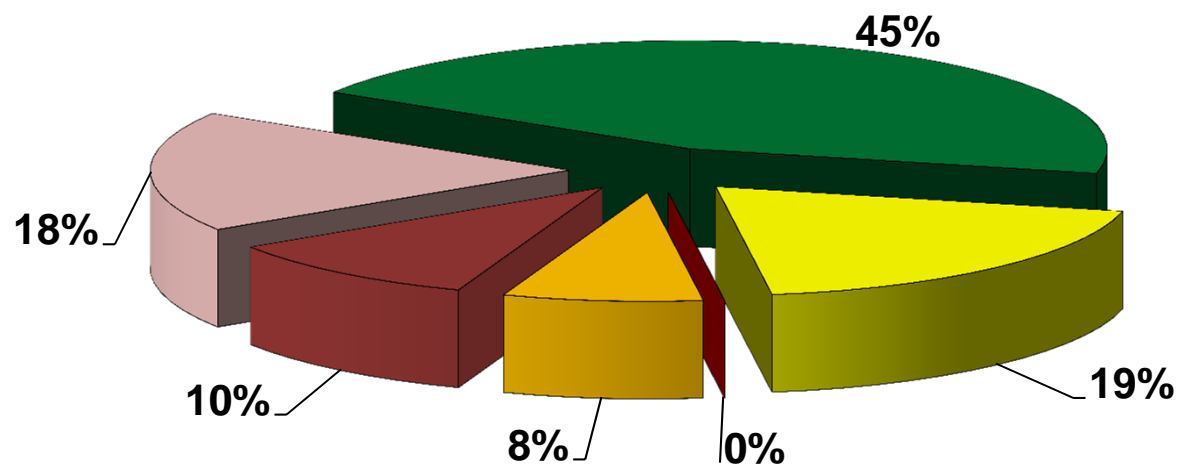

Critérios	Sub Projetos		Setoriais
	Quat.	%	
Projetos com contratos Finalizados	8	10%	IPECE(15); SDE(23); SEDUC(32,33,37,38); COHERH(70); TCE(78).
Projetos com contratos em Execução	14	18%	CGE(02,11); FUNCEME(13); IPECE(14,16,17); SEDUC(36); SEMA(48); SEPLAG(57,58); COGERH(68); STDS(71,72); TCE(77).
Projetos em fase de Licitação (MI publicada)	35	45%	ARCE(01); CGE(03,04,05,07,08); IPECE(20); PGE(21); SDE(22); SECITECE (26,27); SEDUC(28,35,39,40,44,45); SEMA(46,47,49,50,51,52); SEMACE(54,55); SEPLAG(59,60,62,63); SRH(64,65,67); COGERH(69); STDS(73); TCE(76);
Projetos Iniciados (TDR e MC remetidos a UGP)	15	19%	CGE(06,09,10); IPECE(18); SECITECE(25); SEDUC(29,30,31,34,41,42,43); SEPLAG(56,61); STDS(75).
Projetos ainda não iniciados	0	0%	-
Projetos de Aquisições	6	8%	CGE(12); IPECE(19); SDE(24); SEMA(53); SRH(66); STDS(74).
TOTAL	78	100%	



3.7 Projetos de Assistência Técnica por Setorial





CGE

Assistência Técnica – Gestão Pública

Projeto 2: Auditoria Técnica dos Indicadores

Subprojeto 2: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 89.192,29
- **Valor do TOR:** US\$ 14.253,09
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2016 – Março 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução
- **Estágio Atual:** Aguardando o cadastramento do Contrato no Sistema Licitaweb e posterior publicação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 3: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais

Subprojeto 3: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC) do Poder Executivo do Estado do Ceará

- **Responsável:** Marcelo Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 858,990,05
- **Valor do TOR:** US\$ 208.231,31
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Setembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** UGP remeteu o Relatório de Avaliação Técnica após análise a CGE, após análise em 19/02/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Gestão Financeira

Projeto 3: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais

Subprojeto 4: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle.

- **Responsável:** Carlos Jorge Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 858,990,05
- **Valor do TOR:** US\$ 650.758,73
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Março 2017
- **Estágio Previsto:** Convite à Empresa Vencedora para Negociação.
- **Estágio Atual:** UGP encaminhou o Relatório Final da Lista Curta, TDR, MC e Solicitação das Propostas analisados a CGE, após análise, com previsão de envio a UGP ____?
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Gestão Financeira

Projeto 4: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social

Subprojeto 5: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 1.312.431,32
- **Valor do TOR:** US\$ 962.431,32
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015– Abril 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Setorial está realinhando o TDR e MC. O Relatório Final da Lista Curta remetido a CGE após análise em 16/02/2016. Com previsão do envio a UGP em ____?
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Gestão Financeira

Projeto 4: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social

Subprojeto 6: Capacitação da população para o Controle Social

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 1.312.431,32
- **Valor do TOR:** US\$ 350.000,00
- **Método de Aquisição:** LPN
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- **Estágio Atual:** UGP encaminhou a CGE em 11/01/16, TDR e MC para ajustes e análise da setorial e posterior envio ao BM para 'não objeção'. Reunião agendada no dia 24/02/2016, com a Casa Civil para discursão acerca do projeto.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- **Sinalização em relação ao Status:**

Assistência Técnica - Gestão Pública

Projeto 5: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.

Subprojeto 7: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na “Detecção de Casos de Fraude e Corrupção” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.

- **Responsável:** Denise Andrade Araújo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 142.735,64
- **Valor do TOR:** US\$ 142.735,64
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Fevereiro de 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Recebido a ‘não objeção’ do BM da SDP. Encaminhado o Relatório Final da Lista Curta para PGE / Cel04 em 13/01/2016, para encerramento da 1ª fase. Setorial instruindo o processo de SDP nº 0196345/2016 (2ª fase).
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Gestão Financeira

Projeto 6: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Subprojeto 8: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamentos com foco no “Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos do processo de convergência das Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público (IPSAS).

- **Responsável:** Marcelo Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor do Projeto:** US\$ 149.148,18
- **Valor do TOR:** US\$ 149.148,18
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** O RFLC enviado para PGE para encerrar a 1ª fase em 13/01/2016. Processo de SDP nº 0458846/2016, sendo instruído pela setorial.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Gestão Pública

Projeto 7: Ouvidoria Ativa

Subprojeto 9: Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO).

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:**
- **Valor do Projeto:** US\$ 715.186,01
- **Valor do TOR:** US\$ 64.572,29
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2016 – Fevereiro 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TOR.
- **Estágio Atual:** Recebido a “não objeção” do BM em 17/02/2016, para o TDR e MC.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Gestão Pública

Projeto 7: Ouvidoria Ativa



Subprojeto 10: Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:**
- **Valor do Projeto:** US\$ 715.186,01
- **Valor do TOR:** US\$ 650.613,72
- **Método de Aquisição:** LPN
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2016 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TOR.
- **Estágio Atual:** TDR e MC em fase de ajuste na CGE, após análise da UGP em 02/02/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Gestão Pública

Projeto 8: Gestão Documental.



Subprojeto 11: Contratação de consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.

- **Responsável:** Aglaio Soares
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 24.411,82
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Março de 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Serviços em execução.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Gestão Financeira

Projeto 9: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria

Subprojeto 12: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria.

- **Responsável:** Carlos Jorge Freitas
- **Categoria de Licitação:** Serviço de Não consultoria
- **Valor do Projeto:** US\$ 191.250,00
- **Método de Aquisição:** Pregão eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Janeiro de 2016
- **Estágio Previsto:** Assinatura do Contrato.
- **Estágio Atual:** Setorial elaborando as Especificações Técnicas.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 





IPECE

Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Projeto 11: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

Subprojeto 14: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.
CONSULTORES PLENOS

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 500.000,36
- **Valor do TOR:** US\$ 307.181,18
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Projeto 11: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.



Subprojeto 15: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTOR JÚNIOR

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 500.000,36
- **Valor do TOR:** US\$ 21.227,67
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** CONTRATO CONCLUÍDO E PAGO.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Projeto 11: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

*Subprojeto 16: Contratação de 03 (três) **Analistas em Licitações** para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 500.000,36
- **Valor do TOR:** US\$ 171.591,51
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contratos assinados em 17/07/2015 e 16/11/2015. Prestando serviços na UGP.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Projeto 12: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.



*Subprojeto 17: Contratação de Consultor Individual especializado em **Políticas Públicas** para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução a Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.*

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor do Projeto:** US\$ 109.139,93
- **Valor do TOR:** US\$ 109.139,93
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévio
- **Início/Término:** Julho 2015 – Janeiro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 10/2015 publicado em 18/09/2015. Serviços em execução.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Assistência à Família

Projeto 13: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.



Subprojeto 18: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.

- **Responsável:** Mário Aragão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 1.105.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2015 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** O Processo nº. 0335035/2016, referente a Manifestação de Interesse encontra-se na PGE para análise e validação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Projeto 14: Modernização Institucional do IPECE

Subprojeto 19: Modernização Institucional do IPECE

- **Responsável:** Deusimar Lira
- **Categoria de Licitação:** Serviço de Não consultoria
- **Valor do Projeto:** US\$ 195.000,00
- **Método de Aquisição:** NCB
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Assinatura do Contrato.
- **Estágio Atual:** Setorial elaborando o TdR, com previsão de envio a UGP em ____?
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Projeto 15: Metodologia para análise de impacto econômico.

Subprojeto 20: Contratação de Consultoria de Empresa para Desenvolvimento de Metodologia para análise de impacto econômico no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 364.824,94
- **Valor do TOR:** US\$ 364.824,94
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Não Objeção do BM ao contrato rubricado.
- **Estágio Atual:** Aviso da manifestação de Interesse validada em 17/02/2016, com data limite de recebimento de Portfólio até às 15:00 do dia 10/03/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 



PGE

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 16: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.

Subprojeto 21: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Valéria Rodrigues
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 384.658,38
- **Valor do TOR:** US\$ 384.658,38
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2015 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Setorial está finalizando o Relatório de Avaliação Técnica, com previsão de envio a UGP em 04/03/2016 , após contato em 23/02/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 



SECITECE

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 18: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.

Subprojeto 25: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.

- **Responsável:** Sandra Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 210.156,98
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Não Objeção do Banco Mundial.
- **Estágio Atual:** TDR encaminhado pela SECITECE para análise da UGP em 11/02/2016, após comentários do BM em 10/02/2006.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- **Sinalização em relação ao Status:**

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 19: Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

Subprojeto 26: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Sandra Monteiro / Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 172.166,03
- **Valor do TOR:** US\$ 172.166,03
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Setorial finalizando o RFLC. Solicitando uma reunião entre a SECITECE e UGP para orientações. Data ____?
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 20: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

Subprojeto 27: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

- **Responsável:** Sandra Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 33.678,47
- **Valor do TOR:** US\$ 33.678,47
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Março 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato execução.
- **Estágio Atual:** SECITECE informou que remeterá o Relatório de Avaliação Curricular a PGE no dia 26/02/2016, após contato em 24/02/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 





SEPLAG

Assistência Técnica – Gestão Pública

Projeto 33: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.

Subprojeto 56: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Naiana informou que enviará até o dia 26/02/2016, o TDR impresso para o Secretários, após contato em 23/02/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Gestão Pública

Projeto 34: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.



Subprojeto 57: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Adauto Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 404.083,87
- **Valor do TOR:** US\$ 404.083,87
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Contrato 17/2015 - Publicado em 05/11/2015. Consórcio MACROPLAN/TRANSPLAN.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Gestão Pública

Projeto 35: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.

Subprojeto 58: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 947.848,59
- **Valor do TOR:** US\$ 947.848,59
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato 23/2015 - Publicado em 03/12/2015 - MACROPLAN.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Gestão Pública

Projeto 36: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.

Subprojeto 59: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Dominique Gomes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 446.073,87
- **Valor do TOR:** US\$ 446.073,87
- **Método de Aquisição:** SBQ
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Recebido do BM a “não-objeção” do Relatório de Avaliação Técnica em 16/02/2016. SEPLAG remeteu o Relatório a Cel04 em 24/02/2016, que dará continuidade no processo.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Gestão Pública

Projeto 37: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.

*Subprojeto 60: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para **Auditar a Folha de Pagamento** do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Fábio Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 2.113,467,61
- **Valor do TOR:** US\$ 1.089.866,72
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Maio 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** O Relatório de Avaliação Técnica em fase final de preenchimento, com previsão de término e envio a UGP até o dia 26/02/16, após contato em 24/02/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Gestão Pública

Projeto 37: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.

Subprojeto 61: Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Fábio Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 2.113,467,61
- **Valor do TOR:** 1.023.600,89
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Encaminhado o TDR, MC e justificativa a SEPLAG, após comentários do Banco Mundial em 17/02/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Fiduciário

Projeto 38: Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).

Subprojeto 62: Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado - GCOMPRAS

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 483.526,68
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** SEPLAG elaborando a Relatório Final da Lista Custa, após envio dos portfólios pela PGE/Cel04.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Fiduciário

Projeto 39: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.

Subprojeto 63: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 206.373,44
- **Valor do TOR:** US\$ 206.373,44
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** SEPLAG remeteu o Relatório de Avaliação Técnica para análise da UGP em 19/02/16.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 




STDS

Assistência Técnica - Assistência à Família

Projeto 44: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

Subprojeto 71: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 952.079,52
- **Valor do TOR:** US\$ 64.213,69
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2014 – Maio 2016.
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Assistência à Família

Projeto 44: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

Subprojeto 72: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor do Projeto:** US\$ 952.079,52
- **Valor do TOR:** US\$ 63.174,42
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2014 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Assistência à Família

Projeto 44: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

Subprojeto 73: Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PfroR

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 950.477,43
- **Valor do TOR:** US\$ 952.079,52
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2015 - Janeiro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Encaminhado o Relatório Final da Lista Curta pela STDS para análise da UGP em 05/02/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Assistência à Família

Projeto 44: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

Subprojeto 74: Aquisição de Tablets para coletar de dados a ser inserido no Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PfroR

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor do Projeto:** US\$ 952.079,52
- **Valor do TOR:** US\$ 11.177,26
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 - Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Setorial está elaborando Especificações Técnicas e Memória de Cálculo.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Assistência à Família

Projeto 44: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

Subprojeto 75: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor do Projeto:** US\$ 952.079,52
- **Valor do TOR:** US\$ 603.182,03
- **Método de Aquisição:** Pregão
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Pregão Eletrônico publicado. O início de acolhimento das propostas será a partir do dia 26/02/2016. E a Data de abertura das propostas, bem como o início de disputa de preços ocorrerá no dia 09/03/2016 às 8h30min.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 





ARCE

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 1: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.

Subprojeto 1: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.

- **Responsável:** Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 443.428,54
- **Valor TOR:** US\$ 443.428,54
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Prazo recursal encerrou-se em 15/02/16. Encontra-se atualmente na auditoria interna da PGE, com previsão de envio a ARCE em 27/02/16.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 





COGERH

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 41: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos

Subprojeto 68: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Qualiquantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 884.094,13
- **Valor do TOR:** US\$ 884.094,13
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Contrato 48/2015 , em execução - Publicado no DOE de 15/12/2015.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 42: Plano de Segurança Hídrica



Subprojeto 69: Termo de Referência para Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 707.018,10
- **Valor do TOR:** US\$ 707.018,10
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Edital de SDP enviado para as empresas em 14/01/16, com data limite de recebimento das propostas (técnica e financeira) adiada até o dia 29/02/16.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 43: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica

Subprojeto 70: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 27.326,28
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Janeiro 2016
- **Estágio Previsto:** Concluído
- **Estágio Atual:** CONTRATO CONCLUÍDO.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 



FUNCEME

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 10: Metodologia de modelagem de qualidade da água.

Subprojeto 13: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.

- **Responsável:** Francisco Hoilton
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 660.935,56
- **Proposta Vencedora:** €267.442,11 + R\$ 687.325,77 equivalente a R\$ 1.492.246,27
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Março 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução
- **Estágio Atual:** Recebido da FUNCEME em 17/09/2015, o Contrato assinado. Publicado no DOE em 16/10/15.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 





SDE / ADECE

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 17: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas

Subprojeto 22: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.

- **Responsável:** Fernando Costa / Cláudio Ferreira Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 396.053,05
- **Valor do TOR:** US\$ 340.209,03
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução
- **Estágio Atual:** RAT em fase final de preenchimento, com previsão de termino e envio a UGP até o dia 24/02/16.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- **Sinalização em relação ao Status:** 


Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 17: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas


Subprojeto 23: Impact Evaluation Workshop Instambul

- **Responsável:** Inês Studart
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Projeto:** US\$ 396.053,05
- **Valor do TOR:** US\$ 2.894,02
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Maio 2015.
- **Estágio Previsto:** Concluído
- **Estágio Atual:** **CONCLUÍDO E PAGO.** Recebido os documentos comprobatórios do curso (Certificado e Relatório de Viagem).
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 17: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas

Subprojeto 24: Aquisição de equipamentos de T.I para operacionalização dos sistema de Monitoramento.

- **Responsável:** Fernando Costa / Cláudio Ferreira Lima
- **Categoria de Licitação:** Serviço de Não Consultoria
- **Valor do Projeto:** US\$ 396.053,05
- **Valor do TOR:** US\$ 52.950,00
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Outubro 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Em fase de pesquisa de ata de registro de preços e elaboração das Especificações Técnicas.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 



SEDUC

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 21: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.



Subprojeto 28: Contratação de serviços de consultoria para avaliação de desempenho acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Marta Emília
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 330.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** SEDUC finalizará RFLC até 28/02/16. SDP será elaborada pela UGP, tão logo o RFLC seja aprovado.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 22: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.

Subprojeto 29: Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da formação continuada para gestores, professores e instrutores de educação profissional secundárias do Estado (com a inclusão da Avaliação de Desempenho Institucional).

- **Responsável:** Marta Emília
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 371.845,87
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Abril 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Submetido em 25/01/2015 a NO do Banco para MC e TdR revisados.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 23: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.

Subprojeto 30: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Coleta de Dados.

- **Responsável:** Andréa Rocha
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não Consultoria
- **Valor do Projeto:** US\$ 103.154,13
- **Valor do TOR** US\$ 50.000,00
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Abril 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** IPECE esta desenvolvendo o TDR, com estimativa de conclusão em 10/03/16.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 23: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.

Subprojeto 31: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Estatístico .

- **Responsável:** Andréa Rocha
- **Categoria de Licitação:** CI
- **Valor do Projeto:** US\$ 103.154,13
- **Valor do TOR** US\$ 50.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Abril 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Enviado BM em 22/02/16, o TDR e MC para análise e emissão da "não objeção" técnica.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 23: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.



Subprojeto 32: Impact Evaluation Workshop Istanbul

- **Responsável:** Marta Emília
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Projeto:** US\$ 103.154,13
- **Valor do TOR:** US\$ 3.154,13
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** **CONCLUÍDO E PAGO.** Recebido os documentos comprobatórios do curso (Certificado, e Relatório de Viagem).
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Assistência à Família

Projeto 24: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.



Subprojeto 33: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.

- **Responsável:** Henrique César Martins
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Projeto:** US\$ 746.306,25
- **Valor do TOR:** US\$ 4.466,03
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Julho 2015
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** CONTRATO CONCLUÍDO.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Assistência à Família

Projeto 24: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.

Subprojeto 34: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)

- **Responsável:** Henrique César Martins
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 746.306,25
- **Valor do TOR:** US\$ 21.255,20
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Recebida em 22/02/16 a "não objeção" técnica do BM quanto ao TDR e a MC. Processo de CD terá continuidade, tão logo a consultoria de empresas avance.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Assistência à Família

Projeto 24: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.

Subprojeto 35: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.

- **Responsável:** Henrique César Martins
- **Responsável:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 746.306,25
- **Valor:** do TOR US\$ 720.585,02
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Dezembro 2017
- **Estágio Previsto:** Não Objeção do BM ao contrato rubricado.
- **Estágio Atual:** Recebido BM em 22/02/16, a “não objeção” técnica. RFLC será finalizado até 01/03/16. SDP será elaborada pela UGP, tão logo o RFLC seja aprovado.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Assistência à Família

Projeto 25: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.


*Subprojeto 36: Contratação de Consultor Individual Especialista em **Avaliação de Programas para Identificar o Impacto** do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)*

- **Responsável: SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 2.117.653,10
- **Valor do Projeto:** US\$ 16.557,58
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2014 – Setembro 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato Prorrogado até o dia 11/05/2015.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Assistência à Família

Projeto 25 : PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.



*Subprojeto 37: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Henrique César Martins
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.117.653,10
- **Valor do TOR:** US\$ 25.207,85
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** CONTRATO CONCLUÍDO.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Assistência à Família

Projeto 25 : PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

*Subprojeto 38: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Henrique César Martins
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.117.653,10
- **Valor do TOR:** US\$ 29.188,04
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Concluído
- **Estágio Atual:** CONTRATO CONCLUÍDO.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica –Assistência à Família

Projeto 25 : PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

*Subprojeto 39: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de **Arte Gráfica/Design**, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- **Responsável:** Henrique César Martins
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.117.653,10
- **Valor do TOR:** US\$ 71.219,89
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Janeiro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato Homologado e assinado e encaminhado para assinatura do Secretário da SEDUC desde de 16/02/16.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica –Assistência à Família

Projeto 25 : PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 40: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- **Responsável:** Henrique César Martins
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.117.653,10
- **Valor do TOR:** US\$ 169.793,60
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** A SEDUC recebeu em 22/02/16 autorização da CEL04/PGE para a reunião de negociação com a empresa, que ocorrerá em ___.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

*ocorrido desmembramento do TdR de consultoria para 01 subprojeto: “Apoio Logístico”, serviço de não consultoria.

Assistência Técnica – Assistência à Família

Projeto 25 : PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 41: Contratação de Empresa para realizar Apoio Logístico das formações do PADIN

- **Responsável:** Henrique César Martins
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.117.653,10
- **Valor do TOR:** US\$ 486.491,39
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Enviado SEDUC em 19/02/16, email encaminhando o Edital Pregão Eletrônico e o TDR para análise da setorial. Previsão de envio a PGE para lançamento em ___.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Assistência à Família

Projeto 25 : PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 42: Contratação de consultoria individual para trabalhar as Relações Sociais.

- **Responsável:** Henrique César Martins
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.117.653,10
- **Valor do TOR:** US\$ 56.490,16
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Janeiro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** TdR e MC encontra-se na setorial para ajustes desde 12/02/16. Previsão de retorno a UGP em ____.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Assistência à Família

Projeto 25 : PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 43: Desenvolvimento e construção do kit de brinquedos usados para JAD e ADI para PADIN.

- **Responsável:** Henrique César Martins
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.117.653,10
- **Valor do TOR:** US\$ 296.550,60
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Janeiro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Recebido BM em 18/02/16, a NO Técnica para TdR e MC (08 municípios).
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Assistência à Família

Projeto 25 : PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 44: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados).

- **Responsável: SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.117.653,10
- **Valor do TOR:** US\$ 931.503,15
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior (acertada em VC realizada em 18/08/15)
- **Início/Término:** Abril 2015 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** RAT em elaboração com estimativa para conclusão em ____.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica – Assistência à Família

Projeto 25 : PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 45: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN

- **Responsável: SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.117.653,10
- **Valor do TOR:** US\$ 34.650,83
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Março 2016
- **Estágio Previsto: Contrato em Execução.**
- **Estágio Atual:** Setorial Concluindo o Relatório de Análise Curricular (RAC) dos 11 currículos, com previsão de entrega até ____.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 



SEMA

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 26: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.

Subprojeto 46: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto “AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.”

- **Responsável:** Maria Dias / Magda Marinho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 471.579,58
- **Valor do TOR:** US\$ 471.579,58
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2014 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Ata de negociação encaminhada para revisão da empresa em 18/02/16. Minuta de contrato e ata devidamente assinadas serão encaminhadas a UGP até ____.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 27 : Capacitação para o pessoal técnico municipal.

Subprojeto 47: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 358.046,80
- **Valor do TOR:** US\$ 250.777,42
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Agosto 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Aguardando assinatura do contrato do Consorcio Engesoft Engenharia - Quanta Consultoria, previsão em ___.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 27 : Capacitação para o pessoal técnico municipal.

Subprojeto 48: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 358.046,80
- **Valor do TOR:** US\$ 107.269,38
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Fevereiro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Contrato 26/2015 - Publicado em 08/12/2015 Empresa vencedora MSV Multiserviços ME (R\$ 242.557,52).
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 28: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.

Subprojeto 49: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Maria Dias / Francisco Leorne
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** 174.236,97
- **Valor do TOR:** US\$ 174.236,97
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2014 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** SEMA enviou para análise da UGP o Relatório de Avaliação Combinada em 24/02/16. Foi solicitada a Cel04 a revalidação de propostas por igual período.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 29: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.

Subprojeto 50: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Maria Dias / Monica Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 224.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 224.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Setorial elaborando RFLC com previsão de entrega até 25/02/16. SDP será elaborada pela UGP, tão logo o RFLC seja aprovado.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 30: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.

Subprojeto 51: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".

- **Responsável:** Maria Dias / Ilana Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 844.660,13
- **Valor do TOR:** US\$ 844.660,13
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Março 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Encontra-se em fase de elaboração do Relatório Combinado (Técnica e Financeira), com previsão de envio a UGP em ___.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 31: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.



Subprojeto 52: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias e Fabiola Martins
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.839.456,10
- **Valor do TOR:** US\$ 472.119,04
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Novembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Setorial elaborando o RAT desde 19/01/16 . Modelos de RAT enviados a setorial em 25/01/16. Previsão de retorno: 26/02/16.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 31: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

Subprojeto 53: Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas (Equipamentos).

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Serviço de Não Consultoria
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.839.456,10
- **Valor do TOR:** US\$ 1.367.337,05
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Outubro 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** ET e MC elaborados pela SEMA. No entanto, aguarda definição quanto a inserção do componente “aquisição de bens” no PforR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 



SEMACE

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 32: Fortalecimento da gestão ambiental estadual

*Subprojeto 24: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de **capacitação** para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE*

- **Responsável:** Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 547.525,63
- **Valor do TOR:** US\$ 334.350,85
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Marcada abertura pública dos envelopes das propostas até às 16:00 horas do dia 28/03/16.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 32: Fortalecimento da gestão ambiental estadual

*Subprojeto 55: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a **Manualização dos Procedimentos Técnicos** dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.*

- **Responsável:** Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 547.525,63
- **Valor do TOR:** US\$ 213.174,78
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2014 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Recebido da SEMACE em 22/02/16, email encaminhando o RAT para análise da UGP. Previsão de retorno: 29/02/16. Setorial pediu revalidação das propostas por mais 60 dias.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 



SRH

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 40: Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.

Subprojeto 64: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.

- **Responsável:** Karine Machado e Marcilio Caetano
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.077.421,94
- **Valor do TOR:** US\$ 446.303,53
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Não Objeção do BM ao contrato rubricado.
- **Estágio Atual:** RFLC, MC e SDP aprovados pela UGP em 24/02/16. Previsão de envio do processo para lançamento da SDP até dia 26/02/16.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 40: Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.



Subprojeto 65: Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. SIGERH

- **Responsável:** Karine Machado e Fernanda Benevides
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.077.421,94
- **Valor do TOR:** US\$ 441.009,58
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Não Objeção do BM ao contrato rubricado.
- **Estágio Atual:** Marcada abertura pública dos envelopes das propostas até às 16:30 horas do dia 21 de março de 2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 40: Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.

Subprojeto 66: Aquisição de equipamentos para suporte aos sistemas que serão implantados.

- **Responsável:** Karine Machado e Bruno Carvalho
- **Categoria de Licitação:** Serviço de Não consultoria
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.077.421,94
- **Valor do TOR:** US\$ 130.722,71
- **Método de Aquisição:** Pregão eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Abril 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** TDR e MC recebidos pela UGP em 24/11/15. No entanto, aguarda definição quanto a inserção do componente “aquisição de bens” no PforR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 40: Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.

*Subprojeto 67: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - **Malha D'agua.***

- **Responsável:** Karine Machado
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.077.421,94
- Valor do TOR: US\$ 59.386,13
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Manifestação de interesse e recebimento de Currículos
- **Estágio Atual:** SRH enviou RAC (Relatório de Avaliação Curricular) em 19/02/16, para análise da UGP. Previsão de retorno até 26/02/16.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████
- **Sinalização em relação ao Status:** ██████████



TCE

Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Projeto 45: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

Subprojeto 76: Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.

- **Responsável:** Glinton Ferreira / Delinda Almeida
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto :** US\$ 991.637,98
- **Valor do TOR:** US\$ 806.712,10
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/ Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Setorial em fase de envio de SDP as empresas da Lista Curta, com previsão para ___.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Projeto 45: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)



Subprojeto 77: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 991.637,98
- **Valor do TOR:** US\$ 84.010,26
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em execução.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Projeto 45: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

Subprojeto 78: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 991.637,98
- **Valor do TOR:** US\$ 100.915,62
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** CONTRATO CONCLUÍDO.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 



4. APROVAÇÃO DA ATA DA 24ª REUNIÃO (28/01/2016)

COMITÊ *PforR*

Próxima Reunião do Comitê PforR

Próxima Reunião do Comitê PforR:

31/03/2016 – 14h30m - IPECE



5. ENCAMINHAMENTOS

Encaminhamentos da 24ª Reunião realizada em 28/01/2016

- ✓ Aguarda-se a assinatura do contrato do projeto de assistência técnica “**PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário**” – subprojeto ‘Contratação de empresa especializada para elaboração de arte gráfica/design, revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN’;
- ✓ Os demais encaminhamentos foram resolvidos.



6. ENCERRAMENTO
