



**36ª REUNIÃO DO COMITÊ *PforR***  
**ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO**  
**PROJETO *PforR***  
**26 DE JANEIRO DE 2017**



## PAUTA DA REUNIÃO

# Pauta da Reunião

1. Abertura e apresentação dos participantes (14h30-14h35)
2. Algumas Informações (14h35 – 14h40m):
  - 2.1 Posição da Reestruturação do PforR;
  - 2.2 Auditoria TCE – Plano de Ação;
3. Indicadores, Plano de Ação, Programas e Assistência Técnica (14h40 - 15h10m)
  - 3.1. Indicadores Primários 2017.1 e Desembolsos – Giuseppe Nogueira
  - 3.2. Indicadores Secundários 2017.1 – Giuseppe Nogueira
  - 3.3. Programas PforR - Giuseppe Nogueira
  - 3.4. Assistência Técnica: Estatísticas – Lívia Castro
  - 3.5. Tempo disponível até o encerramento do PforR - Lívia Castro
4. Projetos de Assistência Técnica em Situação de Risco e Previsão de Assinatura dos Contratos – Giuseppe Nogueira (15h10 – 15h30)
  - 4.1 Risco de Prazo dos subprojetos – Giuseppe Nogueira
  - 4.2 Previsão de Assinatura dos contratos dos 23 Subprojetos sendo licitados – Giuseppe Nogueira
5. Monitoramento Contratos – André Morel (15h30 – 15h40)
6. Projetos de Assistência Técnica por Setorial Contratados
7. Aprovação da Ata da 35ª Reunião (15/12/2016) (15h40m - 15h45m) – Laura Gonçalves
8. Encaminhamentos (15h45m - 16h) - Lívia Castro
9. Encerramento (16h)



# 1. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES



## 2. ALGUMAS INFORMAÇÕES



## 2.1 Posição da Reestruturação do PforR

## 2.1 Posição da Reestruturação do PforR

✓Cronograma:

<b>Atividades</b>	<b>Datas Previstas</b>	<b>Datas Realizado</b>
1. A Justificativa Técnica será analisada pelo Grupo Técnico da COFIEX	13/07/16	13/07/16
2. Encaminhamento do documento à Secretaria do Tesouro Nacional - STN	12/08/16	09/12/2016
3. Conclusão do Parecer da PGFN	26/08/16	19/01/07
4. Retorno ao Banco Mundial e ao Estado do Ceará aprovando a assinatura do Aditivo	Novembro/16	19/01/17
5. Previsão para assinatura do Aditivo de reestruturação do PforR	Final de fevereiro /17	



## 2.2 Auditoria TCE – Plano de Ação



## Relatório de Auditoria - TCE

- ✓ A UGP enviou no dia 04/01/2017 um e-mail com modelo de respostas às recomendações, bem como o Plano de Ação, referente ao Relatório de Auditoria do TCE dos Programas eleitos no escopo do Projeto PforR do ano de 2015 que deverá ser elaborado pelas setoriais IPECE, SDE, SEDUC, SEMA, SEMACE e STDS até o dia **30/03/2017**.



### 3. INDICADORES, PLANO DE AÇÃO, PROGRAMAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA



## 3.1. Indicadores Primários 2017.1 e Desembolsos

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2016.2 - Desembolso

Nº	Setorial	Nome do Indicador	Valor Desembolso US\$
1	STDS	DLI 4: Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS	3.438.000,00
2	SEPLAG	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência a Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	3.438.000,00
3	SEMA	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	3.438.000,00
4	FUNCEME	DLI 10: Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.	3.438.000,00
<b>Total de metas de 2016.2 atingidas e ainda não desembolsadas</b>			<b>13.752.000,00</b>
1	STDS	DLI 5: Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	3.444.000,00
2	SEMA	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	3.444.000,00
<b>Total de metas de 2017.1 atingidas</b>			<b>6.888.000,00</b>
1	STDS	DLI 5: Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	3.120.000,00
<b>Total de meta de 2017.2 atingida</b>			<b>3.120.000,00</b>
1	SEPLAG	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	2.744.444,00
			3.403.750,00
			3.444.000,00
			3.438.000,00
<b>Total de metas ainda não alcançadas de 2014.2, 2015.1, 2015.2, 2016.1 e 2016.2</b>			<b>13.030.194,00</b>
<b>Total Geral a ser desembolsado pelas metas alcançadas no período de 2016.2<sup>1</sup> (Previsão)</b>			<b>23.760.000,00</b>

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2017.1

Setorial Responsável	n°	Nome	Metas
SDE	1	DLI 1: Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação.	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação
SEDUC	2	DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	Segundo relatório de acompanhamento publicado
	3	DLI 3: Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso	16
STDS	4	DLI 5: Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	75%
SEPLAG	5	DLI 6: Percentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	82.5%
	6	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	5
	7	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	15%
SRH	8	DLI 7: Estabelecimento de comitê multisetorial de Segurança Hídrica.	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas
CAGECE	9	DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	85.7%
SEMA	10	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	75%

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 1: Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação.	SDE Filipe Rabelo	2013	Projeto de documento de estratégia preparado e 4 acordos com setor privado e 4 acordos com universidades assinados	39.375.000,00	
		2014.1	Comitê instituído pelo decreto	4.462.500,00	
		2014.2	Documento de estratégia finalizado	6.198.000,00	
		2015.1	Plano de ação publicado	2.744.448,00	
		2016.1	Uma ação do plano de ação implementado	3.444.000,00	
		2017.1	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação	3.444.000,00	
		2017.2	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação	3.120.000,00	
		Total do Indicador			62.787.948,00


Legenda:  Metas alcançadas

## INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 1º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 1: Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação.	SDE Filipe Rabelo	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação	1 Ação já implementada em 2016.1	O Regimento interno ainda não foi publicado mas deverá sair sua publicação no início de 2017. No dia 12 de janeiro o Comitê se reuniu no IPECE para definir a Ação a ser implementada no primeiro semestre de 2017. Estamos buscando a confirmação da Ação número 5 - Projeto Aprendiz na Escola.

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP.	SEDUC Rivanir Bezerra	2016.1	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	3.444.000,00	
		2017.1	Segundo relatório de acompanhamento publicado	3.444.000,00	
		Total do Indicador		6.888.000,00	

Legenda:  Metas alcançadas



# INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 1º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	SEDUC Rivanir Bezerra	Segundo relatório de acompanhamento publicado	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	A SEDUC está agendando com o Secretário a fim de buscar a articulação para novas parcerias.

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.	SEDUC Rivanir Bezerra	2015.1	10	2.744.444,00	■
		2015.2	12	3.403.750,00	■
		2016.1	13	3.444.000,00	■
		2016.2	15	3.438.000,00	■
		2017.1	16	3.444.000,00	□
		2017.2	18	3.120.000,00	□
		Total do Indicador			

Legenda: ■ Metas alcançadas


## INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 1º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.	SEDUC Rivanir Bezerra	16 acordos	15 acordos firmados	A SEDUC tem reuniões marcadas com diversas empresas para a criação de novas parcerias e termos de cooperação.

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol	
DLI 5: Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	2015.1	15%	2.744.444,00		
		2015.2	30%	3.403.750,00		
		2016.1	42.5%	3.444.000,00		
		2016.2	55%	3.438.000,00		
		2017.1	75%	3.444.000,00		
		2017.2	95%	3.120.000,00		
		Total do Indicador			19.594.194,00	


Legenda:  Metas alcançadas

## INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 1º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	75%	100%	Até Setembro de 2016, foram realizadas capacitações para o acompanhamento familiar, com a participação dos 36 municípios do PforR, atingindo 55 CRAS. As Capacitações continuarão em 2017, devido a grande rotatividade dos profissionais, decorrente das mudanças de gestões municipais.

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	SEPLAG José Freitas	2015.1	22.5%	2.744.444,00	
		2015.2	45%	3.403.750,00	
		2016.1	55%	3.444.000,00	
		2016.2	70%	3.438.000,00	
		2017.1	82.5%	3.444.000,00	
		2017.2	95%	3.120.000,00	
		Total do Indicador			

Legenda:  Metas alcançadas

## INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 1º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 6: Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	SEPLAG José Freitas	82,5%	70%	A SEPLA/FECOP irá reunir a equipe da Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza - CCOPI, para elaborar o planejamento das atividades necessárias ao cumprimento da meta, a acontecer até o fim da primeira quinzena do mês de fevereiro do corrente ano.

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicadores	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol	
DLI 7: Estabelecimento de um Comitê multissetorial de Segurança Hídrica.	SRH Carlos Campelo	2013.2	Comitê instituído pelo decreto	39.375.000,00		
		2015.1	Diagnóstico de Bacias completos	2.744.444,00		
		2016.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.444.000,00		
		2016.2	Minutas de pelo menos duas reuniões	3.438.000,00		
		2017.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.444.000,00		
		2017.2	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.120.000,00		
		Total do Indicador			55.565.444,00	



# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 1º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Metas	Realizado	Status
DLI 7: Estabelecimento do Comitê multisetorial de Segurança da Água.	SRH Carlos Campelo	Atas de pelo menos duas reuniões realizadas	Duas Atas já encaminhadas	O CONERH lançou Edital de Convocação dos Conselheiros do Conselho para o biênio 2017-2019 e a próxima reunião está prevista para fevereiro de 2017.

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	CAGECE Carlos Rossas	2014.1	83.8%	5.250.000,00	
		2014.2	84.3%	6.198.000,00	
		2015.1	84.6%	2.744.444,00	
		2015.2	84.9%	3.403.750,00	
		2016.1	85.2%	3.444.000,00	
		2016.2	85.5%	3.438.000,00	
		2017.1	85.7%	3.444.000,00	
		2017.2	85.9%	3.120.000,00	
		Total do Indicador			

## INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 1º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	CAGECE Carlos Rossas	85.5%	86,86%	Esse indicador foi cumprido em 2015.2 com o resultado de 86,05%.  O resultado do mês de dezembro foi de <u>86,86%</u> .

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicadores	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 9: Índice da qualidade da fiscalização ambiental	2014.1	28%	5.250.000,00	■
	2014.2	40%	6.198.000,00	■
	2015.1	50%	2.744.444,00	■
	2015.2	60%	3.403.750,00	■
	2016.1	65%	3.444.000,00	■
	2016.2	70%	3.438.000,00	■
	2017.1	75%	3.444.000,00	■
	2017.2	80%	3.120.000,00	
	Total do Indicador			31.042.194,00

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 1º Semestre de 2017


Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	SEMA Maria Dias  SEMACE Tiago Bessa  COGERH Denilson Fidelis	<b>75%</b>	78,67%	78,67% (Medição referente a 31/12/16).

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.*	SEPLAG Avilton Júnior	2014.2	Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará.**	6.198.000,00	
		2015.1	1	2.744.444,00	
		2015.2	2	3.403.750,00	
		2016.1	3	3.444.000,00	
		2016.2	4	3.438.000,00	
		2017.1	5	3.444.000,00	
		2017.2	6	3.120.000,00	
		<b>Total</b>			<b>25.792.194,00</b>

\* Nome do Indicador alterado por ocasião da reestruturação do PforR

\*\* Meta do Indicador alterada por ocasião da reestruturação do PforR

Legenda:  Probabilidade baixa de atingir a meta

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 1º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Metas	Realizado	Status
DLI11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	SEPLAG Avilton Júnior	<b>2014.2</b>	-	A Reunião com o Governador para assinatura do Decreto ainda não foi realizada.  A Seplag, a UGP estão empenhadas para conseguir a realização desse momento com o Governador e os Secretários que assinarão os seis acordos de resultados com as secretarias-piloto escolhidas (SCIDADES, SEDUC, SEINFRA, SEMA, SESA, SRH e SSPDS), o que comprovará o atingimento das metas do indicador DLI 11.
		Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará.		
		<b>2015.1</b>		
		1 Secretaria		
		<b>2015.2</b>		
		2 Secretarias		
		<b>2016.1</b>		
		3 Secretarias		
		<b>2016.2</b>		
		4 Secretarias		
<b>2017.1</b>				
5 Secretarias				

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada	SEPLAG Adauto Oliveira	2014.2	Aprovação da metodologia	6.198.000,00	
		2015.1	-	-	
		2015.2	-	-	
		2016.1	5%	3.444.000,00	
		2016.2	10%	3.438.000,00	
		2017.1	15%*	3.444.000,00	
		2017.2	20%*	3.120.000,00	
		Total			19.644.000,00

\*As metas deste Indicador foram modificadas na reestruturação do PforR, anteriormente as metas eram 25% e 40%

Legenda:  Metas alcançadas



## INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 1º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	SEPLAG Adauto Oliveira	15%	-	Encontra-se em análise pela PGE o decreto envolvendo GPR e Gestão do Investimento Público. Os projetos a serem objeto da metodologia de investimentos para cumprimento da meta de 2017 estão em fase de definição por conta da recente aprovação do orçamento.





## 3.2. Indicadores Secundários 2017.2


# INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2017

n°	Setorial	Indicadores	Metas 2017.1	2017.2	Status
1	IPECE	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	-	31.600	
2	SEPLAG	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	-	Outras duas resoluções publicadas e relatório sobre as atividades do Comitê publicado	
3	STDS	Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas	-	10%	
4	COGERH	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa	-	
		Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.	-	Plano de Segurança Hídrica elaborados e apresentados em Reunião do CONERH. Resolução do CONERH criando Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução dos Planos	
		Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	-	67.5	
5	SEMA	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	-	Implementação e monitoramento	

Total de Indicadores Secundários no semestre 2017: 7 Indicadores

## INDICADORES SECUNDÁRIOS: Meta 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Meta 2ª semestre	Realizado	Status
PDO1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	IPECE Victor Hugo	31.600	25.463 técnicos	Houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.463.  (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).


Legenda  Probabilidade baixa de atingir a meta

# INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Meta 2ª semestre	Realizado	Status
Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	SEPLAG Lara Costa	Outras duas resoluções publicadas e relatório sobre as atividades do Comitê publicado	-	O Comitê ainda não se reuniu neste ano, porém as ações e projetos acompanhados pelo Comitê estão em pleno desenvolvimento. A próxima reunião deve ocorrer ainda na primeira quinzena de fevereiro.

## INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Metas 2ª semestre	Realizado	Status
<p>PDO2: Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas</p>	<p>STDS Sebastião Lopes Mary Anne</p>	<p>10%</p>	<p>7,11%</p>	<p>O Sistema de Monitoramento da STDS está sendo alimentado com os dados do acompanhamento familiar, provenientes das visitas domiciliares de acompanhamento técnico, com vistas a emissão de relatórios e verificação dos resultados obtidos no cumprimento do indicador. Foram visitadas até o momento o total de 3.247 famílias.</p>

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

# INDICADORES SECUNDÁRIOS: Meta 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Meta 2ª semestre	Realizado	Status
PDO3:Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	COGERH Denilson Fidelis, Disney Paulino	67.5	76,7	76,7 (referente ao mês de dezembro) IQARce: 4,08 (criticamente degradado a poluído)

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

## INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Metas 2ª semestre	Realizado	Status
Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	COGERH Ana Araújo	Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa	A minuta do Decreto foi encaminhada ao CONERH.	A Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais será encaminhado ao Conselho Estadual dos Recursos Hídricos até o dia 30/12/2016.

\*Comitês Bacias Hidrográficas



## INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Metas 2ª semestre	Realizado	Status
Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.	COGERH Zulene Almada	Plano de Segurança Hídrica elaborados e apresentados em Reunião do CONERH. Resolução do CONERH criando Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução dos Planos	-	Foram entregues versões preliminares dos relatórios de coleta e análise de qualidade das três bacias dos planos. O relatório parcial de metodologia de enquadramento está sendo finalizado.

## INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Responsável	Metas	Realizado	Status
Apresentação da Lei de gestão de Resíduos Sólidos revista.	SEMA Maria Dias	Implementação e monitoramento	Foi encaminhado Relatório demonstrando os resultados da implementação e do monitoramento da Política Estadual de Resíduos Sólidos.	Foi elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região de Sobral, para 20 municípios.  E também foi iniciada a efetivação do Consórcio para Destinação de Resíduos Sólidos de Sobral - COMDERES, com a Assembleia dos Prefeitos, em 18/01/2017.



### 3.3. Programas *PforR*

## Posição do Programa 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional - SEDUC

Iniciativa	Previsão		Execução	FAROL (C)/(A)
	2016 (A)	2017 (B)	Até 31.12.16 (C)	
020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 43,10	R\$ 31,49	R\$ 39,11	91%
020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 15,44	R\$ 8,06	R\$ 10,75	70%
020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 87,52	R\$ 98,93	R\$ 186,71	213%
020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.	R\$ 2,47	R\$ 2,30	R\$ 1,37	55%
020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.	R\$ 29,00	R\$ 30,00	R\$ 32,06	111%
<b>TOTAL SEDUC - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>R\$ 177,53</b>	<b>R\$ 170,78</b>	<b>R\$ 270,00</b>	

# Posição do Programa 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional - SEDUC

Iniciativas		Execução até 31.12.2016	Restos a Pagar até 31.12.2016	TOTAL
771	020.1.01	R\$ 39.111.333,68	R\$ -	R\$ 39.111.333,68
	020.1.02	R\$ 4.949.146,19	R\$ 5.798.075,91	R\$ 10.747.222,10
328	020.1.03	R\$ 184.719.497,77	R\$ 1.995.043,42	R\$ 186.714.541,19
-	020.1.04	R\$ 1.367.953,40	R\$ -	R\$ 1.367.953,40
834	020.1.06	R\$ 30.271.889,90	R\$ 1.786.487,16	R\$ 32.058.377,06
<b>Total</b>		<b>R\$ 260.419.820,94</b>	<b>R\$ 9.579.606,49</b>	<b>R\$ 269.999.427,43</b>

# Posição do Programa 080 – Proteção Social Básica - STDS

Iniciativa	Previsão		Execução	FAROL (C)/(A)
	2016 (A)	2017 (B)	Até 31.12.16 (C)	
080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.	R\$ 7,30	R\$ 10,51	R\$ 7,36	101%
<b>TOTAL STDS - ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA</b>	<b>R\$ 7,30</b>	<b>R\$ 10,51</b>	<b>R\$ 7,36</b>	

Iniciativas		Execução até 31.12.2016	Restos a Pagar até 31.12.2016	TOTAL
03180	080.1.01	R\$ 7.223.500,00	R\$ 136.800,00	R\$ 7.360.300,00

# Posição do Programa 025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana - CIDADES

Iniciativa	Previsão		Execução	FAROL (C)/(A)
	2016 (A)	2017 (B)	Até 31.12.16 (C)	
025.1.12 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário.	R\$ -	R\$ 8,58	R\$ -	0%

## Posição do Programa 064 – Resíduos Sólidos - SEMA

Iniciativa	Previsão		Execução	FAROL (C)/(A)
	2016 (A)	2017 (B)	Até 31.12.16 (D)	
064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.	R\$ 1,10	R\$ 2,00	R\$ 0,43	39%

Iniciativas		Execução até 31.12.2016	Restos a Pagar até 31.12.2016	TOTAL
03104	064.1.04	R\$ 329.002,71	R\$ 99.425,00	R\$ 428.427,71



## Posição do Programa 066 – Ceará Mais Verde - SEMA

Iniciativa	Previsão		Execução	FAROL (C)/(A)
	2016 (A)	2017 (B)	Até 31.12.16 (C)	
066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,05	8%

Iniciativas		Execução até 31.12.2016	Restos a Pagar até 31.12.2016	TOTAL
-	066.1.02	R\$ 46.299,00	R\$ -	R\$ 46.299,00

## Posição do Programa 067 – Ceará no Clima - SEMA

Iniciativa	Previsão		Execução	FAROL (C)/(A)
	2016 (A)	2017 (B)	Até 31.12.16 (C)	
067.1.05 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro.	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ -	0%

<b>TOTAL SEMA (Programas 64, 66, 67) QUALIDADE DA ÁGUA</b>	<b>R\$ 2,25</b>	<b>R\$ 3,15</b>	<b>R\$ 0,47</b>	
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

## Posição do Programa 066 – Ceará Mais Verde - SEMACE

Iniciativa	Previsão		Execução	FAROL (C)/(A)
	2016 (A)	2017 (B)	Até 31.12.16 (C)	
066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais.	R\$ -	R\$ 26,96	R\$ -	
066.1.12 – Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará.	R\$ 0,28	R\$ 2,34	R\$ 0,57	204%
066.1.13 – Ampliação das ações de proteção dos recursos ambientais das áreas protegidas do Estado do Ceará.	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,13	

Iniciativas		Execução até 31.12.2016	Restos a Pagar até 31.12.2016	TOTAL
-	066.1.09	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05170	066.1.12	R\$ 457.819,24	R\$ 113.640,87	R\$ 571.460,11
04815	066.1.13		R\$ 129.000,00	R\$ 129.000,00

## Posição do Programa 067 – Ceará no Clima - SEMACE

Iniciativa	Previsão		Execução	FAROL (C)/(A)
	2016 (A)	2017 (B)	Até 31.12.16 (C)	
067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.	R\$ 2,00	R\$ 0,18	R\$ 1,87	93%

Iniciativas		Execução até 31.12.2016	Restos a Pagar até 31.12.2016	TOTAL
-	067.1.09	R\$ 1.865.000,00	R\$ -	R\$ 1.865.000,00

# Posição do Programa 500 – Gestão e Manutenção - SEMACE

Iniciativas	Previsão		Execução	FAROL (C)/(A)
	2016 (A)	2017 (B)	Até 31.12.16 (C)	
500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas.	R\$ 0,42	R\$ 0,76	R\$ 0,72	171%

Iniciativas		Execução até 31.12.2016	Restos a Pagar até 31.12.2016	TOTAL
00001	500.1.02	R\$ 471.634,46	R\$ 248.340,00	R\$ 719.974,46

<b>TOTAL SEMACE (Programas 66, 67 e 500) QUALIDADE DA ÁGUA</b>	<b>R\$ 2,70</b>	<b>R\$ 30,24</b>	<b>R\$ 3,29</b>	
--	-----------------	------------------	-----------------	--

## Posição do Programa 018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis - FUNCEME

Iniciativas	Previsão		Execução	FAROL (C)/(A)
	2016 (A)	2017 (B)	Até 31.12.16 (C)	
018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias.	R\$ 1,81	R\$ 1,91	R\$ 1,82	101%
018.1.03 - Ampliação e modernização do sistema de monitoramento e previsão.	R\$ 0,05	R\$ 0,07	R\$ -	0%
<b>TOTAL FUNCEME - QUALIDADE DA ÁGUA</b>	<b>R\$ 1,86</b>	<b>R\$ 1,97</b>	<b>R\$ 1,82</b>	

Iniciativas		Execução até 31.12.2016	Restos a Pagar até 31.12.2016	TOTAL
2846	018.1.01	R\$ 1.689.869,26	R\$ 133.389,99	R\$ 1.823.259,25
2847	018.1.03	R\$ -	R\$ -	R\$ -

## Posição de Execução dos Programas de 2016 até 31.12.2016

Sumário de Execução 2016 até 31.12.2016				
Eixo	Setorial	Previsão	Execução	%
Capacitação Profissional	<b>SEDUC</b>	R\$ 177,53	R\$ 270,00	152%
Assistência à Família	<b>STDS</b>	R\$ 7,30	R\$ 7,36	101%
Qualidade da Água	<b>CIDADES</b>	R\$ -	R\$ -	0%
	<b>SEMA</b>	R\$ 2,25	R\$ 0,47	21%
	<b>SEMACE</b>	R\$ 2,70	R\$ 3,29	122%
	<b>FUNCEME</b>	R\$ 1,86	R\$ 1,82	98%
<b>Total</b>		<b>R\$ 191,64</b>	<b>R\$ 282,94</b>	<b>148%</b>

## Posição de Execução dos Programas de 2016 até 31.12.2016

Execução Acumulada Projeto até 31.12.2016			
Meta 2014-2017	R\$	984,80	100,00%
Execução 2014	R\$	243,35	24,71%
Execução 2015	R\$	233,28	23,69%
Execução 2016	R\$	282,94	28,73%
<b>Total Executado</b>	<b>R\$</b>	<b>759,57</b>	<b>77,13%</b>
<b>Falta Executar</b>	<b>R\$</b>	<b>225,24</b>	<b>22,87%</b>



## Posição dos Programas

EIXO	SETORIAL	PROGRAMAS	Previsão		Execução	FAROL (C)/(A)
			2016 (A)	2017 (B)	Até 31.12.16 (C)	
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	SEDUC	020 – Ensino Integrado à Educação Profissional	R\$ 270,00	R\$ 170,78	R\$ 270,00	100%
<b>TOTAL CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL</b>			<b>R\$ 270,00</b>	<b>R\$ 170,78</b>	<b>R\$ 270,00</b>	<b>100%</b>
ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA	STDS	080 – Proteção Social Básica	R\$ 7,36	R\$ 10,51	R\$ 7,36	100%
<b>TOTAL ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA</b>			<b>R\$ 7,36</b>	<b>R\$ 10,51</b>	<b>R\$ 7,36</b>	<b>100%</b>
QUALIDADE DA ÁGUA	CIDADES	025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana;	R\$ -	R\$ 8,58	R\$ -	0%
	SEMA/ SEMACE	064 – Resíduos Sólidos;	R\$ 1,10	R\$ 2,00	R\$ 0,43	39%
		066 – Ceará Mais Verde;	R\$ 0,88	R\$ 29,90	R\$ 0,75	85%
		067 – Ceará no Clima;	R\$ 2,55	R\$ 0,73	R\$ 1,87	73%
	SEMACE	500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada;	R\$ 0,42	R\$ 0,76	R\$ 0,72	171%
FUNCEME	018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis.	R\$ 1,86	R\$ 1,97	R\$ 1,82	98%	
<b>TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA</b>			<b>R\$ 6,81</b>	<b>R\$ 43,94</b>	<b>R\$ 5,58</b>	<b>82%</b>
<b>TOTAL EXECUÇÃO DE 2016</b>			<b>R\$ 284,17</b>	<b>R\$ 225,23</b>	<b>R\$ 282,94</b>	<b>99,57%</b>



## Preparação do Relatório Financeiro – IFR 2016.2

## IFR – Próximos Passos

- ✓ A UGP está finalizando o Relatório Financeiro (IFR) do Segundo Semestre de 2016 para envio ao Banco Mundial até o dia 15/02/2017.
- ✓ Foi enviado um e-mail para as setoriais CIDADES, **COGERH**, FUNCEME, SEMA, SEMACE e STDS para confirmação dos valores executados, bem como um modelo de declaração referente aos valores das Iniciativas que constam no IFR no Componente I.
- ✓ Foi enviado e-mail para SEDUC para confirmação de Pagamentos de Restos a Pagar do ano de 2016 – Programa 014-Ensino Médio Articulado à Educação Profissional gerados pelo sistema IFR com informações do S2GPR e SIAP.
- ✓ Será enviado para SEDUC para confirmação dos valores executados, bem como um modelo de declaração referente aos valores das Iniciativas que constam no IFR no Componente I.

## Posição dos Programas

### ✓ **Lembrete:** Regras Programas


A execução dos programas deve observar as seguintes restrições:

- Devem excluir despesas que são financiadas pelo próprio BIRD ou por outras operações de crédito, ou seja, não é permitido a alocação de recursos do BIRD ou outras operações de crédito para custear despesas dos programas e iniciativas do componente
- Verificar a lista negra do BIRD a cada licitação, antes de assinar contrato. Para atender o Art. 42 da Lei 8.666/93 a SEPLAG incluiu no orçamento de cada ação um valor na fonte 69;
- Não podem apresentar impacto sócio ambiental negativo;
- Os valores dos contratos não podem exceder os limites abaixo:
  - Obras = US\$ 50 milhões
  - Bens = US\$ 30 milhões
  - Sistemas de TIC = US\$ 20 milhões
  - Consultorias = US\$ 15 milhões.



## 3.4. Assistência Técnica – Estatísticas


## Execução dos Subprojetos de AT por Etapa

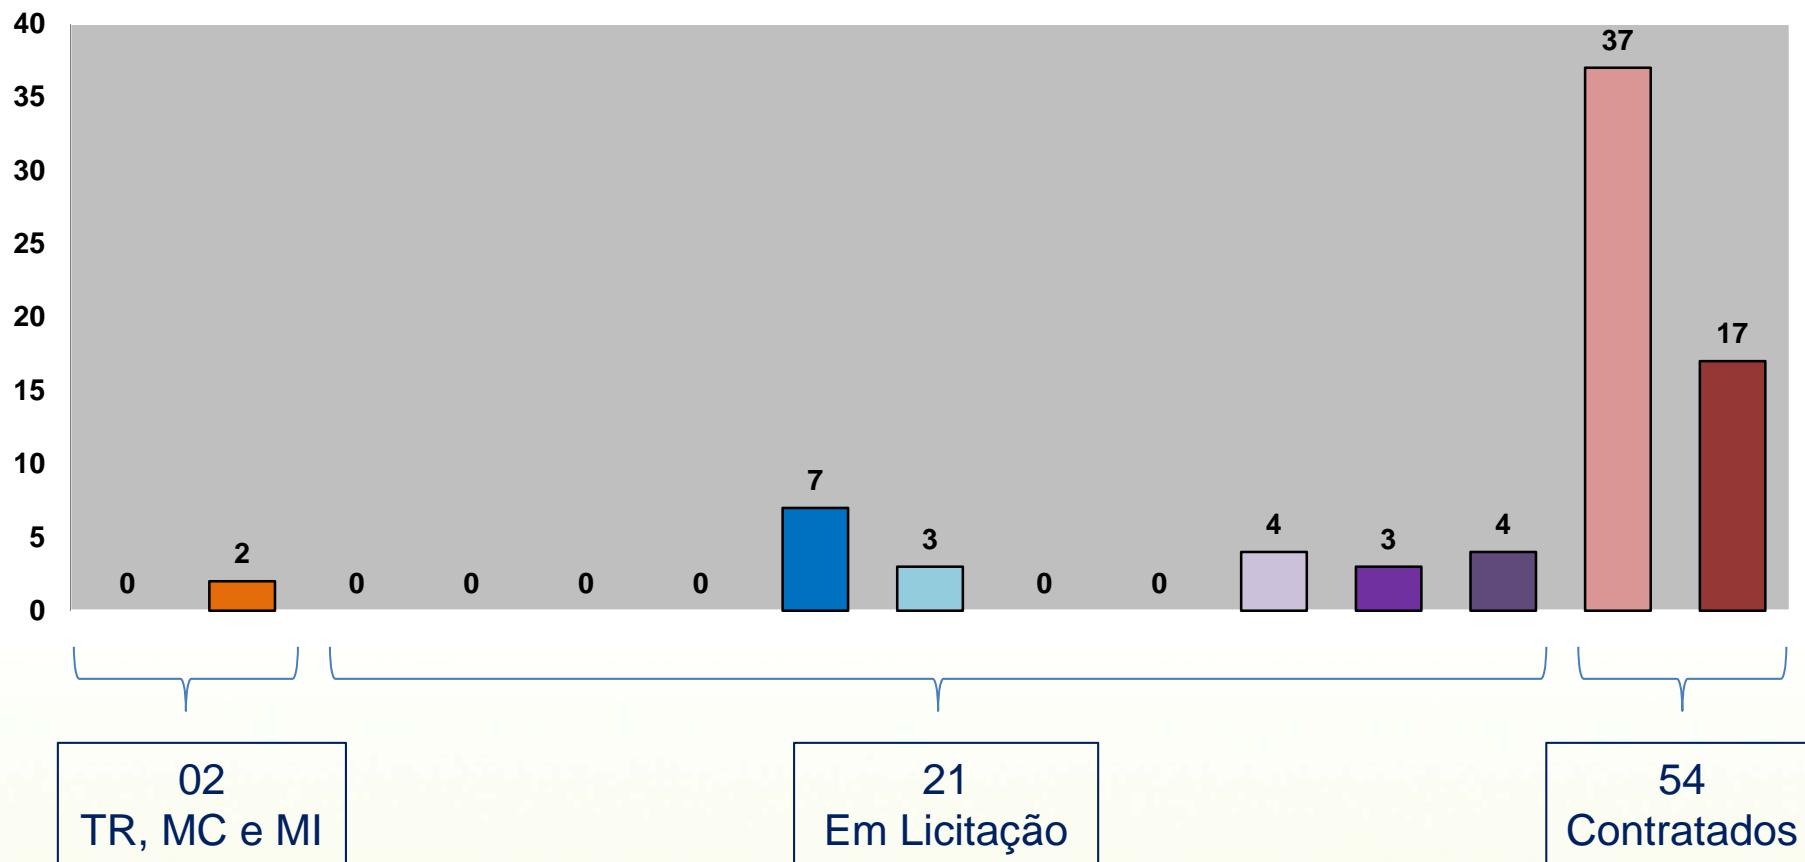

## Subprojetos de Assistência Técnica por Etapa

Etapas			Setoriais com Subprojetos	Valor US\$
1	TDR e MC sendo elaborados para NO BM	0		-
2	TDR e MC aprovado pelo BM e elaborando MI	2	SEDUC(35); SEPLAG(60);	85.600,95
3	Manifestação de Interesse Publicada	0		-
4	Elaborando o Relatório Final da Lista Curta	0	-	-
5	Elaborando a Solicitação de Proposta	0	-	-
6	Solicitação de Proposta Lançada	0		-
7	Elaborando o Relatório Técnico ou Curricular	7	CGE(10); IPECE(22); SECITECE(26); SEDUC(31,32,36); SEPLAG(57);	1.727.241,10
8	Elaborando o Relatório Financeiro e o Combinado	3	CGE(08), SEDUC(29); SEPLAG(64);	1.093.060,35
9	Não Objeção do BM à Avaliação Combinado / Avaliação Curricular	0	-	-
10	Divulgação da Avaliação Combinada / Ofício para Negociação	0	-	-
11	Negociação do Contrato	4	CGE(10); SECITECE(27); SEDUC(30); SEMA(54);	1.109.060,71
12	Divulgação PGE Resultado Final	2	SEDUC(27); SEMA(52); SEPLAG(63);	1.355.378,67
13	Assinando o Contrato / Publicação	1	CGE (07); IPECE(21); SEDUC (38,47);	1.064.081,88
14	Projetos com Contratos em Execução	37	ARCE(01); CGE(04,05,0609); FUNCEME(13); IPECE(14,15,17,18,19,20); PGE(23); SDE(24); SECITECE(28); SEDUC(43,44,45,46); SEMA(48,49,50,51,53); SEMACE(55,56); SEPLAG(59,61,62,65); SRH(66,67,68); COGERH(69,70); STDS(74); TCE(75);	15.318.363,03
15	Projetos com Contratos Finalizados	17	CGE(02,03,12); IPECE(16); SDE(25); SEDUC(33,34,39,40,41,42); SEPLAG(58); COGERH(71); STDS(72,73); TCE(76,77).	1.065.757,23
<b>Total</b>		<b>77</b>		<b>22.818.543,93</b>

## Execução dos Subprojetos de AT por Etapa

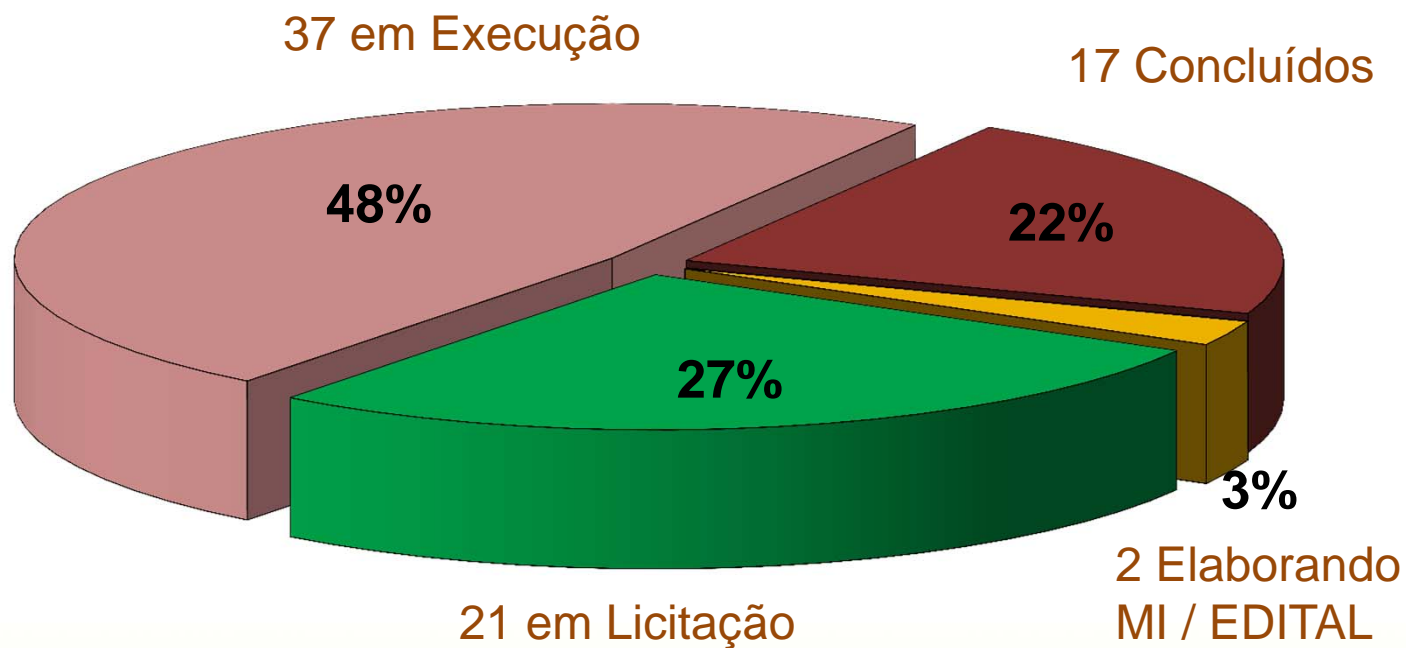





## 3.5 Tempo disponível até encerramento do *PforR*

# Tempo disponível até encerramento do PforR = 31/01/2018

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
<b>1º e 2º Semestres 2017</b>	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	<b>6 meses</b>
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	
<b>2º Semestre 2017 e Jan de 2018</b>	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	<b>6 meses</b>
<b>A partir de fev de 2018</b>							
<b>TOTAL</b>							<b>12 Meses</b>

	Baixo - de 0 a 08 meses
	Médio - de 09 e 10 meses
	Alto - de 11 e 12 meses
	Altíssimo - acima de 12 meses - Inviabiliza o Projeto



## 3.6 Pontos Principais de Aquisições

# Pontos Principais de Aquisições

## ✓ **Contratações**

1. Currículos dos Especialistas devem estar assinados no contrato; e
2. Portaria da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Execução do contrato.

## ✓ **Gerenciando Riscos dos Contratos**


1. Riscos relacionados aos custos (eventos que podem afetar o valor , através de custos excedentes);
2. Riscos relacionados ao tempo (eventos que podem atrasar a execução do contrato);
3. Riscos relacionados ao objeto do contrato (eventos que podem comprometer a entrega ou a qualidade do produto).



## 4. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SITUAÇÃO DE RISCO E PREVISÃO DE ASSINATURA DOS CONTRATOS

## 4. 1 Risco de Prazo dos Subprojetos

## Resumo dos Riscos de Prazo dos Subprojetos de AT

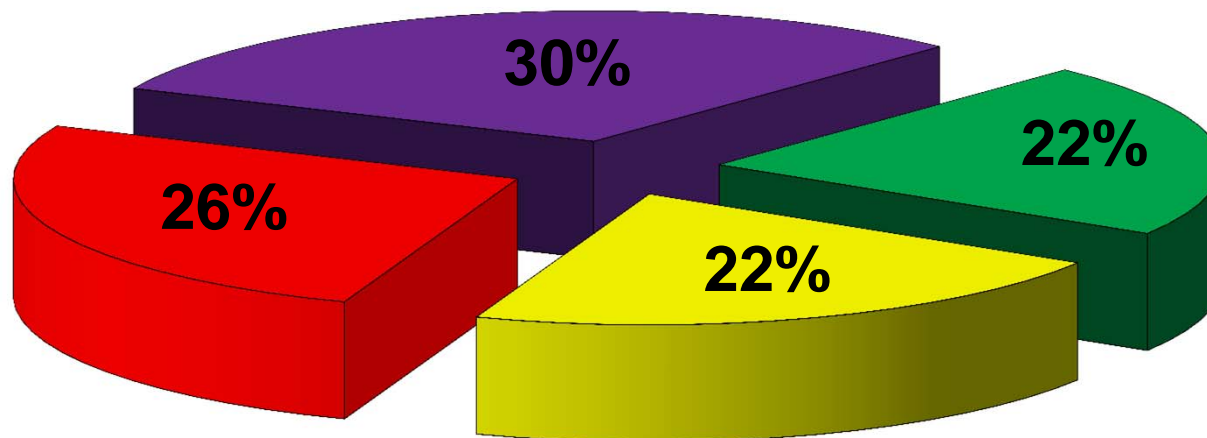

Qtd.	%	Setoriais
05	21%	CGE(2), SEDUC(3),
05	21%	IPECE(01), SECITECE(2), SEDUC(1), SEPLAG(01),
06	25%	CGE(1), SEDUC(1), SEMA(2), SEPLAG(2),
07	29%	IPECE(1), CGE(1), SEDUC(4), SEPLAG (1).
23	100%	

	Baixo - de 0 a 08 meses
	Médio - de 09 e 10 meses
	Alto - de 11 e 12 meses
	Altíssimo - acima de 12 meses - Inviabiliza o Projeto

## Subprojetos de AT em Risco Altíssimo - Inviabilizado

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	IPECE	Metodologias para análise de impacto econômico.	15
2	SEDUC	Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.	15
3	SEDUC	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	14
4	SEDUC	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (01 analistas	14
5	SEDUC	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (01 analistas	14
6	SEPLAG	Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS).	14
7	CGE	Capacitação da população para o Controle Social.	13

	Baixo - de 0 a 08 meses
	Médio - de 09 e 10 meses
	Alto - de 11 e 12 meses
	Altíssimo - acima de 12 meses - Inviabiliza o Projeto



## Subprojetos de AT em Risco Alto

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	SEDUC	Contratação de empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.	12
2	SEMA	Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	12
3	SEPLAG	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	12
4	CGE	Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).	11
5	SEMA	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.	11
6	SEPLAG	Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.	11

	Baixo - de 0 a 08 meses
	Médio - de 09 e 10 meses
	Alto - de 11 e 12 meses
	Altíssimo - acima de 12 meses - Inviabiliza o Projeto

## Subprojetos de AT em Risco Médio

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	IPECE	Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.	9
2	SECITECE	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	9
3	SECITECE	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	9
4	SEDUC	Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN.	9
5	SEPLAG	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial (2a. Etapa)	9

	Baixo - de 0 a 08 meses
	Médio - de 09 e 10 meses
	Alto - de 11 e 12 meses
	Altíssimo - acima de 12 meses - Inviabiliza o Projeto

## Subprojetos de AT em Risco Baixo

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	CGE	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	8
2	SEDUC	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado. Incluindo a Avaliação de Desempenho Institucional	8
3	CGE	consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO).	7
4	SEDUC	Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey).	6
5	SEDUC	Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.	2,5

	Baixo - de 0 a 08 meses
	Médio - de 09 e 10 meses
	Alto - de 11 e 12 meses
	Altíssimo - acima de 12 meses - Inviabiliza o Projeto



## 4.2. Previsão de Assinatura dos contratos dos 23 Subprojetos sendo licitados

## Previsão de Assinatura dos Contratos dos 23 Subprojetos sendo Licitados - Sumário

Previsão de Assinatura dos Contratos									
Setoriais	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Total
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
CGE	1		2		1				4
IPECE	1				1				2
SEPLAG			2		1		1		4
SECITECE			1		1				9
SEMA			1		1				2
SEDUC			5		4				9
SEMACE	1	1							0
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>23</b>

## Previsão de Assinatura dos Contratos dos 02 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Janeiro

Setorial		Projeto	Risco (Tempo execução em meses)	Risco (Previsão de Contratação em meses)	Risco (Tempo contratação + execução em meses)
1	CGE	Capacitação da população para o Controle Social.	12	1	13
2	IPECE	Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.	8	1	9

	Baixo - de 0 a 08 meses
	Médio - de 09 e 10 meses
	Alto - de 11 e 12 meses
	Altíssimo - acima de 12 meses - Inviabiliza o Projeto



# CGE - Assistência Técnica – Gestão Financeira

*Subprojeto 7: Capacitação da população para o Controle Social.*

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 267.522,72
- **Método de Aquisição:** LPN
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Assinatura Contrato.
- **Estágio Atual:** Em fase de assinatura do contrato. Em 24/01/17 enviado o Contrato a Fundação Demócrito Rocha para assinatura.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## IPECE - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 21: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para Desenvolvidos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.*

- **Responsável:** Mário Aragão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 682.482,48
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Fase de Assinatura de Contrato – Aguardando documentação da empresa NOVA VIA para finalização do contrato e assinatura.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



## Previsão de Assinatura dos Contratos dos 11 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Fevereiro 2017

Setorial	Projeto	Risco (Tempo execução em meses)	Risco (Previsão de Contratação em meses)	Risco (Tempo contratação + execução em meses)
1	CGE Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	6	2	8
2	CGE Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO)	5	2	7
3	SECITECE Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	7	2	9
4	SEDUC Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	12	2	14
5	SEDUC Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado. Incluindo a Avaliação de Desempenho Institucional	6	2	8

	Baixo - de 0 a 08 meses
	Médio - de 09 e 10 meses
	Alto - de 11 e 12 meses
	Altíssimo - acima de 12 meses - Inviabiliza o Projeto


## Previsão de Assinatura dos Contratos dos 10 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Fevereiro 2017

Setorial	Projeto	Risco (Tempo execução em meses)	Risco (Previsão de Contratação em meses)	Risco (Tempo contratação + execução em meses)
6 SEDUC	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (01 analista)	12	2	14
7 SEDUC	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (01 analista)	12	2	14
8 SEDUC	Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.	1,5	1	2,5
9 SEMA	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.	9,5	1,5	11
10 SEPLAG	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	6	3	9
11 SEPLAG	Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.	12	2	14

	Baixo - de 0 a 08 meses
	Médio - de 09 e 10 meses
	Alto - de 11 e 12 meses
	Altíssimo - acima de 12 meses - Inviabiliza o Projeto

## CGE - Assistência Técnica - Gestão Pública

*Subprojeto 8: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na “Detecção de Casos de Fraude e Corrupção” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.*

- **Responsável:** Denise Andrade Araújo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 152.225,69
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial elaborando relatório Financeiro desde 29/12/16 com previsão de envio à UGP em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## CGE - Assistência Técnica – Gestão Pública

*Subprojeto 10: Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema (MODELO).*

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 93.436,26
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2016 – Fevereiro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Em Fase de negociação de Contrato – Aguardando o envio da minuta do contrato para análise da UGP, com previsão de envio até \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

# SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 27: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Sandra Monteiro / Tarcísio Hilter
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 208.751,32
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Novembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em fase de negociação de contrato. - Reunião de negociação realizada em 25/01/17.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

# SEDUC- Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 29: Contratação de serviços de consultoria para avaliação de desempenho acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará. (Teste de Proficiência)*

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 374.353,64
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Em licitação – Após reunião em 23/01/17 SEDUC decidiu que vai dar continuidade ao processo de contratação. Aguardando reunião com Banco Mundial para alinhamento.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

# SEDUC - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 30: Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da **formação continuada para gestores**, professores e instrutores de educação profissional secundárias do Estado (com a inclusão da Avaliação de Desempenho Institucional).*

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 83.599,52
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Novembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em licitação – Aguardando devolução da Ata e Minuta do Contrato devidamente assinadas com previsão de envio até 30/01/2017.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

# SEDUC- Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojetos 31 e 32: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (02 analistas).*

- **Responsável:** Luciano Nery
- **Categoria de Licitação:** CI
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 54.151,20
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Relatório de Avaliação Curricular entregue a PGE em 24/01/17, aguardando a ofício de autorização para convocação dos consultores selecionados.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 





## SEDUC- Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 38: Contratação de Empresa Especializada para serviço de **Impressão Gráfica dos materiais** de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 91.449,17
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2016 - Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Processo no setor jurídico da SEDUC elaborando o contrato e homologação. Aguardando minuta do contrato para apreciação da UGP.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


## SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 52: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Maria Dias / Monica Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 217.760,38
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Aviso Resultado Final publicado no DOE dia 20/01/16, aguardando prazo recursal até dia 30/01/17.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

*Subprojeto 57: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.*

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 85.603,96
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Relatório de Avaliação Curricular e Justificativa enviada para “não objeção” do Banco Mundial. Aguardando reunião de alinhamento para continuidade do projeto.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

*Subprojeto 63: Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Silvana Dourado
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 776.780,21
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Abril 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Aviso Resultado Final publicado no DOE dia 17/01/17, prazo recursal até dia 24/01/17. Aguardando retorno da auditoria preventiva.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

## Previsão de Assinatura dos Contratos dos 09 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Março 2017

Setorial		Projeto	Risco (Tempo execução em meses)	Risco (Previsão de Contratação em meses)	Risco (Tempo contratação + execução em meses)
1	CGE	Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas. (APLICAÇÃO)	8	3	11
2	IPECE	Metodologias para análise de impacto econômico.	12	3	15
3	SECITECE	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	6	3	9
4	SEDUC	Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey).	3	3	6
5	SEDUC	Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.	12	3	15

	Baixo - de 0 a 08 meses
	Médio - de 09 e 10 meses
	Alto - de 11 e 12 meses
	Altíssimo - acima de 12 meses - Inviabiliza o Projeto



## Previsão de Assinatura dos Contratos dos 09 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Março 2017

Setorial		Projeto	Risco (Tempo execução em meses)	Risco (Previsão de Contratação em meses)	Risco (Tempo contratação + execução em meses)
1	SEDUC	Contratação de empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.	10	2	12
2	SEDUC	Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN.	8	1	9
3	SEMA	Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	9	3	12
4	SEPLAG	Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS).	12	2	14

	Baixo - de 0 a 08 meses
	Médio - de 09 e 10 meses
	Alto - de 11 e 12 meses
	Altíssimo - acima de 12 meses - Inviabiliza o Projeto

## CGE - Assistência Técnica – Gestão Pública

*Subprojeto 11: Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).*

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 760.937,50
- **Método de Aquisição:** LPN
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2016 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Recebida 01 propostas, CGE elaborando Relatório de Julgamento das propostas com previsão de envio à UGP em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

# IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojeto 22: Contratação de Consultoria de Empresa para Desenvolvimento de Metodologia para análise de impacto econômico no Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 432.682,09
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Setembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial analisando as propostas com previsão de envio para revisão da UGP até dia 27/01/17.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



# SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 26: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.*

- **Responsável:** Sandra Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 149.556,68
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – RAT em análise na UGP , com previsão de entrega até dia 27/01/17.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

# SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 35: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 25.728,75
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Atividades Preparatórias –TR e MC enviados ao Banco Mundial para “Não Objeção” técnica.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


## SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 36: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de **formação para gestores das creches e pré-escolas** dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 244.309,68
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Junho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Relatório de Avaliação Técnica finalizado, colhendo assinaturas para posterior envio à Cel04.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



## SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 37: Contratação de empresa especializada para operacionalizar e executar os **serviços de logística** das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 318.941,00
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2016 – Fevereiro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Processo Pregão Eletrônico nº 20160073 em fase de homologação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



## SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 47: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 22.627,51
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2016 – Outubro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Em fase de assinatura de contrato. Aguardando avanço de outros projetos para efetivar a contratação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 54: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da **coleta seletiva** nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 723.273,62
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Reunião de negociação realizada em 25/01/2017.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## SEPLAG - Assistência Técnica – Fiduciário

*Subprojeto 64: Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado – GCOMPRAS.*

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 566.481,02
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Abril 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Aguardando reunião com equipe do novo secretário da SEPLAG depois do dia 02/02/17 para alinhamento sobre a forma de contratação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## Previsão de Assinatura dos Contratos dos 01 Subprojeto sendo Licitados – Mês de Março 2017



Setorial	Projeto	Risco (Tempo execução em meses)	Risco (Previsão de Contratação em meses)	Risco (Tempo contratação + execução em meses)
1 SEPLAG	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial (2a. Etapa)	6	3	9

	Baixo - de 0 a 08 meses
	Médio - de 09 e 10 meses
	Alto - de 11 e 12 meses
	Altíssimo - acima de 12 meses - Inviabiliza o Projeto



# SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

*Subprojeto 60: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter setorial (2a. Etapa)*

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 337.500,00
- **Método de Aquisição:**
- **Revisão Prévia/Posterior:**
- **Início/Término:** Junho 2016 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Manifestação de Interesse aguardando assinatura do secretário para envio a Cel04, com previsão para \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



## 5. MONITORAMENTO CONTRATOS

## Situação dos Contratos – Resumo Financeiro

Setorial	Nº de Contratos	Nº de Contratos em Andamento	Nº de Contratos Concluídos	Valor Contratado (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo a Pagar (R\$)	% PAGO
ARCE	1	1	-	839.665,66	629.916,48	209.749,18	75%
CGE	7	4	3	6.728.509,05	503.443,52	6.225.065,53	7%
COGERH	3	2	1	4.419.133,06	1.584.428,09	2.834.704,97	36%
FUNCEME	1	1	-	1.493.282,77	1.058.618,64	434.664,13	71%
IPECE	7	6	1	1.353.262,80	971.766,30	381.496,50	72%
PGE	1	1	-	1.434.107,25	-	1.434.107,25	0%
SDE	2	1	1	1.148.959,99	280.723,80	868.236,19	24%
SECITECE	1	1	-	192.364,00	20.527,45	171.836,55	11%
SEDUC	10	4	6	5.758.018,15	932.403,14	4.825.615,01	16%
SEMA	5	5	-	4.976.407,80	1.107.433,81	3.868.973,99	22%
SEMACE	2	2	-	1.744.961,99	336.304,50	1.408.657,49	19%
SEPLAG	5	4	1	7.406.350,24	3.370.597,80	4.035.752,44	46%
SRH	3	3	-	3.048.215,88	342.448,83	2.705.767,05	11%
STDS	3	1	2	2.307.050,00	585.556,00	1.721.494,00	25%
TCE	3	1	2	3.067.178,37	529.663,21	2.537.515,16	17%
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>37</b>	<b>17</b>	<b>45.917.467,01</b>	<b>12.253.831,57</b>	<b>33.663.635,44</b>	<b>27%</b>

# Situação dos Contratos - Financeiro

## Valores Contratados e Previsão a Contratar - Assistência Técnica (Componente 2)


Valores Contratados (R\$)	Previsão a Contratar (R\$)				Total (R\$)
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	
45.917.467,01	3.053.339,10	7.026.636,88	9.814.827,03	1.080.000,00	66.892.270,02
68,64%	4,56%	10,50%	14,67%	1,61%	100%
54 Contratos	02 Contratos	12 Contratos	8 Contratos	1 Contrato	77 Contratos

## Valores Pagos e Previsão a Pagar - Assistência Técnica (Componente 2)

Valores Pagos (R\$)	Previsão a Pagar (R\$)				Total (R\$)
	1º Tri 2017	2º Tri 2017	3º Tri 2017	4º Tri 2017	
12.253.831,57	5.501.934	13.754.834	11.003.867	24.377.802,98	66.892.270,02
18,32%	8,23%	20,56%	16,45%	36,44%	100%

## Situação dos Contratos – Aditivos de Prazo

Setorial	ARCE	CGE	COGERH	FUNCEME	PGE	SEMA	SEMACE	SEPLAG	SDE	SEDUC	STDS	SECITECE	IPECE	TCE	SRH	TOTAL
Nº Contratos	1	7	3	1	1	5	2	5	2	10	3	1	7	3	3	<b>54</b>
Aditivo de Prazo	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	4	0	7	3	0	<b>21</b>

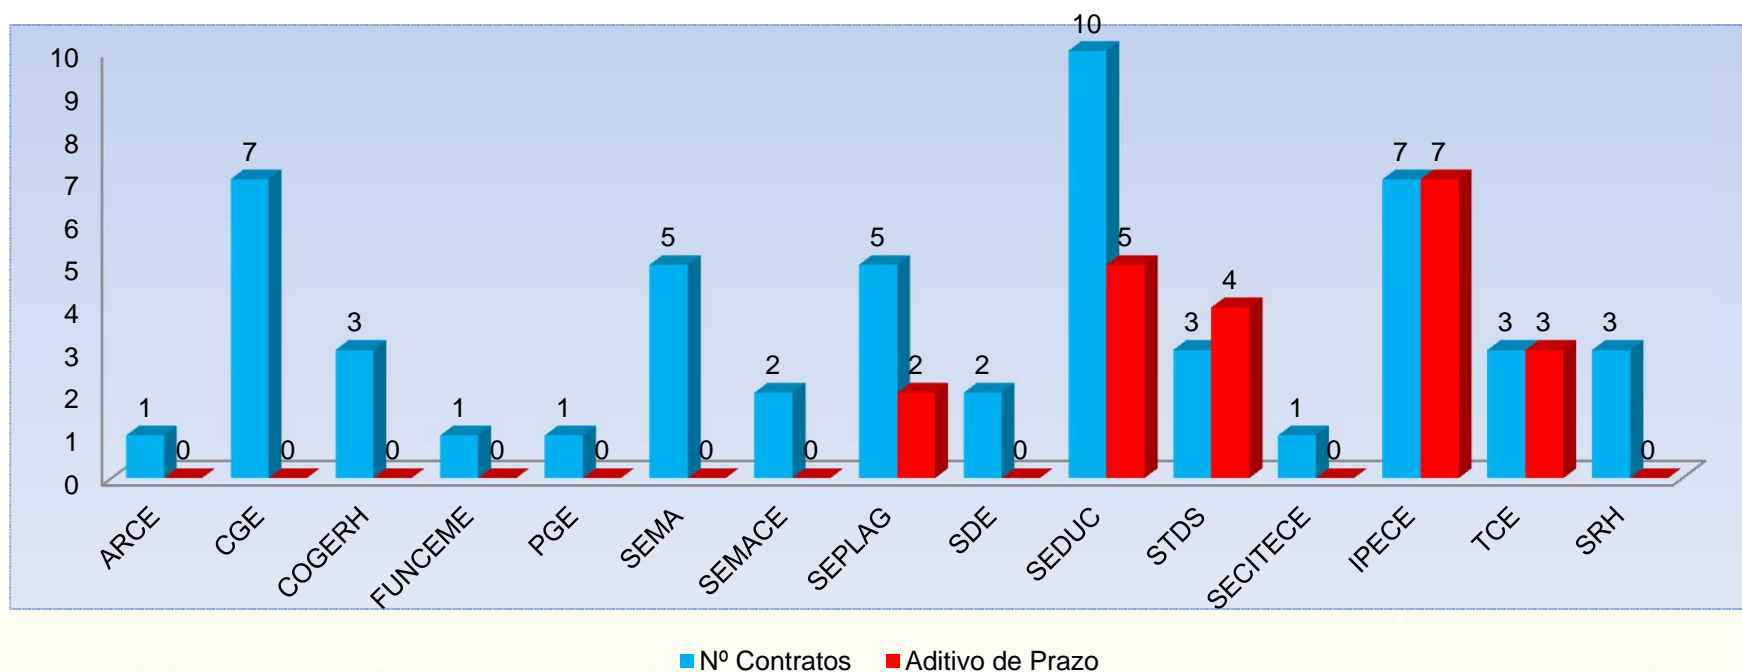

**39% dos Contratos já foram elaborados Aditivos de Prazo**

# Divulgação dos Contratos e Produtos no Site

20/01/2017, Sexta-Feira   Destaques

**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
Governo do Estado do Ceará

**Institucional** Nossa Identidade e Estrutura | **Planejamento** Planejamento e Orçamento | **Gestão** Ações e informações de Gestão | **Gestão do Servidor** | **Compras** Acesso ao Portal de Compras

**Acesso à Informação**

[Gestão para Resultados](#)  
[Plano Plurianual](#)  
[Lei de Diretrizes Orçamentárias](#)  
[Lei Orçamentária Anual](#)  
[Execução Orçamentária](#)  
[Mensagem à A.L.](#)  
[Plano Operativo](#)  
[MAPP Gestão](#)  
[Descentralização Orçamentária](#)  
[Parceria Público-Privadas](#)  
[Cooperação Técnico-Financeira](#)  
[Contrato de Gestão](#)  
[Consórcio Público](#)

**Órgãos Vinculados**  
COHAB - Companhia de Habitação  
EGP - Escola de Gestão Pública  
ETICE - Empresa de Tecnologia  
IPECE - Instituto de Pesquisa e Planejamento Econômico e Social  
ISSEC - Instituto de Saúde do Ceará

**Projeto de Fortalecimento do Modelo de Gestão para Resultados - GPR**

O projeto de Fortalecimento do Modelo de Gestão Pública para Resultados – GPR, adotado pelo Governo do Estado do Ceará, tem como objetivos:

- Avaliar o modelo de Gestão Pública para Resultados em implementação no Governo do Estado, fundamentando-se nas referências de boas práticas adotadas por países e estados da federação;
- Revisar o modelo de GPR aperfeiçoando o processo de coordenação, melhorando a qualidade dos indicadores a serem monitorados, com base na sua relevância para o alcance dos resultados esperados (ou dos componentes do modelo), estruturando um ciclo integrado de planejamento, orçamento, monitoramento e avaliação;
- Apoiar o fortalecimento da governança para resultados, aprimorando os mecanismos de coordenação e colaboração intersetorial entre secretarias, focada, em especial nos temas de assistência familiar, qualidade da água e capacitação;
- Dispor de um plano de implementação da metodologia de GPR com Modelo de Incentivos para o Estado e sua aplicação em áreas-piloto; e
- Dotar o Governo do Estado de capacidade institucional (estrutura organizacional, e capacitação) para implementação do modelo revisado de GPR.

Neste projeto está prevista a entrega dos seguintes produtos, devidamente analisados e validados por uma Comissão formada por técnicos servidores da Secretaria do Planejamento e Gestão – Seplag (coordenadora do projeto), Secretaria da Fazenda – Sefaz, Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado – CGE, Casa Civil Procuradoria Geral do Estado – PGE:

- Relatório com a análise de benchmarking consolidando as práticas e metodologias de GPR e de modelos de incentivos;
- Relatório do diagnóstico e conclusões do modelo de GPR adotado no Estado do Ceará e da análise de mecanismos de incentivos existentes no Estado;
- Relatório consolidado de Avaliação do Modelo de GPR do Ceará;
- Carteira de Projetos Estratégicos Prioritários do Governo do Estado do Ceará;
- Relatório com o detalhamento dos planos dos projetos selecionados e implantação do monitoramento intensivo
- Metodologia que consolide o Modelo de GPR, com e sem Modelo de Incentivos alinhado ao alcance dos objetivos estratégicos, a ser adotado pelo Estado do Ceará;
- Relatório de requisitos ao desenvolvimento de ferramentas de suporte à aplicação do Modelo de GPR e do Modelo de Incentivos;
- Minuta de regulamentação para a efetiva execução do Modelo de GPR;
- Plano de Implantação do Modelo de GPR e do Modelo de Incentivos;
- Relatório de implantação do Modelo de GPR em uma secretaria-piloto;
- Relatório de implantação do Modelo de GPR em cinco secretarias;
- Termo de Referência para Avaliação do Modelo de GPR adotado no Estado e respectivo Modelo de Incentivos.

**Serviços**  
[Servidor Online](#)  
[Ouvidoria](#)  
[Manuais da SEPLAG](#)  
[Acesso a Sistemas](#)  
[Acesso Cidadão - Catálogo Eletrônico de Serviços do Estado do Ceará](#)  
[Diário Oficial](#)  
[Acompanhamento de Processos - VIPROC](#)  
[Concursos Públicos](#)  
[Consulta às Licitações Publicadas](#)  
[Banco de Talentos](#)  
[Registro de Preço](#)  
[Rotas](#)  
[WEBMAIL](#)  
[Programas orçamentários para execução de parcerias](#)  
[Certidão de Acumulação de Cargos](#)

**PROGRAMAS ORÇAMENTÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE PARCERIAS**  
LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2012



## 6. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR SETORIAL CONTRATADOS



# CGE



# CGE- Assistência Técnica – Gestão Pública

*Subprojetos 2 e 3: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR. <sup>1</sup>*

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 67.354,63
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 - Fevereiro 2016
- **Estágio Atual:** Contratos Concluídos.

***Nota 1: Auditoria será realizada pela equipe da CGE a partir do semestre 16.1***

## CGE - Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

*Subprojeto 4: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Marcelo Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 224.190,70
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2016 – Abril 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 08/2016 - Publicado em 28/06/2016.
- **Consultora Vencedora:** Empresa NT Consult Tecnologia e Consultoria LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 725.256,92
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## CGE - Assistência Técnica - Gestão Financeira

*Subprojeto 5: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).*

- **Responsável:** Carlos Jorge Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 658.560,58
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2016 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 026/2016 - Publicado em 16/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** Ivia Serviços de Informática Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.130.443,48.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

## CGE - Assistência Técnica - Gestão Financeira

*Subprojeto 6: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.*

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.071.989,29
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2016 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 029/2016 – Publicado em 02/12/2016.
- **Consultora Vencedora:** CAIENA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 3.467.885,35.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

## Assistência Técnica – Gestão Financeira

*Subprojeto 9: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamentos com foco no “**Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público**” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos do processo de convergência das Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público (IPSAS).*

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 63.341,12
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2016 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 025/2016 - Publicado em 30/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** KPMG ASSESSORES LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 197.421,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

## CGE - Assistência Técnica – Gestão Pública

*Subprojeto 12: Contratação de consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.*


- **Responsável:** Aglaio Soares
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 24.411,82
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Março de 2016
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.



# IPECE

## CGE- Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojetos 14 e 15: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.*  
**CONSULTORES PLENOS**

- **Responsável:** Viviane Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 322.192,82
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contratos em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 




## CGE- Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojeto 16: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTOR JÚNIOR*

- **Responsável:** Viviane Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 21.227,67
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.


## CGE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojetos 17,18 e 19: Contratação de 03 (três) **Analistas em Licitações** para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- **Responsável:** Viviane Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 223.560,31
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contratos em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## CGE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojeto 20: Contratação de Consultor Individual especializado em **Políticas Públicas** para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução a Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.*

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 109.139,93
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévio
- **Início/Término:** Julho 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 10/2015 publicado em 18/09/2015. Serviços em execução.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



# PGE

## PGE - Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

*Subprojeto 23: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.*


- **Responsável:** Valéria Rodrigues
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 443.309,81
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2015 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 23/2016 assinado em 14/09.
- **Consultora Vencedora:** NTConsult Tecnologia e Consultoria Ltda.
- **Valor do Contrato:** 1.434.107,25
- **Sinalização em relação ao Prazo:**



# SECITECE

# SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 28:* Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

- **Responsável:** Sandra Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 85.071,64
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Fevereiro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 16/2016, assinado em 06/07/2016.
- **Consultora:** Maria Fatima Ludovico da Gama e Souza.
- **Valor do Contrato:** R\$ 138.720,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 




# SEPLAG



## SEPLAG - Assistência Técnica - Gestão Pública

*Subprojeto 58: Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Aduino Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 504.550,12
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído. Aguardando o pagamento.
- **Consultora vencedora:** Consórcio Macroplan e Transplan.
- **Valor do contrato:** 913.714,44.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


## SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

*Subprojeto 59: Consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.128.001,21
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 023/2015. Serviço em Execução.
- **Consultora vencedora:** Macroplan Prospectiva, Estratégia e Gestão S/S Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ 2.143.275,24
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

*Subprojeto 61: Consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Dominique Gomes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 317.051,64
- **Método de Aquisição:** SBQ
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Outubro 2015 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Contrato e ordem de serviço assinados em 04/10/2016. Realizado 1ª reunião de partida do projeto. Aguardando a publicação no DOE.
- **Consultora vencedora:** Consórcio IADH x DELOS.
- **Valor do contrato:** R\$ 1.025.662,05.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


## SEPLAG - Assistência Técnica - Gestão Pública

*Subprojeto 62: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para **Auditar a Folha de Pagamento** do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Fábio Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 556.414,22
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato assinado e emitido a Ordem de Serviço em 16/09/2016.
- **Consultora vencedora:** Deloitte Touche Tohatsu Consultores LTDA .
- **Valor do contrato:** R\$ 1.800.000,00
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

## SEPLAG - Assistência Técnica – Fiduciário

*Subprojeto 65: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 238.726,47
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato assinado em 22/11/16. Aguardando publicação.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



# STDS

## STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 72: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.*

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 64.213,69
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Novembro 2016
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído - Consultora Maria Cílvia Queiroz.
- **Valor do Contrato:** R\$ 121.000,00.

## STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família


*Subprojeto 73: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.*

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 63.174,42
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Setembro 2015
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Consultora Vencedora:** Empresa Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 142.850,00.



## STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 74: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará*


- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 892.888,73
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico (NCB)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução - Contrato nº 058/2016, assinado em 25/05/2016.
- **Consultora Vencedora:** Maestria Comunicação e Eventos LTDA- EPP.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.019.000,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



# ARCE

# ARCE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 1: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.*

- **Responsável:** Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Subprojeto:** US\$ 371.040,45
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 019/2016, assinado em 14/06/2016.
- **Consultora Vencedora:** RPG – Regulation, Performance and Governace LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 838.996,66.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



# COGERH

# COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 69: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Quali-quantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.*

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 677.500,59
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em execução – Contrato 48/2015, assinado em 24/11/2015.  
**Consultora Vencedora:** Consórcio Água e Solo / Quanta / Engeplus.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.954.015,55.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

# COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 70: Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.*

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 742.914,10
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Contrato em execução – Contrato 21/2016, assinado em 19/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Nippon Koei Latin America - Caribbean Co. Ltd. / Nippon Koei LAC do Brasil Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.403.327,11.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**



# COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 71: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas*

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor Subprojeto:** US\$ 27.326,28
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2015 – Outubro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato concluído.




# FUNCEME



## FUNCEME - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 13: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.*

- **Responsável:** Francisco Hoilton
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Proposta Vencedora:** €267.442,11 + R\$ 687.325,77 equivalente a R\$ 1.492.246,27
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Março 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 10/2015, assinado em 09/09/2015.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Aqualogus / Azurit.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.492.246,27.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



# SDE / ADECE

## SDE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 24: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.*

- **Responsável:** Fernando Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 353.142,52
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato assinado em 26/08/2016.
- **Consultora Vencedora:** Ivia Serviços de Informática Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.142.416,04
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

# SDE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

## *Subprojeto 25: Impact Evaluation Workshop Instambul*

- **Responsável:** Inês Studart
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 2.894,02
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Maio 2015.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.



# SEDUC

## SEDUC- Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 34: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 4.466,03
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Julho 2015
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.

## SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 39: Contratação de Consultor Individual Especialista em **Avaliação de Programas para Identificar o Impacto** do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor Subprojeto:** US\$ 4.139,40
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2014 – Maio 2016
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.

## SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 40: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 25.207,85
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Agosto 2015
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.



## SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 41: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 29.188,04
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Agosto 2015
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído

## SEDUC - Assistência Técnica –Assistência à Família

*Subprojeto 42: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de **Arte Gráfica/Design**, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 61.838,85
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Setembro 2016
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Consultora Vencedora:** Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 139.830,00.

## SEDUC - Assistência Técnica –Assistência à Família

*Subprojeto 43: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 202.891,81
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2016 – Setembro 2017
- **Estágio Atual:** Contratado em Execução – Contrato nº 236/2016, assinado em 30/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** CASAM – Centro de Apoio Social e de Animação Missionária.
- **Valor do Contrato:** R\$ 656.355,00
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 44: Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 309.109,89
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2016 – Setembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 214/2016, assinado em 12/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** VC Promoções e Eventos Ltda – EPP.
- **Valor do Contrato:** R\$ 999.970,50.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


## SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 45: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados).*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 1.155.818,22
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Outubro 2017
- **Estágio Atual:** Contratado em Execução – Contrato nº 214/2016, assinado 28/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** OVERVIEW SERVICOS & INFORMACAO LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 3.739.071,95
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

# SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 46: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 22.627,51
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2016 – Outubro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contratado em Execução – Contrato nº 253/2016, assinado 19/10/2016.
- **Consultora Vencedora:** Rafaela Martins Leite Monteiro.
- **Valor do Contrato:** R\$ 63.000,00
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



# SEMA

## SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 48: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto “AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.” (AIEDA)*

- **Responsável:** Maria Dias / Magda Marinho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 376.432,70
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2016 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 18/2016, assinado em 16/08/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Aquino – Mcrit SL – Barcelona Brasil Group.
- **Valor do Contrato:** R\$ 885.207,23.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



# SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 49: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas*

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 314.274,86
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 06/2016, assinado em 25/02/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Engesoft Engenharia / Quanta Consultoria Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 710.638,32.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**


## SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 50: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicos.*

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor Subprojeto:** US\$ 107.269,38
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 26/2016, assinado em 26/11/2015.
- **Consultora Vencedora:** Empresa MSV Multiserviços ME.
- **Valor do Contrato:** R\$ 242.557,52.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

# SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 51: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Maria Dias / Francisco Leorne
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** 174.082,76
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2014 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 16/2016, assinado em 05/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** Arcadis Logos S.A.
- **Valor do Contrato:** R\$ 563.157,73.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

# SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 53: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".*

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 1.153.752,25
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 20/2016, assinado em 01/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** Bureau de Projetos e Consultoria Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.608.864,60.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████



# SEMACE

# SEMACE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 55: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE*

- **Responsável:** Elizabeth Romão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 331.484,70
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Dezembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato assinado.
- **Consultora Vencedora:** Tramitty Serviços LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.072.352,99.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

# SEMACE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 56: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a **Manualização dos Procedimentos Técnicos** dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.*

- **Responsável:** Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 207.916,23
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 20/2016, assinado em 13/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** MBS CONSULTING – MBS Estratégias e Sistemas LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 672.609,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 




# SRH



# SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 66: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.*

- **Responsável:** Deborah Mithya e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 431.620,55
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato N° 02/2016, assinado em 27/10/2016.
- **Consultora Vencedora:** IBI Engenharia Consultiva.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.396.292,47
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


# SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 67: Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. **SIGERH***

- **Responsável:** Deborah Mithya e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 403.809,40
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 03/2016.
- **Consultora Vencedora:** CAPGEMINI CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.306.323,41.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

# SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 68: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - **Malha D'agua.***


- **Responsável:** Deborah Mithya e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do TOR:** US\$ 152.839,20
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 01/2016, assinado em 18/05/2016.
- **Consultora:** Dorian Ponte Lima – R\$ 288.000,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



# TCE

## TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

*Subprojeto 75: Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.*

- **Responsável:** Glinton Ferreira / Delinda Almeida
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 834.461,49
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/ Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato Nº 21/2016 em Execução.
- **Consultora Vencedora:** Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
- **Valor do Contrato:** 2.699.484,21.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

# TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

*Subprojeto 76: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará*

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 61.694,57
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato concluído.

## TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

*Subprojeto 77: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).*

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 100.915,62
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato concluído.



## 7. APROVAÇÃO DA ATA

### 35ª REUNIÃO COMITÊ *PforR* (15/12/2016)



## Próxima Reunião do Comitê PforR

Próxima Reunião do Comitê PforR:

**23/02/2017**  
**14h30m - IPECE**



## 8. ENCAMINHAMENTOS

## Encaminhamentos da 35ª Reunião realizada em 15/12/2016

- ✓ Não houve encaminhamentos.



## 9. ENCERRAMENTO

Unidade de Gerenciamento do Projeto PforR (UGP)  
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)  
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora  
Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N  
Ed. SEPLAG, 2º andar- Fortaleza-CE  
Tel.: (85) 3101.3499 e (85) 3101.3510
