



51ª REUNIÃO DO COMITÊ *PforR*
ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO
PROJETO *PforR*
26 DE ABRIL DE 2018



PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

1. Abertura e apresentação dos participantes;
2. Informações Importantes – **Laura Gonçalves / Viviane Costa**
3. Indicadores, Programas e Assistência Técnica
 - 3.1. Indicadores Primários – Informações atualizadas – **Laura Gonçalves**
 - 3.2. Programas PforR - **Thâmara Teixeira**
 - 3.3. Assistência Técnica – Estatísticas
 - 3.4. Pontos Principais de Aquisições / Contratos – **Giuseppe Nogueira**
4. Monitoramento Contratos – **André Morel**
5. Projetos de assistência técnica por setorial contratados
6. Apresentação dos Resultados de Assistência Técnica
 - ✓ SEMA
 - ✓ SEPLAG
7. Aprovação da Ata da 50ª Reunião (22/03/2018) – **Viviane Costa**
8. Encerramento



1. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES



2. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Informações Importantes

➤ Lições Aprendidas PforR – Elaboração Relatório Final PforR -

1 . Experiência adquirida no Projeto (Lições Aprendidas):

- ✓ Indicadores;
- ✓ Programas;
- ✓ Assistências Técnicas

2. Fortalecimento Institucional

- Setoriais que ainda não enviaram: SEMA, COGERH, CAGECE e CIDADES – **Prazo Final 30/04**

Informações Importantes

1. Missão de Gerenciamento Financeiro com a Especialista Susana Amaral:

❖ 14 a 16 de maio de 2018

2. Missão Virtual de Supervisão do Projeto *PforR*:

❖ 21 a 22 de maio de 2018



3. INDICADORES, PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA



3.1. Indicadores Primários 2017.2 e Desembolsos

INDICADORES PRIMÁRIOS – Acompanhamento

Nº	Setorial	Nome do Indicador
1	SDE	DLI 1: aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação
2	SEDUC	DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP
3	SEDUC	DLI 3: número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.
4	STDS	DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS
5	STDS	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.
6	SEPLAG	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas
7	SRH	DLI 7: Estabelecimento de um comitê interagência de segurança hídrica
8	CAGECE	DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.
9	SEMA	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.
10	FUNCEME	DLI 10: Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.
11	SEPLAG	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.
12	SEPLAG	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada

INDICADORES SECUNDÁRIOS – Acompanhamento

Nº	Setorial	Nome do Indicador
1	STDS	Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas.
2	SEPLAG	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).
3	SEMA	Apresentação da Lei de Resíduos Sólidos revista.
4	IPECE	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).
5	COGERH	Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.
6	COGERH	Apresentação da nova lei de proteção das bacias hidrográficas.
7	COGERH	Qualidade da água bruta na Região Metropolitana de Fortaleza.

SUMÁRIO DESEMBOLSO - Valores Previstos/Desembolsados

Categorias	Previsto US\$ (A)	Realizado US\$ (B)	Realizado R\$	Valor Disponível US\$ (A) - (B)	% Valor Desembolsado/ Total Previsto
CATEGORIA I e III	325.000.000,00	325.000.000,00	990.265.885,76	-	100%
CATEGORIA II	25.000.000,00	19.415.028,00	55.814.003,08	5.584.972,00	77,66%
Total	350.000.000,00	344.415.028,00	1.046.079.888,84	5.584.972,00	98,40%

Atualizado em 22/03/18



3.2. Programas *PforR*

Posição dos Programas em 2017

Meta 2014-2017	Estipulada no Documento de Avaliação do Projeto	R\$ 728,00	100%
Execução 2014	Auditada pelo TCE	R\$ 223,36	30,68%
Execução 2015	Auditada pelo TCE	R\$ 226,15	31,06%
Execução 2016	Auditada pelo TCE	R\$ 275,39	37,83%
Total Executado e auditado até 2016		R\$ 724,90	99,57%
Execução 2017	A ser auditada em 2018	R\$ 268,72	-
Total Executado		R\$ 993,62	-

Execução Acumulada dos Programas – 2014 à 2017

Setorial	EXECUÇÃO				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
SEDUC	R\$ 208,91	R\$ 213,00	R\$ 263,25	R\$ 257,87	R\$ 943,04
STDS	R\$ 7,21	R\$ 7,24	R\$ 7,36	R\$ 7,32	R\$ 29,13
SRH/COGERH	R\$ 0,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,46
CIDADES	R\$ -				
SEMA	R\$ 0,39	R\$ 1,11	R\$ 0,24	R\$ 0,69	R\$ 2,43
SEMACE	R\$ 4,60	R\$ 2,43	R\$ 2,71	R\$ 1,32	R\$ 11,06
FUNCEME	R\$ 1,79	R\$ 2,37	R\$ 1,82	R\$ 1,52	R\$ 7,50
TOTAL	R\$ 223,36	R\$ 226,15	R\$ 275,39	R\$ 268,72	R\$ 993,62

- ✓ Em 16 de fevereiro de 2018, foi enviado ao Banco Mundial e TCE o último Relatório Financeiro do Projeto – IFR que será auditado pelo TCE a partir de junho do mesmo ano.

Posição da Execução dos Programas - 2018

Capacitação Profissional

SEDUC	Orçamento	Restos a Pagar	Total
020 - Ensino Integrado à Educação Profissional	R\$ 61.482.579,84	R\$ 21.226.796,84	R\$ 82.709.376,68
020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 24.320.506,45	R\$ 13.386.373,85	R\$ 37.706.880,30
18802 - EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ 24.320.506,45	R\$ 12.916.521,85	R\$ 37.237.028,30
18803 - EXPANSÃO E MELHORIA DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ -	R\$ 469.852,00	R\$ 469.852,00
020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 32.913.399,11	R\$ 6.621.309,46	R\$ 39.534.708,57
22668 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - APORTE.	R\$ 670.353,74	R\$ 525.470,73	R\$ 1.195.824,47
22669 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ 31.897.451,74	R\$ 5.048.239,18	R\$ 36.945.690,92
22670 - GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ 345.593,63	R\$ 1.047.599,55	R\$ 1.393.193,18
020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.	R\$ -	R\$ 9.726,95	R\$ 9.726,95
18806 - ADEQUAÇÃO DA OFERTA E DOS CURRÍCULOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ -	R\$ -	R\$ -
18807 - AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS.	R\$ -	R\$ 9.726,95	R\$ 9.726,95
020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.	R\$ 4.248.674,28	R\$ 1.209.386,58	R\$ 5.458.060,86
18815 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ 4.248.674,28	R\$ 1.209.386,58	R\$ 5.458.060,86

Posição da Execução dos Programas - 2018

Assistência à Família

STDS	Orçamento	Restos a Pagar	Total
080 – Proteção Social Básica	R\$ 1.222.786,00	R\$ -	R\$ 1.222.786,00
080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.	R\$ 1.222.786,00	R\$ -	R\$ 1.222.786,00
22874 - COFINANCIAMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	R\$ 1.222.786,00	R\$ -	R\$ 1.222.786,00

Posição da Execução dos Programas - 2018

Qualidade da Água

SEMA	Orçamento	Restos a Pagar	Total
064 – Resíduos Sólidos	R\$ -	R\$ 83.200,00	R\$ 83.200,00
064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.	R\$ -	R\$ 83.200,00	R\$ 83.200,00
18911 - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$ -	R\$ 83.200,00	R\$ 83.200,00
066 – Ceará Mais Verde	R\$ -	R\$ 79.664,00	R\$ 79.664,00
066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.	R\$ -	R\$ 79.664,00	R\$ 79.664,00
17569 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	R\$ -	R\$ 79.664,00	R\$ 79.664,00

Posição da Execução dos Programas - 2018

Qualidade da Água

SEMACE	Orçamento	Restos a Pagar	Total
066 – Ceará Mais Verde	R\$ -	R\$ 102.276,02	R\$ 102.276,02
066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais.	R\$ -	R\$ 102.276,02	R\$ 102.276,02
18657 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS	R\$ -	R\$ 102.276,02	R\$ 102.276,02
500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada	R\$ -	R\$ 268.119,91	R\$ 268.119,91
500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas.	R\$ -	R\$ 268.119,91	R\$ 268.119,91
17971 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - SEMACE	R\$ -	R\$ 220.619,91	R\$ 220.619,91
17973 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TI - SEMACE	R\$ -	R\$ 47.500,00	R\$ 47.500,00

Posição da Execução dos Programas - 2018

Qualidade da Água

FUNCEME	Orçamento	Restos a Pagar	Total
018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis	R\$ 354.921,80	R\$ 207.355,44	R\$ 562.277,24
018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias.	R\$ 354.921,80	R\$ 207.355,44	R\$ 562.277,24
22611 - PROMOÇÃO E SUPORTE AO MONITORAMENTO E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES HIDROAGROMETEOROLÓGIAS	R\$ 354.921,80	R\$ 207.355,44	R\$ 562.277,24

PROGRAMAS EXECUÇÃO ACUMULADA 2018	Execução Orçamentária	Execução Extraorçamentária	Total
	R\$ 63.060.287,64	R\$ 21.967.412,21	R\$ 85.027.699,85



3.3. Assistência Técnica



3.4 Pontos Principais de Aquisições / Contratos

Pontos Principais de Aquisições / Contratos

- Envio do Produto e Parecer em meio digital para UGP, para liberação de pagamento no S2GPR;
- Envio da Documentação (Nota de Empenho, Nota fiscal, recibo e Nota de Pagamento) de pagamento para arquivamento e acompanhamento pela UGP




4. MONITORAMENTO CONTRATOS

Cronograma Assinatura dos Contratos AT (R\$)

Descrição	Ano									Total
	2014.1	2014.2	2015.1	2015.2	2016.1	2016.2	2017.1	2017.2	Previsão 2018.1	
Contratos Assinados	0	3	11	11	7	20	19	4	5	80
Valores R\$	-	557.865	1.165.551	8.716.477	4.821.785	29.514.252	13.543.998	1.605.414	4.301.942	64.227.285
% Financeiro dos Projetos Contratados	0,0%	0,9%	1,8%	13,6%	7,5%	46,0%	21,1%	2,5%	6,7%	100%

Contratos Assinados e Previsão de Assinatura

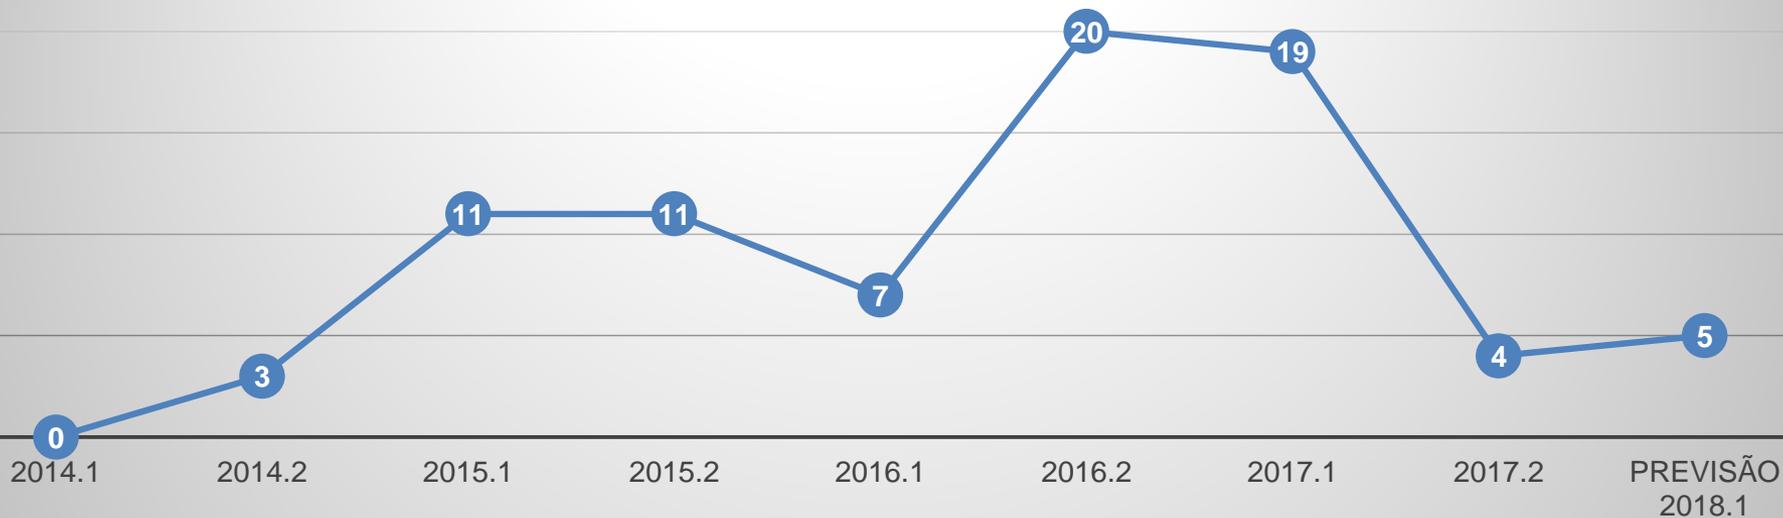

Contratos Assistência Técnica


Setorial	Nº de Contratos	Nº de Contratos em Andamento	Nº de Contratos Concluídos	Valor Contratado + Patronal (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo a Pagar (R\$)	% PAGO
ARCE	1	-	1	839.982,65	839.982,65	-	100%
CGE	9	2	7	7.883.945,04	6.063.008,73	1.820.936,31	77%
COGERH	3	1	2	4.419.133,06	3.914.434,34	504.698,72	89%
FUNCEME	1	-	1	1.666.842,98	1.666.842,98	-	100%
IPECE	9	6	3	5.636.414,90	4.300.429,92	1.335.984,98	76%
SDE	2	0	2	1.148.959,99	1.148.959,99	-	100%
SECITECE	3	0	3	1.400.260,31	1.400.260,31	-	100%
SEDUC	20	9	11	8.760.839,28	5.505.726,69	3.255.112,59	63%
SEMA	7	1	6	7.234.534,13	6.060.545,06	1.173.989,07	84%
SEMACE	2	0	2	1.639.804,89	1.639.804,89	-	100%
SEPLAG	8	4	4	10.788.155,29	7.866.017,60	2.922.137,69	73%
SRH	3	2	1	3.048.215,88	1.901.694,08	1.146.521,80	62%
STDS	3	1	2	2.307.050,00	1.307.072,00	999.978,00	57%
TCE	4	1	3	3.164.958,37	1.302.314,26	1.862.644,11	41%
TOTAL	75	27	48	59.939.096,77	44.917.093,50	15.022.003,27	75%

Cronograma Pagamentos AT(R\$)

Pago e Previsão de Pagamento da Assistência Técnica - PforR (R\$)


Ano	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Ano 2018 Pago até 20/04	A pagar em 2018	Total
Valor	72.600	975.610	11.205.681	30.816.267	1.850.292	19.306.836	64.227.285

Pago e Previsão de Pagamentos da AT

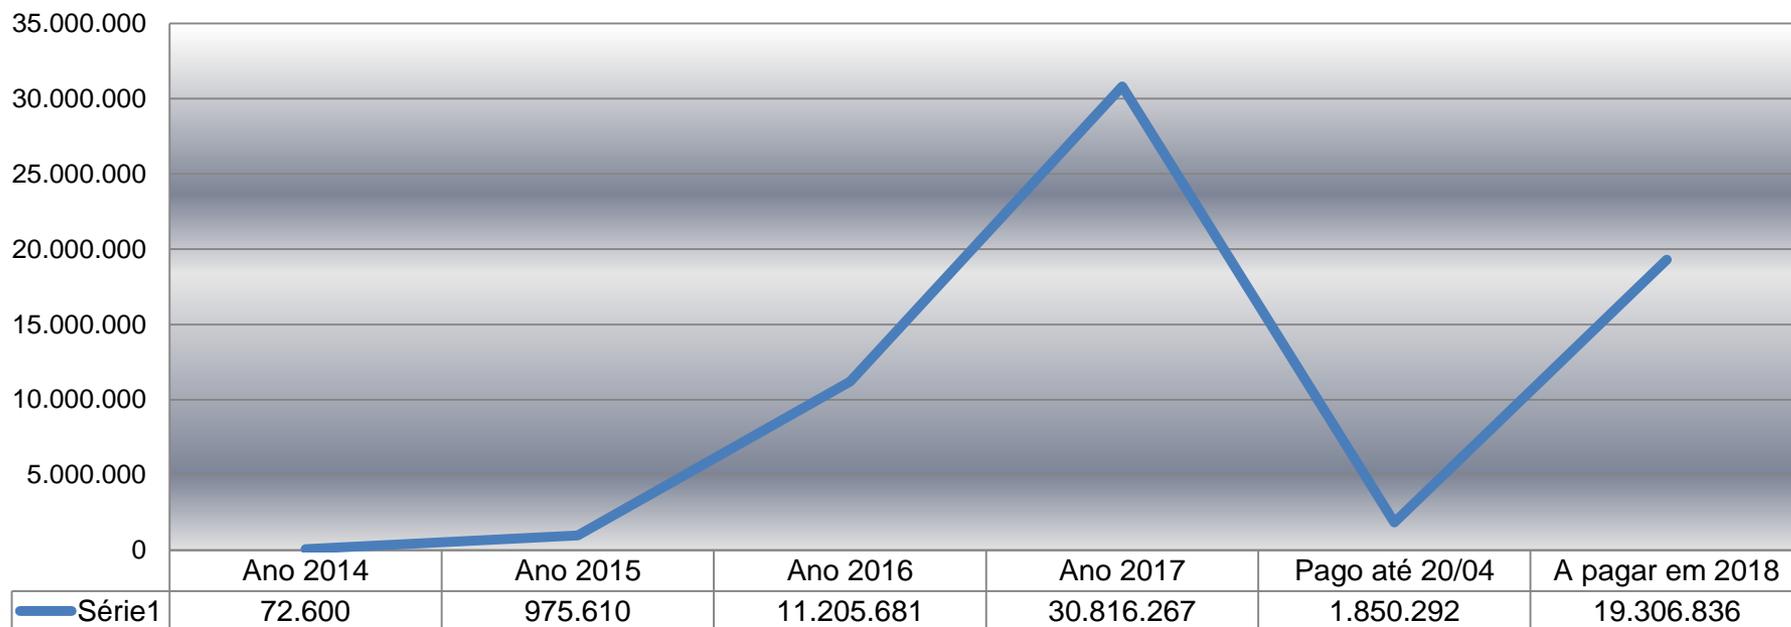

Situação dos Contratos – Aditivos de Prazo

Setorial	ARCE	CGE	COGERH	FUNCEME	SEMA	SEMACE	SEPLAG	SDE	SEDUC	STDS	SECITECE	IPECE	TCE	SRH	TOTAL
Nº Contratos	1	9	3	1	7	2	8	2	20	3	3	9	4	3	75
Aditivo de Prazo	0	3	1	1	2	0	6	0	18	5	1	16	4	4	61
%	0%	33%	33%	100%	29%	0%	75%	0%	90%	167%	33%	178%	100%	133%	81%

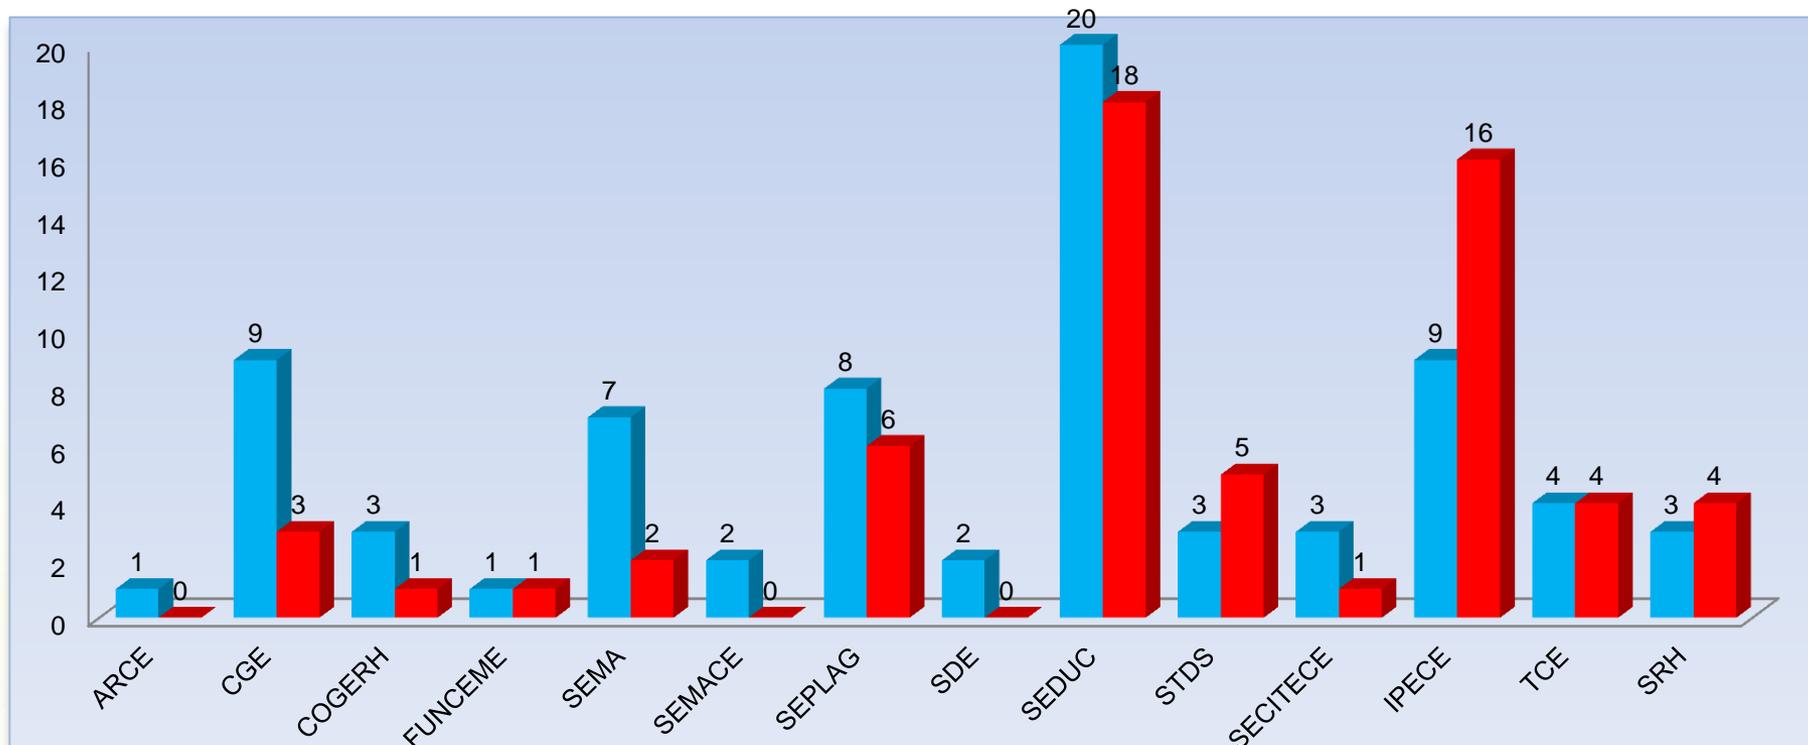

81% dos Contratos já foram elaborados Aditivos de Prazo



5. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR SETORIAL CONTRATADOS



CGE

Subprojeto 6: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.071.989,29
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2015 – Maio 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 029/2016 – Assinado em 24/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** Caiena Desenvolvimento de Sistemas Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 3.467.885,35.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
3.467.885,35	2.254.125,44	1.213.759,91	10/15	65,00%



IPECE

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 20: Desenvolvimento de metodologias para planejamento e avaliação dos projetos estratégicos de investimentos do poder executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 531.727,04
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Setembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 04/2017, assinado em 28/04/2017.
- **Consultora Vencedora:** Quadrante Consultoria Econômica Ltda.
- **Valor do Contrato:** 1.720.136,97.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
1.720.136,97	964.438,15	755.698,82	06/15	56,07%



SEPLAG

Subprojeto 63: Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Silvana Dourado
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 818.677,30
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Maio 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 02/2017, assinado em 24/03/2017. 2º Aditivo de Prazo e Valor em elaboração, documentação revisada pela UGP.
- **Consultora vencedora:** Elogroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ 2.648.421,05.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
2.648.421,05	926.947,36	1.721.473,69	16/34	35,00%



SRH

*Subprojeto 68: Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. **SIGERH***

- **Responsável:** Marcus Vinicius e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 403.809,40
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 03/2016, assinado em 23/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** Capgemini Consulting Technology Outsourcing.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.306.323,41.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
1.306.323,41	339.644,09	966.679,32	06/16	26%



TCE

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 76: Desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.

- **Responsável:** Delinda Almeida / Ricardo Araújo / Glinton Ferreira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 834.461,49
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/ Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Novembro 2018
- **Estágio Previsto:** Em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 21/2016 em Execução. Assinado em 28/07/2017. Não pagamento do Produto 4 em virtude de pendência cadastral da EY junto ao CPOM.
- **Consultora Vencedora:** Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
- **Valor do Contrato:** 2.699.484,21.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Contrato	Pago	Saldo	Produtos	% Pago
2.699.484,21	836.840,10	1.862.644,11	05/16	31,00%



6. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS: PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



SEMA

Contratos Encerrados – Consultoria de Empresa

QTD.	Setoriais	Subprojeto	Contrato	Apresentação
1	SEPLAG	Desenvolvimento do projeto de Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	Contrato Nº 032/2016	-
2	SECITECE	Criação de um observatório de políticas públicas estaduais de apoio a ciência, tecnologia e inovação no Ceará.	Contrato Nº 016/2016	-
3	SECITECE	Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	Contrato Nº 07/2017	-
4	SEMA	Desenvolver Implementação da Coleta Seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	Contrato Nº 17/2017	26/04/2018
5	COGERH	Fortalecimento do Manejo Estadual de Recursos Hídricos.	Contrato Nº 48/2015	22/03/2018
6	SEDUC	Formação Continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.	Contrato Nº 079/2017	-



7. APROVAÇÃO DA ATA

50ª REUNIÃO COMITÊ *PforR* (22/03/2018)

Próxima Reunião do Comitê PforR:

24/05/2018

14h30m – IPECE



8. ENCERRAMENTO

Unidade de Gerenciamento do Projeto PforR (UGP)
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora
Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N
Ed. SEPLAG, 2º andar- Fortaleza-CE
Tel.: (85) 3101.3499 e (85) 3101.3510
