



14ª REUNIÃO DO COMITÊ *PforR*
ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO
PROJETO *PforR*
26 DE MARÇO DE 2015



PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

1. Abertura e apresentação dos participantes (14h30-14h40)
2. Posição Fev/2015 dos Programas, Indicadores, Assistência Técnica e Plano de Ação (14h40-16h):
 - ✓ Sumário da Posição dos Indicadores com metas para o primeiro semestre de 2015 - **Laura Gonçalves**;
 - ✓ Plano de Ação Mitigação Riscos Sócio Ambiental - **Laura Gonçalves**;
 - ✓ Sumário da Posição da execução Orçamentária dos Programas do Escopo do PforR de 2015 - **Heloísa Cunha**;
 - ✓ Sumário da Posição da realização dos Projetos de Assistência Técnica - **Viviane Costa**;
 - ✓ Principais pontos de atenção nos Processos de Licitação - **Giuseppe Nogueira**.
3. Missão de Supervisão do Banco Mundial em Abril (16h - 16h10m)
4. Aprovação da Ata da 13ª Reunião (26/02/15) - (16h10m - 16h20m)
5. Encaminhamentos (16h20m - 16h30m)
6. Encerramento (16h30m)



1. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES



2. POSIÇÃO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2015: INDICADORES, PLANO DE AÇÃO, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Sumário da Posição dos Indicadores com metas para o 1º semestre de 2015

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2014

Tema	Nº	Nome do Indicador	Setorial	Responsável	Meta	Status
Gestão Pública	1	Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos	SEPLAG	Avilton Júnior	Aprovação de modelo para o alinhamento dos incentivos.	Essa meta só será alcançada em novembro de 2015, conforme Nota Técnica e Plano de Ação enviado pelo Responsável, pois depende da contratação de consultoria de empresa que está em fase de Solicitação de Propostas (Envio da SDP). (Fonte: SIMA em 16/03/15).
					Valor: US\$ 6,198	
TOTAL					US\$ 12,396	

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2014

Tema	Nº	Nome do Indicador	Setorial	Responsável	Meta	Status
Gestão Pública	2	Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada	SEPLAG	Adauto Oliveira	Aprovação da metodologia	O cumprimento da meta deste Indicador está vinculado à contratação de consultoria e, no momento, o Processo aguarda a NO do BM ao Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas. A previsão de contratação da empresa é Maio/15. (Fonte: SIMA 16/03/15).
					Valor: US\$ 6,198	
TOTAL					US\$ 12,396	

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2015

Tema	Nº	Nome do Indicador	Setorial	Responsável	Meta 1ºSemestre	Status
Crescimento Econômico	1	Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação	CEDE	Sendo Definido	Plano de Ação publicado.	Está programada uma Oficina Técnica para o dia 31 de março na qual haverá discussões sobre possíveis ações a serem incluídas no PPA no âmbito da estratégia de desenvolvimento do capital humano. (Fonte: SIMA em 20/03/15).
					Valor: US\$ 2.744.448,00	

Legenda:

	Probabilidade alta de atingir a meta
	Probabilidade intermediária de atingir a meta
	Probabilidade baixa de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2015

Tema	Nº	Nome do Indicador	Setorial	Responsável	Meta 1ºSemestre	Status
Crescimento Econômico	2	Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.	SEDUC	Andrea	10	A linha de base deste indicador são 8 acordos firmados, sendo necessário para o cumprimento da meta (10 acordos) mais 2 acordos. Os dois termos de parcerias que faltam ser estabelecidos estão em andamento. (Fonte: SIMA em 18/03/2015)
					Valor: US\$ 2.744.444,00	

Legenda:

- Probabilidade alta de atingir a meta
- Probabilidade intermediária de atingir a meta
- Probabilidade baixa de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2015

Tema	Nº	Nome do Indicador	Setorial	Responsável	Meta 1ºSemestre	Status
Redução da Pobreza	3	Porcentagem de famílias com crianças entre 0 e 5 anos no Cadastro Único em municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.	STDS	Mary Anne Libório/ Sebastião Lopes	-	O indicador possui meta apenas para o 2º semestre (10%). Depende da contratação de Serviço de Consultoria de empresa especializada para elaborar um Sistema de Monitoramento e o TR está em fase de elaboração na STDS. (Fonte: SIMA em 20/03/15).



INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2015

Tema	Nº	Nome do Indicador	Setorial	Responsável	Meta 1ºSemestre	Status
Redução da Pobreza	4	Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.	STDS	Mary Anne Libório/ Sebastião Lopes	15%	O indicador depende da Contratação de Serviços de Consultoria para arte gráfica e impressão e Consultoria Individual para elaboração dos Manuais que estão em fase de assinatura de contrato (Asjur da STDS). O TR para a capacitação está em fase de elaboração. (Fonte: SIMA em 20/03/15).
					Valor: US\$2.744.44,00	

Legenda:

	Probabilidade alta de atingir a meta
	Probabilidade intermediária de atingir a meta
	Probabilidade baixa de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2015

Tema	Nº	Nome do Indicador	Setorial	Responsável	Meta 1ºSemestre	Status
Redução da Pobreza	5	Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	SEPLAG	Lara Costa	22.5%	Devido ao tempo demandado para definição de pessoal das secretarias, a capacitação das equipes técnicas das setoriais para repasse da metodologia de elaboração do marco lógico deverá ser realizada em abril. Será trabalhado um grupo específico de projetos visando atender a meta do período. (Fonte: SIMA em 18/03/15).
					Valor: US\$ 2.744.444,00	



INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2015

Tema	Nº	Nome do Indicador	Setorial	Responsável	Meta 1ºSemestre	Status
Sustentabilidade Ambiental	6	Estabelecimento de Comitê Multisetorial de Segurança Hídrica.	CONPAM	Maria Dias	Diagnóstico de Bacias Hidrográficas.	Na reunião do Comitê foi definido a elaboração de um cronograma de reuniões para discutir a execução do Diagnóstico das Bacias. (Fonte: SIMA em 24/03/15).
					Valor: US\$ 2.744.444,00	

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2015

Tema	Nº	Nome do Indicador	Setorial	Responsável	Meta 1ºSemestre	Status
Sustentabilidade Ambiental	7	Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	CAGECE	Carlos Rossas	84.6%	85,03% (Fonte: SIMA em 24/03/15; o arquivo com a tela do sistema foi anexado via SIMA).
					Valor: US\$ 2.744.444,00	

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2015

Tema	Nº	Nome do Indicador	Setorial	Responsável	Meta 1ºSemestre	Status
Sustentabilidade Ambiental	8	Índice de qualidade de fiscalização ambiental.	CONPAM	Maria Dias	50%	O cálculo do Indicador ainda não foi realizado para o ano de 2015. O índice será informado a partir do mês de março. (Fonte: SIMA em 20/03/15)
					Valor: US\$ 2.744.444,00	



INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2015

Tema	Nº	Nome do Indicador	Setorial	Responsável	Meta 1ºSemestre	Status
Sustentabilidade Ambiental	9	Implementação do monitoramento participativo da Qualidade da Água.	FUNCEME	Hoilton Rios	Metodologia de monitoramento definida e adotada.	O indicador está vinculado a uma Assistência Técnica cujo processo de seleção encontra-se em andamento, na fase de análise das propostas técnicas. (Fonte: SIMA em 23/03/15).
					Valor: US\$ 2.744.444,00	

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2015

Tema	Nº	Nome do Indicador	Setorial	Responsável	Meta 1ºSemestre	Status
Gestão Pública	10	Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos	SEPLAG	Avilton Júnior	1	Essa meta só será alcançada em novembro de 2015, conforme Nota Técnica e Plano de Ação enviado pelo Responsável, pois depende da contratação de consultoria de empresa que está em fase de Solicitação de Propostas (Envio da SDP). (Fonte: SIMA em 16/03/15).
					Valor: US\$ 2.744.444,00	
TOTAL PARA O 1º SEMESTRE DE 2015					24.700.000,00	

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2015

TEMA	Nº	Indicador Secundário	Órgão	Responsáveis	Metas 2ª semestre	Status
Crescimento Econômico	1	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	IPECE	Victor Hugo	29.000	Os dados da RAIS para 2014 ainda não foram divulgados. Foi elaborada uma NT a fim de propor uma readequação nos valores das metas levando em conta a tendência de longo prazo.

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2015

TEMA	Nº	Indicador Secundário	Órgão	Responsáveis	Metas 2ª semestre	Status
Crescimento Econômico	2	Análise e melhoria dos mecanismos de governança da política de desenvolvimento do setor produtivo (incluindo Capacitação Profissional).	SEPLAG	Avilton Júnior	Plano de Ação Publicado.	Este indicador depende da contratação de uma empresa de consultoria, cujo processo encontra-se em fase preliminar, e também tem relação com as atividades relacionadas ao Indicador de Estratégia para o Crescimento Econômico. (Fonte: SIMA em 16/03/15).

Legenda:



Probabilidade alta de atingir a meta
 Probabilidade intermediária de atingir a meta
 Probabilidade baixa de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2015

TEMA	Nº	Indicador Secundário	Órgão	Responsáveis	Metas 2ª semestre	Status
Redução da Pobreza	3	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE).	SEPLAG	Lara Maria Silva Costa	Outras duas Resoluções Publicadas	O Gabinete da 1ª Dama está providenciando os trâmites jurídicos para a nomeação da Sra Onélia Leite como presidente do Comitê. A próxima reunião do Comitê deverá ser realizada no começo de abril para abertura oficial dos trabalhos de 2015. (Fonte: SIMA em 18/03/15).

Legenda:

	Probabilidade alta de atingir a meta
	Probabilidade intermediária de atingir a meta
	Probabilidade baixa de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2015

TEMA	Nº	Indicador Secundário	Órgão	Responsáveis	Metas 2ª semestre	Status
Redução da Pobreza	4	Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.	STDS	Mary Anne Libório/ Sebastião Lopes	10%	O presente indicador terá início no segundo semestre de 2015 após a Capacitação dos Técnicos dos CRAS dos 36 municípios do PforR. É dependente da contratação de serviço técnico de consultoria de para o desenvolvimento e implantação de um sistema de Monitoramento que está em fase de elaboração do Termo de Referência.

Legenda:



Probabilidade alta de atingir a meta
 Probabilidade intermediária de atingir a meta
 Probabilidade baixa de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2015

TEMA	Nº	Indicador Secundário	Órgão	Responsáveis	Metas 2ª semestre	Status
Sustentabilidade Ambiental	5	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	COGERH	Zulene Almada	Planos Preparados	Os planos de Segurança Hídrica serão elaborados através de Projetos de Assistência Técnica. O Termos de Referência estão sendo ajustados pela COGERH. (Fonte: SIMA em 24/03/15).

Legenda:

	Probabilidade alta de atingir a meta
	Probabilidade intermediária de atingir a meta
	Probabilidade baixa de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2015

TEMA	Nº	Indicador Secundário	Órgão	Responsáveis	Metas 2ª semestre	Status
Sustentabilidade Ambiental	6	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	COGERH	Adahil Sena	Projetos de Lei apresentados	Foram realizadas duas reuniões de apresentação e discussão do Projeto de Lei com o Comitê das Bacias Metropolitanas (dezembro/2014 e janeiro/2015). Estão programadas reuniões para março de 2015 com os Comitês da Bacia do Salgado e para a Bacia do Acaraú).



INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2015

TEMA	Nº	Indicador Secundário	Órgão	Responsáveis	Metas 2ª semestre	Status
Sustentabilidade Ambiental	7	Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	COGERH	Denilson Fidelis	64.3	80,2* SIMA 24/03/15) (Fonte: em

*O Relatório enviado pela COGERH informa, de forma adicional, o resultado do IQAR no período é 4,23 (4 - **criticamente degradado a poluído**)



INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2015

TEMA	Nº	Indicador Secundário	Órgão	Responsáveis	Metas 2ª semestre	Status
Sustentabilidade Ambiental	8	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	CONPAM	Marias Dias	Divulgação e Implementação	A SEMA através do seu departamento jurídico empreendeu várias tentativas no intuito de acelerar a análise do processo, contudo o Projeto de Lei encaminhado a PGE no dia 10/12/14 ainda encontra-se na PGE para análise. (Fonte SIMA em 24/03/15)





Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental

Posição do Plano de Ação

Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental - PforR						
Descrição da Ação	Responsável	Período	Indicador	Coordenação	Encaminhamentos	Posição em Fevereiro
1 A. Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar (incluindo a busca ativa de famílias vulneráveis)	SEDUC, STDS e Gabinete do Governador	Durante o primeiro ano	Aumento do número de crianças indígenas e quilombolas atendidas em creches ou recebem atenção domiciliar (proporcional às metas gerais do projeto).	STDS - Sebastião Lopes	De acordo com o cronograma enviado pelas setoriais foi destacada a atividade: "Realização de Seminário com os Gestores Municipais para sensibilização e adesão ao PforR e início da implementação". Prazo para execução: Fevereiro 2015.	A STDS informou que essa atividade permanece sem alterações e com prazo para execução da atividade até abril de 2015. Possíveis alterações serão informadas à UGP com antecedência.

Posição do Plano de Ação

Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental - PforR						
Descrição da Ação	Responsável	Período	Indicador	Coordenação	Encaminhamentos	Posição em Fevereiro
1 B. Inclusão de um módulo de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas de ensino) no programa de treinamento de professores dos cursos de capacitação profissional	SEDUC e Gabinete do Governador	Durante o primeiro ano	Módulo desenvolvido em colaboração com a FUNAI, Associação Quilombolas e Coordenadoria para a Igualdade Racial.	SEDUC- Andréa, Rejane Hélvia.	Solicitação do BM: validar este conteúdo com a FUNAI, a Coordenadoria de Igualdade Racial e as associações quilombola e indígena.	A UGP agendou reunião para o dia 31/03/15 a fim de apresentar o Plano de Ação à nova Coordenadora de Aperfeiçoamento Pedagógico.

Posição do Plano de Ação

Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental - PforR						
Descrição da Ação	Responsável	Período	Indicador	Coordenação	Encaminhamentos	Posição em Fevereiro
<p>C. Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terras dependentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).</p>	PGE, SEDUC	Durante o primeiro ano	Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.	SEDUC- Joízia Lima	A Empresa é responsável por realizar a Varredura Fundiária e a SEDUC monitora através dos contratos.	O cronograma estabelecido para a entrega do relatório é junho de 2015.
<p>D. Exclusão das áreas em que a execução das obras civis venha a requerer o reassentamento involuntário ou a relocação de famílias (com ou sem título de propriedade)</p>					Das 22 obras de EEEP, 16 Obras já estão com documentação do terreno, certidões dos imóveis.	A SEDUC informou que das 22 obras de EEEP, 18 já entregaram a documentação que está na PGE para análise. E 18 prefeituras enviaram declarações informando que as obras não causarão impactos relacionados ao reassentamento involuntário.

Posição do Plano de Ação

Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental - PforR						
Descrição da Ação	Responsável	Período	Indicador	Coordenação	Encaminhamentos	Posição em Fevereiro
3 E. Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água	COGERH, CONPAM, SRH (em consulta junto à FUNAI)	Até o fim do segundo ano	Os planos de segurança hídrica para as três microbacias estratégicas incluem medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (definidas em consulta junto às comunidades afetadas – inclusive os povos indígenas). Documentar de maneira efetiva o apoio da comunidade indígena à sua elaboração.	COGERH – Adahil Sena	O TR para contratação de consultoria que irá elaborar o Plano de Segurança Hídrica foi realizado e enviado ao BM em 22/12/14.	O TR do Plano foi revisado pelo Banco Mundial e encaminhado à COGERH para correção.

Posição do Plano de Ação

Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental - PforR						
Descrição da Ação	Responsável	Período	Indicador	Coordenação	Encaminhamentos	Posição em Fevereiro
3 F. Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água	CONPAM, SEMACE, COGERH, CAGECE	Até o fim do segundo ano	Campanha de comunicação estabelecida e sob execução.	CONPAM-Maria Dias	O Conpam e a Cagece estão em articulação com a Casa Civil para a elaboração do Plano de Comunicação.	O Conpam entrou em contato com a Casa Civil para agendar uma reunião, está aguardando retorno do órgão.



Sumário da Posição da execução Orçamentária dos Programas do Escopo do *PforR* de 2015

Posição dos Programas

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Fevereiro 2015

Programa	Setorial	Iniciativa	Previsão 2014-2017 (R\$ milhões)	LOA 2015 (A)	Executado 2014	Previsão Fevereiro (B)	Executado 28/02/15 (R\$ milhões)			Farol (C)/(B)%		
							Valor Executado (C)	Executado /LOA (C)/(A)%	Executado/ Previsão Fevereiro (C)/(B)%			
Capacitação Profissional												
1	014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional	SEDUC	1	00328	396,43	161,48	118,98	14,68	6,06	3,8%	41,3%	
			2	00771	205,21	26,18	63,06	2,38	0,00	0,0%	0,0%	
			3	00834	166,39	22,20	28,22	2,02	0,00	0,0%	0,0%	
Assistência à Família												
2	050 - Assistência Social	STDS	4	03180	33,69	7,87	7,21	0,72	0,00	0,0%	0,0%	
Qualidade da Água												
3	041 - Gestão dos Recursos Hídricos	COGERH	5	05310 ¹	0,14	0,14	0,00	0,01	0,00	0,0%	0,0%	
		COGERH	6	05311 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		SRH / COGERH	7	05273	13,03	0,50	0,46	0,05		0,0%	0,0%	
4	032 - Saneamento Ambiental	CIDADES/ CAGECE	8	5384	11,07	5,00	0,00	0,45	0,00	0,0%	0,0%	
5	082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais	SEMA	9	03104	13,34	0,25	0,00	0,02	0,00	-	0,0%	
		SEMACE	10	04815	1,82	0,42	0,50	0,04	0,00	0,0%	0,0%	
		SEMACE	11	02466 ²	1,32	0,42	0,00	0,04	0,00	0,0%	0,0%	
		SEMACE	12	05170	24,81	9,76	1,97	0,89	0,00	0,0%	0,0%	
		SEMACE	13	05155 ²	0,55	0,15	0,00	0,01	0,00	0,0%	0,0%	
6	079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará	FUCEME	14	02846 ³	18,01	3,13	1,80	0,28	0,04	1,4%	15,2%	
		FUCEME	15	02847	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,0%	0,0%	
Total			15		885,83	237,52	222,19	21,61	6,10	2,57%	28,24%	

Até o dia 23/03/2015, a FUNCEME, na iniciativa 02846 executou R\$ 149.517,09, a SEDUC, na iniciativa 00328 executou R\$15.223963,65, na 771 executou R\$ 93.830,17 e na 834 executou R\$ 935.022,83.

Valor Total Previsto do Projeto até Fev/15	243,80
Percentual = Valor Previsto/Valor Total do Projeto	27,50%
Valor Total Executado do Projeto até Fev/15	228,30
Percentual = Valor Executado/Valor Total do Projeto	25,8%

Obs:

- (1) A SRH/COGERH informou na reunião do dia 06/02/2015 que vai preparar uma nova proposta para substituir as iniciativas (5310 e 5311), referentes ao Plano de Segurança Hídrica que passou a ser Assistência Técnica. Até o momento não foi apresentada a UGP a nova proposta, com as novas iniciativas.
- (2) A SEMACE informou na reunião do dia 06/02/2015 que os valores dos MAPPs das iniciativas 2466 - Realização do Monitoramento da Poluição/Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado e 5155 - Realização do Monitoramento da Poluição/Contaminação das Praias do Litoral Cearense foram reduzidos para R\$ 0,00 pois os seus MAPPs no Custeio Finalístico foram cortados. Os valores propostos ainda não foram alterados na LOA e nem foi feita Nota Técnica para apresentação ao Banco Mundial, pois a SEMACE está aguardando reunião com a SEMA para discutir a proposta.
- (3) A FUNCEME informou na reunião do dia 06/02/2015 que o valor da iniciativa 2846 - Ampliação e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará foi reduzido do previsto na LOA de R\$ 2,88 milhões para R\$ 1,79 milhões e para iniciativa 2847 - Elaboração do Mapeamento e Monitoramento Hidrombiental do Ceará será decrescido de R\$0,01 milhões para R\$ 0,09 milhões. Totalizando para o Programa o valor de R\$ 1,88 milhões e isso representa uma redução de R\$ 1,1 milhões do que está previsto na LOA (R\$ 2,89 milhões) e de R\$ 0,37 milhões do que tinha sido inicialmente previsto no Projeto de R\$2,25 milhões. A FUNCEME está aguardando a mudança do órgão gestor de SECITECE para SRH, para alterar o orçamento e enviar a Nota Técnica a UGP.

Legenda de Faróis:



Posição dos Programas

Eixo: Capacitação Profissional

1. Programa 014 ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (SEDUC)

PPA Iniciativa - SEDUC		EXECUTADO	LOA	PROJEÇÃO		TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
1	00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional	R\$ 118,98	R\$ 161,48	R\$ 56,71	R\$ 59,26	R\$ 396,43
2	00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional	R\$ 63,06	R\$ 26,18	R\$ 56,71	R\$ 59,26	R\$ 205,22
3	00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio	R\$ 28,22	R\$ 22,20	R\$ 56,71	R\$ 59,26	R\$166,39
Total		R\$ 210,26	R\$ 209,87	R\$ 170,13	R\$ 177,78	R\$ 768,04

Posição dos Programas

Eixo: Assistência à Família

2. Programa 050 ASSISTÊNCIA SOCIAL (STDS)

PPA Iniciativa - STDS	EXECUTADO	LOA	PROJEÇÃO		TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
1 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.	R\$ 7,21	R\$ 7,87	R\$ 9,08	R\$ 9,54	R\$ 33,70
Total	R\$ 7,21	R\$ 7,87	R\$ 9,08	R\$ 9,54	R\$ 33,70

Posição dos Programas

Eixo: Qualidade da Água

3. Programa 041 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (SRH/COGERH)

PPA Iniciativa – SRH/COGERH		EXECUTADO	LOA	PROJEÇÃO		TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
1	05310 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14
2	05311 - Implantação do Plano de Segurança Hídrica para as Bacias Hidrográficas Metropolitanas.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.	R\$ 0,46	R\$ 0,50	R\$ 12,07	R\$ -	R\$ 13,03
Total		R\$ 0,46	R\$ 0,64	R\$ 12,07	R\$ -	R\$ 13,17

Posição dos Programas

Eixo: Qualidade da Água

4. Programa 032 SANEAMENTO AMBIENTAL (CIDADES/CAGECE)

PPA Iniciativa – CIDADES/CAGECE	EXECUTADO	LOA	PROJEÇÃO		TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
05384 - Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistema de Esgotamento Sanitário	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 3,52	R\$ 2,55	R\$ 11,07
Total	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 3,52	R\$ 2,55	R\$11,07

¹Secretaria das CIDADES criou uma nova iniciativa (5384) para *PforR* para o ano de 2015 e demais anos do projeto.

Posição dos Programas

Eixo: Qualidade da Água

5. Programa 082 GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS (SEMA)

PPA Iniciativa - SEMA	EXECUTADO	LOA	PROJEÇÃO		TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.	R\$ -	R\$ 0,25	R\$ 6,40	R\$ 6,69	R\$ 13,34
Total	R\$ -	R\$ 0,25	R\$ 6,40	R\$ 6,69	R\$ 13,34

Posição dos Programas

Eixo: Qualidade da Água

5. Programa 082 GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS (SEMACE)

PPA Iniciativa - SEMACE		EXECUTADO	LOA	PROJEÇÃO		TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
1	04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.	R\$ 0,50	R\$ 0,42	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 1,82
2	02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.	R\$ -	R\$ 0,42	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 1,32
3	05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.	R\$ 1,97	R\$ 9,76	R\$ 6,40	R\$ 6,69	R\$ 24,82
4	05155 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação das praias do litoral cearense.	R\$ -	R\$ 0,15	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,55
Total		R\$ 2,47	R\$ 10,75	R\$ 7,50	R\$ 7,79	R\$ 28,51

Posição dos Programas

Eixo: Qualidade da Água

6. Programa 079 MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ (FUNCEME)

PPA Iniciativa - FUNCEME	EXECUTADO	LOA	PROJEÇÃO		TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.	R\$ 1,80	R\$ 3,13	R\$ 6,40	R\$ 6,69	R\$ 18,02
02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará.	R\$ -	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,02
Total	R\$ 1,80	R\$ 3,15	R\$ 6,40	R\$ 6,69	R\$ 18,04

Posição dos Programas

Sumário dos Programas

Setorial	Programa	Executado	LOA	Previsão Setoriais		Total
		2014	2015	2016	2017	
SEDUC	014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	210,26	209,87	170,13	177,79	768,04
STDS	050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7,21	7,87	9,08	9,54	33,69
SRH/ COGERH	041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	0,46	0,64	12,07	0,00	13,17
CIDADES/ CAGECE	032 - SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	5,00	3,52	2,55	11,07
CONPAM/ SEMACE	082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS	2,47	11,00	13,90	14,48	41,84
FUNCEME	079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ	1,79	3,15	6,40	6,69	18,03
TOTAL		222,18	237,52	215,11	211,05	885,85

Posição dos Programas

✓ **Lembrete:** Regras Programas

A execução dos programas deve observar as seguintes restrições:


- Devem excluir despesas que são financiadas pelo próprio BIRD ou por outras operações de crédito, ou seja, não é permitido a alocação de recursos do BIRD ou outras operações de crédito para custear despesas dos programas e iniciativas do componente
- Verificar a lista negra do BIRD a cada licitação, antes de assinar contrato. Para atender o Art. 42 da Lei 8.666/93 a SEPLAG incluiu no orçamento de cada ação um valor na fonte 69;
- Não podem apresentar impacto sócio ambiental negativo;
- Os valores dos contratos não podem exceder os limites abaixo:
 - Obras – inferior a US\$ 50 milhões
 - Bens – inferior a US\$ 30 milhões
 - Sistemas de TIC – inferior a US\$ 20 milhões
 - Consultorias – inferior a US\$ 15 milhões.



Sumário da Posição da realização dos Projetos de Assistência Técnica

Posição dos Projetos Assistência Técnica

51 PROJETOS NO PLANO DE LICITAÇÃO

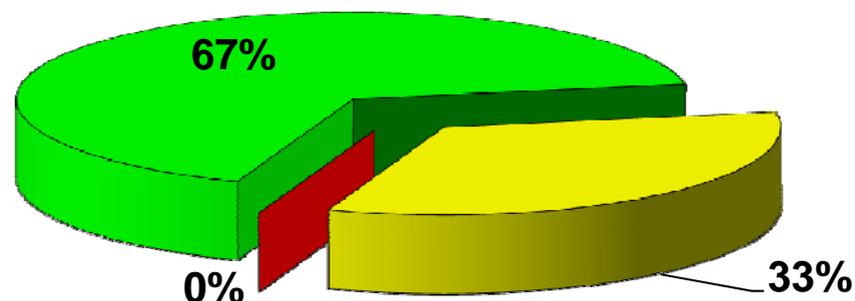

- Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
- Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia
- Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses


34	Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações	CEDE (2), CGE (3,4,5,6,7), CONPAM (9,11,12,13), FUNCEME (14), IPECE (15,16,18,19,20), PGE (21), SECITECE (22,23,24,25,26), SEDUC (29,30,31,32,33), SEPLAG (37,38,42,44), SRH(46,48,49)
17	Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia	ARCE (1), CONPAM(8,10), IPECE (17), SECITECE (27), SEDUC(28,34,35), SEMACE(36), SEPLAG (39,40,41,43,45), SRH(47), STDS(50), TCE (51)
0	Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses	

Atualizado em 23/03/2015

O número em parênteses se refere ao número do projeto na lista dos Projetos de Assistência Técnica no site do IPECE no link:
http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/assistencia/Lista_dos_projetos_de_AT_rev_22012015_por_Setorial.pdf

Posição dos Projetos Assistência Técnica

89 SUBPROJETOS NO PLANO DE LICITAÇÃO

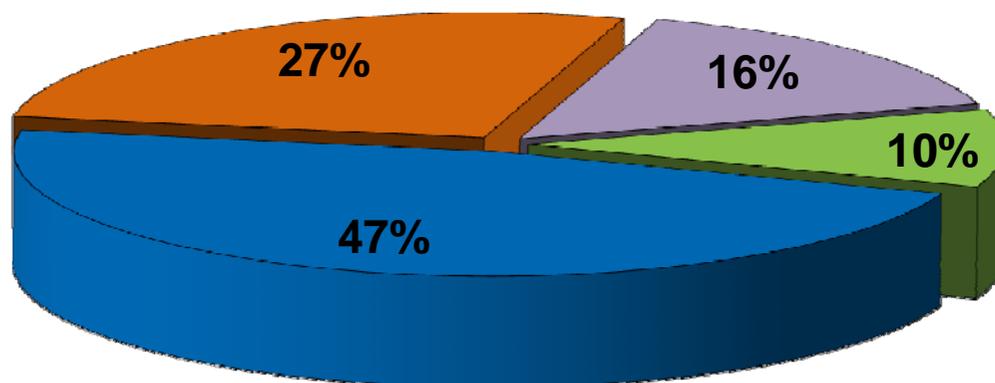

■ Não iniciado ■ Atividades Preparatórias ■ Em licitação ■ Em Execução


42	Não iniciado conforme Plano de Licitação	CGE (4,5,6,7), IPECE (22,23,24,28,29,30), SECITECE (32,33,34,35,36), SEDUC (39,40,41,42,43,44,45,53,54,55,56,57), SEMACE (58), SEPLAG (60,61,62,63,64,68,69,70,71,73,75,76,77), SRH (81)
24	Em Andamento	Atividades Preparatórias CGE (8,9), CONPAM (11,12,14,15,16,17,18), IPECE (26,27), PGE (31), SEDUC (38,49,50,51,52), SEPLAG (65,66), SRH (79,82), STDS (85,86), TCE (87)
14		Em Licitação ARCE (1), ADECE (2), CONPAM (10,13), FUNCEME (19), IPECE (25), SECITECE (37), SEMACE (59), SEPLAG (67,72,74,78), SRH (80), TCE (88)
09		Em Execução CGE(3), IPECE(20,21), SEDUC(46,47,48), STDS(83,84), TCE(89)

Atualizado em 23/03/2015

O número em parênteses se refere ao número do subprojeto na lista dos Projetos de Assistência Técnica no site do IPECE no link: http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/assistencia/Lista_dos_projetos_de_AT_rev_22012015_por_Setorial.pdf

Posição dos Projetos Assistência Técnica

47 SUBPROJETOS EM ANDAMENTO

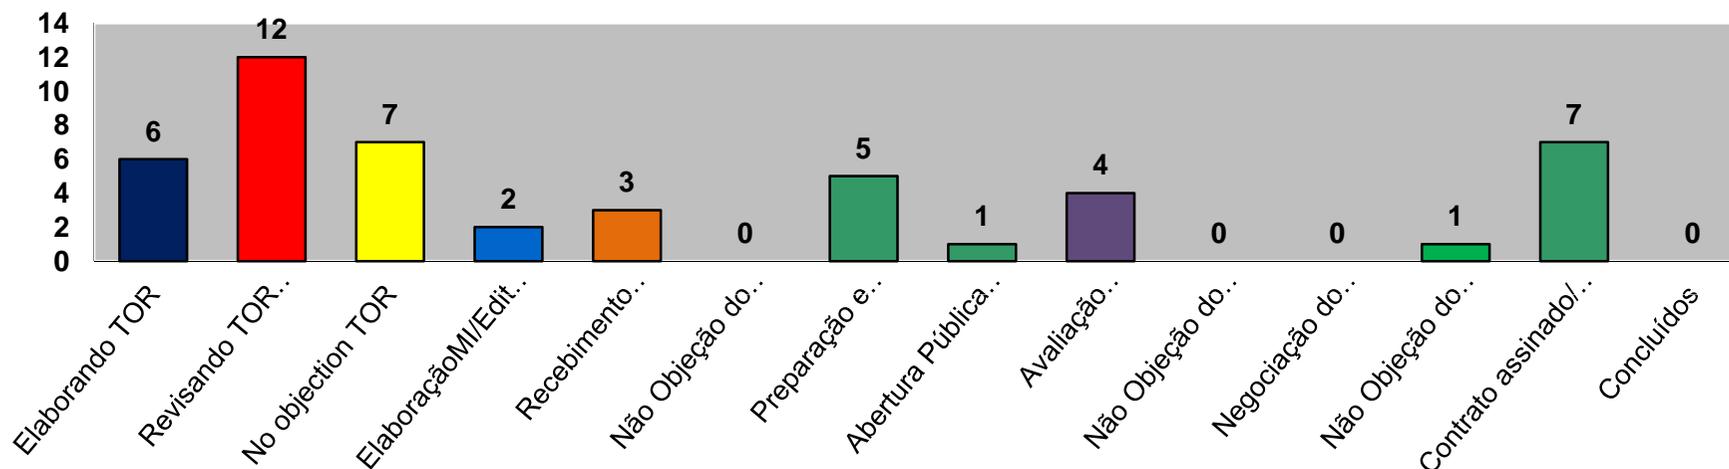

Etapas		Setoriais
5	Elaborando TOR	SEDUC(49,51), SRH(79), STDS(85,86)
10	Revisando TOR após envio ao BM	CGE(8), CONPAM(14,15,16,17,18), IPECE(26,27), SEDUC(38), SEPLAG(65)
4	Não Objeção do TOR	CONPAM(11), PGE(31), SEDUC(52), SRH(82)
5	Elaboração MI/Edital/ Publicação	CGE(9), CONPAM(12), SEDUC(50), SEPLAG(66), TCE(87)
6	Recebimento portfólios / Currículos, Preparação Lista Curta e SDP	CEDE(2), CONPAM(10,13), IPECE(25), SEMACE(59), SEPLAG(78)
1	Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta) ou convocação do CI para negociação	SEPLAG(74)
1	Abertura Pública das Propostas	SEPLAG(72)
4	Avaliação Propostas / Currículos	ARCE(1), FUNCEME(19), SECITECE(37), SRH(80)
1	Não Objeção do BM Avaliação Técnica	SEPLAG (67)
1	Negociação do contrato	TCE(88)
9	Contrato assinado/ Prestando Serviço	CGE(3), IPECE(20,21), SEDUC(46,47,48), STDS(83,84), TCE(89)



Principais pontos de atenção nos Processos de Licitação

Processo de Licitação

- ✓ Comunicações por email:

Giuseppe Nogueira – giuseppe.nogueira@ipece.ce.gov.br

Viviane Costa – viviane.costa@ipece.ce.gov.br;

- ✓ Formação da Lista Curta (Contatos prévios);
- ✓ Elaboração de Memória de Cálculo (equipe x despesas reembolsáveis);



3. MISSÃO DE SUPERVISÃO DO BANCO MUNDIAL EM ABRIL



4. APROVAÇÃO DA ATA DA 13ª REUNIÃO (26/02/15)

COMITÊ PforR



5. ENCAMINHAMENTOS



6. ENCERRAMENTO



DETALHAMENTO POR EIXO



CRESCIMENTO ECONÔMICO

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL



CEDE / ADECE



INDICADOR PRIMÁRIO

Indicadores – Capacitação Profissional

Indicador Primário: Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação.

Responsável: Á definir

- **Meta 2015:**

1º semestre – Plano de Ação Publicado

- **Posição em 28/02:** O Plano de Ação será elaborado a partir do Documento da Estratégia

- **Posição em 28/02 em relação à meta:** ██████████

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

- **Justificativa:** A MATRIZ SWOT está em processo de finalização na qual subsidiará os trabalhos a serem desenvolvidos na Oficina Técnica voltada para o aperfeiçoamento e estratégia de desenvolvimento do capital humano. O evento está programado para acontecer no dia 31 de março de 2015. (Fonte: SIMA em 20/03/15).



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Capacitação Profissional

Projeto 2: *Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas*

Subprojeto 2: Contratação de consultoria de empresa para desenvolver um sistema informatizado para o monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Inês Studart
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 200.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 195.396,32
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Manifestação de Interesse
- **Estágio Atual:** Encerrado prazo da MI em 16/03/2015. Documentação em análise na CEL04 desde 17/03/2015 para posterior envio dos portfólios a Setorial.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



SECITECE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 22: Definir e estabelecer um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas de apoio à inovação.

Subprojeto 32: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para Estabelecer um Sistema de Monitoramento e Avaliação para Coletar dados e Informações Relacionadas com Programas e Iniciativas de Apoio a Inovação.

- **Responsável:** Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 450.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 353.140,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2015 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de referência.
- **Estágio Atual:** Aguardando contratação de Consultoria Individual em inovação para auxiliar na conclusão do TdR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 23: Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

Subprojeto 33: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Francisco Carvalho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto :** US\$ 200.000,00
- **Valor TOR:** US\$ 212.900,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Aguardando contratação de Consultoria Individual em inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 24: Avaliação do desempenho e impacto de REDENIT-CE no que diz respeito à sua missão de gestão da inovação e propriedade intelectual e apoiar a transferência de tecnologias para o mercado.

Subprojeto 34: Termo de Referência para Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para Avaliação de Desempenho e Impacto da REDENIT no que diz respeito à sua Missão de Gestão da Inovação e Propriedade Intelectual e Apoio à Transferência de Tecnologias para o Mercado.

- **Responsável:** Francisco Carvalho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 225.000,00
- **Valor do Termo:** US\$ 246.340,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Aguardando contratação de Consultoria Individual em Inovação para auxiliar na conclusão do TdR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 25: *Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.*

Subprojeto 35: Contratação de Consultoria de Empresa para elaborar estudo para avaliar um Parque Tecnológico.

- **Responsável:** Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 75.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Março 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** : Aguardando contratação de Consultoria Individual em Inovação para auxiliar a conclusão do TdR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ████████████████████

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 27: *Suporte Técnico Especializado em Inovação Sênior*

Subprojeto 37: Suporte Técnico Especializado em Inovação Sênior- Pessoa Física, visando apoiar a COTEC/SECITECE na elaboração dos Termos de Referência que orientem os processos de contratação, execução e monitoramento de cada uma das Consultorias previstas no Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará, até sua total implantação.

- **Responsável:** Francisco Carvalho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 170. 612,66
- **Valor do TOR:** US\$ 170.612,66
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Avaliação dos Currículos
- **Estágio Atual:** Currículos sendo analisados pela Setorial e em elaboração do RAC.
Enviado instruções para dar continuidade no processo de seleção em 11/03/15.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



SEDUC



PROGRAMAS

Programas – Capacitação Profissional

Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

- **Setoriais envolvidas:** SEDUC
- **PPA Iniciativa:** 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- **Ação I:** 28685 - Manutenção e Funcionamento das Unidades Escolares de Educação Profissional
- **Ação II:** 28686 - Garantia do funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional
- **Total Previsto para 2014 - 2017:** R\$ 396,43
- **Previsto para o Ano de 2015:** R\$ 161,48
- **Realizado até 28/02/2015:** 6,06
- **Realizado/Previsto Anual:** 3,8%
- **Periodicidade:** Frequência Bimestral
- **Farol:** ██████████

Programas – Capacitação Profissional

Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

- **Setoriais envolvidas:** SEDUC
- **PPA Iniciativa:** 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- **Ação I:** 19475 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- **Ação II:** 19482 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- **Total Previsto para 2014 - 2017:** R\$ 205,21
- **Previsto para o Ano de 2015:** R\$ 26,18
- **Realizado até 28/02/2015:** R\$ 0,00
- **Realizado/Previsto Anual:** 0
- **Periodicidade:** Frequência Bimestral
- **Farol:** ██████████

Programas – Capacitação Profissional

Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

- **Setoriais envolvidas:** SEDUC
- **PPA Iniciativa:** 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio.
- **Ação I:** 19483 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- **Total Previsto para 2014 - 2017:** R\$ 166,39
- **Previsto para o Ano de 2015:** R\$ 22,20
- **Realizado até 28/02/2015:** R\$ 0,00
- **Realizado/Previsto Anual:** 0
- **Periodicidade:** Frequência da execução quadrimestral
- **Farol:** ██████████



INDICADOR PRIMÁRIO

Indicadores – Capacitação Profissional

Indicador Primário: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.

Responsável - Andréa Rocha/Marta Emília

- **Meta 2015:**

1º semestre – 10

2º semestre – 12

- **Posição em 28/02:** A SEDUC está providenciando a assinatura dos 2 acordos restantes.

- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta.

- **Justificativa:** A linha de base deste indicador é 8 acordos firmados, sendo necessário para o cumprimento da meta (10 acordos) mais 2 acordos. Foi informado ao Banco Mundial, na ocasião da elaboração do Protocolo a assinatura dos 8 acordos. Sobre os dois acordos restantes, a SEDUC está providenciando os mesmos. (Fonte: SIMA em 20/03/14)



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Capacitação Profissional

Projeto 28: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.

Subprojeto 38: Termo de Referencia para contratação de serviços de Consultoria para Avaliação do Desempenho Acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Andrea Rocha
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 250.000,00
- **Valor do TOR:** U\$ 491.128,15
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2015 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Publicação da Manifestação de Interesse
- **Estágio Atual:** Recebido do BM comentários sobre TdR em 03/03/2015. Enviado a Setorial para providências em 04/03/2015.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Capacitação Profissional

Projeto 29: Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos. Áreas a serem avaliadas, entre outras: gestão administrativa, gestão de recursos humanos, desenho de currículo, serviços de apoio aos estudantes.

Subprojeto 39: Contrato de Empresa para avaliar desempenho das escolas públicas profissionais de educação com recomendações de melhoria.

- **Responsável:** Andrea Rocha
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Abril 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Capacitação Profissional

Projeto 30: Implantação de uma sistema de custos para a rede das escolas estaduais de Educação Profissional

Subprojeto 40: Contratação de empresa para implantação de um sistema de curso para rede das escolas estaduais de Educação Profissional

- **Responsável:** Andrea Rocha
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 100.000,00
- **Método de Aquisição:** SOF/SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Capacitação Profissional

Projeto 31: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.

Subprojeto 41: Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da formação continuada para gestores, professores e instrutores de educação profissional secundárias

- **Responsável:** Andrea Rocha
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 100.000,00
- **Método de Aquisição:** SOF/SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2015 – Abril 2016
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Capacitação Profissional

Projeto 32: Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.

Subprojeto 42: Contratação de empresa para apoiar na concepção de instrumentos/iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das escolas profissionais.

- **Responsável:** Andrea Rocha
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 75.000,00
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2015 – Abril 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Capacitação Profissional

Projeto 33: Avaliação de Impacto para um programa inovador para elevar qualidade dos professores do ensino médio das escolas

Subprojeto 43: Contratação de empresa para elaborar avaliação de impacto para um programa inovador para elevar qualidade dos professores do ensino médio das escolas.

- **Responsável:** Conceição Ávila
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 100.000,00
- **Método de Aquisição:** SOF/SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Abril 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



PLANO DE AÇÃO

Plano de Ação

Risco 1: Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

2º Ação: Inclusão de um módulo de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas de ensino) no programa de treinamento de professores dos cursos de capacitação profissional.

Responsável: SEDUC e Gabinete do Governador

Coordenação: SEDUC

Período: Durante o primeiro ano

Indicador: Módulo desenvolvido em colaboração com a FUNAI, Associações Quilombolas e Coordenadoria para a Igualdade Racial.

Posição em Fevereiro: Os módulos foram entregues ao BM e a SEDUC está articulando uma reunião junto à FUNAI e a Coordenadoria de Igualdade Racial e as associações quilombola e indígena com a finalidade de validar o conteúdo dos módulos apresentados. A UGP agendou reunião para o dia 31/03/15 a fim de apresentar o Plano de Ação à nova Coordenadora de Aperfeiçoamento

Plano de Ação

Risco 2: A localização exata dos trabalhos de construção civil (i.e., 8 Centros de Formação Profissional) não é conhecida. Três riscos sociais foram identificados em relação ao atual sistema de aquisição de áreas pelo Estado: (i) as pessoas sem título legal de propriedade não são compensadas, nem recebem assistência em caso de impactos negativos; (ii) atividades para recuperação dos modos de vida não são implementadas para as famílias afetadas; e (iii) embora haja algumas terras indígenas e territórios quilombolas demarcados no estado, há um certo número de reivindicações territoriais em processo. Também foram identificadas lacunas no processo de licenciamento – em termos de compartilhamento de informações entre a instituição responsável por licenciar os empreendimentos e a FUNAI e o INCRA.

1º Ação: . Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).

Responsável: PGE e SEDUC

Coordenação: SEDUC

Período: Durante o primeiro ano

Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.

Posição em Fevereiro: A Empresa é responsável por realizar a Varredura Fundiária e a SEDUC monitora através dos contratos. O cronograma estabelecido para a entrega do relatório é junho de 2015.

Plano de Ação

2º Ação: Exclusão das áreas em que a execução das obras civis venha a requerer o reassentamento involuntário ou a relocação de famílias (com ou sem título de propriedade)

Responsável: PGE e SEDUC

Coordenação: SEDUC

Período: Durante o primeiro ano

Indicador: Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.

Posição em Fevereiro: A SEDUC informou que das 22 obras de EEEP, 18 já entregaram a documentação que está na PGE para análise. E 18 prefeituras enviaram declarações informando que as obras não causarão impactos relacionados ao reassentamento involuntário.



SEPLAG



INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicadores – Capacitação Profissional

Indicador Secundário: Análise e melhoria dos mecanismos de governança da política de desenvolvimento do setor produtivo (incluindo Capacitação Profissional)

Responsável – Avilton Júnior

- **Meta 2015:**

2º semestre - Plano de Ação Publicado

- **Posição em 28/02:** Indicador vinculado à Projeto de AT - Elaboração do Termo de Referência.
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta.
- **Justificativa:** Este indicador depender da contratação de um empresa de consultoria, cujo processo encontra-se em fase preliminar, e também tem relação com as atividades relacionadas a outro indicado, o da Estratégia para o Crescimento Econômico. (Fonte: SIMA em 16/03/15).



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 34: Avaliação da Estrutura de Governança para os programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo.

Subprojeto 73: Contratação de Consultor Individual para avaliar a estrutura de governança dos programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo.

- **Responsável:** Avilton Júnior (SEPLAG)/ Wítalo Paiva (IPECE)
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaborando Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração e discussão.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



IPECE



INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicadores – Capacitação Profissional

Indicador Secundário: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).

Responsável: Victor Hugo

- **Meta 2015:**

2º semestre – 29.000

- **Posição em 28/02:** Os dados da RAIS para 2014 ainda não foram divulgados

- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade baixa de atingir a meta.

- **Justificativa:** Os Dados da RAIS publicaram o valor de: 24.403 técnicos absorvidos no ano de 2013. Será submetida ao Banco Mundial uma NT solicitando o reajuste dos valores das metas tendo em vista as alterações no ciclo econômico do período analisado. (Fonte: SIMA em 23/03/15).



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 17: Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.

Subprojeto 25: Contratação de Serviço Técnico de Consultoria de Empresa Especializada para a definição e estabelecimento de um Sistema de Inserção e Monitoramento de Egressos da Educação Profissional no Mercado de Trabalho.

- **Responsável:** Victor Hugo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 700.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 542.363,33
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Preparação da Lista Curta e Minuta da SDP
- **Estágio Atual:** RFLC concluído, aguardando publicação a Portaria Multisetorial. Em fase de elaboração da Minuta da SDP desde 09/03/2015.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 17: Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.

*Subprojeto 26: Contratação de Serviço de Consultoria Individual especializada em **Engenharia da Computação** para assessorar a definição e o estabelecimento de um sistema de inserção e monitoramento dos egressos da educação profissional no mercado de trabalho.*

- **Responsável:** Victor Hugo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 700.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 78.818,34
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2015 – Abril 2016
- **Estágio Previsto:** Não Objeção do TdR
- **Estágio Atual:** Recebido do BM comentários sobre TdR e M.C em 06/03/15. Enviado a Setorial para ajustes em 09/03/15.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 17: Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.

*Subprojeto 27: Contratação de Serviço de Consultoria Individual especializada em **Economia** para assessorar a definição e o estabelecimento de um sistema de inserção e monitoramento dos egressos da educação profissional no mercado de trabalho.*

- **Responsável:** Victor Hugo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 700.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 78.818,33
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2015 – Abril 2016
- **Estágio Previsto:** Não objeção do TdR
- **Estágio Atual:** Recebido do BM comentários sobre TdR e M.C em 06/03/15. Enviado a Setorial para ajustes em 09/03/15.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 18: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.

Subprojeto 28: Contratação de Consultor Individual para realizar avaliação de impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.

- **Responsável:** Victor Hugo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 300.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2015 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Em fase de elaboração do termo.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 19: *Elaborar mapeamento dos programas e entidades envolvidas na educação profissional, capacitação e treinamento técnico e tecnológico, para identificar complementaridades e áreas de possível sobreposição de esforços.*

Subprojeto 29: Termo de Referência para contratação de Serviço Técnico de consultoria de Empresa Especializada para a Elaboração de um Diagnóstico e estabelecimento de Diretrizes para a Política de Educação Profissional no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Victor Hugo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 75.000,00
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração de Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Em discussão com as Setoriais envolvidas e o Banco Mundial a elaboração do Termo.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



REDUÇÃO DA POBREZA

ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA



IPECE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica – Assistência à Família

Projeto 20: Criação do Sistema de Monitoramento e Avaliação (M&A) dos projetos financiados pelo FECOP.

Subprojeto 30: Contratação de Empresa pra desenvolver sistema de monitoramento e avaliação dos projetos financiados pelo FECOP.

- **Responsável:** Jimmy Oliveira e Mário Aragão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 800.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** A parte técnica do TR está feita, faltando apenas a concepção do Sistema e MC.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



SEDUC



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica – Assistência à Família

Projeto 34: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.

Subprojeto 44: Contratação de Consultoria de Empresa para o Desenvolvimento das Ações de Formação para o núcleo gestor das creches e pré-escolas dos municípios e regionais de Fortaleza participantes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN – CURSO DE GESTÃO PARA DIRETORES.

- **Responsável:** Henrique César Martins
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 250.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Não Objeção do TdR
- **Estágio Atual:** Termo de Referência em fase de conclusão desde 03/02/2015 e posterior aprovação do Secretário.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Assistência à Família

Projeto 34: *Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.*

Subprojeto 45: Contratação de Consultoria e Assessoria de Empresa de Treinamento para o Desenvolvimento das Ações de Formação ofertadas aos Diretores e Coordenadores Pedagógicos de Creches e Pré-Escolas dos Municípios e Regionais de Fortaleza através do Fortalecimento Institucional da Educação Infantil. – CURSO COACHING.

- **Responsável:** Henrique César Martins
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 250.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Abril 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Em fase final de elaboração do Termo, para posterior envio ao Secretário para aprovação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Assistência à Família

Projeto 35: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 46: Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para Identificar o Impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)

- **Responsável:** Henrique César Martins(SEDUC) / Jimmy Oliveira (IPECE)
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do Projeto:** US\$ 14.932,38
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2014 – Setembro 2015
- **Estágio Previsto:** Início do contrato
- **Estágio Atual:** Aguardando assinatura do contrato e sua publicação desde do dia 23/02/2015.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Assistência à Família

Projeto 35: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

*Subprojeto 47: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Henrique César Martins
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 30.055,70
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Junho 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Contrato
- **Estágio Atual:** Aguardando assinatura do contrato e sua publicação desde do dia 23/02/2015.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Assistência à Família

Projeto 35: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

*Subprojeto 48: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Henrique César Martins
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 21.498,73
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Junho 2015
- **Estágio Previsto:** Término do Contrato
- **Estágio Atual:** Aguardando assinatura do contrato e sua publicação desde do dia 23/02/2015.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Assistência à Família

Projeto 35: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

*Subprojeto 49: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de **Arte Gráfica/Design**, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- **Responsável:** Henrique César Martins
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 77.819,45
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Janeiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração das especificações
- **Estágio Atual:** Enviado a UGP a MC em 23/03/15 para análise.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Assistência à Família

Projeto 35: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 50 : Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- **Responsável:** Henrique César Martins
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 205.693,74
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Publicação do Aviso da Manifestação de Interesse
- **Estágio Atual:** Recebido a NO do BM em 10/03/15 para prosseguimento do processo de seleção.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

*ocorrido desmembramento do TdR de consultoria para 01 subprojeto: “Apoio Logístico”, serviço de não consultoria.

Assistência Técnica - Assistência à Família

Projeto 35: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 51: Contratação de Empresa para realizar Apoio Logístico das formações do PADIN

- **Responsável:** Henrique César Martins
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** NCB
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração das especificações
- **Estágio Atual:** Recebido da Setorial em 02/02/15 as especificações técnicas para análise da UGP. Aguardando a MC.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Assistência à Família

Projeto 35: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 52: Análise para compreensão investigativa das relações sociais e culturais que envolvam a estrutura familiar e comunitária as linguagens artísticas e brinquedo do PADIN.

- **Responsável:** Henrique César Martins
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 10.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Setembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Enviado ao BM para NO: TdR e MC em 04/03/15.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica - Assistência à Família

Projeto 35: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 53: Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN

- **Responsável:** Henrique César Martins(SEDUC) / Jimmy Oliveira (IPECE)
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 1.000.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR sendo discutido com IPECE, BM e Consultor Flávio Cunha
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica - Assistência à Família

Projeto 35: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 54: Avaliação do Programa para Coordenar o Trabalho de Campo do PADIN

- **Responsável:** Henrique César Martins(SEDUC) / Jimmy Oliveira (IPECE)
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 50.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR sendo discutido com IPECE, BM e o Consultor Flávio Cunha.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica - Assistência à Família

Projeto 35: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 55: Contratação de especialista em elaborar brinquedos infantis para desenvolver a proposta de construção de um KIT de brinquedo de baixo custo para estimular crianças de 0 a 3 anos.

- **Responsável:** Henrique César Martins
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 30.000,00
- **Método de Aquisição:** C.I
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Outubro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR está sendo reavaliado pela equipe técnica da SEDUC, após reuniões com BM em Fevereiro.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica - Assistência à Família

Projeto 35: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 56: Serviços para construção de KITS DE BRINQUEDOS para ações do PADIN.

- **Responsável:** Henrique César Martins
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** NCB
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração das especificações técnicas
- **Estágio Atual:** Em fase de discussão com BM, IPECE e Setorial.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica - Assistência à Família

Projeto 35: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 57: Realização de formação complementares para o PADIN

- **Responsável:** Henrique César Martins
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 2.500.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 660.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2015 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração e discussões técnicas.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



SEPLAG



INDICADOR PRIMÁRIO

Indicadores – Assistência à Família

Indicador Primário: Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.

Responsável: Lara Costa

- **Meta 2015:**

1º semestre – 22.5%

2º semestre – 45%

- **Posição em 28/02:** Equipes serão treinadas em março para elaboração do marco lógico.
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta.
- **Justificativa:** Devido ao tempo demandado para definição de pessoal das secretarias, a capacitação das equipes técnicas das setoriais para repasse da metodologia de elaboração do marco lógico deverá ser realizada em abril. Será trabalhado um grupo específico de projetos visando atender a meta do período. (Fonte: SIMA em 18/03/15).



INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicadores – Assistência à Família

Indicador Secundário: Criação e funcionamento de Comitê Consultivo ECD multissetorial (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE).

Responsável - Lara Costa

- **Meta 2015:**

2º semestre – Outras duas Resoluções Publicadas

- **Posição em 28/02:** A próxima reunião do Comitê está prevista para começo de abril, na qual começarão as discussões para a elaboração da 1º Resolução.
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** ██████████
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta.
- **Justificativa:** Após a Sra. Onélia Leite aceitar o convite para compor o Comitê Consultivo Intersetorial das Políticas de Desenvolvimento Infantil (CPDI) ocupando a presidência, o seu Gabinete ficou de providenciar os trâmites jurídicos necessários para que a unidade possa cumprir essa função, compondo a estrutura organizacional do Estado do Ceará. O Gabinete informou que estão finalizando esse processo, e uma próxima reunião do Comitê deverá ser realizada no começo de abril para abertura oficial dos trabalhos de 2015. (Fonte: SIMA em 18/03/15).



STDS



PROGRAMAS

Programas – Assistência à Família

Programa: 050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

- **Setoriais envolvidas:** STDS
- **PPA Iniciativa:** 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.
- **Ação I:** 14330 - Cofinanciamento dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 33,69
- **Previsto para o Ano de 2015:** R\$ 7,87
- **Realizado até 28/02/2015:** R\$ 0,00
- **Realizado/Previsto Anual:**
- **Periodicidade:** Frequência da execução mensal.
- **Farol:** ██████████



INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicadores – Assistência à Família

Indicador Primário: Porcentagem de famílias com crianças entre 0 e 5 anos no Cadastro Único em municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.

Responsável: Mary Anne Libório/ Sebastião Lopes

- **Meta 2015:**

2º semestre – 10%

- **Posição em 28/02:** Este Indicador é dependente da contratação de Consultoria e o TR está em fase de elaboração na STDS.
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta.
- **Justificativa:** O presente indicador terá início no segundo semestre de 2015 após a Capacitação dos Técnicos dos CRAS dos 36 municípios do PforR. É dependente da contratação de serviço técnico de consultoria de empresa especializada para o desenvolvimento e implantação do sistema de monitoramento do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará - Programa para Resultados (PforR) em fase de elaboração do Termo de Referência. (Fonte: SIMA em 20/03/15)

Indicadores – Assistência à Família

Indicador Primário: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.

Responsável: Mary Anne Libório/Sebastião Lopes

▪ **Meta 2015:**

1º semestre – 15%

2º semestre – 30%

- **Posição em 28/02:** O indicador depende da Contratação de 3 Serviços de Consultoria. Dois já estão em fase de assinatura do Contrato e 1 em fase de elaboração do TR.
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta.
- **Justificativa:** 1). Contratação de empresa especializada para executar capacitação das equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, com foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para crianças de 0 a 5 anos e suas famílias. Em fase de elaboração do Termo de Referência. 2). Contratação de Serviços de Empresa Especializada na elaboração de arte gráfica/design, revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social do Estado do Ceará (CRAS/CE) em fase de assinatura de contrato. Encaminhamento da documentação para Assessoria Jurídica da STDS para a formalização e assinatura do contrato. (Fonte: SIMA em 20/03/15).



INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicadores – Assistência à Família

Indicador Secundário: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.

Responsável: Mary Anne Libório

- **Meta 2015:**

2º semestre – 10%

- **Posição em 28/02:** Este Indicador é dependente da contratação de Consultoria. O TR está em fase de elaboração.
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta.
- **Justificativa:** O presente indicador terá início no segundo semestre de 2015 após a Capacitação dos Técnicos dos CRAS dos 36 municípios do PforR. É dependente do processo licitatório para a contratação de serviço técnico de consultoria de empresa especializada para o desenvolvimento e implantação do sistema de monitoramento do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará - Programa para Resultados (PforR) em fase de elaboração do Termo de Referência.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Assistência à Família

Projeto 50: *Monitoramento e capacitação dos CRAS.*

Subprojeto 83: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor do Projeto:** US\$ 900.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 75.986,84
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2014 – Janeiro 2016
- **Estágio Previsto:** Assinatura do Contrato
- **Estágio Atual:** Homologação publicada no DOE em 20/02/15. Aguardando a publicação do contrato, desde do dia 26/02/2015.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Assistência à Família

Projeto 50: *Monitoramento e capacitação dos CRAS.*

Subprojeto 84: Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PfroR

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 900.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 400.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015- Janeiro 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Setorial enviou TdR para análise da UGP em 24/03/2015.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica - Assistência à Família

Projeto 50: *Monitoramento e capacitação dos CRAS.*

Subprojeto 85: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Projeto:** US\$ 900.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 306.957,81
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de discussão e levantamento.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica - Assistência à Família

Projeto 50: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

Subprojeto 86: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 900.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 117.055,35
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2014 – Abril 2015
- **Estágio Previsto:** Início do Contrato
- **Estágio Atual:** Setorial está aguardando o Ofício da PGE para homologação e publicação do contrato desde 02/03/15.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**



PLANO DE AÇÃO

Plano de Ação

Risco 1: Serviços de educação e programas de proteção social apresentam limitações e enfrentam dificuldades para alcançar e atender aos Povos Indígenas, comunidades quilombolas e áreas rurais remotas, onde o acesso a informações sobre estes programas permanece limitado (exemplo, CRAS). Esta situação aponta para a importância de se fortalecerem as estratégias de contato e busca existentes para estes grupos vulneráveis e marginalizados de modo a que eles sejam capazes de terem acesso adequado aos benefícios desses programas.

1º Ação: Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar (incluindo a busca ativa de famílias vulneráveis).

Responsável: SEDUC, STDS e Gabinete do Governador

Coordenação: STDS

Período: Durante o primeiro ano

Indicador: Aumento do número de crianças indígenas e quilombolas atendidas em creches ou recebem atenção domiciliar (proporcional às metas gerais do projeto).

Posição em Fevereiro: De acordo com o cronograma enviado pelas setoriais foi destacada a atividade: “Realização de Seminário com os Gestores Municipais para sensibilização e adesão ao PforR e início da implementação”. Prazo para execução: Abril 2015. A STDS informou que essa atividade ainda não foi iniciada.



SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

QUALIDADE DA ÁGUA



ARCE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 1: *Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.*

Subprojeto 1: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.

- **Responsável:** Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 400.000,00
- **Valor TOR:** US\$ 391.546,55
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Abril 2014 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Avaliação das Propostas Técnicas
- **Estágio Atual:** Recebido do BM comentários sobre RAT em 06/03/15 para ajuste.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**



CIDADES



PROGRAMAS

Programas – Qualidade da Água

Programa: 032 - SANEAMENTO AMBIENTAL

- **Setoriais envolvidas:** Cidades/CAGECE
- **PPA Iniciativa:** 05384 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário – CIDADES PforR
5384 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário – CAGECE
- **Ação:** 19849 - Estruturação de Esgotamento Sanitário em Localidades Urbanas
- **Total Previsto para 2014 - 2017:** R\$ 11,07
- **Previsto para o Ano de 2015:** R\$ 5,00
- **Realizado até 28/02/2015:** R\$ 0,00
- **Realizado/Previsto Anual:**
- **Periodicidade da execução:** Frequência de Execução Mensal.
- **Farol:** ██████████

A CIDADES criou uma nova iniciativa (5384) e ação (21751) para o PforR para os anos de 2015 – 2017.



CAGECE



INDICADOR PRIMÁRIO

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador Primário: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.

Responsável: Carlos Rossas

▪ **Meta 2015:**

1º semestre – 84.6%

2º semestre – 84.9%

▪ **Posição em 28/02:** 85,03%

▪ **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

▪ **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

▪ **Justificativa:** Registrado no SIMA em 24/03/15 (enviado tela do sistema através do SIMA)



SEMA



PROGRAMAS

Programas – Qualidade da Água

Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- **Setoriais envolvidas:** SEMA
- **PPA Iniciativa:** 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.
- **Ação:** 14190 - Elaboração dos Planos de Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 13,34
- **Previsto para o Ano de 2015:** 0,25
- **Realizado até 28/02/2015:** R\$ 0,00
- **Realizado/Previsto Anual:**
- **Periodicidade:** Frequência da execução quadrimestral
- **Farol:** ██████████



INDICADOR PRIMÁRIO

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador Primário: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao Sistema de Esgoto.

Responsável: Carlos Rossas

- **Meta 2015:**

1º semestre – 84.6%

2º semestre – 84.9%

- **Posição em 28/02:** 85,03%

- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta

- **Justificativa:** Registrado no SIMA em 24/03/15 (enviado tela do sistema através do SIMA)

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador Primário: Estabelecimento de Comitê Multisetorial de Segurança Hídrica

Responsável - Maria Dias

▪ Meta 2015:

1º semestre – Diagnóstico de Bacias Hidrográficas

- **Posição em 28/02:** O Comitê irá realizar um cronograma para discussões do Diagnóstico das Bacias.
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta
- **Justificativa:** Na reunião do Comitê foi definido a elaboração de um cronograma de reuniões para discutir a execução do Diagnóstico das Bacias. (Fonte: SIMA em 24/03/15).



INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador Secundário: Apresentação da Lei de Gestão de Resíduos Sólidos revista

Responsável - Maria Dias

- **Meta 2015:**

2º semestre – Divulgação e Implementação

- **Posição em 28/02:** A minuta da Lei está na PGE para análise.
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta.
- **Justificativa:** A SEMA através do seu departamento jurídico empreendeu várias tentativas no intuito de acelerar a análise do processo, contudo o Projeto de Lei encaminhado a PGE no dia 10/12/14 ainda encontra-se na PGE para análise.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 8: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.

Subprojeto 10: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto “AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.”

- **Responsável:** Maria Dias e Viviane Monte
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 450.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 416.854,24
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Março 2016
- **Estágio Previsto:** Preparação da SDP
- **Estágio Atual:** Recebido da Setorial em 18/03/15 o TdR e MC ajustados para reanálise da UGP.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 9: Capacitação para o pessoal técnico municipal.

Subprojeto 11: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas

- **Responsável:** Maria Dias e Viviane Monte
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 720.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 250.777,42
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Fevereiro 2017
- **Estágio Previsto:** Não Objeção do Banco do TdR
- **Estágio Atual:** Enviado ao BM em 12/02/15 para NO: TdR e MC.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 9: Capacitação para o pessoal técnico municipal.

Subprojeto 12: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas 3 bacias hidrográficas estratégicos.

- **Responsável:** Maria Dias e Viviane Monte
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 720.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 96.308,32
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Fevereiro 2017
- **Estágio Previsto:** Não Objeção do BM
- **Estágio Atual:** Recebido do BM em 06/03/15a NO: E.T e MC.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 10: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.

Subprojeto 13: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Maria Dias e Viviane Monte
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 540.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 225.006,01
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2014 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração da Lista Curta e SDP
- **Estágio Atual:** Portfólios enviados a Setorial para análise e elaboração da Lista Curta em 10/02/15.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 11: *Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.*

Subprojeto 14 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Maria Dias e Viviane Monte
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 224.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 221.437,94
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 - Março 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** Solicitado através de email em 10/12/14 alteração de data de início do projeto no P.A .
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 12: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.

Subprojeto 15: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".

- **Responsável:** Maria Dias e Viviane Monte
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.345.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 1.344.963,40
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Março 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** TdR sendo discutido com equipe técnica, tendo vista a realização em 34 municípios já contemplados pelo projeto da SCIDADES.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 13: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

Subprojeto 16: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias e Viviane Monte
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 2.242.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 1.120.935,31
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Setembro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TDR
- **Estágio Atual:** Em fase de elaboração do TdR
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 13: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

Subprojeto 17: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver **plano de comunicação** para implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias e Viviane Monte
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 2.242.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 661.746,51
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Setembro 2016.
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** Solicitado através de email em 10/12/14 alteração de data de início do projeto no P.A, visto da necessidade de discutir com a Casa Civil.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 13: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

Subprojeto 18: Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas (**Equipamentos**)

- **Responsável:** Maria Dias e Viviane Monte
- **Categoria de Licitação:** Serviço de Não Consultoria
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 2.242.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 459.318,18
- **Método de Aquisição:** NCB
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Outubro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração das Especificações Técnicas
- **Estágio Atual:** Em fase de ajustes após comentários do BM.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



PLANO DE AÇÃO

Plano de Ação

2º Ação: Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água.

Responsável: CONPAM, SEMACE, COGERH, CAGECE

Coordenação: CONPAM,

Período: Até o fim do segundo ano

Indicador: Campanha de comunicação estabelecida e sob execução.

Posição em Fevereiro: O Conpam está tentando articular uma reunião com a Casa Civil sobre isso, mas não consegue retorno do órgão.



SEMACE



PROGRAMAS

Programas – Qualidade da Água

Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- **Setoriais envolvidas:** SEMACE
- **PPA Iniciativa:** 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.
- **Ação I:** 19861 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 1,82
- **Previsto para o Ano de 2015:** R\$ 0,42
- **Realizado até 28/02/2015:** R\$ 0,00
- **Realizado/Previsto Anual:**
- **Periodicidade:** Frequência da execução quadrimestral
- **Farol:** ██████████

Programas – Qualidade da Água

Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- **Setoriais envolvidas:** SEMACE
- **PPA Iniciativa:** 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.
- **Ação I:** 21570 - Monitoramento da Poluição / Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado.
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 1,32
- **Previsto para o Ano de 2015:** R\$ 0,42
- **Realizado até 28/02/2015:** R\$ 0,00
- **Realizado/Previsto Anual:**
- **Periodicidade:** Frequência da execução quadrimestral
- **Farol:** ██████████

Programas – Qualidade da Água

Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- **Setoriais envolvidas:** SEMACE
- **PPA Iniciativa:** 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.
- **Ação I:** 21317 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 24,81
- **Previsto para o Ano de 2015:** R\$ 9,76
- **Realizado até 28/02/2015:** R\$ 0,00
- **Realizado/Previsto (%):**
- **Periodicidade:** Frequência da execução quadrimestral
- **Farol:** ██████████

Programas – Qualidade da Água

Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

- **Setoriais envolvidas:** SEMACE
- **PPA Iniciativa:** 05155 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação das praias do litoral cearense.
- **Ação I:** 21571 - Monitoramento da Poluição / Contaminação das Praias do Litoral Cearense
- **Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões:** R\$ 0,55
- **Previsto para o Ano de 2015:** R\$ 0,15
- **Realizado até 28/02/2015:** R\$ 0,00
- **Realizado/Previsto Anual:**
- **Periodicidade:** Frequência da execução quadrimestral
- **Farol:** ██████████



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 36: *Fortalecimento da gestão ambiental estadual*

Subprojeto 58: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a **manualização dos Procedimentos Técnicos** dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.

- **Responsável:** Maurício Giffoni
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.054.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 285.232,19
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2014 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Preparação da SDP
- **Estágio Atual:** Sendo providenciado reanálise da lista curta, visto a saída de uma empresa.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 36: *Fortalecimento da gestão ambiental estadual*

Subprojeto 59: Contratação de Consultoria especializada que irá ministrar **Cursos de Capacitação** para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente

- **Responsável:** Maurício Giffoni
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.054.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2015 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Termo sendo discutido com a equipe interna da Setorial.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



FUNCEME



PROGRAMAS

Programas – Qualidade da Água

Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ

- **Setoriais envolvidas:** FUNCEME
- **PPA Iniciativa:** 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.
- **Ação 1:** 13973 - Modernização e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.
- **Ação 2:** 21421 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de Informações Hidroagrometeorológicas.
- **Total Previsto para 2014 - 2017:** R\$ 18,01
- **Previsto para o Ano de 2015:** R\$ 3,13
- **Realizado até 28/02/2015:** R\$ 0,04
- **Realizado/Previsto Anual:** 1,4%
- **Periodicidade:** Frequência da execução quadrimestral
- **Farol:** ██████████

Programas – Qualidade da Água

Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ

- **Setoriais envolvidas:** FUNCEME
- **PPA Iniciativa:** 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará.
- **Ação 1:** 14037 - Mapeamento Hidroambiental do Ceará
- **Total Previsto para 2014 - 2017:** R\$ 0,02
- **Previsto para o Ano de 2015:** R\$ 0,02
- **Realizado até 28/02/2015:** R\$ 0,00
- **Realizado/Previsto Anual:**
- **Periodicidade:** Frequência da execução Anual.
- **Farol:** ██████████



INDICADOR PRIMÁRIO

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador Primário: Implementação do Monitoramento participativo da Qualidade da Água

Responsável - Hoilton Rios

- **Meta 2015:**

1º semestre – Metodologia de monitoramento definida e adotada

2º semestre – Protocolo de coleta de dados definido e adotado

- **Posição em 28/02:** O Indicador está vinculado a Projeto de AT encontra-se em andamento, na fase de análise das propostas técnicas.
- **Posição em 28/02 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade intermediária de atingir a meta.
- **Justificativa:** O indicador está vinculado a uma Assistência Técnica cujo processo de seleção continua na fase de análise das propostas técnicas. (Fonte: SIMA em 23/03/15).



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 14: *Metodologia de modelagem de qualidade da água.*

Subprojeto 19: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.

- **Responsável:** Francisco Hoilton
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 630.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 591.313,55
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Não Objeção do RAT
- **Estágio Atual:** Recebido da Setorial o RAT em 20/03/2015 para análise da UGP e posterior envio ao BM para NO.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



SRH



PROGRAMAS

Programas – Qualidade da Água

Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

- **Setoriais envolvidas:** SRH
- **PPA Iniciativa:** 05310 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.
- **Ação I:** 15690 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica
- **Total Previsto para 2014 - 2017:** R\$ 0,14
- **Previsto para o Ano de 2015:** R\$ 0,14
- **Realizado até 28/02/2015:** R\$ 0,00
- **Realizado/Previsto Anual:**
- **Periodicidade:** Mensal
- **Farol:** ██████████

Programas – Qualidade da Água

Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

- **Setoriais envolvidas:** SRH
- **PPA Iniciativa:** 05311 - Implantação do Plano de Segurança Hídrica para as Bacias Hidrográficas Metropolitanas.
- **Ação I:** 15777 - Elaboração de Estudos para enquadramento dos Açudes das Bacias Estratégicas
- **Total Previsto para 2014 - 2017:** R\$ 2,43
- **Previsto para o Ano de 2015:** -
- **Realizado até 28/02/2015:** -
- **Realizado/Previsto Anual:** -
- **Periodicidade:** Execução iniciando em 2015 - Frequência mensal
- **Farol:** ██████████

Programas – Qualidade da Água

Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

- **Setoriais envolvidas:** SRH
- **PPA Iniciativa:** 05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.
- **Ação I:** 14926 - Aquisição, Instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade)
- **Total Previsto para 2014 - 2017:** R\$ 13,03
- **Previsto para o Ano de 2015:** R\$ 0,50
- **Realizado até 28/02/2015:** R\$ 0,00
- **Realizado/Previsto Anual:**
- **Periodicidade:** Mensal
- **Farol:** ██████████



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 46: Planejamento Estratégico do Sistema de Recursos Hídricos com Restruturação de Recursos Humanos.

Subprojeto 79: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica para Solução Integrada de Reestruturação Organizacional e Mapeamento de Perfil de Competências para a Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH

- **Responsável:** Ramon Rodrigues
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 370.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de revisão após comentários em 13/02/15.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 47: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos.

Subprojeto 80: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Qualiquantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 670.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 668.936,95
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Avaliação Técnica das Propostas
- **Estágio Atual:** Enviado a Setorial em 18/03/15 as propostas técnicas (02 empresas) para análise e elaboração do RAT.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 48: *Plano de Segurança Hídrica*

Subprojeto 81: Termo de Referência para Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.

- **Responsável:** Zulene Almada(COGERH)
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.249.728,24
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** Após reunião realizada com Setorial em 05/02/15, foi solicitado mudança de escopo do projeto.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Projeto 49: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica

Subprojeto 82: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas

- **Responsável:** Zulene Almada(Cogerh)
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 50.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Março 2015 – Janeiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do TdR
- **Estágio Atual:** Recebido da Setorial em 23/03/15 os documentos: TdR, MC, Minuta do Contrato e Minuta da MI para análise e posterior envio ao BM para NO.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



COGERH



INDICADORES SECUNDÁRIOS

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador Secundário: Apresentação de Planos de Segurança Hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.

Responsável: Zulene Almada

- **Meta 2015:**

2º semestre - Planos preparados

- **Posição em 28/02:** TR em análise na COGERH após sugestões do Banco Mundial.
- **Posição em 28/02 em relação à meta:**
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade intermediária de atingir a meta
- **Justificativa:** O plano de Segurança Hídrica inicialmente estava contido no Programa (componente 1), porém, após acertos da Direção da COGERH, os planos de segurança hídrica serão elaborados através de assistências técnicas (componente 2).

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de proteção de bacias hidrográficas.

Responsável: Adahil Sena

- **Meta 2015:**

2º semestre – Projetos de Lei apresentados

- **Posição em 28/02:** Estão programadas reuniões para março de 2015 com os Comitês da Bacia do Salgado e para a Bacia do Acaraú) para apresentação dos Projetos.
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade alta de atingir a meta
- **Justificativa:** Registrado no SIMA em 20/02/15: Foram realizadas duas reuniões de apresentação e discussão do Projeto de Lei com o Comitê das Bacias Metropolitanas (dezembro/2014 e janeiro/2015). Estão programadas reuniões para março de 2015 com os Comitês da Bacia do Salgado e para a Bacia do Acaraú).

Indicadores – Qualidade da Água

Indicador Secundário: Índice da Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza (IQA).

Responsável: Denilson Fidelis

- **Envolvidos:** COGERH

- **Meta 2015:**

2º semestre – 64.3

- **Posição em 28/02:** 80,02

- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 

- **Perspectiva de Cumprimento:** A meta foi cumprida.

- **Justificativa:** Registrado no SIMA em 24/03/15 (Relatório enviado por email).



PLANO DE AÇÃO

Plano de Ação

Risco 3: Planos de Gestão e Segurança Hídrica podem levar a algumas restrições adicionais no uso dos recursos naturais. Apesar de existirem mecanismos legais de proteção (Código Florestal), registraram-se limitações na capacidade institucional para assegurar seu cumprimento que requerem que atenção adicional seja dada para se desenvolverem soluções alternativas para as comunidades afetadas.

1º Ação: Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água

Responsável: COGERH, CONPAM, SRH (em consulta junto à FUNAI)

Coordenação: COGERH

Período: Até o fim do segundo ano

Indicador: Os planos de segurança hídrica para as três microbacias estratégicas incluem medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (definidas em consulta junto às comunidades afetadas – inclusive os povos indígenas). Documentar de maneira efetiva o apoio da comunidade indígena à sua elaboração.

Posição em Fevereiro: O TR do Plano foi revisado pelo Banco Mundial e encaminhado à COGERH para correção.



GESTÃO PÚBLICA

GESTÃO POR RESULTADOS



SEPLAG



INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicadores – Gestão por Resultado

Indicador Primário: Número de secretarias do Mutuário usando o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos.

Responsável: Avilton Júnior

- **Meta 2015:**

1º semestre – 1

2º semestre – 2

- **Posição em 28/02:** A SDP foi encaminhada às seis empresas da lista curta A meta de 2014 será cumprida somente em novembro de 2015. A meta referente a 2015.1 tem previsão de cumprimento somente em 2016.
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** 
- **Perspectiva de Cumprimento:** Probabilidade baixa de atingir a meta
- **Justificativa:** Este indicador está dependente da contratação de uma empresa de consultoria que efetuará a reestruturação do modelo de GPR adotado no Ceará. Atualmente, estamos na seguinte fase: a SDP foi encaminhada às seis empresas da lista curta. As mesmas terão até o dia 16 de abril para apresentar as propostas técnicas. (Fonte: SIMA em 16/03/2015).

Indicadores – Gestão por Resultado

Indicador Primário: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparados com a metodologia aprovada.

Responsável: Aداuto Oliveira

- **Meta 2014:**

2º semestre - Aprovação da metodologia

- **Meta 2015:**

Sem metas para o ano de 2015

- **Posição em 28/02:** Indicador vinculado à AT – No Processo licitatório o Relatório de Avaliação das Propostas Técnica aguarda a NO do Banco Mundial.
- **Posição em 28/02 em relação à meta:** ██████████
- **Perspectiva de Cumprimento:** a meta não foi cumprida em 2014.
- **Justificativa:** O processo licitatório para contratação da consultoria que irá desenvolver a Metodologia encontra-se na fase de aguardar não objeção do BIRD ao Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas. A previsão de contratação da empresa é Maio/15. (Fonte: SIMA em 16/03/15).



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 37: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.

Subprojeto 60: Desenvolvimento de Metodologia para **previsão de receitas** tributárias e Outras Receitas Correntes.

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de discussão com SEFAZ e Setorial, após reunião do dia 09/03/15, Subprojeto passará a ser da SEFAZ.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 37: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.

Subprojeto 61: Metodologias para a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará – Matriz Insumo Produto

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima/ Nicolino Trompieri (IPECE)
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 212.512,75
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em finalização, com previsão de envio a UGP final de fevereiro.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 37: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.

Subprojeto 62: Metodologias para a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará – Indicadores Antecedentes e Coincidentes

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima/ Nicolino Trompieri (IPECE)
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 87.487,25
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em finalização, com previsão de entrega a UGP final de fevereiro.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 37: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento.

*Subprojeto 63: Desenvolvimento de **Metodologia** para elaboração e execução do Orçamento Estadual*

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 300.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2016 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Após reunião realizada no dia 09/03/15, Projeto alterado para 2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 38: *Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.*

Subprojeto 64: Contratação de empresa para desenvolver a metodologia para custeio de programas e projetos.

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto :** US\$ 800.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Junho 2015 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Reunião realizada em com a SEFAZ, SEPLAG, SEDUC e UGP em 20/02/15 para discutir o TdR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 39: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.

Subprojeto 66: Termo de Referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada para elaborar o projeto de **Aprimoramento do Modelo de Administração e Gestão de Pessoas** do Governo do Estado do Ceará

- **Responsável:** Fábio Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 4.400.00,00
- **Valor do TOR:** 3.310.133,28
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Tdr sendo elaborado conforme nova definição de escopo do projeto.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 39: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.

Subprojeto 65: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para **Auditar a Folha de Pagamento** do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Fábio Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 4.400.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 1.089.866,72
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Maio 2017
- **Estágio Previsto:** Manifestação de Interesse
- **Estágio Atual:** Processo aberto no dia 09/03/15 e enviado a PGE para providências.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 40: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

Subprojeto 67: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Aduino Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.300.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 400.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Setembro 2015
- **Estágio Previsto:** Abertura Pública da Proposta Financeira
- **Estágio Atual:** Recebido do BM a NO em 24/03/15 referente o RAT.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 40: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

Subprojeto 69: Construção de um modelo de equilíbrio geral computável para economia cearense voltado à avaliação de impacto dos investimentos públicos estaduais.

- **Responsável:** Aduino Oliveira e Witalo Paiva (Ipece)
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.300.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 150.000,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 40 Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

Subprojeto 68: Implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

- **Responsável:** Aduino Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.300.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 550.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 40: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

Subprojeto 70: Capacitação técnica para a equipe da SEPLAG

- **Responsável:** Aduino Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.300.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 100.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 40: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

Subprojeto 71: Apoio Logístico para as viagens Técnica da equipe da SEPLAG

- **Responsável:** Aduino Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor Total do Projeto:** US\$ 1.300.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 100.000,00
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 41: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.

Subprojeto 72: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará(1ª Etapa).

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 839.830,96
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Avaliação Técnica das Propostas
- **Estágio Atual:** Enviado a SDP para Lista Curta em 16/03/15 com data de abertura de recebimento das propostas para 16/04/15.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 41: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersectorial.

Subprojeto 73: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial (2ª Etapa)

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 500.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2016 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 42: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.

Subprojeto 74: Fortalecer a participação cidadã no planejamento, monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Dominique Gomes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 446.073,87
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Avaliação Técnica das Propostas
- **Estágio Atual:** Processo nº 0428057/2015 enviado a PGE em 18/03/15 com RFLC e SDP. Encontra-se em análise pela CEL04.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Gestão por Resultado

Projeto 41: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.

Subprojeto 75: Desenvolvimento de Ferramentas de Suporte à aplicação do modelo de Gestão Participativa.

- **Responsável:** Dominique Gomes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.800.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 1.535.926,13
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2015 – Janeiro 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase de elaboração
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



IPECE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Projeto 15: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

Subprojeto 20 e 21: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor:** US\$ 500.000,00
- **Valor do Projeto:** US\$ 296.225,77
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Abril 2014 – Julho 2018
- **Estágio Previsto:** Contratação
- **Estágio Atual:** Contrato em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Projeto 15: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

Subprojeto 22: Ampliação e aquisição de mobiliário para o ambiente da unidade de gerenciamento do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – *PforR*.

- **Responsável:** Deusimar Lira
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor:** US\$ 500.000,00
- **Valor do Projeto:** US\$ 50.000,00
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2016 – Janeiro 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração das especificações técnicas
- **Estágio Atual:** Projeto adiado para 2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Projeto 15: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

Subprojeto 23: Aquisições de Equipamentos para Unidade de Gerenciamento do PforR.

- **Responsável:** Deusimar Lira
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor:** US\$ 500.000,00
- **Valor do Projeto:** US\$ 195.000,00
- **Método de Aquisição:** NCB
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2016 – Janeiro 2017
- **Estágio Previsto:** Elaboração das especificações técnicas
- **Estágio Atual:** Em fase de elaboração das especificações
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Projeto 16: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE -Sistema Informatizado de Monitoramento.

Subprojeto 24: Contratação de empresa para desenvolver sistema de monitoramento da UGP/PforR

- **Responsável:** Mário Aragão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 500.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Em fase de elaboração do termo.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



CGE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Gestão Transversal - Auditoria

Projeto 3: Auditoria Técnica dos Indicadores

Subprojeto 3: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 350.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 153.829,53
- **Valor do Contrato – Ano 1:** US\$ 49.564,77 *
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Novembro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução
- **Estágio Atual:** Contrato assinado e ordem de serviço emitida em 14/01/2015. Consultor prestando os serviços.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

* Valor do contrato em reais: R\$ 116.616,00 (R\$ 97.180,00(contrato) + R\$19.436,00 (INSS Patronal))



SISTEMA FIDUCIÁRIO



CGE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 4: *Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais*

- **Responsável:** Marcelo Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 875.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Setembro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Em fase de elaboração do TdR.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 5: *Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social*

Subprojeto 5: Aprimoramento do Portal da Transparência

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015– Abril 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Enviado modelos de documentos a Setorial em 27/02/15.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 5: *Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social*

Subprojeto 6: Aprimoramento do Sistema de Ouvidoria – SOU (Ouvidoria e Acesso à Informação).

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015– Abril 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Enviado modelos de documentos a Setorial em 27/02/15.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 5: *Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social*

Subprojeto 7: Capacitação da população para o Controle Social

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Solicitado através do Ofício nº 1541/2014 em 16/12/14 alteração do P.A para 28/02/15 o início do Projeto.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 6: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.

Subprojeto 8: Contratação de Empresa especializada para realização de treinamento com foco “Detecção de Casos de Fraudes e Corrupção”, para capacitar servidores do poder Executivo do Estado no que tange aos princípios aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.

- **Responsável:** Denise Andrade Araújo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 150.000,00
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Fevereiro de 2016
- **Estágio Previsto:** Não Objeção do BM
- **Estágio Atual:** Recebido da Setorial em 23/03/15 o TdR ajustado para análise da UGP.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação: ██████████

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 7: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Subprojeto 9: Contratação de Empresa especializada para realização de treinamento com foco “Detecção de Casos de Fraudes e Corrupção”, para capacitar servidores do poder Executivo do Estado no que tange aos princípios aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção

- **Responsável:** Marcelo Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor:** US\$ 150.000,00
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2015 – Fevereiro de 2016
- **Estágio Previsto:** Manifestação de Interesse
- **Estágio Atual:** Recebido do BM em 19/03/15 a NO do TdR. Setorial providenciando abertura do processo de licitação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



PGE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 21 : Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.

Subprojeto 31: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Valéria Rodrigues
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 525.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 524.818,44
- **Método de Aquisição:** NCB
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2015 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Não Objeção do BM
- **Estágio Atual:** Enviado ao BM para NO em 16/03/15: TdR e MC
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████



SEPLAG

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 44: *Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).*

Subprojeto 77: Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado - GCOMPRAS

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.000.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do termo de referência
- **Estágio Atual:** TdR em fase final de conclusão
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 45: *Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.*

Subprojeto 78: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 200.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 196.914,15
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Preparação da Lista Curta
- **Estágio Atual:** Portfólios em análise da CEL04 desde 05/03/15 para posterior envio a Setorial para análise e elaboração do RFLC.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**



TCE



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 51: *Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)*

Subprojeto 88: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 1.000.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 149.096,50
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Notificação e Adjudicação
- **Estágio Atual:** Marcado reunião de negociação do Consultor selecionado para o dia 30/03/15.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 51: *Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)*

Subprojeto 89: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Projeto:** US\$ 1.000.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 149.096,50
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Notificação e Adjudicação
- **Estágio Atual:** Recebido a NO do BM em 24/03/15 da Minuta do Contrato e Ata de Negociação
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 51: *Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)*

Subprojeto 87: Reformulação do Processo eletrônico do TCE

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US\$ 1.000.000,00
- **Valor do TOR:** US\$ 700.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Elaboração do Termo de Referência
- **Estágio Atual:** TdR e MC está sendo reanalisada, para posterior publicação do aviso da M.I.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████

Unidade de Gerenciamento do Projeto PforR (UGP)
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora
Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N
Ed. SEPLAG, 2º andar- Fortaleza-CE
Tel.: (85) 3101.3499 e (85) 3101.3510
