



33ª REUNIÃO DO COMITÊ *PforR*
ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO
PROJETO *PforR*
27 DE OUTUBRO DE 2016



PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

1. Abertura e apresentação dos participantes (14h30-14h35)
2. Algumas Informações (14:35 – 14h40m):
 - 2.1 Posição da Reestruturação do PforR
3. Indicadores, Plano de Ação, Programas e Assistência Técnica (14h40 - 15h40m)
 - 3.1. Indicadores Primários 2016.2 e Desembolsos - Laura Gonçalves
 - 3.2. Indicadores Secundários 2016.2 - Laura Gonçalves
 - 3.3. Plano de Ação de Mitigação de Riscos – Laura Gonçalves
 - 3.4. Programas PforR - Thâmara Teixeira
 - 3.5. Assistência Técnica: Estatísticas – Lívia Castro e Rodrigo Almeida
 - 3.6. Tempo disponível do PforR - Lívia Castro
 - 3.7. Projetos de Assistência Técnica em situação de risco - Lívia Castro
 - 3.8. Monitoramento dos Contratos – André Morel
 - 3.9. Pontos Principais de Aquisições – Giuseppe Nogueira
 - 3.10. Projetos de Assistência Técnica por Setorial - Giuseppe Nogueira
4. Apresentação do Resumo das áreas Foco do PforR II (15h40m - 15h50m)
5. Aprovação da Ata da 32ª Reunião (29/09/2016) (15h50m - 15h55m)
6. Encaminhamentos (15h55m - 16h)
7. Encerramento (16h)



1. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES



2. ALGUMAS INFORMAÇÕES



2.1 Posição da Reestruturação do PforR

2.1 Posição da Reestruturação do PforR

✓Cronograma:

Atividades	Datas Previstas	Datas Realizado
1. A Justificativa Técnica será analisada pelo Grupo Técnico da COFIEIX	13/07/16	13/07/16
2. Encaminhamento do documento à Secretaria do Tesouro Nacional - STN	12/08/16	12/08/16
3. Conclusão do Parecer da PGFN	26/08/16	Está a 74 dias na STN
4. Retorno ao Banco Mundial e ao Estado do Ceará aprovando a elaboração do Aditivo	Novembro/16	
5. Previsão para assinatura do Aditivo de reestruturação do PforR	Dezembro/16	



3. INDICADORES, PLANO DE AÇÃO, PROGRAMAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA



3.1. Indicadores Primários 2016.2

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2016.2

n°	SETORIAL RESPONSÁVEL	Indicadores		Metas
		DLI	Nome	2°Semestre2016
1	SEDUC	DLI3	Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso.	15
2	STDS	DLI4	Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS.	7%
		DLI5	Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	55%
3	SEPLAG	DLI6	Percentual de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com Marco Lógico implementado.	70%
4	SRH	DLI7	Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	Minutas de pelo menos duas reuniões
5	CAGECE	DLI8	Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	85.5%
6	SEMA SEMACE COGERH	DLI9	Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	70%
7	FUNCEME	DLI10	Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	Metodologia implementada em um reservatório estratégico
8	SEPLAG	DLI11	Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	4
9	SEPLAG	DLI12	Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	10%

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.	SEDUC Rivanir Bezerra	2015.1	10	2.744.444,00	■
		2015.2	12	3.403.750,00	■
		2016.1	13	3.444.000,00	■
		2016.2	15	3.438.000,00	
		2017.1	16	3.444.000,00	
		2017.2	18	3.120.000,00	
		Total do Indicador			

Legenda: ■ Metas alcançadas

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.	SEDUC Rivanir Bezerra	15 acordos	13 acordos firmados	A SEDUC assinou o 14º Termo com a empresa Jangadeiro e já dialoga com 2 novas empresas para que sejam feitas novas parcerias.

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas*	Valores em US\$	Farol
DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	2015.2	5%	3.403.750,00	
		2016.2	7%	3.438.000,00	
		2017.2	10%	3.120.000,00	
		Total do Indicador		9.961.750,00	

*As metas deste Indicador foram alteradas na reestruturação, anteriormente eram: 10%, 15% e 25%

Legenda: Meta alcançada em 5,11%


INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	7% ¹	5,11%	Já foram visitadas 2.391 famílias e a STDS continua realizando as visitas, bem como a articulação com os gestores dos municípios para a execução do acompanhamento familiar

¹Meta alterada por ocasião da reestruturação do PforR

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol	
DLI 5: Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	2015.1	15%	2.744.444,00		
		2015.2	30%	3.403.750,00		
		2016.1	42.5%	3.444.000,00		
		2016.2	55%	3.438.000,00		
		2017.1	75%	3.444.000,00		
		2017.2	95%	3.120.000,00		
		Total do Indicador			19.594.194,00	


Legenda:  Metas alcançadas

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	55%	96,36%	Até setembro de 2016 foram capacitados um total de 237 técnicos, dentre estes, 144 de Nível Superior e 93 de Nível Médio, de 34 municípios da área de abrangência do PforR, atingindo <u>55 CRAS</u> , o equivalente a <u>100%</u> do total de CRAS, cumprindo-se, portanto, as metas referentes ao 1º e 2º semestre de 2017, de 75% e 95% respectivamente.

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	SEPLAG José Freitas	2015.1	22.5%	2.744.444,00	
		2015.2	45%	3.403.750,00	
		2016.1	55%	3.444.000,00	
		2016.2	70%	3.438.000,00	
		2017.1	82.5%	3.444.000,00	
		2017.2	95%	3.120.000,00	
		Total do Indicador			

Legenda:  Metas alcançadas

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 6: Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	SEPLAG José Freitas	70%	60%	<p>A Equipe do FECOP está seguindo o seguinte Cronograma para fins de atingimento deste Indicador:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Levantamento de projetos (1ª quinzena de outubro); b) Realização de oficinas (2ª quinzena de outubro e 1ª de novembro); c) Revisão dos marcos lógicos construído (2ª quinzena de novembro); e, d) Consolidação de relatório (1ª quinzena de dezembro).

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicadores	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 7: Estabelecimento de um Comitê multissetorial de Segurança Hídrica.	SRH Carlos Campelo	2013.2	Comitê instituído pelo decreto	39.375.000,00	
		2015.1	Diagnóstico de Bacias completos	2.744.444,00	
		2016.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.444.000,00	
		2016.2	Minutas de pelo menos duas reuniões	3.438.000,00	
		2017.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.444.000,00	
		2017.2	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.120.000,00	
		Total do Indicador			55.565.444,00

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Metas	Realizado	Status
DLI 7: Estabelecimento do Comitê multisetorial de Segurança da Água.	SRH Carlos Campelo	Atas de pelo menos duas reuniões realizadas	-	Já foram encaminhadas à UGP duas Atas de reuniões. A próxima deverá ocorrer no dia 18/10/16 e logo que as atas estejam devidamente aprovadas, também serão encaminhadas para comprovação do Indicador.

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	CAGECE Carlos Rossas	2014.1	83.8%	5.250.000,00	
		2014.2	84.3%	6.198.000,00	
		2015.1	84.6%	2.744.444,00	
		2015.2	84.9%	3.403.750,00	
		2016.1	85.2%	3.444.000,00	
		2016.2	85.5%	3.438.000,00	
		2017.1	85.7%	3.444.000,00	
		2017.2	85.9%	3.120.000,00	
		Total do Indicador			

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	CAGECE Carlos Rossas	85.5%	86,71%	Esse indicador foi cumprido em 2015.2 com o resultado de 86,05%. O resultado do mês de setembro foi de <u>86,71%</u> .





INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicadores	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 9: Índice da qualidade da fiscalização ambiental	2014.1	28%	5.250.000,00	■
	2014.2	40%	6.198.000,00	■
	2015.1	50%	2.744.444,00	■
	2015.2	60%	3.403.750,00	■
	2016.1	65%	3.444.000,00	■
	2016.2	70%	3.438.000,00	
	2017.1	75%	3.444.000,00	
	2017.2	80%	3.120.000,00	
	Total do Indicador			31.042.194,00

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	SEMA Maria Dias SEMACE Tiago Bessa COGERH Denilson Fidelis	70%	71,20%	71,20% (Medição referente a setembro).

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME Hoilton Rios	2015.1	Metodologia de monitoramento definida e adotada.	2.744.444,00	
		2015.2	Protocolo de coleta de dados definida e adotada.	3.403.750,00	
		2016.2	Metodologia implementada em um reservatório estratégico.	3.438.000,00	
		2017.2	Metodologia implementada em dois reservatórios estratégicos adicionais.	3.120.000,00	
		Total Indicador			12.706.194,00

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
<p>DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.</p>	<p>FUNCEME Hoilton Rios</p>	<p>Metodologia implementada em um reservatório estratégico.</p>	<p>Metodologia implementada em um reservatório estratégico.</p>	<p>A Metodologia foi aplicada ao Açude Acarape do Meio e apresentada ao CBH da Região Metropolitana de Fortaleza em 15 de setembro de 2016. A Declaração do Comitê aprovando o estudo foi enviada à UGP.</p>

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.*	SEPLAG Avilton Júnior	2014.2	Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará.**	6.198.000,00	
		2015.1	1	2.744.444,00	
		2015.2	2	3.403.750,00	
		2016.1	3	3.444.000,00	
		2016.2	4	3.438.000,00	
		2017.1	5	3.444.000,00	
		2017.2	6	3.120.000,00	
		Total			25.792.194,00

* Nome do Indicador alterado por ocasião da reestruturação do PforR

** Meta do Indicador alterada por ocasião da reestruturação do PforR

Legenda: ■ Probabilidade baixa de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Metas	Realizado	Status
DLI11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	SEPLAG Avilton Júnior	2014.2	-	O Produto 4 (Metodologia que consolide o Modelo de GPR, com e sem Modelo de Incentivos alinhado ao alcance dos objetivos estratégicos) fruto do Contrato com a Empresa Macroplan foi entregue em 11/10/16. A minuta do Decreto está sendo elaborada pela Empresa de Consultoria.
		Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará.		
		2015.1		
		1 Secretaria		
		2015.2		
		2 Secretarias		
		2016.1		
		3 Secretarias		
		2016.2		
4 Secretarias				

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada	SEPLAG Adauto Oliveira	2014.2	Aprovação da metodologia	6.198.000,00	
		2015.1	-	-	
		2015.2	-	-	
		2016.1	5%	3.444.000,00	
		2016.2	10%	3.438.000,00	
		2017.1	15%*	3.444.000,00	
		2017.2	20%*	3.120.000,00	
		Total			19.644.000,00

*As metas deste Indicador foram modificadas na reestruturação do PforR, anteriormente as metas eram 25% e 40%

Legenda:  Metas alcançadas

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Metas	Realizado	Status
DLI12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	SEPLAG Adauto Oliveira	2016.1	20%	As próximas metas do ano de 2017 serão cumpridas somente após a publicação da LOA para 2017. Assim que forem definidos os valores dos recursos destinados para os Projetos Estratégicos serão selecionados quais deles utilizarão a metodologia de Planejamento de Investimentos.
		5% dos Projetos		
		2016.2		
		10% dos Projetos		






3.2. Indicadores Secundários 2016.2

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2016

n°	Setorial	Indicadores	Metas 2016.2	Status
1	IPECE	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	30.300	
2	SEPLAG	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	Outras duas resoluções publicadas	
3	STDS	Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas	7%	
4	COGERH	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	-	
		Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	Encaminhamento do Projeto ao CONERH	
		Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	65.9	
5	SEMA	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	Implementação e monitoramento	
Total de Indicadores Secundários: 7 Indicadores				

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Meta 2º Semestre 2016

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Meta 2ª semestre	Realizado	Status
PDO1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	IPECE Victor Hugo	30.300	25.463 técnicos	Houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).


Legenda  Probabilidade baixa de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Meta 2ª semestre	Realizado	Status
Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	SEPLAG Lara Costa	Outras duas resoluções publicadas	-	<p>Foi publicada a 1ª Resolução do CPDI de 2016 com a definição de Estratégias técnicos-operacionais do Programa Mais Infância Ceará, com foco no Monitoramento e Avaliação de Resultados.</p> <p>A segunda resolução do ano será elaborada e publicada posteriormente.</p>

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Metas 2ª semestre	Realizado	Status
<p>PDO2: Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas</p>	<p>STDS Sebastião Lopes Mary Anne</p>	<p>7%</p>	<p>-</p>	<p>O Sistema de Monitoramento da STDS foi concluído e encontra-se em fase de teste. Os dados do acompanhamento familiar, referentes a primeira e a segunda visitas estão sendo inseridos, para a emissão de relatórios de acompanhamento e verificação dos resultados obtidos no cumprimento do indicador.</p>

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Meta 2º Semestre 2016

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Meta 2ª semestre	Realizado	Status
PDO3:Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	COGERH Denilson Fidelis, Disney Paulino	65,9	78,20	78,20 (referente ao mês de setembro) IQARce: 4,21 (criticamente degradado a poluído)

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Metas 2ª semestre*	Realizado	Status
Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	COGERH Zulene Almada	-	-	O Projeto “Plano de Segurança Hídrica” foi apresentado ao CONERH em 18/10. O Consórcio contratado apresentou um mapa das áreas indígenas e Quilombolas para que a COGERH inicie o planejamento dos trabalhos de sensibilização e articulação junto a essas comunidades.

*De acordo com o novo Protocolo este Indicador só terá meta em 2017.2

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Metas 2ª semestre	Realizado	Status
Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	COGERH Ana Araújo	Encaminhamento do Projeto ao CONERH	As Consultas foram realizadas nos 12 Comitês de Bacias Hidrográficas.	Após a Finalização do processo de compilação das contribuições das Consultas realizadas junto aos Comitês das Bacias a Minuta da Lei será enviada para análise da Assessoria Jurídica e em seguida será enviada e apresentada ao CONERH.

*Comitês Bacias Hidrográficas

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

Nome do Indicador	Responsável	Metas	Realizado	Status
Apresentação da Lei de gestão de Resíduos Sólidos revista.	SEMA Maria Dias	Implementação e monitoramento	-	Atualmente, está em execução a elaboração dos Planos Regionais de Resíduos Sólidos e a estruturação dos Consórcios Municipais.



3.3. Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental

Pendências Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental - PforR

	Descrição da Ação	Responsável	Posição
1	A. Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar.	STDS	A Ação será realizada apenas pela, pois a SEDUC informou que não poderá participar da Ação, por motivos especificados em NT enviada ao Banco. A STDS enviou um documento com as respostas aos questionamentos realizados pelo Especialista Alberto Costa.
2	E. Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água	COGERH	O Consórcio contratado apresentou um mapa das áreas Indígenas e Quilombolas para que a COGERH inicie o planejamento dos trabalhos de sensibilização e articulação junto a essas comunidades.



3.4. Programas *PforR*

Posição do Programa 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional - SEDUC

Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	Até 26.10.16 (B)	2017 (C)	Até 26.10.16 (D)	2016 (D)/(A)	FAROL (D)/(B)
020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 43,10	R\$ 35,26	R\$ 31,49	R\$ 23,14	54%	66%
020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 15,44	R\$ 12,63	R\$ 8,06	R\$ 8,68	56%	69%
020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 87,52	R\$ 71,60	R\$ 98,93	R\$ 133,86	153%	187%
020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.	R\$ 2,47	R\$ 2,02	R\$ 2,30	R\$ 1,09	44%	54%
020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.	R\$ 29,00	R\$ 23,73	R\$ 30,00	R\$ 21,20	73%	89%
TOTAL	R\$ 177,53	R\$ 145,25	R\$170,78	R\$ 187,97	106%	

Posição do Programa 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional - SEDUC

Iniciativas		Execução até 26.10.2016	Restos a Pagar até 26.10.2016	TOTAL
771	020.1.01	R\$ 23.138.711,11	R\$ -	R\$ 23.138.711,11
	020.1.02	R\$ 3.497.499,41	R\$ 5.186.936,32	R\$ 8.684.435,73
328	020.1.03	R\$ 131.984.686,17	R\$ 1.877.665,95	R\$ 133.862.352,12
-	020.1.04	R\$ 1.087.060,86	R\$ -	R\$ 1.087.060,86
834	020.1.06	R\$ 19.414.281,34	R\$ 1.780.936,44	R\$ 21.195.217,78
Total		R\$ 179.122.238,89	R\$ 8.845.538,71	R\$ 187.967.777,60

Posição do Programa 080 – Proteção Social Básica - STDS

Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	Até 26.10.16 (B)	2017 (C)	Até 26.10.16 (D)	2016 (D)/(A)	FARO L (D)/(B)
080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.	R\$ 7,30	R\$ 5,97	R\$ 10,51	R\$ 5,60	77%	94%
TOTAL STDS - ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA	R\$ 7,30	R\$ 5,97	R\$ 10,51	R\$ 5,60	77%	

Iniciativas		Execução até 26.10.2016	Restos a Pagar até 26.10.2016	TOTAL
03180	080.1.01	R\$ 5.530.600,00	R\$ 72.000,00	R\$ 5.602.600,00

Posição do Programa 025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana - CIDADES

Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	Até 26.10.16 (B)	2017 (C)	Até 26.10.16 (D)	2016 (D)/(A)	FAROL (D)/(B)
025.1.12 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário.	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,58	R\$ -	0%	0%

Posição do Programa 064 – Resíduos Sólidos - SEMA

Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	Até 26.10.16 (B)	2017 (C)	Até 26.10.16 (D)	2016 (D)/(A)	Farol (D)/(B)
064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.	R\$ 1,10	R\$ 0,90	R\$ 2,00	R\$ 0,26	23%	29%

Posição do Programa 066 – Ceará Mais Verde - SEMA

Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	Até 26.10.16 (B)	2017 (C)	Até 26.10.16 (D)	2016 (D)/(A)	Farol (D)/(B)
066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.	R\$ 0,60	R\$ 0,49	R\$ 0,60	R\$ 0,02	3%	4%

Posição do Programa 067 – Ceará no Clima - SEMA

Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	Até 26.10.16 (B)	2017 (C)	Até 26.10.16 (D)	2016 (D)/(A)	Farol (D)/(B)
067.1.05 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro.	R\$ 0,55	R\$ 0,45	R\$ 0,55	R\$ -	0%	0%

Iniciativas		Execução até 26.10.2016	Restos a Pagar até 26.10.2016	TOTAL
03104	064.1.04	R\$ 99.750,00	R\$ 157.438,30	R\$ 257.188,30
-	066.1.02	R\$ 20.834,55	R\$ -	R\$ 20.834,55
Total		R\$ 120.584,55	R\$ 157.438,30	R\$ 278.022,85

Posição do Programa 066 – Ceará Mais Verde - SEMACE

Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	Até 26.10.16 (B)	2017 (C)	Até 26.10.16 (D)	2016 (D)/(A)	Farol (D)/(B)
066.1.12 – Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará.	R\$ 0,28	R\$ 0,23	R\$ 2,34	R\$ 0,23	82%	100%
066.1.13 – Ampliação das ações de proteção dos recursos ambientais das áreas protegidas do Estado do Ceará.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,13	129%	129%

Posição do Programa 067 – Ceará no Clima - SEMACE

Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	Até 26.10.16 (B)	2017 (C)	Até 26.10.16 (D)	2016 (D)/(A)	Farol (D)/(B)
067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.	R\$ 2,00	R\$ 1,64	R\$ 0,18	R\$ -	0%	0%

Posição do Programa 500 – Gestão e Manutenção - SEMACE

Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	Até 26.10.16 (B)	2017 (C)	Até 26.10.16 (D)	2016 (D)/(A)	Farol (D)/(B)
500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas.	R\$ 0,42	R\$ 0,34	R\$ 0,76	R\$ -	0%	0%

Iniciativas		Execução até 26.10.2016	Restos a Pagar até 26.10.2016	TOTAL
05170	066.1.12	R\$ 201.512,98	R\$ 27.600,00	R\$ 229.112,98
04815	066.1.13	R\$ -	R\$ 129.000,00	R\$ 129.000,00
Total		R\$ 201.512,98	R\$ 156.600,00	R\$ 358.112,98

Posição do Programa 018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis - FUNCEME

Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	Até 26.10.16 (B)	2017 (C)	Até 26.10.16 (D)	2016 (D)/(A)	FAROL (D)/(B)
018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias.	R\$ 1,81	R\$ 1,48	R\$ 1,91	R\$ 1,35	75%	91%
018.1.03 - Ampliação e modernização do sistema de monitoramento e previsão.	R\$ 0,05	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,04	90%	110%
TOTAL	R\$ 1,86	R\$ 1,52	R\$ 1,97	R\$ 1,39	75%	

Posição do Programa 018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis - FUNCEME

Iniciativas		Execução até 26.10.2016	Restos a Pagar até 26.10.2016	TOTAL
2846	018.1.01	R\$ 1.264.024,15	R\$ 88.499,99	R\$ 1.352.524,14
-	018.1.03	R\$ -	R\$ 44.890,00	R\$ 44.890,00
Total		R\$ 1.264.024,15	R\$ 133.389,99	R\$ 1.397.414,14

Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2016 até 26.10.2016

Eixo	Setorial	Previsão	Execução	%
Capacitação Profissional	SEDUC	R\$ 177,53	R\$ 187,97	106%
Assistência à Família	STDS	R\$ 7,30	R\$ 5,60	77%
Qualidade da Água	CIDADES	R\$ -	R\$ -	0%
	SEMA	R\$ 2,25	R\$ 0,28	12%
	SEMACE	R\$ 2,70	R\$ 0,36	13%
	FUNCEME	R\$ 1,86	R\$ 1,39	75%
Total		R\$ 191,64	R\$ 195,60	102%

Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2016 até 26.10.2016

Execução Acumulada do Projeto até 26.10.2016			
Meta 2014-2017	R\$	866,54	100%
Execução 2014	R\$	243,35	28%
Execução 2015	R\$	233,28	27%
Execução 2016	R\$	195,60	23%
Total Executado	R\$	672,23	78%
Falta Executar	R\$	194,31	22%

Posição dos Programas

EIXO	SETORIAL	PROGRAMAS	Previsão			Execução	%	
			2016 (A)	Até 26.10.16 (B)	2017 (C)	Até 26.10.16 (D)	2016 (D)/(A)	FAROL (D)/(B)
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	SEDUC	020 – Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 177,53	R\$ 145,25	R\$170,78	R\$ 187,97	106%	129%
TOTAL CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			R\$ 177,53	R\$ 145,25	R\$170,78	R\$ 187,97	106%	129%
ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA	STDS	080 – Proteção Social Básica.	R\$ 7,30	R\$ 5,97	R\$ 10,51	R\$ 5,60	77%	94%
TOTAL ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA			R\$ 7,30	R\$ 5,97	R\$ 10,51	R\$ 5,60	77%	94%
QUALIDADE DA ÁGUA	CIDADES	025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana;	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,58	R\$ -	0%	0%
	SEMA/ SEMACE	064 – Resíduos Sólidos;	R\$ 1,10	R\$ 0,90	R\$ 2,00	R\$ 0,26	23%	29%
		066 – Ceará Mais Verde;	R\$ 0,88	R\$ 0,72	R\$ 2,94	R\$ 0,38	43%	53%
		067 – Ceará no Clima;	R\$ 2,55	R\$ 2,09	R\$ 0,73	R\$ -	0%	0%
	SEMACE	500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada;	R\$ 0,42	R\$ 0,34	R\$ 0,76	R\$ -	0%	0%
FUNCEME	018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis.	R\$ 1,86	R\$ 1,52	R\$ 1,97	R\$ 1,39	75%	91%	
TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA			R\$ 6,81	R\$ 5,57	R\$ 16,98	R\$ 2,03	30%	36%
TOTAL EXECUÇÃO DE 2016			R\$ 191,64	R\$ 156,80	R\$ 198,27	R\$195,60	102%	125%

Posição dos Programas

✓ **Lembrete:** Regras Programas


A execução dos programas deve observar as seguintes restrições:

- Devem excluir despesas que são financiadas pelo próprio BIRD ou por outras operações de crédito, ou seja, não é permitido a alocação de recursos do BIRD ou outras operações de crédito para custear despesas dos programas e iniciativas do componente
- Verificar a lista negra do BIRD a cada licitação, antes de assinar contrato. Para atender o Art. 42 da Lei 8.666/93 a SEPLAG incluiu no orçamento de cada ação um valor na fonte 69;
- Não podem apresentar impacto sócio ambiental negativo;
- Os valores dos contratos não podem exceder os limites abaixo:
 - Obras = US\$ 50 milhões
 - Bens = US\$ 30 milhões
 - Sistemas de TIC = US\$ 20 milhões
 - Consultorias = US\$ 15 milhões.



3.5. Assistência Técnica – Estatísticas


Execução dos Subprojetos de AT por Etapa

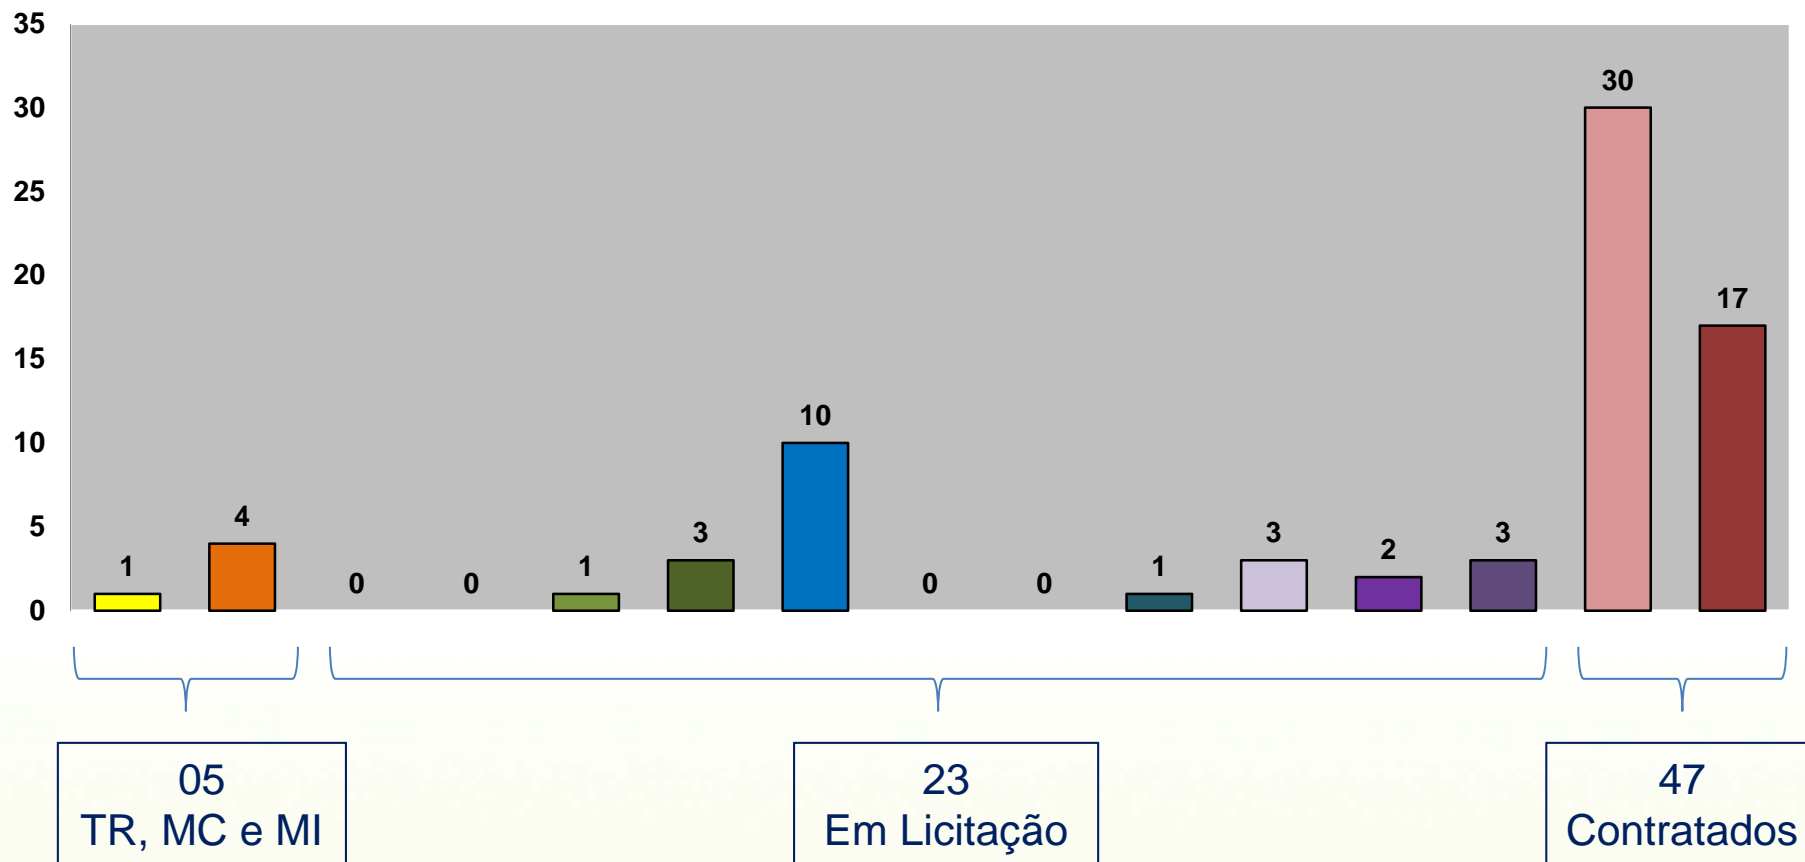

Subprojetos de Assistência Técnica por Etapa

Etapas			Setoriais com Subprojetos	Valor US\$
1	TDR e MC sendo elaborados para NO BM	1	SEPLAG(58);	337.500,00
2	TDR e MC aprovado pelo BM e elaborando MI	4	CGE(11); SEDUC(31,34,36);	1.159.758,45
3	Manifestação de Interesse Publicada	0	-	-
4	Elaborando o Relatório Final da Lista Curta	0	-	-
5	Elaborando a Solicitação de Proposta	1	SEMA(52);	723.273,62
6	Solicitação de Proposta Lançada	3	SECITECE(26); SEDUC(30,35);	477.465,88
7	Elaborando o Relatório Técnico ou Curricular	10	CGE(08,10); IPECE(21,22); SECITECE(27); SEDUC(29,37); SEPLAG(55,61,62);	3.608.710,49
8	Elaborando o Relatório Financeiro e o Combinado	0	-	-
9	Não Objeção do BM à Avaliação Combinado / Avaliação Curricular	0	-	-
10	Divulgação da Avaliação Combinada / Ofício para Negociação	1	SEMA(50);	242.143,78
11	Negociação do Contrato	3	CGE(06); SEMACE(53); SRH (65);	2.092.830,88
12	Divulgação PGE Resultado Final	2	CGE (05,07);	951.147,90
13	Assinando o Contrato / Publicação	3	CGE (09); SEPLAG(63); SRH(64);	798.209,25
14	Projetos com Contratos em Execução	30	ARCE(01); CGE(04); FUNCEME(13); IPECE(14,15,17,18,19,20); PGE(23); SDE(24); SECITECE(28); SEDUC(42,43,44,45); SEMA(46,47,48,49,51); SEMACE(54); SEPLAG(57,59,60); SRH(66); COGERH(67,68); STDS(72); TCE(73);	12.141.009,73
15	Projetos com Contratos Finalizados	17	CGE(02,03,12); IPECE(16); SDE(25); SEDUC(32,33,38,39,40,41); SEPLAG(56); COGERH(69); STDS(70,71); TCE(74,75).	1.043.063,76
Total		75		23.597.807,20

Execução dos Subprojetos de AT por Etapa

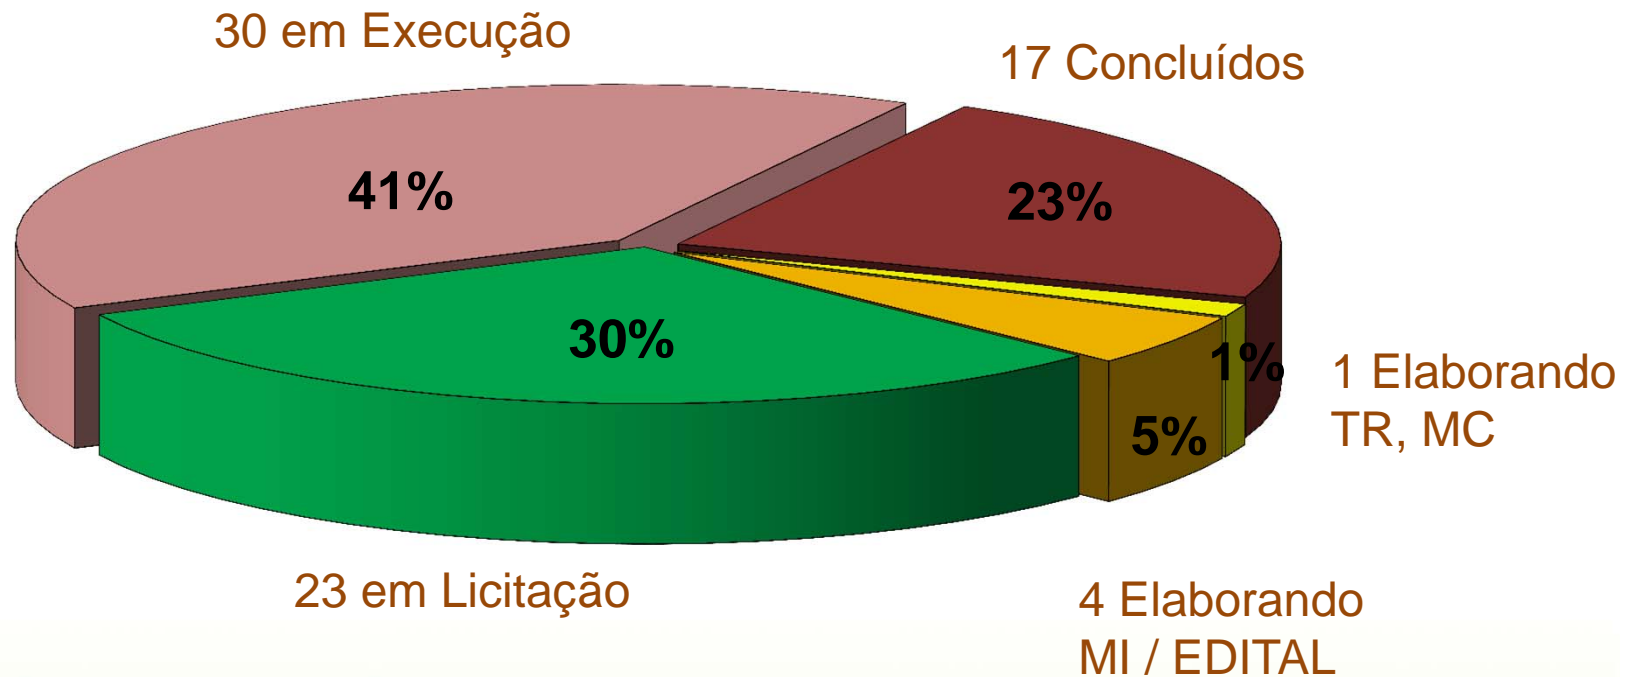



3.6 Tempo disponível até encerramento do PforR

Tempo disponível até encerramento do PforR = 31/01/2018

2016 e 2017	1	2	3	4	5	6	6 meses
	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	
1º e 2º Semestre 2017	7	8	9	10	11	12	6 meses
	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	
2º Semestre 2017 e Jan 2018	13	14	15				3 meses
	Nov	Dez	Jan				
2018							

TOTAL


**15
Meses**

	Baixo - de 0 a 10 meses
	Médio - de 11 a 13 meses
	Alto - de 14 e 15 meses
	Altíssimo - acima de 15 meses - Inviabiliza o Projeto



3.7. Projetos de Assistência Técnica em Situação de Risco

Subprojetos de AT em Risco

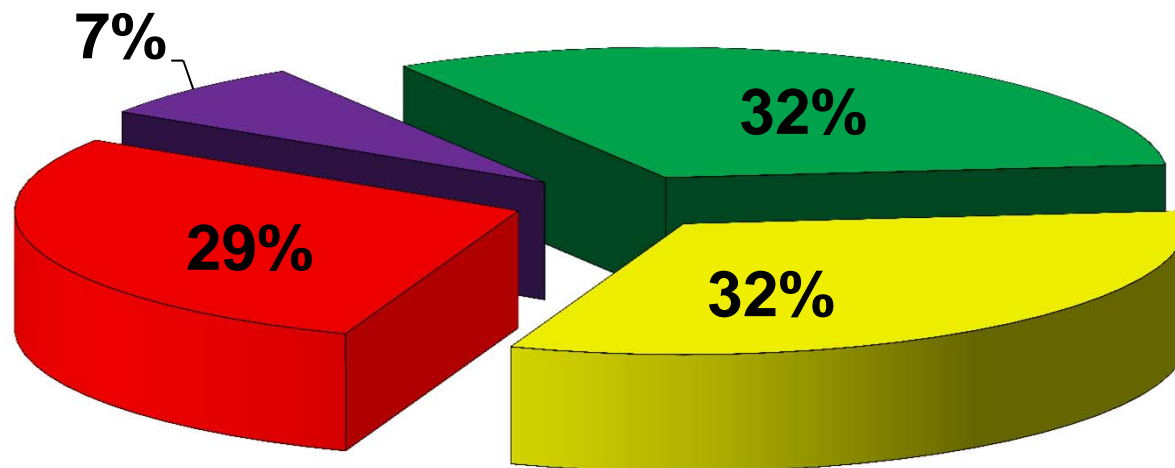





Qtd.	%	Setoriais
09	32%	CGE(3), SECITECE(1), SEDUC(3), SEPLAG(2)
09	32%	CGE(2), IPECE(1), SECITECE(1), SEDUC(1), SEMA(1), SEPLAG(1), SRH(2)
08	29%	CGE(1), IPECE(1), SEDUC(2), SEMACE(1), SEMA(1), SEPLAG(2)
02	7%	CGE(1); SEDUC(1)
28	100%	

	Baixo - de 0 a 10 meses
	Médio - de 11 a 13 meses
	Alto - de 14 e 15 meses
	Altíssimo - acima de 15 meses - Inviabiliza o Projeto

Subprojetos de AT em Risco Altíssimo

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	CGE	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	16
2	SEDUC	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (02 analistas)	16

	Baixo - de 0 a 10 meses
	Médio - de 11 a 13 meses
	Alto - de 14 e 15 meses
	Altíssimo - acima de 15 meses - Inviabiliza o Projeto

Subprojetos de AT em Risco Alto

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	CGE	Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).	15
2	IPECE	Metodologias para análise de impacto econômico.	15
3	SEDUC	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	15
4	SEMA	Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	15
5	SEMACE	Contratação de consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.	15
6	SEPLAG	Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS).	15
7	SEDUC	Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.	14
8	SEPLAG	Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.	14

	Baixo - de 0 a 10 meses
	Médio - de 11 a 13 meses
	Alto - de 14 e 15 meses
	Altíssimo - acima de 15 meses - Inviabiliza o Projeto



3.8 Monitoramento Contratos

Previsão de Início dos 28 Contratos sendo Licitados

Setoriais	Novembro	Dezembro	Janeiro	Total
CGE	3	1	3	7
IPECE	-	1	1	2
SEPLAG	1	2	2	5
SECITECE	-	1	1	2
SEMA	-	1	1	2
SEDUC	-	2	5	7
SEMACE	1	-	-	1
SRH	2	-	-	2
Total	7	8	13	28

Situação dos Contratos


Setorial	Nº de Contratos	Nº de Contratos em Andamento	Nº de Contratos Concluídos	Valor Contratado (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo a Pagar (R\$)	% PAGO
ARCE	1	1	-	838.997	-	838.997	0%
CGE	4	1	3	899.338	207.502	691.836	23%
COGERH	3	2	1	4.363.485	653.477	3.710.008	15%
FUNCEME	1	1	-	1.492.246	1.062.866	429.380	71%
IPECE	7	6	1	1.063.459	870.605	192.854	82%
PGE	1	1	-	1.434.107	-	1.434.107	0%
SDE	2	1	1	1.148.960	6.544	1.142.416	1%
SECITECE	1	1	-	164.620	-	164.620	0%
SEDUC	10	4	6	5.727.318	149.591	5.577.727	3%
SEMA	5	5	-	5.010.425	271.205	4.739.221	5%
SEMACE	1	1	-	672.609	-	672.609	0%
SEPLAG	4	3	1	6.634.070	2.415.092	4.218.978	36%
SRH	1	1	-	288.000	79.488	208.512	28%
STDS	3	1	2	2.282.850	462.561	1.820.289	20%
TCE	3	1	2	3.034.992	367.694	2.667.298	12%
TOTAL	47	30	17	35.055.477	6.546.625	28.508.853	19%

Situação dos Contratos

Valores Contratados (R\$)	Previsão a Contratar (Out a Dez) 2016 (R\$)	Previsão a Contratar em 2017 (R\$)	Total Contratos (R\$)
35.055.477	22.419.309	11.918.436	69.393.223
50,52%	32,31%	17,18%	100%

Valores Pagos (R\$)	Previsão a Pagar (Out a Dez) 2016 (R\$)	Previsão a Pagar em 2017 (R\$)	Total (R\$)
6.546.625	9.627.243	53.219.356	69.393.223
9,43%	13,87%	76,69%	100%

Situação dos Contratos

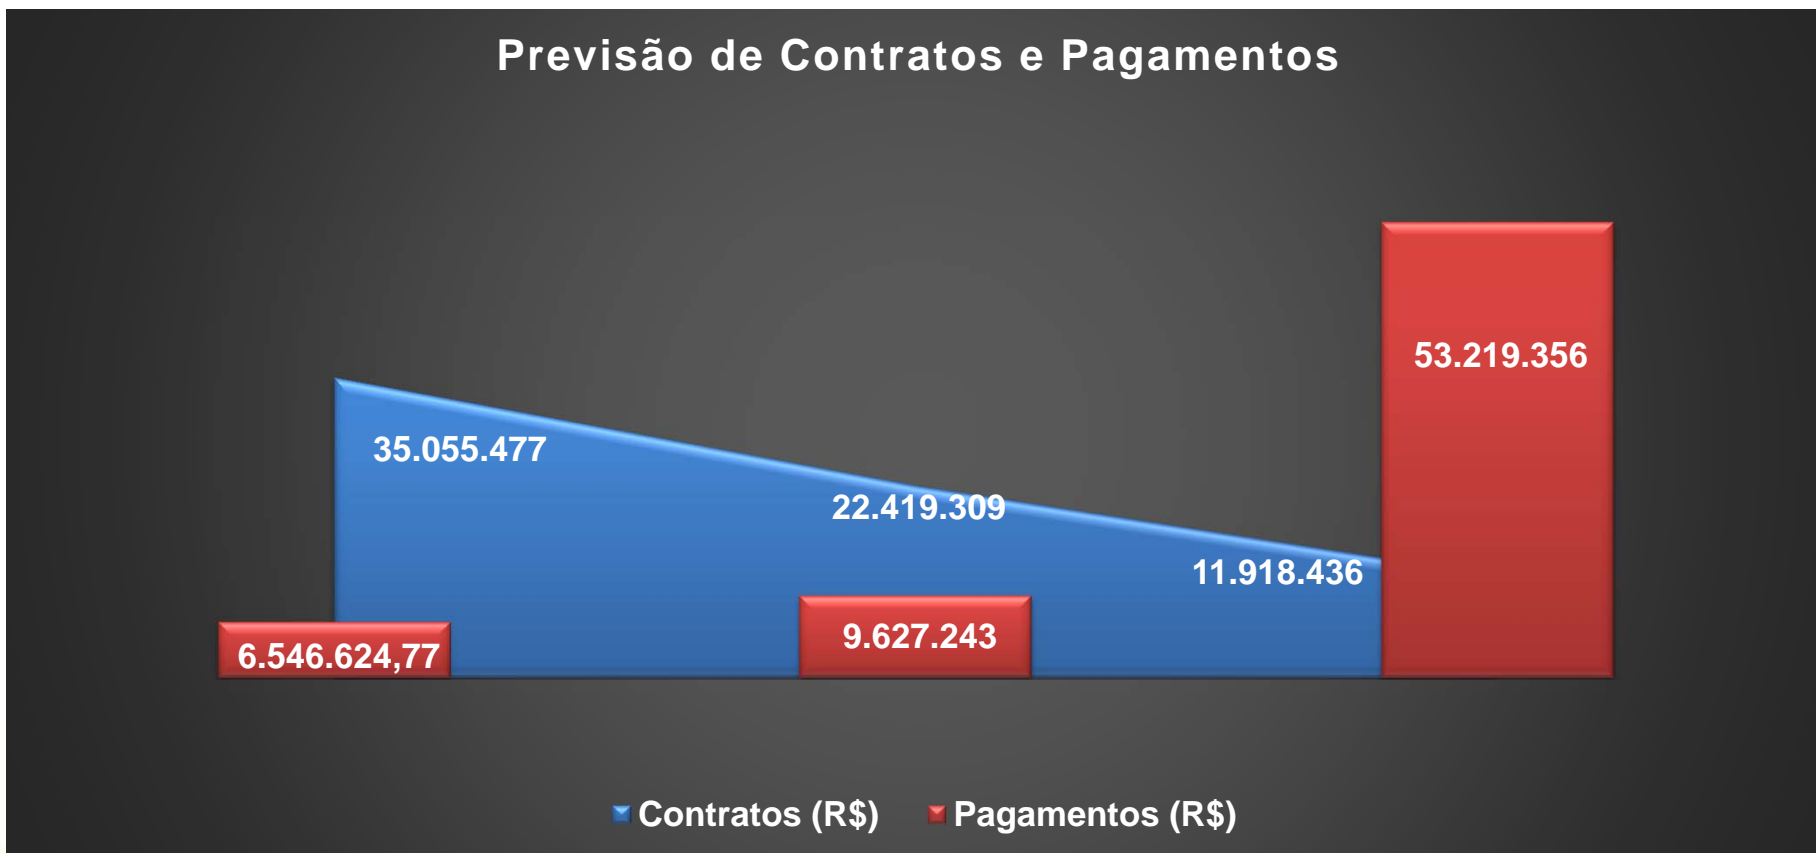



3.9 Pontos Principais de Aquisições

Pontos Principais de Aquisições

✓ Contratações

1. Currículos dos Especialistas devem estar assinados no contrato; e
2. Portaria da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Execução do contrato.



3.10 Projetos de Assistência Técnica por Setorial



CGE

Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	Carlos Jorge Freitas	Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).	658.560,58	14	1	15	Alto
2	Ítalo Brígido Coelho e Tiago Peixoto	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	1.207.049,74	14,5	1,5	16	Altíssimo
3	Ítalo Brígido Coelho e Tiago Peixoto	Capacitação da população para o Controle Social.	292.587,32	12	1	13	Médio
4	Denise Andrade Araújo	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	152.225,69	6	4	10	Baixo
5	Paulo Roberto	Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	127.862,23	6	1	7	Baixo
6	Ítalo Brígido Coelho e Tiago Peixoto	consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO).	93.436,26	5	4	9	Baixo
7	Ítalo Brígido Coelho e Tiago Peixoto	Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).	760.937,50	8	4	12	Médio
TOTAL			3.292.659,33				

	Baixo - de 0 a 10 meses
	Médio - de 11 a 13 meses
	Alto - de 14 e 15 meses
	Altíssimo - acima de 15 meses - Inviabiliza o Projeto

Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojetos 2 e 3: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR. ¹

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 67.354,63
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 - Fevereiro 2016
- **Estágio Atual:** Contratos Concluídos.

Nota 1: Auditoria será realizada pela equipe da CGE a partir do semestre 16.1



Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Subprojeto 4: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Marcelo Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 224.190,70
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2016 – Abril 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 08/2016 - Publicado em 28/06/2016.
- **Consultora Vencedora:** Empresa NT Consult Tecnologia e Consultoria LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 725.256,92
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 5: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).

- **Responsável:** Carlos Jorge Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 658.560,58
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Março 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Publicado o Aviso do Resulta Final em 19/10/2016.
Processo encontra-se na auditoria preventiva.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 6: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.207.049,74
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – CGE remeteu a Minuta do Contrato a empresa em 25/10/2016 para assinatura e rubrica por parte do representante. Empresa encaminhou via correios no dia 26/10/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 7: Capacitação da população para o Controle Social.

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 292.587,32
- **Método de Aquisição:** LPN
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Assinatura Contrato.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Publicação do Aviso de Resultado Final no dia 25/10/2016, abrindo o prazo recursal até o dia 01/11/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Gestão Pública

Subprojeto 8: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na “Detecção de Casos de Fraude e Corrupção” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.

- **Responsável:** Denise Andrade Araújo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 152.225,69
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial está elaborando o Relatório de Avaliação Técnica após o recebimento das Propostas Técnicas e reunião de orientação. Previsão de envio para análise da UGP ___/___?
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 9: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamentos com foco no “Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos do processo de convergência das Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público (IPSAS).

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 127.862,23
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial está providenciando a Homologação/Adjudicação e posterior assinatura e publicação do contrato, após contato em 25/10/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 10: Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema (MODELO).

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 93.436,26
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2016 – Fevereiro 2017
- **Estágio Previsto:** Avaliação Técnica da Propostas.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial está avaliando a Proposta Técnica após a realização da reunião de orientação com a UGP em 20/10/2016. Previsão ___/___?
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 11: Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 760.937,50
- **Método de Aquisição:** LPN
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2016 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Elaborando Contrato.
- **Estágio Atual:** Em Atividades Preparatórias – Edital de Licitação Pública Nacional encontra-se em análise na UGP, previsão de envio até o dia 27/10/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 12: Contratação de consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.





- **Responsável:** Aglaio Soares
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 24.411,82
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Março de 2016
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.



IPECE


Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	Mario Aragão	Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.	820.787,10	8	3	11	Amarelo
2	Nicolino Trompieri e Witalo Paiva	Metodologias para análise de impacto econômico.	432.682,09	12	3	15	Vermelho
TOTAL			1.253.469,19				

	Baixo - de 0 a 10 meses
	Médio - de 11 a 13 meses
	Alto - de 14 e 15 meses
	Altíssimo - acima de 15 meses - Inviabiliza o Projeto

Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojetos 14 e 15: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.
CONSULTORES PLENOS

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 322.192,82
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contratos em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 16: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.
CONSULTOR JÚNIOR

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 21.227,67
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.


Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojetos 17,18 e 19: Contratação de 03 (três) **Analistas em Licitações** para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 223.560,31
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contratos em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojeto 20: Contratação de Consultor Individual especializado em **Políticas Públicas** para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução a Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.*

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 109.139,93
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévio
- **Início/Término:** Julho 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 10/2015 publicado em 18/09/2015. Serviços em execução.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 21: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para Desenvolvidos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.

- **Responsável:** Mário Aragão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 826.947,14
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial finalizando o Relatório de Avaliação Técnica com previsão de envio para análise da UGP em 27/10/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 22: Contratação de Consultoria de Empresa para Desenvolvimento de Metodologia para análise de impacto econômico no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 432.682,09
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Setembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial está avaliando a Proposta Técnica após a realização da reunião de orientação com a UGP em 18/10/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████



PGE

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Subprojeto 23: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Valéria Rodrigues
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 443.309,81
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2015 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 23/2016 assinado em 14/09.
- **Consultora Vencedora:** NTConsult Tecnologia e Consultoria Ltda.
- **Valor do Contrato:** 1.434.107,25
- **Sinalização em relação ao Prazo:**



SECITECE

Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	Sandra Monteiro e Ana Iris	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	149.556,68	6	4	10	
2	Sandra Monteiro e Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	208.751,32	7	4	11	
TOTAL			358.308,00				

	Baixo - de 0 a 10 meses
	Médio - de 11 a 13 meses
	Alto - de 14 e 15 meses
	Altíssimo - acima de 15 meses - Inviabiliza o Projeto

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 26: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.

- **Responsável:** Sandra Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 149.556,68
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial está avaliando a Proposta Técnica após o recebimento das propostas em 25/10/2016. Aguardando a data para a realização da reunião de orientação com a UGP ___/___?
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 27: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Sandra Monteiro / Tarcísio Hilter
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 208.751,32
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Novembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – UGP remeteu em 26/10/2016 o Relatório de Avaliação Técnica revisado e com ajustes e correções nas planilhas (necessário melhorar os comentários do ponto forte e fraco) antes de ser impresso.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 28: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

- **Responsável:** Sandra Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 87.362,46
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Fevereiro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 16/2016, assinado em 06/07/2016.
- **Consultora:** Maria Fatima Ludovico da Gama e Souza.
- **Valor do Contrato:** R\$ 138.720,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SEPLAG



Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	Naiana Correia	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	85.603,96	10	3	13	
2	Avilton Júnior	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial (2a. Etapa)	337.500,00	-	-	-	
3	Katia Burgos	Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.	776.780,21	10	4	14	
4	Valdir Silva	Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS).	566.481,02	12	3	15	
5	Valdir Silva	Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	238.726,47	6	2	8	
TOTAL			2.005.091,65				

	Baixo - de 0 a 10 meses
	Médio - de 11 a 13 meses
	Alto - de 14 e 15 meses
	Altíssimo - acima de 15 meses - Inviabiliza o Projeto


Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 55: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 85.603,96
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – O Relatório de Avaliação Curricular está em análise na UGP, previsão de envio até o dia 03/11/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Assistência Técnica - Gestão Pública

Subprojeto 56: Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Aduino Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 481.856,65
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído. Aguardando o pagamento.
- **Consultora vencedora:** Consórcio Macroplan e Transplan.
- **Valor do contrato:** 913.714,44.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 57: Consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.128.001,21
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 023/2015. Serviço em Execução.
- **Consultora vencedora:** Macroplan Prospectiva, Estratégia e Gestão S/S Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ 2.143.275,24
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 58: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial (2a. Etapa)

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 337.500,00
- **Método de Aquisição:**
- **Revisão Prévia/Posterior:**
- **Início/Término:** Junho 2016 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaborando o Termo de Referência com previsão de envio para análise da UGP em 28/10/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 59: Consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Dominique Gomes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 317.051,64
- **Método de Aquisição:** SBQ
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Outubro 2016 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Contrato e ordem de serviço assinados em 04/10/2016. Realizado 1ª reunião de partida do projeto. Aguardando a publicação no DOE.
- **Consultora vencedora:** Consórcio IADH x DELOS.
- **Valor do contrato:** R\$ 1.025.662,05.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Gestão Pública

*Subprojeto 60: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para **Auditar a Folha de Pagamento** do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Fábio Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 529.102,21
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2016 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato assinado e emitido a Ordem de Serviço em 16/09/2016.
- **Consultora vencedora:** Deloitte Touche Tohatsu Consultores LTDA .
- **Valor do contrato:** R\$ 1.800.000,00
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 61: Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Silvana Dourado
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 776.780,21
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Abril 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial está finalizando o Relatório de Avaliação Técnica após revisão da UGP em 17/10/2016. Reunião de orientação para agendada o dia 28/10/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Assistência Técnica – Fiduciário

Subprojeto 62: Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado – GCOMPRAS.

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 566.481,02
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Abril 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – UGP remeteu o Relatório de Avaliação Técnica analisado e com comentários para ajustes da setorial em 10/10/2016 e realizado reunião de orientação no dia 13/10. Previsão de envio a UGP em 28/10/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Fiduciário

Subprojeto 63: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 238.726,47
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial está providenciando a Homologação/Adjudicação e posterior assinatura e publicação do contrato, após contato em 25/10/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



STDS

Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 70: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 64.213,69
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Novembro 2016
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído - Consultora Maria Cílvia Queiroz.
- **Valor do Contrato:** R\$ 121.000,00.


Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 71: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 63.174,42
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Setembro 2015
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Consultora Vencedora:** Empresa Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 142.850,00.

Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 72: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará


- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 892.888,73
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico (NCB)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução - Contrato nº 058/2016, assinado em 25/05/2016.
- **Consultora Vencedora:** Maestria Comunicação e Eventos LTDA- EPP.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.019.000,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



ARCE

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 1: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.

- **Responsável:** Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Subprojeto:** US\$ 371.040,45
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2016 – Janeiro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 019/2016, assinado em 14/06/2016.
- **Consultora Vencedora:** RPG – Regulation, Performance and Governace LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 838.996,66.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



COGERH

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 67: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Quali-quantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 663.482,08
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em execução – Contrato 48/2015, assinado em 24/11/2015.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Água e Solo / Quanta / Engeplus.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.908.665,65.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 68: Termo de Referência para Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 742.914,10
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2016 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Contrato em execução – Contrato 21/2016, assinado em 19/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Nippon Koei Latin America - Caribbean Co. Ltd. / Nippon Koei LAC do Brasil Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.403.327,11.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 69: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor Subprojeto:** US\$ 27.326,28
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2015 – Outubro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato concluído.



FUNCEME

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 13: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.

- **Responsável:** Francisco Hoilton
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Proposta Vencedora:** €267.442,11 + R\$ 687.325,77 equivalente a R\$ 1.492.246,27
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Setembro 2016 – Março 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 10/2015, assinado em 09/09/2015.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Aqualogus / Azurit.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.492.246,27.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SDE / ADECE

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 24: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.

- **Responsável:** Fernando Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 353.142,52
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2016 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato assinado em 26/08/2016.
- **Consultora Vencedora:** Ivia Serviços de Informática Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.142.416,04
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 25: Impact Evaluation Workshop Instambul

- **Responsável:** Inês Studart
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 2.894,02
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Maio 2015.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.



SEDUC

Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO E CONTRATAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SEDUC							
Nº	Órgão	Responsável	Subprojetos	Tempo de execução do contrato em meses	Tempo estimado para assinatura do contrato em meses	Tempo contratação + execução em meses	Risco
1	SEDUC	Jussara Batista	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	12	3	15	
2	SEDUC	Jussara Batista	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores , professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado. Incluindo a Avaliação de Desempenho Institucional	6	4	10	
3	SEDUC	Luciano Nery	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (02 analistas)	12	4	16	
4	SEDUC	Lucas Fernandes e Celana Skeff	Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey).	3	2	5	

Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO E CONTRATAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SEDUC							
Nº	Órgão	Responsável	Subprojetos	Tempo de execução do contrato em meses	Tempo estimado para assinatura do contrato em meses	Tempo contratação + execução em meses	Risco
5	SEDUC	Lucas Fernandes e Celana Skeff	Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.	10	4	14	Alto
6	SEDUC	Lucas Fernandes e Celana Skeff	Contratação de empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.	10	3	13	Médio
7	SEDUC	Lucas Fernandes e Celana Skeff	Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados	1	3	4	Baixo

	Baixo - de 0 a 10 meses
	Médio - de 11 a 13 meses
	Alto - de 14 e 15 meses
	Altíssimo - acima de 15 meses - Inviabiliza o Projeto

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 29: Contratação de serviços de consultoria para avaliação de desempenho acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará. (Teste de Proficiência)

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 374.353,64
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Em licitação – Cel04/PGE divulgou o Resultado da Avaliação da Proposta Técnica a empresa em 26/10/2016 e a Abertura Pública das Propostas Financeiras, marcada o dia 31 de outubro de 2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 30: Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da **formação continuada para gestores**, professores e instrutores de educação profissional secundárias do Estado (com a inclusão da Avaliação de Desempenho Institucional).*

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 83.599,52
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Novembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em licitação – Processo de SDP lançada em 11/10/2016. Reunião prévia realizada no dia 27/10/2016. Recebimento das Proposta Técnica e Financeira até as 16:00hrs do dia 08/11/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 31: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (02 analistas).

- **Responsável:** Luciano Nery
- **Categoria de Licitação:** CI
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 54.151,20
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Atividades Preparatórias – Setorial remeteu o processo de Manifestação de Interesse nº 5998563/2016 à PGE/Cel04 para análise e publicação, após contato em 25/10/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 33: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 4.466,03
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Julho 2015
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.

Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 34: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 25.728,75
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Atividades Preparatórias: Setorial está aguardando a nova indicação pelo Leandro e Rita do Banco Mundial, previsão até o final de outubro.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 35: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de **formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.***

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 244.309,68
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Dezembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Processo de SDP lançada em 06/10/2016. Reunião prévia realizada no dia 14/10/2016. Recebimento das Propostas Técnicas e Financeiras até as 15:00hrs do dia 07/11/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 36: Contratação de empresa especializada para operacionalizar e executar os **serviços de logística** das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 318.941,00
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2016 – Fevereiro 2017
- **Estágio Previsto:** Preparação do Edital
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Processo para lançamento do Edital de PE encontra-se na Comissão de Licitação da SEDUC para ajustes solicitados pela PGE (mapa comparativo de preços), após contato em 26/10/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 37: Contratação de Empresa Especializada para serviço de **Impressão Gráfica dos materiais** de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 91.449,17
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2016 - Novembro 2016
- **Estágio Previsto:** Preparação do Edital
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial está elaborando o Relatório de Julgamento após o recebimento das Propostas em 10/10/2016. Aguardando a decisão acerca da revogação do processo.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 38: Contratação de Consultor Individual Especialista em **Avaliação de Programas para Identificar o Impacto** do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)*

- **Responsável: SEDUC** - Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor Subprojeto:** US\$ 4.139,40
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2014 – Maio 2016
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.

Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 39: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 25.207,85
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Agosto 2015
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.

Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 40: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 29.188,04
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Agosto 2015
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído

Assistência Técnica –Assistência à Família

*Subprojeto 41: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de **Arte Gráfica/Design**, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 61.838,85
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Setembro 2016
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Consultora Vencedora:** Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 139.830,00.

Assistência Técnica –Assistência à Família

Subprojeto 42: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 202.891,81
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2016 – Setembro 2017
- **Estágio Atual:** Contratado em Execução – Contrato nº 236/2016, assinado em 30/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** CASAM – Centro de Apoio Social e de Animação Missionária.
- **Valor do Contrato:** R\$ 656.355,00
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 43: Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 309.109,89
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2016 – Setembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 214/2016, assinado em 12/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** VC Promoções e Eventos Ltda – EPP.
- **Valor do Contrato:** R\$ 999.970,50.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 44: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados).

- **Responsável: SEDUC** – Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 1.155.818,22
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Outubro 2017
- **Estágio Atual:** Contratado em Execução – Contrato nº 214/2016, assinado 28/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** OVERVIEW SERVICOS & INFORMACAO LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 3.739.071,95
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 45: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN

- **Responsável: SEDUC** – Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 41.489,95
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contratos Assinados – Aguardando publicação e Ordem de Serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████



SEMA

Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	Maria Dias e Monica Freitas	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.	242.143,78	9,5	2,5	12	Amarelo
2	Maria Dias e Fabiola Martins	Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	723.273,62	15	5	15	Vermelho
TOTAL			965.471,40				

	Baixo - de 0 a 10 meses
	Médio - de 11 a 13 meses
	Alto - de 14 e 15 meses
	Altíssimo - acima de 15 meses - Inviabiliza o Projeto

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 46: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto “AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.” (AIEDA)

- **Responsável:** Maria Dias / Magda Marinho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 391.476,75
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2016 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 18/2016, assinado em 16/08/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Aquino – Mcrit SL – Barcelona Brasil Group.
- **Valor do Contrato:** R\$ 885.207,23.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 47: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 314.274,86
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2016 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 06/2016, assinado em 25/02/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Engesoft Engenharia / Quanta Consultoria Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 710.638,32.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 48: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicos.

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor Subprojeto:** US\$ 107.269,38
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 26/2016, assinado em 26/11/2015.
- **Consultora Vencedora:** Empresa MSV Multiserviços ME.
- **Valor do Contrato:** R\$ 242.557,52.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 49: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Maria Dias / Francisco Leorne
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** 174.236,97
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2014 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 16/2016, assinado em 05/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** Arcadis Logos S.A.
- **Valor do Contrato:** R\$ 563.157,73.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 50: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Maria Dias / Monica Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 242.143,78
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – PGE/Cel04 remeteu a setorial em 26/10/2016, o ofício de autorização/convocação com empresa melhor qualificada para reunião de negociação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 51: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 1.153.752,25
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2016 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 20/2016, assinado em 01/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** Bureau de Projetos e Consultoria Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.608.864,60.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 52: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias e Fabiola Martins
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 723.273,62
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Negociações com a empresa vencedora foram canceladas por recomendação do BM, uma vez que os custos do contrato estariam acima dos custos estimados, em aproximadamente 115%. Documentação pertinente relançamento da SDP, readequação do TDR e a atualização dos custos, está sendo concluída pela SEMA, em conjunto com a UGP.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SEMACE

Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	Elizabeth Romão e Tiago Bessa	Contratação de consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.	385.212,76	14	1	15	
TOTAL			385.212,76				

	Baixo - de 0 a 10 meses
	Médio - de 11 a 13 meses
	Alto - de 14 e 15 meses
	Altíssimo - acima de 15 meses - Inviabiliza o Projeto

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 53: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE

- **Responsável:** Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 385.212,76
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Reunião de negociação realizada em 27/09/2016. Foram solicitadas substituições de alguns profissionais da equipe técnica, tendo em vista que os mesmos não cumpriam com requisitos do TDR. Agendado um reunião entre a UGP e a SEMA em 31/10/2016 às 15:30.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 54: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a **Manualização dos Procedimentos Técnicos** dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.*

- **Responsável:** Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 207.916,23
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2016 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 20/2016, assinado em 13/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** MBS CONSULTING – MBS Estratégias e Sistemas LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 672.609,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SRH



Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	Deborah Mithya e Sergio Câmara	Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga e Cobrança.	431.620,55	12	1	13	
2	Deborah Mithya e Sergio Câmara	Sistema de Informação de Gestão dos Recursos Hídricos (cadastro, fiscalização, outorga, monitoramento qualitativo, segurança de barragens e medição) com Integração com o Sistema Administrativo Financeiro PROTHEUS.	500.568,39	12	1	13	
TOTAL			932.188,93				

	Baixo - de 0 a 10 meses
	Médio - de 11 a 13 meses
	Alto - de 14 e 15 meses
	Altíssimo - acima de 15 meses - Inviabiliza o Projeto

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 64: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.

- **Responsável:** Deborah Mithya e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 446.328,65
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial está providenciando a Homologação/Adjudicação e posterior assinatura e publicação do contrato, após contato em 25/10/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 65: Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. **SIGERH***

- **Responsável:** Deborah Mithya e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 418.975,09
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Janeiro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial remeteu a Minuta do Contrato e as Atas de negociação a empresa para assinatura e rubrica por parte do representante, após contato em 26/10/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 66: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - **Malha D'agua.***


- **Responsável:** Deborah Mithya e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do TOR:** US\$ 152.839,20
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2016 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 01/2016, assinado em 18/05/2016.
- **Consultora:** Dorian Ponte Lima – R\$ 288.000,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



TCE

Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 73: Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.

- **Responsável:** Glinton Ferreira / Delinda Almeida
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 843.588,82
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/ Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato Nº 21/2016 em Execução.
- **Consultora Vencedora:** Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
- **Valor do Contrato:** 2.699.484,21.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 74: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 84.010,26
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato concluído.

Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 75: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 100.915,62
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato concluído.



4.PforR II



5. APROVAÇÃO DA ATA

32ª REUNIÃO COMITÊ *PforR* (29/09/2016)

Próxima Reunião do Comitê PforR

Próxima Reunião do Comitê PforR:

24/11/2016
14h30m - IPECE



6. ENCAMINHAMENTOS

Encaminhamentos da 32ª Reunião realizada em 29/09/2016

✓ Todos os encaminhamentos realizados.



7. ENCERRAMENTO

Unidade de Gerenciamento do Projeto PforR (UGP)
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora
Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N
Ed. SEPLAG, 2º andar- Fortaleza-CE
Tel.: (85) 3101.3499 e (85) 3101.3510
