



**30ª REUNIÃO DO COMITÊ *PforR***  
**ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO**  
**PROJETO *PforR***  
**28 DE JULHO DE 2016**



## PAUTA DA REUNIÃO

# Pauta da Reunião

1. Abertura e apresentação dos participantes (14h30-14h35)
2. Algumas Informações (14:35 – 14h45m):
  - 2.1 Posição da Reestruturação do PforR
  - 2.2 Auditoria os Indicadores - CGE
3. Indicadores, Plano de Ação, Programas e Assistência Técnica (14h45 - 16h)
  - 3.1. Indicadores Primários 2016.2 e Desembolsos - Laura Gonçalves
  - 3.2. Indicadores Secundários 2016.2 - Laura Gonçalves
  - 3.3. Plano de Ação de Mitigação de Riscos – Laura Gonçalves
  - 3.4. Programas PforR - Thâmara Teixeira
  - 3.5. Assistência Técnica: Estatísticas – Lívia Castro e Rodrigo Almeida
  - 3.6. Tempo disponível do PforR
  - 3.7. Projetos de Assistência Técnica em situação de risco
  - 3.8. Situação Atual Aquisições dos Projetos de Assistência Técnica – Viviane Ramos / Giuseppe Nogueira
4. Apresentação do Filme Institucional sobre o PforR
5. Aprovação da Ata da 29ª Reunião (30/06/2016) (16h - 16h10m)
6. Encaminhamentos (16h10m - 16h20m)
7. Encerramento (16h20m)



# 1. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES



## 2. ALGUMAS INFORMAÇÕES



## 2.1 Posição da Reestruturação do PforR

## 2.1 Posição da Reestruturação do PforR

✓Cronograma:

Atividades	Datas Previstas
1. A Justificativa Técnica será analisada pelo Grupo Técnico da COFIEIX	13/07/2016
2. Encaminhamento do documento à Secretaria do Tesouro Nacional - STN	27/07/2016
3. Conclusão do Parecer da PGFN	17/08/2016
4. Retorno ao Banco Mundial e ao Estado do Ceará aprovando a elaboração do Aditivo	26/08/2016
5. Previsão para assinatura do Aditivo de reestruturação do PforR	06/09/2016



## 2.2 Auditoria dos Indicadores - CGE





### 3. INDICADORES, PLANO DE AÇÃO, PROGRAMAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA



## 3.1. Indicadores Primários 2016.1 e Desembolsos

# INDICADORES PRIMÁRIOS 1º SEMESTRE 2016: Realizado

nº	Nome do Indicador	Setorial	Período	Meta	Realizado	Valor US\$	STATUS	
1	1	DLI 1: Aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação	SDE	2016.1	Uma Ação do Plano de Ação Implementado	A Ação 06 do Plano de Ação foi implementada	3.444.000,00	VERDE
2	2	DLI 2: estabelecimento do sistema de monitoramento para programas TVET	SEDUC	2016.1	Primeiro relatório de monitoramento publicado.	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	3.444.000,00	VERDE
3	3	DLI 3: número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.	SEDUC	2016.1	13	13 acordos firmados	3.444.000,00	VERDE
4	4	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	SEPLAG	2016.1	55%	55%	3.444.000,00	VERDE
5	5	DLI 7: Estabelecimento de um comitê multisetorial de segurança hídrica	SRH	2016.1	Atas das últimas duas reuniões do Comitê realizadas no primeiro semestre do ano 2016.	Duas Atas de Reuniões realizadas	3.444.000,00	VERDE
6	6	DLI 9: Índice da qualidade da fiscalização ambiental	SEMA	2016.1	65%	65,74%	3.444.000,00	VERDE
7	7	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada.	SEPLAG	2016.1	5%	-	3.444.000,00	VERDE
<b>Total Metas 1º semestre 2016 com sinalização cumprimento da meta</b>						<b>24.108.000,00</b>		
8	1	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada. <sup>1</sup>	SEPLAG	2016.2	10%	20%	3.438.000,00	VERDE
<b>Indicador 2º semestre 2016 com sinalização de cumprimento da meta</b>						<b>3.438.000,00</b>		
9	2	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada	SEPLAG	2014.2	Aprovação da metodologia	Metodologia Aprovada	6.198.000,00	VERDE
<b>Indicador 2º semestre 2014 com sinalização de cumprimento da meta</b>						<b>6.198.000,00</b>		
<b>Valor previsto a ser desembolsado em setembro 2016</b>						<b>33.744.000,00</b>		

# INDICADORES PRIMÁRIOS 1º SEMESTRE 2016: Realizado

nº		Nome do Indicador	Setorial	Período	Meta	Realizado	Valor US\$	STATUS
1	1	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar	STDS	2016.1	42.5%	65,45%	3.444.000,00	VERDE
2	2	DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	CAGECE	2016.1	85.2%	86,48%	3.444.000,00	VERDE
<b>Total Metas 1º semestre 2016 já cumpridas e desembolsadas</b>							<b>6.888.000,00</b>	

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2016

n°	SETORIAL RESPONSÁVEL	Indicadores			Metas	
		N°	DLI	Nome	2016	
					1°Semestre	2°Semestre
1	SDE	1	DLI1	Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação	Uma ação do plano de ação implementado	-
2	SEDUC	2	DLI2	Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	-
		3	DLI3	Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso.	13	15
3	STDS	4	DLI4	Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS.	-	7%
		5	DLI5	Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	42.5%	55%
4	SEPLAG	6	DLI6	Percentual de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com Marco Lógico implementado.	55%	70%
5	SRH	7	DLI7	Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	Minutas de pelo menos duas reuniões
6	CAGECE	8	DLI8	Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	85.2%	85.5%
7	SEMA/SEMACE/COGERH	9	DLI9	Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	65%	70%
8	FUNCEME	10	DLI10	Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	-	Metodologia implementada em um reservatório estratégico
9	SEPLAG	11	DLI11	Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	3	4
		12	DLI12	Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	5%	10%
<b>Total de Indicadores em 2016: 12 Indicadores</b>						
<b>Total de Indicadores com metas para o 1º Semestre: 10 Indicadores</b>						

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.	SEDUC Rivanir Bezerra	2015.1	10	2.744.444,00	■
		2015.2	12	3.403.750,00	■
		2016.1	13	3.444.000,00	■
		2016.2	15	3.438.000,00	
		2017.1	16	3.444.000,00	
		2017.2	18	3.120.000,00	
		<b>Total do Indicador</b>			


Legenda: ■ Metas alcançadas

## INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2016


Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.	SEDUC Rivanir Bezerra	<b>15 acordos</b>	13 acordos firmados	A SEDUC concluiu no primeiro semestre com 13 acordos firmados, restando para o cumprimento da meta de 2016.2 mais <u>dois</u> contratos.

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas*	Valores em US\$	Farol
DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	2015.2	5%	3.403.750,00	
		2016.2	7%	3.438.000,00	
		2017.2	10%	3.120.000,00	
		<b>Total do Indicador</b>			9.961.750,00

\*As metas deste Indicador foram alteradas na reestruturação, anteriormente eram: 10%, 15% e 25%

Legenda:  Meta alcançada em 5,11%



# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	7% <sup>1</sup>	5,11%	<p>Um cronograma de visitas foi elaborado pela equipe da STDS, aos 36 municípios no âmbito do PforR para o cumprimento do indicador até o segundo semestre de 2016.</p> <p>Foi realizada uma articulação com os gestores e equipes municipais, para a execução do acompanhamento familiar.</p> <p>O sistema de monitoramento está em fase de elaboração pela Equipe de Tecnologia da Informação e do PforR da STDS para registro do acompanhamento.</p>


<sup>1</sup>Meta alterada por ocasião da reestruturação do PforR

## REESTRUTURAÇÃO: Alteração de Meta

Indicador Primário	Mudança	Período	Antes	Proposta
DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.	Alterações de Metas	2016.2	15%	7%
		2017.2	25%	10%

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol	
DLI 5: Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	2015.1	15%	2.744.444,00		
		2015.2	30%	3.403.750,00		
		2016.1	42.5%	3.444.000,00		
		2016.2	55%	3.438.000,00		
		2017.1	75%	3.444.000,00		
		2017.2	95%	3.120.000,00		
		<b>Total do Indicador</b>			19.594.194,00	


Legenda:  Metas alcançadas

## INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	55%	65,45%	<p><b>Esse indicador foi cumprido em 2015.2 com o resultado de 65,45%.</b></p> <p>Licitação: Encontra-se na fase de <u>assinatura e publicação</u> do Contrato com Empresa Maestria Comunicação e Eventos LTDA para a Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social / CRAS.</p> <p>A ordem de serviço foi assinatura para início das atividades e encaminhamento para publicação.</p> <p>Realizada, no período de 18 a 22 de julho de 2016, Capacitação Geral/ Módulo I, para os Técnicos de Nível Médio, dos 36 Municípios do PforR.</p>

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	SEPLAG José Freitas	2015.1	22.5%	2.744.444,00	
		2015.2	45%	3.403.750,00	
		2016.1	55%	3.444.000,00	
		2016.2	70%	3.438.000,00	
		2017.1	82.5%	3.444.000,00	
		2017.2	95%	3.120.000,00	
		<b>Total do Indicador</b>			

Legenda:  Metas alcançadas

## INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 6: Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	SEPLAG José Freitas	<b>70%</b>	55%	Meta alcançada para 2016.1 (55%), com Relatório entregue no dia 30 de Junho de 2016.

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicadores	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 7: Estabelecimento de um Comitê multissetorial de Segurança Hídrica.	SRH Carlos Campelo	2013.2	Comitê instituído pelo decreto	39.375.000,00	
		2015.1	Diagnóstico de Bacias completos	2.744.444,00	
		2016.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.444.000,00	
		2016.2	Minutas de pelo menos duas reuniões	3.438.000,00	
		2017.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.444.000,00	
		2017.2	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.120.000,00	
		<b>Total do Indicador</b>			<b>55.565.444,00</b>

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Metas	Realizado	Status
<p>DLI 7: Estabelecimento do Comitê multisetorial de Segurança da Água.</p>	<p>SRH Carlos Campelo</p>	<p><b>Atas de pelo menos duas reuniões realizadas</b></p>		<p>Estão previstas, para o segundo semestre de 2016, três reuniões do CONERH e logo que as duas atas estejam devidamente aprovadas, estas serão encaminhadas para comprovação de indicador.</p>



# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	CAGECE Carlos Rossas	2014.1	83.8%	5.250.000,00	
		2014.2	84.3%	6.198.000,00	
		2015.1	84.6%	2.744.444,00	
		2015.2	84.9%	3.403.750,00	
		2016.1	85.2%	3.444.000,00	
		2016.2	85.5%	3.438.000,00	
		2017.1	85.7%	3.444.000,00	
		2017.2	85.9%	3.120.000,00	
		<b>Total do Indicador</b>			

## INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Metas	Realizado	Status
DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	CAGECE Carlos Rossas	<b>85.5%</b>	86,55%	<p><b>Esse indicador foi cumprido em 2015.2 com o resultado de 86,05%.</b></p> <p>O resultado do mês de junho foi de <u>86,55%</u>.</p>





# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicadores	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 9: Índice da qualidade da fiscalização ambiental	2014.1	28%	5.250.000,00	■
	2014.2	40%	6.198.000,00	■
	2015.1	50%	2.744.444,00	■
	2015.2	60%	3.403.750,00	■
	2016.1	65%	3.444.000,00	■
	2016.2	70%	3.438.000,00	
	2017.1	75%	3.444.000,00	
	2017.2	80%	3.120.000,00	
	<b>Total do Indicador</b>			31.042.194,00

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	SEMA Maria Dias  SEMACE Tiago Bessa  COGERH Denilson Fidelis	<b>70%</b>	65,75%	65,75% (Medição referente a 30/06/2016).

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME Hoilton Rios	2015.1	Metodologia de monitoramento definida e adotada.	2.744.444,00	
		2015.2	Protocolo de coleta de dados definida e adotada.	3.403.750,00	
		2016.2	Metodologia implementada em um reservatório estratégico.	3.438.000,00	
		2017.2	Metodologia implementada em dois reservatórios estratégicos adicionais.	3.120.000,00	
		<b>Total Indicador</b>			12.706.194,00

## INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME Hoilton Rios	<b>Metodologia implementada em um reservatório estratégico.</b>	-	<p>Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em execução no âmbito do Contrato No. 010/2015.</p> <p>O Relatório 02 (Documentação da atividade de coleta de dados e dificuldades encontradas) foi aprovado.</p> <p>A 2ª versão do Relatório 03 (Estratégia proposta e análise dos resultados) foi enviada pela empresa no dia 18 de julho e está sob avaliação. Também foi apresentada, pela empresa, uma versão do Banco de Dados com algumas alterações feitas a partir de sugestões da Comissão de Acompanhamento do Projeto.</p>

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.*	SEPLAG Avilton Júnior	2014.2	Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará.**	6.198.000,00	
		2015.1	1	2.744.444,00	
		2015.2	2	3.403.750,00	
		2016.1	3	3.444.000,00	
		2016.2	4	3.438.000,00	
		2017.1	5	3.444.000,00	
		2017.2	6	3.120.000,00	
		<b>Total</b>			<b>25.792.194,00</b>

\* Nome do Indicador alterado por ocasião da reestruturação do PforR

\*\* Meta do Indicador alterada por ocasião da reestruturação do PforR

Legenda: ■ Probabilidade baixa de atingir a meta

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Metas	Realizado	Status
DLI11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	SEPLAG Avilton Júnior	<b>2014.2</b>	-	A meta de Aprovação do Modelo de Gestão para Resultados ainda não foi atingida, porém a perspectiva é que a mesma seja alcançada neste mês de agosto com a entrega do produto 4 do projeto de Assistência Técnica de Fortalecimento do Modelo de GPR.
		Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará.		
		<b>2015.1</b>		
		1 Secretaria		
		<b>2015.2</b>		
		2 Secretarias		
		<b>2016.1</b>		
		3 Secretarias		
		<b>2016.2</b>		
4 Secretarias				



# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada	SEPLAG Adauto Oliveira	2014.2	Aprovação da metodologia	6.198.000,00	
		2015.1	-	-	
		2015.2	-	-	
		2016.1	5%	3.444.000,00	
		2016.2	10%	3.438.000,00	
		2017.1	15%*	3.444.000,00	
		2017.2	20%*	3.120.000,00	
		Total			19.644.000,00

\*As metas deste Indicador foram modificadas na reestruturação do PforR, anteriormente as metas eram 25% e 40%

Legenda:  Metas alcançadas

# INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Metas	Realizado	Status
DLI12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	SEPLAG Adauto Oliveira	2016.1	20%	A SEPLAG enviou no dia 22/07/2016 a CI 037/2016 encaminhando o documento "Aplicação da metodologia de Gestão do Investimento Público" o qual a aplicação da metodologia evidencia ao Projeto Cinturão da Águas do Ceará o qual comprova o atendimento das metas para o ano de 2016.
		<b>5% dos Projetos</b>		
		2016.2		
		<b>10% dos Projetos</b>		



## REESTRUTURAÇÃO: Alteração de Meta

Indicador Primário	Mudança	Período	Antes	Proposta
DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada.	Alterações de Metas	2014.2	"Aprovação da Metodologia". (Publicação de Decreto)	"Aprovação da Metodologia". (Minuta do Decreto)
		2017.1	25%	15%
		2017.2	40%	20% (Decreto publicado)




## 3.2. Indicadores Secundários 2016.2

# INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2016

n°	Setorial Responsável	N°	Indicadores	Metas 2016	
				1°Semestre	2°Semestre
1	IPECE	1	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	-	30.300
2	SEPLAG	2	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	-	Outras duas resoluções publicadas
3	STDS	3	Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada	-	15%
4	COGERH	4	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	-	-
		5	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	-	Proposta e consultas completas aos Comitês das Bacias Hidrográficas.
		6	Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	-	65.9
5	SEMA	7	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	-	Implementação e monitoramento
<b>Total de Indicadores Secundários: 7 Indicadores</b>					

## INDICADORES SECUNDÁRIOS: Meta 2º Semestre 2016

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Meta 2ª semestre	Realizado	Status
PDO1:Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	IPECE Victor Hugo	<b>30.300</b>	26.141 técnicos	Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos. As informações da RAIS ainda não foram disponibilizadas para 2015. Este Indicador será discutido no Comitê de Estratégia.


Legenda  Probabilidade baixa de atingir a meta

## INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Meta 2ª semestre	Realizado	Status
Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	SEPLAG Lara Costa	<b>Outras duas resoluções publicadas</b>	-	Realizada oficina nos dias 01 e 04/07, em que foi repassada a metodologia e esclarecidas dúvidas gerais para elaboração dos indicadores de resultado da matriz de desenvolvimento infantil.  Elaborada proposta de conteúdo da Resolução nº 1 de 2016, a qual está no Gabinete da Primeira-dama para análise e posterior validação pela presidente do CPDI.

## INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Metas 2ª semestre	Realizado	Status
<p>PDO2: Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas</p>	<p>STDS Sebastião Lopes Mary Anne</p>	<p>7%</p>	<p>-</p>	<p>Banco Mundial emitiu a não objeção para a mudança do Indicador em 05/07/2016.</p> <p>Portanto, para o segundo semestre de 2016, a meta do indicador, que antes era 15%, passou a ser 7% e para o segundo semestre de 2017, que antes era 25%, passou a ser 10%.</p> <p>Ressalta-se que o nome do indicador também sofreu alteração.</p>

Legenda:  Probabilidade intermediária de atingir a meta



## INDICADORES SECUNDÁRIOS: Meta 2º Semestre 2016


Nome do Indicador	Setorial Responsável	Meta 2ª semestre	Realizado	Status
PDO3:Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	COGERH Denilson Fidelis, Disney Paulino	<b>65,9</b>	74,7	74,7 (referente ao mês de junho)  IQARce: Até o fechamento dos índice, o laboratório responsável pela análise de contagem e identificação de fitoplanctons não enviou os resultados, impossibilitando o cálculo do IQAR.

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

# INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Metas 2ª semestre*	Realizado	Status
Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	COGERH Zulene Almada	-	-	Contrato assinado e Ordem de Serviço assinados em 19/07/2016.

\*De acordo com o novo Protocolo este Indicador só terá meta em 2017.2

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

## INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Metas 2ª semestre	Realizado	Status
Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	COGERH Ana Araújo	<b>Encaminhamento do Projeto ao CONERH</b>	As Consultas foram realizadas nos 12 Comitês de Bacias Hidrográficas.	Estão realizando uma compilação das contribuições dos representantes (membros) dos 12 (doze) Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará da Lei de Conservação e Recuperação dos Recursos Hídricos de Interesse do Estado do Ceará.

\*Comitês Bacias Hidrográficas

# INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

Nome do Indicador	Responsável	Metas	Realizado	Status
Apresentação da Lei de gestão de resíduos sólidos revista.	SEMA Maria Dias	<b>Implementação e monitoramento</b>	-	Após a publicação da PERS*, iniciou-se a implantação das Metas contidas no Plano. Atualmente, está em execução a Estruturação dos Consórcios Municipais, e a elaboração dos Planos Regionais de Resíduos Sólidos.

\* PERS: Política Estadual de Resíduos Sólidos



### 3.3. Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental

## Pendências do Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental-PforR

	Descrição da Ação	Responsável	Prazo	Posição
1	<p><b>A.</b> Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar.</p>	STDS	1 Semestre de 2016	<p>A STDS e SEDUC encaminharam à UGP a NOTA TÉCNICA nº 06, ressaltando que a STDS continuará capacitando as equipes técnicas dos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS, enfocando a diversidade étnico-racial com o apoio da CEPPIR e que a SEDUC continuará desenvolvendo suas ações junto às escolas indígenas.</p>
2	<p><b>C.</b> Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terras dependentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).</p>	SEDUC	1 Semestre de 2016	<p>O Relatório foi finalizado e enviado ao BM.</p>
3	<p><b>F.</b> Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água.</p>	SEMA	1 Semestre de 2016	<p>A 4ª fase da Campanha de Comunicação que trata do tema Qualidade da água foi ao ar dia 19/03/16, por ocasião da Missão em abril a Casa Civil apresentou as peças ao Banco Mundial que analisou e continua aguardando as próximas fases da campanha que irão tratar da temática Qualidade da Água de forma mais efetiva.</p>



## 3.4. Programas *PforR*

# Posição dos Programas

Capacitação Profissional						
SEDUC						
020 – Ensino Integrado à Educação Profissional	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Julho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 43,10	R\$ 23,51	R\$ 31,49	R\$ 12,36	53%	
020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 15,44	R\$ 8,42	R\$ 8,06	R\$ 5,98	71%	
020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 87,52	R\$ 47,74	R\$ 98,93	R\$ 69,55	146%	
020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.	R\$ 2,47	R\$ 1,35	R\$ 2,30	R\$ 0,35	26%	
020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.	R\$ 29,00	R\$ 15,82	R\$ 30,00	R\$ 4,50	28%	
<b>TOTAL CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>R\$ 177,53</b>	<b>R\$ 96,83</b>	<b>R\$ 170,78</b>	<b>R\$ 92,74</b>	<b>96%</b>	

\* Execução até 27.07.2016




Legenda dos faróis

81% a 100% de execução
  51% a 80% de execução
  0% a 50% de execução





# Posição dos Programas

Assistência à Família						
STDS						
080 – Proteção Social Básica	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Julho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.	R\$ 8,10	R\$ 4,42	R\$ 10,51	R\$ 4,47	101%	
<b>TOTAL ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA</b>	<b>R\$ 8,10</b>	<b>R\$ 4,42</b>	<b>R\$ 10,51</b>	<b>R\$ 4,47</b>	<b>101%</b>	

\* Execução até 27.07.2016

# Posição dos Programas

Qualidade da Água						
CIDADES						
025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Julho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
025.1.12 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário.	R\$ 4,99	R\$ 2,72	R\$ 7,01	R\$ -	0%	

SEMA						
064 – Resíduos Sólidos	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Julho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.	R\$ 2,00	R\$ 1,09	R\$ 3,00	R\$ 0,10	9%	
066 – Ceará Mais Verde	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Julho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.	R\$ 2,00	R\$ 1,09	R\$ 3,00	R\$ -	0%	
067 – Ceará no Clima	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Julho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
067.1.05 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro.	R\$ 1,50	R\$ 0,82	R\$ 2,00	R\$ -	0%	

\* Execução até 27.07.2016



Legenda dos faróis

81% a 100% de execução
  51% a 80% de execução
  0% a 50% de execução



# Posição dos Programas

Qualidade da Água						
SEMACE						
066 – Ceará Mais Verde	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Julho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
066.1.08 – Publicação de Inventário Florestal do Estado do Ceará Elaborado.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
066.1.12 – Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará.	R\$ 1,62	R\$ 0,88	R\$ 1,00	R\$ -	0%	
066.1.13 – Ampliação das ações de proteção dos recursos ambientais das áreas protegidas do Estado do Ceará.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,13	129%	
067 – Ceará no Clima	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Julho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.	R\$ 2,00	R\$ 1,09	R\$ 0,18	R\$ -	0%	
067.1.11 – Realização de análise da qualidade dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Julho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas.	R\$ 0,25	R\$ 0,14	R\$ 0,60	R\$ -	0%	

\* Execução até 27.07.2016



Legenda dos faróis

81% a 100% de execução
  51% a 80% de execução
  0% a 50% de execução

# Posição dos Programas

Qualidade da Água						
FUNCEME						
018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Julho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias.	R\$ 1,81	R\$ 0,99	R\$ 1,91	R\$ 1,19	121%	
018.1.03 - Ampliação e modernização do sistema de monitoramento e previsão.	R\$ 0,05	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ -	0%	
<b>TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA</b>	<b>R\$ 16,22</b>	<b>R\$ 8,84</b>	<b>R\$ 18,76</b>	<b>R\$ 1,42</b>	<b>16%</b>	<b>(D)/(A)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 201,84</b>	<b>R\$ 110,10</b>	<b>R\$ 200,06</b>	<b>R\$ 98,63</b>	<b>90%</b>	<b>49%</b>

\* Execução até 27.07.2016

## Posição dos Programas

Sumário de Execução 2016 até 27.07.2016				
Eixo	Setorial	Previsão	Execução*	%
Capacitação Profissional	<b>SEDUC</b>	R\$ 177,53	R\$ 92,74	52%
Assistência à Família	<b>STDS</b>	R\$ 8,10	R\$ 4,47	55%
Qualidade da Água	<b>CIDADES</b>	R\$ 4,99	R\$ -	0%
	<b>SEMA</b>	R\$ 5,50	R\$ 0,10	2%
	<b>SEMACE</b>	R\$ 3,87	R\$ 0,13	3%
	<b>FUNCEME</b>	R\$ 1,86	R\$ 1,19	64%
<b>Total</b>		<b>R\$ 201,84</b>	<b>R\$ 98,63</b>	<b>49%</b>

Execução Acumulada Projeto até 27.07.2016		
Meta 2014-2017	R\$ 878,52	100%
Execução 2014	R\$ 243,35	27,70%
Execução 2015	R\$ 233,28	26,55%
Execução 2016	R\$ 98,63	11,23%
<b>Total Executado</b>	<b>R\$ 575,26</b>	<b>65,48%</b>
<b>2016-2017</b>	<b>R\$ 303,27</b>	<b>34,52%</b>

## Posição dos Programas

### ✓ **Lembrete:** Regras Programas


A execução dos programas deve observar as seguintes restrições:

- Devem excluir despesas que são financiadas pelo próprio BIRD ou por outras operações de crédito, ou seja, não é permitido a alocação de recursos do BIRD ou outras operações de crédito para custear despesas dos programas e iniciativas do componente
- Verificar a lista negra do BIRD a cada licitação, antes de assinar contrato. Para atender o Art. 42 da Lei 8.666/93 a SEPLAG incluiu no orçamento de cada ação um valor na fonte 69;
- Não podem apresentar impacto sócio ambiental negativo;
- Os valores dos contratos não podem exceder os limites abaixo:
  - Obras = US\$ 50 milhões
  - Bens = US\$ 30 milhões
  - Sistemas de TIC = US\$ 20 milhões
  - Consultorias = US\$ 15 milhões.




## 3.5. Assistência Técnica – Estatísticas

## Execução dos Subprojetos de AT por Etapa

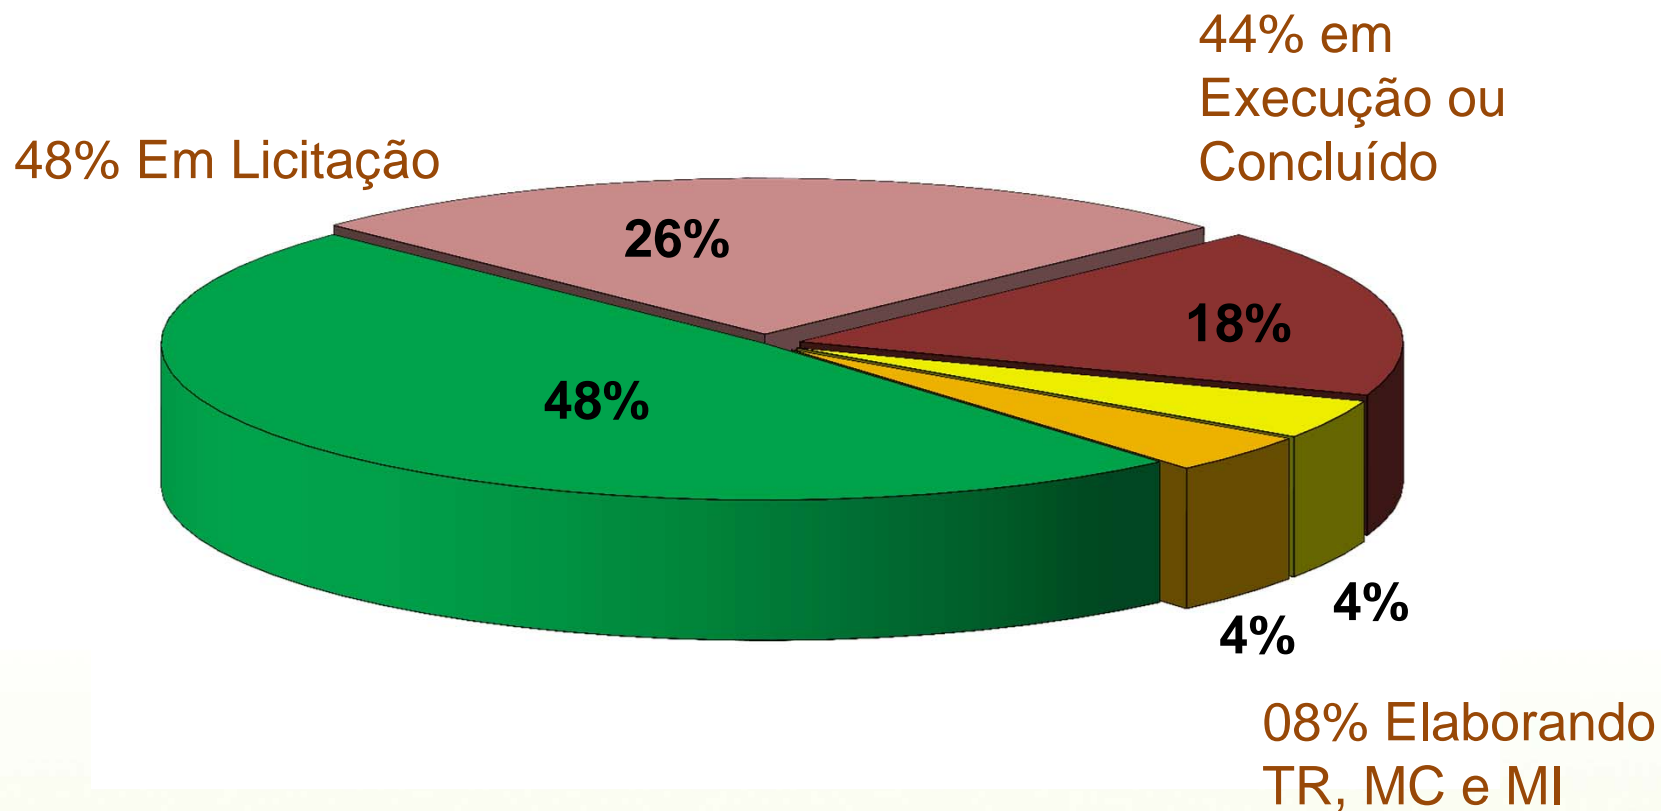



# Execução dos Subprojetos de AT por Etapa

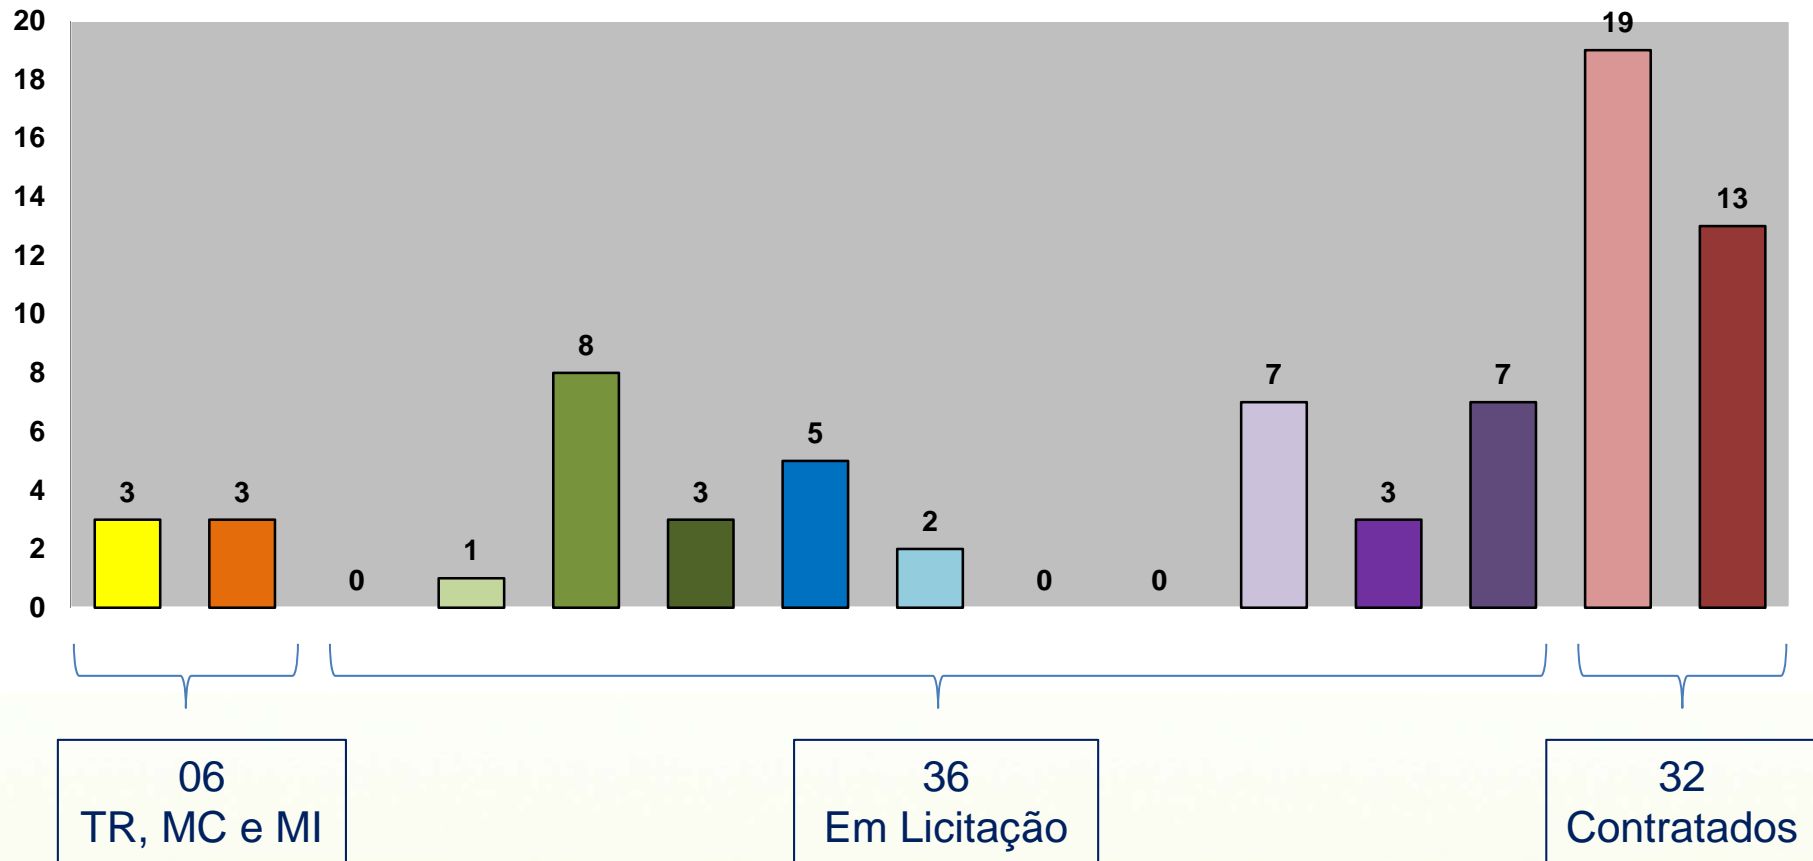

## Sub projetos de Assistência Técnica por Etapa

Etapas			Setoriais com Subprojetos	Valor US\$
1	TDR e MC sendo elaborados para NO BM	3	CGE(11); SEDUC(36); SEPLAG(57);	1.039.291,70
2	TDR e MC aprovado pelo BM e elaborando MI	3	CGE(07); SEDUC(31,34);	311.665,42
3	Manifestação de Interesse Publicada	0	-	-
4	Elaborando o Relatório Final da Lista Curta	1	SEPLAG(54);	70.825,78
5	Elaborando a Solicitação de Proposta	8	CGE(08,10); IPECE(22); SECITECE(26); SEDUC(30,35); SEPLAG(60,61);	2.591.506,44
6	Solicitação de Proposta Lançada	3	IPECE(21); SEDUC(42), SEMACE(52);	1.623.709,45
7	Elaborando o Relatório Técnico ou Curricular	5	CGE(06); SECITECE(27); SEDUC(29); SEMA(49); SRH(63);	2.218.767,49
8	Elaborando o Relatório Financeiro e o Combinado	2	CGE(05); SEMA(51);	908.982,57
9	Não Objeção do BM à Avaliação Combinado / Avaliação Curricular	0	-	-
10	Divulgação da Avaliação Combinada / Ofício para Negociação	0	-	-
11	Negociação do Contrato	7	CGE(09), SEDUC(41,43,44); SEMA(50); SEPLAG(62); SRH (64);	3.197.844,73
12	Divulgação PGE Resultado Final	3	SDE(24); SEPLAG(58,59);	1.315.385,11
13	Assinando o Contrato / Publicação	7	ARCE(01); PGE(23); SECITECE(28); SEMA(45,48); SEMACE(53); TCE(72);	2.532.553,49
14	Projetos com Contratos em Execução	19	CGE(04); FUNCEME(13); IPECE(14,15,17,18,19,20); SEDUC(40); SEMA(46,47); SEPLAG(55,56); SRH(65); COGERH(66,67); STDS(70,71); TCE(73);	6.423.758,81
15	Projetos com Contratos Finalizados	13	CGE(02,03,12); IPECE(16); SDE(25); SEDUC(32,33,37,38,39); COGERH(68); STDS(69); TCE(74).	374.499,27
<b>Total</b>		<b>74</b>		<b>22.608.790,25</b>



## 3.6 Tempo disponível até encerramento do PforR

## Tempo disponível até encerramento do PforR = 31/01/2018

2016	1	2	3	4	5	6	6 meses
	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	
1º Semestre 2017	7	8	9	10	11	12	6 meses
	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	
2º Semestre 2017 e Jan 2018	13	14	15	16	17	18	6 meses
	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	
2018							

TOTAL

18 meses

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 15 meses
	Alto - de 16 a 18 meses
	Altíssimo - acima de 18 meses - Inviabiliza o Projeto



## 3.7. Projetos de Assistência Técnica em Situação de Risco

# Subprojetos de AT em Risco

Nº	Órgão	Subprojetos	Valor US\$	Risco
1	SEMACE	Contratação de consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.	358.092,90	19
2	TCE	Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.	843.588,82	18
3	SEPLAG	Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do Ceará.	529.102,21	18
4	CGE	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	1.027.580,50	17
5	SEPLAG	Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS).	523.590,31	17
6	IPECE	Metodologias para análise de impacto econômico.	423.419,78	17
7	CGE	Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).	436.863,53	16

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 15 meses
	Alto - de 16 a 18 meses
	Altíssimo - acima de 18 meses - Inviabiliza o Projeto



## 3.8 Projetos de Assistência Técnica por Setorial e Pontos Principais de Aquisições

# Pontos Principais de Aquisições

✓ Fase de Licitação:

1. SDP lançada;
2. Relatório de Avaliação – pontos fortes e fracos;
3. O processo licitatório deverá estar arquivado, para fins de auditoria.

✓ Fase de Contrato:

1. Cláusula 41.2.2 da Seção II Condições Gerais do Contrato (60 dias);
2. Substituição de Especialista Principal;
3. Comissão de Acompanhamento contratual;
4. Cláusula 13.1 da Seção III Condições Especiais do Contrato - Declaração assinada por cada especialista principal;
5. Apêndices/Anexo.





# CGE


# Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	Carlos Jorge Freitas	Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SISTEMA SIEC).	436.863,53	13	3	16	Alto
2	Ítalo Brígido Coelho e Tiago Peixoto	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	1.027.580,50	14	3	17	Alto
3	Ítalo Brígido Coelho e Tiago Peixoto	Capacitação da população para o Controle Social.	270.434,28	12	3	15	Alto
4	Denise Andrade Araújo	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	131.654,65	6	6	12	Médio
5	Paulo Roberto	Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	110.302,49	6	3	09	Baixo
6	Ítalo Brígido Coelho e Tiago Peixoto	Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO).	64.572,29	5	7	12	Médio
7	Ítalo Brígido Coelho e Tiago Peixoto	Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).	650.613,72	8	5	13	Médio
<b>TOTAL</b>			<b>2.692.021,46</b>				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 15 meses
	Alto - de 16 a 18 meses
	Altíssimo - acima de 18 meses - Inviabiliza o Projeto

# Assistência Técnica – Gestão Pública


*Subprojetos 2 e 3: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR. <sup>1</sup>*

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 67.354,63
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 - Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Contratos Concluídos.
- **Estágio Atual:** Contratos Concluídos.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

*Nota 1: Auditoria será realizada pela equipe da CGE a partir do semestre 16.1*

## Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

*Subprojeto 4: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Marcelo Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 226.642,79
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Março 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 08/2016 - Publicado em 28/06/2016. Empresa NTCONSULT TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## Assistência Técnica - Gestão Financeira

*Subprojeto 5: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).*

- **Responsável:** Carlos Jorge Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 436.863,53
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Março 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial remeterá o Relatório de Avaliação Final (Combinado) à Cel04, que encaminhará ofício com autorização para convidamos a empresa para negociação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## Assistência Técnica - Gestão Financeira

*Subprojeto 6: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.*

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.027.580,50
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – UGP submeteu o Relatório de Avaliação de Propostas Técnicas e Planilhas de Avaliações para “não objeção” do Banco Mundial em 21/07/16.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

## Assistência Técnica – Gestão Financeira

*Subprojeto 7: Capacitação da população para o Controle Social.*

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 270.434,28
- **Método de Aquisição:** LPN
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Assinatura Contrato.
- **Estágio Atual:** Em Atividades Preparatórias – CGE remeteu à PGE o processo de LPN (Licitação Pública Nacional) para análise e publicação em 22/07/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

## Assistência Técnica - Gestão Pública

*Subprojeto 8: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na “Detecção de Casos de Fraude e Corrupção” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.*

- **Responsável:** Denise Andrade Araújo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 131.654,65
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial aguardando a suplementação para atualização da Intenção de Gasto - IG, e posterior envio do processo da Solicitação de Proposta à Cel04/PGE para o relançamento, após contato em 27/07/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



## Assistência Técnica – Gestão Financeira

*Subprojeto 9: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamentos com foco no “Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos do processo de convergência das Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público (IPSAS).*

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 110.302,49
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Cel04/PGE encaminhou a CGE o ofício nº 245/2016 de autorização/convocação com empresa melhor qualificada para reunião de negociação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## Assistência Técnica – Gestão Pública

*Subprojeto 10: Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO).*

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 64.572,29
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2016 – Fevereiro 2017
- **Estágio Previsto:** Avaliação Técnica da Propostas.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – UGP submeteu o Relatório de Formação da Lista Curta, a planilha das avaliações, a Estimativa dos Custos e 02 Minutas de SDP para o método SQC para “não objeção” do Banco Mundial em 21/07/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


## Assistência Técnica – Gestão Pública

*Subprojeto 11: Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).*

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 650.613,72
- **Método de Aquisição:** LPN
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2016 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Elaborando Contrato.
- **Estágio Atual:** Em Atividades Preparatórias - UGP remeteu a Especificações Técnicas e Orçamento para “não objeção” técnica do Banco Mundial em 21/07/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

## Assistência Técnica – Gestão Pública

*Subprojeto 12: Contratação de consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.*

- **Responsável:** Aglaio Soares
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 24.411,82
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Março de 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



# IPECE



# Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	21	Mario Aragão	Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.	769.636,60	8	2	12	Amarelo
2	22	Nicolino Trompieri e Witalo Paiva	Metodologias para análise de impacto econômico.	423.419,78	12	5	17	Vermelho
<b>TOTAL</b>				<b>1.193.056,38</b>				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 15 meses
	Alto - de 16 a 18 meses
	Altíssimo - acima de 18 meses - Inviabiliza o Projeto


## Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojetos 14 e 15: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.*  
**CONSULTORES PLENOS**

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 322.192,82
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contratos em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP



*Subprojeto 16: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTOR JÚNIOR*

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 21.227,67
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído e Pago.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 





## Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojetos 17,18 e 19: Contratação de 03 (três) **Analistas em Licitações** para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 223.560,31
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contratos em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojeto 20: Contratação de Consultor Individual especializado em **Políticas Públicas** para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução a Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.*

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 109.139,93
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévio
- **Início/Término:** Julho 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 10/2015 publicado em 18/09/2015. Serviços em execução.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 21: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para Desenvolvidos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.*

- **Responsável:** Mário Aragão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 769.636,60
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2015 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação - Processo de SDP lançada em 19/07/2016. Reunião prévia realizada no dia 28/07/2016. Recebimento das Propostas Técnicas e Financeiras até as 14:00hrs do dia 18/08/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojeto 22: Contratação de Consultoria de Empresa para Desenvolvimento de Metodologia para análise de impacto econômico no Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 423.419,78
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial está instruindo o processo de SDP para posterior envio à PGE/Cel04 para lançamento.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



# PGE



# Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	23	Valéria Rodrigues	Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.	448.158,52	14	1	15	
<b>TOTAL</b>				<b>448.158,52</b>				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 15 meses
	Alto - de 16 a 18 meses
	Altíssimo - acima de 18 meses - Inviabiliza o Projeto

## Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

*Subprojeto 23: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Valéria Rodrigues
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 448.158,52
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2015 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Cel04 encaminhará o ofício com resultado da licitação a setorial para que seja providenciado a Homologação e Adjudicação e publicação do Contrato. Empresa vencedora: NTConsult. Valor do Contrato R\$ 1.434.107,25.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



# SECITECE



# Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	26	Sandra Monteiro e Ana Iris	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	147.255,81	6	7	13	
2	27	Sandra Monteiro e Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	190.858,35	7	5	12	
3	28	Sandra Monteiro e Ana Iris	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	87.362,46	7	1	8	
<b>TOTAL</b>				<b>425.476,62</b>				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 15 meses
	Alto - de 16 a 18 meses
	Altíssimo - acima de 18 meses - Inviabiliza o Projeto

## Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 26: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.*

- **Responsável:** Sandra Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 147.255,81
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Notificação e Adjudicação.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial remeterá Relatório Final da Lista Curta à Cel04 para o encerramento da 1ª fase. Solicitação da Proposta está em análise na UGP, após recebimento em 27/06/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 27: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Sandra Monteiro / Tarcísio Hilter
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 190.858,35
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial está elaborando o Relatório de Avaliação Técnica com previsão de envio para análise da UGP em 17/08/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 28:* Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

- **Responsável:** Sandra Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 87.362,46
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial remeteu o contrato a Casa Civil para publicação em 28/07/2016. Consultora Seleccionada: Sra. Maria Fatima Ludovico da Gama e Souza.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



# SEPLAG



# Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
54	Naiana Correia	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	70.825,78	10	3	13	Amarelo
58	Dominique Gomes	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.	446.073,87	8	2	10	Verde
59	Fábio Miranda	Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do Ceará.	529.102,21	16	2	18	Vermelho
60	Katia Burgos	Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.	766.123,16	10	6	16	Vermelho
61	Valdir Silva	Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS).	523.590,31	12	5	17	Vermelho
62	Valdir Silva	Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	241.337,54	6	2	8	Verde
<b>TOTAL</b>			<b>2.577.052,87</b>				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 15 meses
	Alto - de 16 a 18 meses
	Altíssimo - acima de 18 meses - Inviabiliza o Projeto



## Assistência Técnica – Gestão Pública

*Subprojeto 54: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.*

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 70.825,78
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial está elaborando o Relatório de Avaliação Curricular após o recebimento dos currículos em 29/07/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## Assistência Técnica - Gestão Pública



*Subprojeto 55: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Aduino Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 481.856,65
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 17/2015 - Publicado em 05/11/2015. Consórcio MACROPLAN/TRANSPLAN. Serviço em execução.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 





## Assistência Técnica – Gestão Pública

*Subprojeto 56: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.128.001,21
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 023/2015. Serviço em execução.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## Assistência Técnica – Gestão Pública

*Subprojeto 57: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial (2a. Etapa)*

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 300.000,00
- **Método de Aquisição:**
- **Revisão Prévia/Posterior:**
- **Início/Término:** Junho 2016 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaborando o Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## Assistência Técnica – Gestão Pública

*Subprojeto 58: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Dominique Gomes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 446.073,87
- **Método de Aquisição:** SBQ
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Novembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial remeteu a Ata e Minuta de Contrato à PGE/Cel04 para divulgação do Resultado Final.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## Assistência Técnica - Gestão Pública

*Subprojeto 59: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para **Auditar a Folha de Pagamento** do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Fábio Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 529.102,21
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Maio 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Cel04 encaminhará o ofício com resultado da licitação a setorial para que seja providenciado a Homologação, Adjudicação e publicação do Contrato. Empresa vencedora: DELOITTE. Valor do Contrato R\$ 1.800.00,00.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## Assistência Técnica – Gestão Pública

*Subprojeto 60: Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Silvana Dourado
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 766.123,16
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Abril 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação - Setorial encaminhará o Relatório Final da Lista Curta para o encerramento da 1ª fase e instruindo o processo de SDP nº 4911294/2016 para posterior envio à PGE/Cel04 para lançamento.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## Assistência Técnica – Fiduciário

*Subprojeto 61: Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado - GCOMPRAS*

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 523.590,31
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Abril 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial encaminhou o Relatório Final da Lista Curta para encerramento da 1ª Fase e o processo de SDP para lançamento à PGE/Cel04 em 12/07/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

## Assistência Técnica – Fiduciário

*Subprojeto 62: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 241.337,54
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – 1º Reunião de Negociação realizada em 14/07/2016 e a 2ª Reunião de negociação marcada para o dia 29/07/2016. Ata da reunião e o Parecer de substituição dos consultores da NT Consult em análise na UGP, após recebimento no dia 27/07/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 




# STDS





## Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 69: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.*

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 64.213,69
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2014 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



## Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 70: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.*

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 63.174,42
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 71: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará*

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 892.888,73
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico (NCB)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Dezembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



# ARCE



# Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	Alexandre Caetano	Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.	443.428,54	7	1	8	
TOTAL			443.428,54				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 15 meses
	Alto - de 16 a 18 meses
	Altíssimo - acima de 18 meses - Inviabiliza o Projeto

## Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 1: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.*

- **Responsável:** Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Subprojeto:** US\$ 370.112,85
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato Assinado, aguardando publicação e envio do contrato à UGP.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



# COGERH

# Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT



Nº	Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	67	Zulene Almada e Davi Pereira	Plano de Segurança Hídrica.	866.937,02	18	1	19	
TOTAL				866.937,02				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 15 meses
	Alto - de 16 a 18 meses
	Altíssimo - acima de 18 meses - Inviabiliza o Projeto



## Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 66: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Quali-quantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.*

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 884.094,13
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em execução - Contrato 48/2015, em execução - Publicado no DOE de 15/12/2015.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



# Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 67: Termo de Referência para Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.*

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 751.039,72
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Contrato Assinado em 19/07/2016, aguardando publicação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

## Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 68: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas*


- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor Subprojeto:** US\$ 27.326,28
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Janeiro 2016
- **Estágio Previsto:** Concluído
- **Estágio Atual:** CONTRATO CONCLUÍDO.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



# FUNCEME

## Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 13: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.*

- **Responsável:** Francisco Hoilton
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Proposta Vencedora:** €267.442,11 + R\$ 687.325,77 equivalente a R\$ 1.492.246,27
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Março 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução
- **Estágio Atual:** Contrato em execução - Recebido da FUNCEME em 17/09/2015, o Contrato assinado. Publicado no DOE em 16/10/2015.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



# SDE / ADECE

## Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
24	Fernando Costa e Inês Studart	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas.	340.209,03	10	1	11	
<b>TOTAL</b>			<b>340.209,03</b>				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 15 meses
	Alto - de 16 a 18 meses
	Altíssimo - acima de 18 meses - Inviabiliza o Projeto

# Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 24: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.*

- **Responsável:** Fernando Costa / Cláudio Ferreira Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 340.209,03
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução
- **Estágio Atual:** Publicado Resultado Final de Licitação em 18/07/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



# Assistência Técnica – Capacitação Profissional

## *Subprojeto 25: Impact Evaluation Workshop Instambul*

- **Responsável:** Inês Studart
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 2.894,02
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Maio 2015.
- **Estágio Previsto:** Concluído
- **Estágio Atual:** **CONCLUÍDO E PAGO.** Recebido os documentos comprobatórios do curso (Certificado e Relatório de Viagem).
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- **Sinalização em relação ao Prazo:**





# SEDUC

## Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	29	Jussara Batista	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	330.000,00	11	3	13	
2	30	Jussara Batista	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado. Incluindo a Avaliação de Desempenho Institucional	61.635,53	6	4	10	
3	31	Luciano Nery	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Estatístico .	19.975,94	12	3	15	
4	34	Lucas Fernandes e Celena Skeff	Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey).	21.255,20	3	2	5	
5	35	Lucas Fernandes e Celena Skeff	Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.	473.254,91	10	5	15	
6	36	Lucas Fernandes e Celena Skeff	Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados	22.801,43	1	1	5	
<b>TOTAL</b>				<b>928.923,01</b>				

# Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de execução do contrato em meses	Tempo estimado para assinatura do contrato em meses	Tempo contratação + execução em meses	Risco
7	41	Lucas Fernandes e Celana Skeff	Contratação de serviços técnicos de Empresa de Consultoria especializada em <b>visitas domiciliares e para formação dos Agentes</b> de Desenvolvimento Infantil e dos supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	169.793,60	10	2	12	
8	42	Lucas Fernandes e Celana Skeff	Contratação de serviço de empresa para <b>apoio logístico</b> das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.	495.979,95	10	3	13	
9	43	Lucas Fernandes e Celana Skeff	Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN. <b>(Coleta de Dados)</b> .	1.069.268,38	12	1	13	
10	44	Lucas Fernandes e Celana Skeff	Contratação de Consultoria Individual para <b>Coordenar o Trabalho de Campo</b> para Avaliação de Programa PADIN.	34.415,38	12	2	14	
<b>TOTAL PROJETOS</b>				<b>2.698.380,32</b>				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 15 meses
	Alto - de 16 a 18 meses
	Altíssimo - acima de 18 meses - Inviabiliza o Projeto

# Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 29: Contratação de serviços de consultoria para avaliação de desempenho acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará. (Teste de Proficiência)*

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 330.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Setembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Em licitação – Elaborando o Relatório de Avaliação Técnica. Recebido propostas desde 06/07/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 30: Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da **formação continuada para gestores**, professores e instrutores de educação profissional secundárias do Estado (com a inclusão da Avaliação de Desempenho Institucional).*

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 61.635,53
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Abril 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em licitação – Em elaboração do RFLC e SDP para lançamento.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


# Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 31: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Estatístico .*

- **Responsável:** Luciano Nery
- **Categoria de Licitação:** CI
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 19.975,94
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Atividades Preparatórias- Elaborando TDR de acordo com novo escopo.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

# Assistência Técnica – Capacitação Profissional


## *Subprojeto 32: Impact Evaluation Workshop Istanbul*

- **Responsável:** Luciano Nery
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 3.154,13
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** **CONCLUÍDO E PAGO.** Recebido os documentos comprobatórios do curso (Certificado, e Relatório de Viagem).
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



## Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 33: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 4.466,03
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Julho 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 34: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 21.255,20
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Atividades Preparatórias – TDR ajustado em análise na UGP desde 13/06/16. Previsão de retorno (elaboração da minuta do contrato e estimativa dos custos pela UGP) somente quando retomar o processo da formação de gestores..
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 35: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de **formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.***

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 473.254,91
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Dezembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Recebidos em 28/07/2016, dois (2) TOR em função do desmembramento do Apoio Logístico, aguardando análise da UGP.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



## Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 36: Contratação de Empresa Especializada para serviço de **Impressão Gráfica dos materiais** de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 22.801,43
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2016 - Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Atividades Preparatórias
- **Estágio Atual:** Em Atividades Preparatórias – Edital de Shopping, Especificações Técnicas e a Estimativa de Custos devidamente revisados e prontos para envio a PGE, aguardando continuidade da “Formação de Gestores”.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


## Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 37: Contratação de Consultor Individual Especialista em **Avaliação de Programas para Identificar o Impacto** do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)*

- **Responsável: SEDUC** - Lucas Fernandes/ **IPECE** - Jimmy Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor Subprojeto :** US\$ 16.557,58
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2014 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


## Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 38: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 25.207,85
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



## Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 39: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 29.188,04
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Assistência Técnica –Assistência à Família



*Subprojeto 40: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de **Arte Gráfica/Design**, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 61.838,85
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 





## Assistência Técnica –Assistência à Família

*Subprojeto 41: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 169.793,60
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – SEDUC elaborando Minuta do Contrato. Aguardando ajustes (parecer de substituição). Previsão de envio a UGP no dia \_\_\_/\_\_\_/.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



## Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 42: Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 557.643,38
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fev 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Em Licitação - Edital Pregão Eletrônico marcado para o dia 01/08/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 43: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados).*

- **Responsável:** SEDUC – Lucas Fernandes / IPECE - Jimmy Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 1.069.268,38
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Realizada 2ª reunião de negociação, SEDUC/UGP estão documentos para ajustes finais.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 44: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN*

- **Responsável: SEDUC** – Lucas Fernandes/ **IPECE** - Jimmy Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 34.415,38
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Março 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** : Em Licitação – Marcada reunião de negociação com consultora para o dia 02/08/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



# SEMA

# Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	45	Maria Dias e Magda Marinho	Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.	391.476,75	6	1	7	
2	48	Maria Dias e Francisco Leorne	Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.	181.663,88	6	1	7	
3	49	Maria Dias e Monica Freitas	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.	224.000,00	9	4	13	
4	50	Maria Dias e Ilana Fernandes	Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por licitações a céu aberto.	1.153.752,25	12	1	13	
5	51	Maria Dias e Fabiola Martins	Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	472.119,04	6	2	8	
<b>TOTAL</b>				<b>2.423.011,92</b>				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 15 meses
	Alto - de 16 a 18 meses
	Altíssimo - acima de 18 meses - Inviabiliza o Projeto

## Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 45: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto “AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.” (AIEDA)*

- **Responsável:** Maria Dias / Magda Marinho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 391.476,75
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2014 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – SEMA elaborando contrato, aguardando registro do consórcio na Junta comercial desde 14/07/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## Assistência Técnica - Qualidade da Água



*Subprojeto 46: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas*

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 314.274,86
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Agosto 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução - Contrato 06/2016 - Publicado em 15/04/2016. Empresa vencedora Consórcio Engesoft Engenharia / Quanta Consultoria Ltda. (R\$ 710.638,32).
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 





## Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 47: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicos.*

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor Subprojeto:** US\$ 107.269,38
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Fevereiro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em execução - Contrato 26/2015 - Publicado em 08/12/2015  
Empresa vencedora MSV Multiserviços ME (R\$ 242.557,52).
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


# Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 48: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Maria Dias / Francisco Leorne
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** 174.236,97
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2014 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Aguardando a chegada do contrato assinado pela empresa (ARCADIS) desde 27/07/2016. Para posterior publicação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



## Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 49: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Maria Dias / Monica Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 224.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação- SEMA elaborando o RAT, com previsão de entrega para dia \_\_\_\_/\_\_\_\_.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

# Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 50: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".*

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 1.153.752,25
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Março 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação –Aguardando divulgação do Aviso de Resultado Final pela Cel04.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 51: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.*

- **Responsável:** Maria Dias e Fabiola Martins
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 472.119,04
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Novembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Realizada reunião de negociação em 27/07/2016.  
aguardando ajustes.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



# SEMACE



# Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	52	Elizabeth Romão e Tiago Bessa	Contratação de consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.	358.092,90	14	4	18	
2	53	Elizabeth Romão e Tiago Bessa	Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE.	210.190,31	8	0	8	
<b>TOTAL</b>				<b>568.283,21</b>				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 15 meses
	Alto - de 16 a 18 meses
	Altíssimo - acima de 18 meses - Inviabiliza o Projeto

## Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 52: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de **capacitação** para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE*

- **Responsável:** Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 358.092,90
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Relançamento da SDP em 30/06/2016, com data para recebimento das propostas estipulada até 01/08/16.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



## Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 53: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a **Manualização dos Procedimentos Técnicos** dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.*

- **Responsável:** Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 210.190,31
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2014 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Contrato assinado, aguardando publicação e envio a UGP.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



# SRH



## Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	63	Karine Machado e Sergio Câmara	Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga e Cobrança.	446.328,65	12	3	15	
2	64	Karine Machado e Sergio Camara	Sistema de Informação de Gestão dos Recursos Hídricos (cadastro, fiscalização, outorga, monitoramento qualitativo, segurança de barragens e medição) com Integração com o Sistema Administrativo Financeiro PROTHEUS.	418.975,09	12	2	14	
<b>TOTAL</b>				<b>865.303,74</b>				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 15 meses
	Alto - de 16 a 18 meses
	Altíssimo - acima de 18 meses - Inviabiliza o Projeto



## Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 63: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.*

- **Responsável:** Karine Machado e Marcilio Caetano
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 446.328,65
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – RAT aguardando ajustes. Previsão de retorno estimada em \_\_/\_\_/16.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



# Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 64: Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. **SIGERH***

- **Responsável:** Karine Machado e Fernanda Benevides
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 418.975,09
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Fase final de negociação contratual, aguardando adequações por parte da empresa.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

## Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 65: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - **Malha D'agua.***

- **Responsável:** Karine Machado
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do TOR:** US\$ 152.839,20
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contratado – Contrato assinado em 18/05/2016, aguardando publicação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



# TCE

# Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT



Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
72	Glinton Ferreira e Delinda Almeida	Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.	806.274,68	18	1	19	
TOTAL			806.274,68				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 15 meses
	Alto - de 16 a 18 meses
	Altíssimo - acima de 18 meses - Inviabiliza o Projeto




## Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

*Subprojeto 72: Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.*

- **Responsável:** Glinton Ferreira / Delinda Almeida
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 806.712,10
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/ Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Fase final de contratação, publicando Homologação e Adjudicação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


# Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

*Subprojeto 73: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará*

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 84.010,26
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em execução.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

## Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

*Subprojeto 74: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).*

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 100.915,62
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** CONTRATO CONCLUÍDO.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



## 4. APRESENTAÇÃO DO FILME INSTITUCIONAL SOBRE O PFORR



## 5. APROVAÇÃO DA ATA DA 29ª REUNIÃO (30/06/2016)

### COMITÊ *PforR*

## Próxima Reunião do Comitê PforR

Próxima Reunião do Comitê PforR:

**25/08/2016**  
**14h30m - IPECE**



## 6. ENCAMINHAMENTOS

## Encaminhamentos da 29ª Reunião realizada em 30/06/2016

- ✓ Encaminhamentos pendentes da 29ª Reunião:
- ✓ 1. **SEDUC**- Envio do parecer de substituição da coordenadora, para finalização da contratação da Formação de Gestores do PADIN.
- ✓ 2. **CGE**- Aguardando a suplementação para atualização da Intenção de Gasto - IG, e posterior envio do processo da Solicitação de Proposta à Cel04/PGE para o relançamento do projeto “Detecção de Casos de Fraude e Corrupção”





## 6. ENCERRAMENTO
