



44ª REUNIÃO DO COMITÊ *PforR*
ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO
PROJETO *PforR*
28 DE SETEMBRO DE 2017



PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

1. Abertura e apresentação dos participantes
2. Sumário de Desembolso – Viviane Costa
3. Indicadores, Programas e Assistência Técnica
 - 3.1. Indicadores Primários 2017.1, 2017.2 e Desembolsos – Viviane Costa
 - 3.2. Indicadores Secundários 2017.2 – Viviane Costa
 - 3.3. Programas PforR - Thâmara Aragão
 - 3.4. Assistência Técnica: Estatísticas – Giuseppe Nogueira
 - 3.5. Pontos Principais de Aquisições / Contratos - Giuseppe Nogueira
4. Monitoramento Contratos – André Morel
5. Projetos de Assistência Técnica por setorial contratados – Giuseppe Nogueira
6. Apresentação dos Resultados: Projetos de Assistência Técnica
7. Aprovação da Ata da 43ª Reunião (31/08/2017) – Viviane Costa
8. Encerramento



1. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES



2. SUMÁRIO DE DESEMBOLSO

SUMÁRIO DESEMBOLSO - Valores Previstos/Desembolsados

- ✓ A Sefaz informou no dia 25/09/2017 que foi internalizado nesta data os montantes de US\$48.480.628,00 e US\$8.620.000,00 (US\$ 57.100.628,00) respectivamente, com a cotação de US\$/R\$3,1450, totalizando o valor de **R\$179.581.475,06.**



3. INDICADORES, PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA



3.1. Indicadores Primários 2017.1 e Desembolsos

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2017.1

Nº	Setorial	Nome do Indicador	Valor Desembolso US\$
1	SDE	DLI 1: aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação	3.444.000,00
2	SEDUC	DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	3.444.000,00
3	SEDUC	DLI 3: número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.	3.444.000,00
4	SEPLAG	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	3.444.000,00
5	SRH	DLI 7: Estabelecimento de um comitê interagência de segurança hídrica	3.444.000,00
6	SEPLAG	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	4.500.000,00
7	SEPLAG	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada	4.694.000,00
Total de metas de 2017.1 atingidas (A)			26.414.000,00
1	SEPLAG	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	4.594.194,00
			4.500.000,00
			4.500.000,00
			4.500.000,00
Total de metas de 2015.1 à 2016.2 atingidas (B)			18.094.194,00
1	FUNCEME	DLI 10: Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.	3.120.000,00
2	SEPLAG	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada.	4.370.000,00
Total de metas de 2017.2 atingidas (C)			7.490.000,00
1	STDS	DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS	3.438.000,00
Total da meta cumprida em 2016.2, mas não desembolsada por aguardar a reestruturação (D)			3.438.000,00
1	STDS	DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS	1.664.434,00
Total meta STDS 2º Semestre de 2015 que não foi cumprida (5%) (E)			1.664.434,00
Total Geral desembolsado pelo alcance das metas no período de 2017.1 (A+B+C+D+E)			57.100.628,00

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 1: Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação.	SDE Filipe Rabelo	Uma ação adicional implementada a partir do Plano de Ação	1 Ação já implementada em 2017.2	No início de setembro o comitê se reuniu para tratar da implementação da ação para 2017.2. Iniciou-se uma discussão técnica mas ainda não está definida a ação que será implementada no período. O Comitê está preparando uma agenda para o início de outubro para a definição da meta, sua implementação e comprovação.

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.	SEDUC Rivanir Bezerra	18 acordos	17 acordos firmados	A SEDUC está assinando com mais duas empresas

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	10%	7,10%	Até o momento foram acompanhadas 4.189 famílias nos municípios do PforR, as informações obtidas nas visitas estão sendo registradas em instrumental próprio e informadas no Sistema de Monitoramento da STDS. As visitas às famílias estão sendo articuladas pela equipe de Proteção Social Básica da STDS com os gestores municipais e com as equipes técnicas dos CRAS para o cumprimento do indicador até dezembro/ 2017.

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	95%	100%	As Capacitações foram realizadas nos CRAS dos 36 municípios mais pobres, portanto, todas as metas do Indicador já foram alcançadas. No entanto, a STDS continua realizando as capacitações tendo em vista a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão em alguns municípios. No mês de agosto foram realizadas mais 03 (três) capacitações, incluindo a Capacitação do Sistema de Monitoramento com os técnicos dos 36 municípios de abrangência do PforR.

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 6: Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	SEPLAG José Freitas	95%	86,49%	A Equipe da Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza - CCOPI, comprometida com a realização das atividades necessárias ao cumprimento da meta, realizou uma reunião para o dia 25/09/2017, com a finalidade de elaborar o respectivo planejamento das ações pertinentes.

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Metas	Realizado	Status
DLI 7: Estabelecimento do Comitê multisetorial de Segurança da Água.	SRH Carlos Campelo	Atas de pelo menos duas reuniões realizadas	-	Para o segundo semestre já foi realizada uma reunião, como regimentalmente as atas do Conselho são aprovadas nas reuniões posteriores, essa terá sua ata aprovada e assinada na segunda reunião (deste semestre) proposta para 17 de outubro.

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	CAGECE Carlos Rossas	85.9%	87,17%	87,17% (referente ao mês de julho)

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	SEMA Maria Dias SEMACE Tiago Bessa COGERH Denilson Fidelis	80%	98,28%	98,28 (referente à 01/09/2017)

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME Hoilton Rios	Metodologia implementada em mais dois reservatórios estratégicos.	Metodologia implementada em mais dois reservatórios estratégicos.	Meta alcançada. A aplicação da metodologia nos açudes Olho d'Água e Araras, foram apresentados aos Comitês de Bacias Hidrográfica do Acaraú e Sub-bacia Hidrográfica do Salgado.

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	SEPLAG Avilton Júnior	6 Secretarias	5 Secretarias	Além das cinco secretarias que já assinaram os acordos de resultados, a equipe está finalizando os trabalhos com outras quatro (Scidades, Sema, Sejus e STDS) para que os acordos de resultados sejam assinados até a primeira quinzena de outubro. Além disso, serão iniciados, ainda neste mês de setembro, os trabalhos em outras quatro secretarias: SDE, SDA, Setur e Secitece.

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	SEPLAG Adauto Oliveira	20%	20%	As metas de 2017.1 (15%) e 2017.2 (20% + Decreto publicado) foram cumpridas.





3.2. Indicadores Secundários 2017.2

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Meta 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Meta 2ª semestre	Realizado	Status
PDO1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	IPECE Victor Hugo	31.600	25.463 técnicos	Os dados referentes ao ano de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS. Em 2015 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Meta 2ª semestre	Realizado	Status
Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multisetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	SEPLAG Lara Costa	Outras duas resoluções publicadas e relatório sobre as atividades do Comitê publicado	Duas Resoluções já publicadas em 2017.2	A proposta de resolução elaborada após a reunião do dia 21/08 está passando por uma reformulação, considerando os avanços nas discussões relativas ao Programa Estadual de Combate à Pobreza, com foco no público infantil. Essa reformulação visa registrar diretrizes mais concretas no contexto desse programa, para só então ser encaminhada para publicação. O relatório sobre as atividades do Comitê deverá ser elaborado em meados de novembro a fim de consolidar o máximo de ações desenvolvidas até o final do ano. Está sendo desenhada uma proposta para sua estrutura, a qual deverá ser validada na próxima reunião do Comitê.

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Metas 2ª semestre	Realizado	Status
PDO2: Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	10%	7,11%	O Sistema de Monitoramento do PforR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, estão sendo inseridos os dados dos instrumentais dos 36 dos municípios no sistema. Continuam sendo feitos ajustes no Sistema para a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos. O relatório referente à meta de 2016.2 foi entregue no dia 22/09/2017 e está sendo revisado pela UGP.

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Meta 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Meta 2ª semestre	Realizado	Status
PDO3:Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	COGERH Denilson Fidelis, Disney Paulino	67.5	77,6	77,6 (referente ao mês de Agosto) IQAR ce: 4,04 (criticamente degradado a poluído)

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Metas 2ª semestre	Realizado	Status
Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	COGERH Ana Araújo	Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa	A minuta do Decreto foi apresentada ao CONERH.	Alterações da Minuta do Decreto de Proteção das Bacias Hidrográficas realizada pelos Conselheiros do CONERH (Conselho Estadual de Recursos Hídricos)

*Comitês Bacias Hidrográficas

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Metas 2ª semestre	Realizado	Status
Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.	COGERH Zulene Almada	Plano de Segurança Hídrica elaborados e apresentados em Reunião do CONERH. Resolução do CONERH criando Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução dos Planos	-	No dia 18/09, representantes da Cogeh se reuniram com a UGP para debater sobre as dificuldades do contrato. No dia 20/09, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato elaborou uma Nota de Esclarecimento, que será enviada para a Contratada.


INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Responsável	Metas	Realizado	Status
Apresentação da Lei de gestão de Resíduos Sólidos revista.	SEMA Maria Dias	Implementação e monitoramento	Foi encaminhado Relatório demonstrando os resultados da implementação e do monitoramento da Política Estadual de Resíduos Sólidos.	Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para as 11 regiões do Estado, e vão ser iniciadas as Audiências Públicas para esses planos. Foram entregues e analisados os Panoramas de RS das 11 regiões. Está sendo acompanhado o cumprimento das metas dos TAC's de Sobral, Limoeiro e Cascavel.



3.3. Programas *PforR*

Execução dos Programas

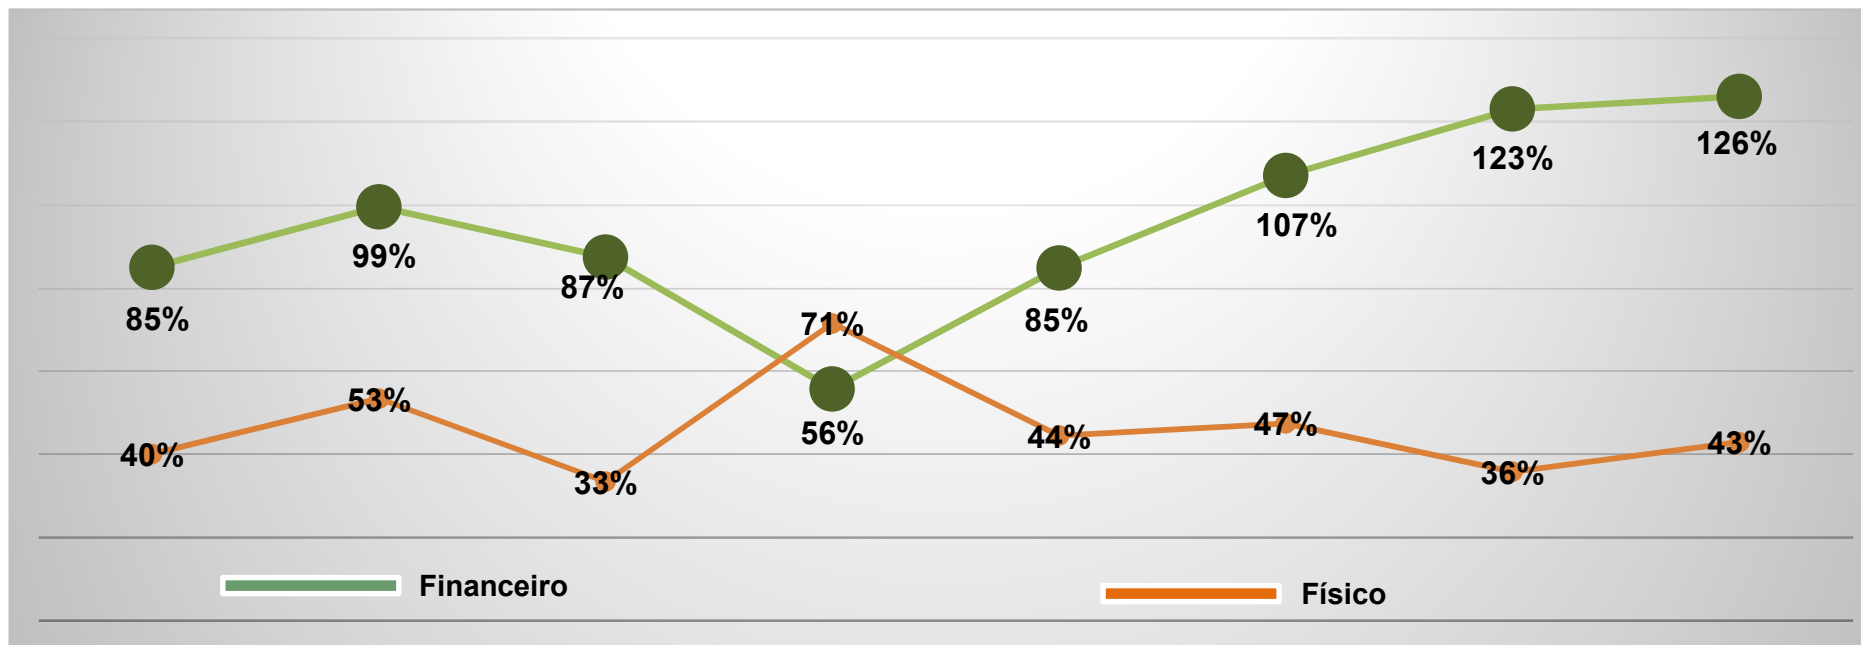

Descrição		Ano							
		2014.1	2014.2	2015.1	2015.2	2016.1	2016.2	2017.1	2017.2
Financeiro (R\$)	Iniciativas	81.750.000	157.830.000	100.830.000	258.500.000	91.750.000	191.640.000	86.370.000	138.000.000
	Iniciativas Cumpridas	69.430.000	157.040.000	88.124.000	143.878.000	77.780.000	205.126.000	106.270.000	174.000.000
	%	85%	99%	87%	56%	85%	107%	123%	126%
Físico (Quantidade)	Iniciativas	15	15	15	14	18	19	14	14
	Iniciativas Cumpridas	6	8	5	10	8	9	5	6
	%	40%	53%	33%	71%	44%	47%	36%	43%

Posição do Programa 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional - SEDUC

Iniciativas	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 28/09/2017 (B)	Até 28/09/2017 (C)	FAROL setembro (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 31,49	R\$ 22,90	R\$ 56,18	245%	178%
020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 8,06	R\$ 5,86	R\$ 0,95	16%	12%
020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 98,93	R\$ 71,95	R\$ 100,74	140%	102%
020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.	R\$ 2,30	R\$ 1,67	R\$ 0,14	8%	6%
020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.	R\$ 30,00	R\$ 21,82	R\$ 9,48	43%	32%
TOTAL SEDUC - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	R\$ 170,78	R\$ 124,21	R\$ 167,49	135%	98%

Posição do Programa 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional - SEDUC

Iniciativas		Execução até 28/09/2017	Restos a Pagar até 28/09/2017	TOTAL
771	020.1.01	R\$ 54.078.853,43	R\$ 2.101.989,98	R\$ 56.180.843,41
	020.1.02	R\$ 199.675,49	R\$ 754.748,07	R\$ 954.423,56
328	020.1.03	R\$ 89.579.746,92	R\$ 11.162.026,44	R\$ 100.741.773,36
-	020.1.04	R\$ 123.844,15	R\$ 14.304,54	R\$ 138.148,69
834	020.1.06	R\$ 9.250.606,16	R\$ 225.895,20	R\$ 9.476.501,36
Total		R\$ 153.232.726,15	R\$ 14.258.964,23	R\$ 167.491.690,38

Posição do Programa 080 – Proteção Social Básica - STDS

Iniciativa	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 28/09/2017 (B)	Até 28/09/2017 (C)	FAROL setembro (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.	R\$ 7,30	R\$ 5,31	R\$ 5,19	98%	71%
TOTAL STDS - ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA	R\$ 7,30	R\$ 5,31	R\$ 5,19		

Iniciativas		Execução até 28/09/2017	Restos a Pagar até 28/09/2017	TOTAL
03180	080.1.01	R\$ 5.174.200,00	R\$ 15.750,00	R\$ 5.189.950,00

Posição do Programa 025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana - CIDADES

Iniciativa	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 28/09/2017 (B)	Até 28/09/2017 (C)	FAROL setembro (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
025.1.07 - Ampliação do serviço de esgotamento sanitário.	R\$ 5,00	R\$ 3,64	R\$ -	0%	0%
TOTAL CIDADES - QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 5,00	R\$ 3,64	R\$ -		

Posição dos Programas - SEMA

064 – Resíduos Sólidos

066 – Ceará Mais Verde

067 – Ceará no Clima

064 – Resíduos Sólidos	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 28/09/2017 (B)	Até 28/09/2017 (C)	FAROL setembro (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.	R\$ 1,10	R\$ 0,80	R\$ 0,10	12%	9%
066 – Ceará Mais Verde					
066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.	R\$ 0,42	R\$ 0,31	R\$ 0,29	94%	68%
067 – Ceará no Clima					
067.1.02 – Promoção de ações voltadas ao fortalecimento do Sistema de Gestão Ambiental do Estado do Ceará.	R\$ 0,55	R\$ 0,40	R\$ -	0%	0%
TOTAL SEMA - QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 2,07	R\$ 1,51	R\$ 0,39	26%	19%

Posição dos Programas - SEMA

064 – Resíduos Sólidos

066 – Ceará Mais Verde

067 – Ceará no Clima

Iniciativas		Execução até 28/09/2017	Restos a Pagar até 28/09/2017	TOTAL
03104	064.1.04	R\$ -	R\$ 99.780,00	R\$ 99.780,00
-	066.1.02	R\$ 287.242,51		R\$ 287.242,51
-	067.1.02	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 287.242,51	R\$ 99.780,00	R\$ 387.022,51

Posição dos Programas da SEMACE

066 – Ceará Mais Verde

067 – Ceará no Clima

500 – Gestão e Manutenção

066 – Ceará Mais Verde	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 28/09/2017 (B)	Até 28/09/2017 (C)	FAROL setembro (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais.	R\$ 2,50	R\$ 1,82	R\$ 0,01	0%	0%
066.1.12 – Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará.	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,02	0%	0%
067 – Ceará no Clima					
067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.	R\$ 0,10	R\$ 0,07	R\$ 0,10	140%	102%
500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada					
500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas.	R\$ 0,76	R\$ 0,55	R\$ 0,05	10%	7%
TOTAL SEMACE - QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 3,36	R\$ 2,44	R\$ 0,18	8%	6%

Posição dos Programas da SEMACE

066 – Ceará Mais Verde

067 – Ceará no Clima

500 – Gestão e Manutenção

Iniciativas		Execução até 28/09/2017	Restos a Pagar até 28/09/2017	TOTAL
-	066.1.09	R\$ 7.480,00	R\$ -	R\$ 7.480,00
05170	066.1.12	R\$ 24.473,94	R\$ -	R\$ 24.473,94
-	067.1.09	R\$ -	R\$ 101.603,34	R\$ 101.603,34
00001	500.1.02	R\$ 13.329,99	R\$ 40.054,66	R\$ 53.384,65
Total		R\$ 45.283,93	R\$ 141.658,00	R\$ 186.941,93

Posição do Programa 018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis - FUNCEME

Iniciativa	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 28/09/2017 (B)	Até 28/09/2017 (C)	FAROL AGOSTO (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias.	R\$ 1,50	R\$ 1,09	R\$ 0,69	64%	46%
TOTAL FUNCEME - QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 1,50	R\$ 1,09	R\$ 0,69	64%	46%

Iniciativas		Execução até 28/09/2017	Restos a Pagar até 28/09/2017	TOTAL
2846	018.1.01	R\$ 694.324,41	R\$ -	R\$ 694.324,41
Total		694.324,41	-	694.324,41

TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 11,93	R\$ 8,68	R\$ 1,27	15%	11%
--------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	------------

Posição de Execução dos Programas de 2017 até 28/09/2017

Sumário de Execução 2017 até 28/09/2017					
Eixo	Setorial	Previsão	Execução Agosto	Execução Setembro	%
Capacitação Profissional	SEDUC	R\$ 170,78	R\$ 144,81	R\$ 167,49	98%
Assistência à Família	STDS	R\$ 7,30	R\$ 4,69	R\$ 5,19	71%
Qualidade da Água	CIDADES	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ -	0%
	SEMA	R\$ 2,07	R\$ 0,18	R\$ 0,39	19%
	SEMACE	R\$ 3,36	R\$ 0,17	R\$ 0,18	5%
	FUNCEME	R\$ 1,50	R\$ 0,57	R\$ 0,69	46%
Total		R\$ 190,01	R\$ 150,43	R\$ 173,95	91,55%

Posição de Execução dos Programas de 2017 até 28/09/2017

Execução Acumulada do Projeto até 28/09/2017			
Meta 2014-2017	Documentado ao Banco	R\$ 949,58	100,00%
Execução 2014	Ok	R\$ 243,35	25,63%
Execução 2015	Ok	R\$ 233,28	24,57%
Execução 2016	Aguardando Auditoria do TCE	R\$ 282,94	29,80%
Execução 2017	Em execução	R\$ 173,95	18,32%
Total Executado		R\$ 933,52	98,31%
Falta Executar		R\$ 16,06	1,69%

Obs: O total auditado pelo TCE e documentado ao Banco foi de R\$ 476,62 milhões (IFR 2014 e IFR 2015).

Posição dos Programas

EIXO	SETORIAL	PROGRAMAS	Previsão		Execução		FAROL 2017 (C)/(A)
			2017 (A)	Até 28/09/2017 (B)	Até 28/09/2017 (C)	FAROL SETEMBRO (D)	
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	SEDUC	020 – Ensino Integrado à Educação Profissional;	R\$ 170,78	R\$ 124,21	R\$ 167,49	135%	98%
TOTAL CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			R\$ 170,78	R\$ 124,21	R\$ 167,49	135%	98%
ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA	STDS	080 – Proteção Social Básica;	R\$ 7,30	R\$ 5,31	R\$ 5,19	98%	71%
TOTAL ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA			R\$ 7,30	R\$ 5,31	R\$ 5,19	98%	71%
QUALIDADE DA ÁGUA	CIDADES	025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana;	R\$ 5,00	R\$ 3,64	R\$ -	0%	0%
	SEMA/SEMACE	064 – Resíduos Sólidos;	R\$ 1,10	R\$ 0,80	R\$ 0,10	12%	9%
		066 – Ceará Mais Verde;	R\$ 2,92	R\$ 2,12	R\$ 0,31	15%	11%
		067 – Ceará no Clima;	R\$ 0,65	R\$ 0,47	R\$ 0,10	21%	16%
	SEMACE	500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada;	R\$ 0,76	R\$ 0,55	R\$ 0,05	10%	7%
	FUNCEME	018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis.	R\$ 1,50	R\$ 1,09	R\$ 0,69	64%	46%
TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA			R\$ 11,93	R\$ 8,68	R\$ 1,26	15%	11%
TOTAL EXECUÇÃO DE 2017			R\$ 190,01	R\$ 138,19	R\$ 173,95	125,88%	91,55%

Posição dos Programas

✓ **Lembrete:** Regras Programas


A execução dos programas deve observar as seguintes restrições:

- Devem excluir despesas que são financiadas pelo próprio BIRD ou por outras operações de crédito, ou seja, não é permitido a alocação de recursos do BIRD ou outras operações de crédito para custear despesas dos programas e iniciativas do componente
- Verificar a lista negra do BIRD a cada licitação, antes de assinar contrato. Para atender o Art. 42 da Lei 8.666/93 a SEPLAG incluiu no orçamento de cada ação um valor na fonte 69;
- Não podem apresentar impacto sócio ambiental negativo;
- Os valores dos contratos não podem exceder os limites abaixo:
 - Obras = US\$ 50 milhões
 - Bens = US\$ 30 milhões
 - Sistemas de TIC = US\$ 20 milhões
 - Consultorias = US\$ 15 milhões.



3.4. Assistência Técnica – Estatísticas

Execução dos Subprojetos de AT por Etapa – 75 Subprojetos

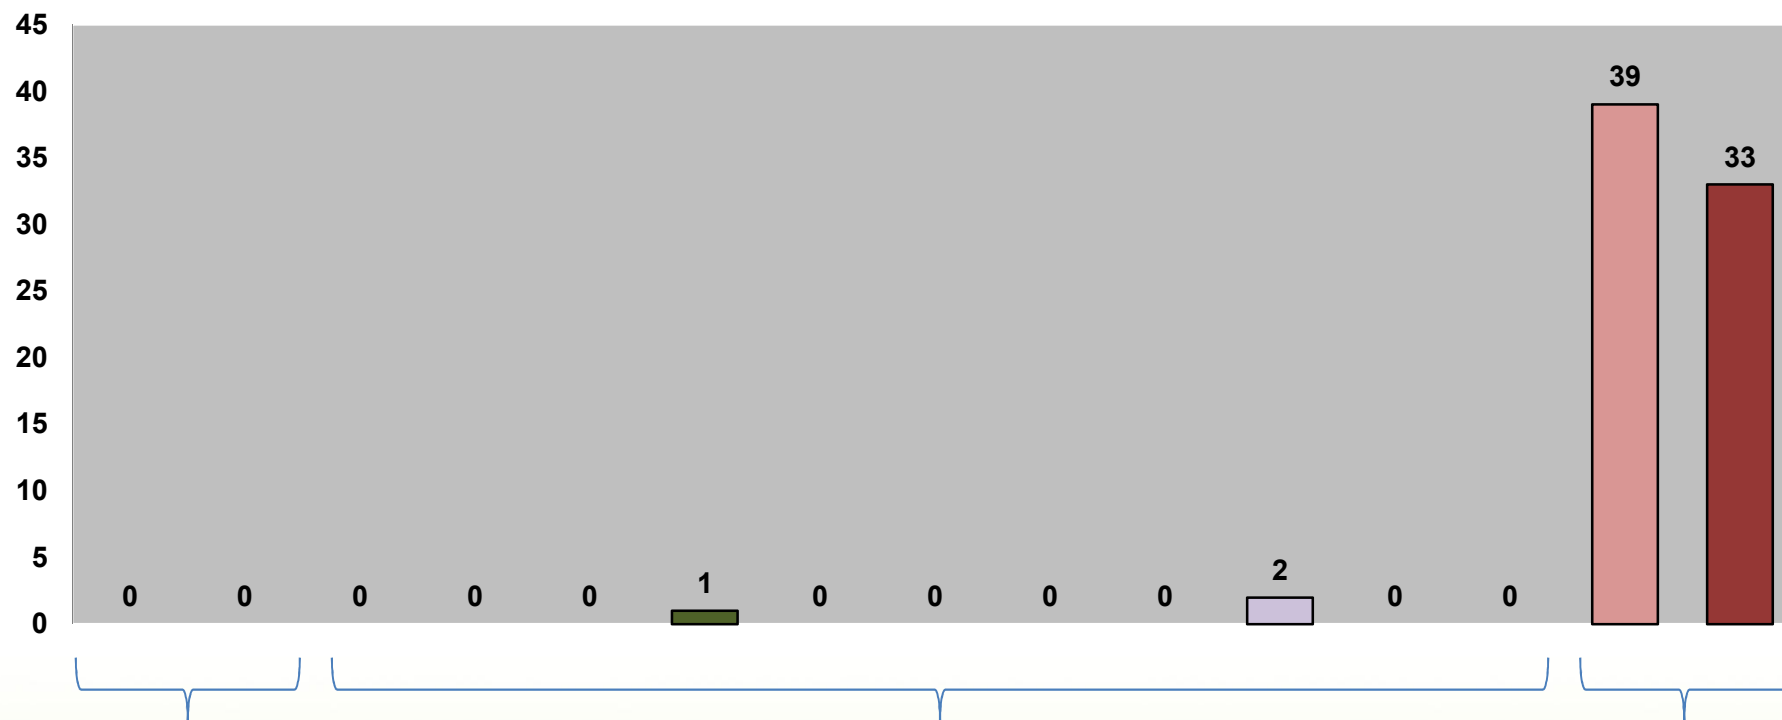

00
TR, MC e MI

03
Em Licitação

Total 72
39 - Em Andamento
33 - Concluídos

Subprojetos de Assistência Técnica

QTD.	Setoriais	Subprojeto	Status
1	SDE	Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.	Solicitação de Proposta lançada em 11/09/2017. Reunião prévia realizada no dia 26/09/2017. Recebimento das Propostas Técnicas e Financeiras até as 16:00hrs do dia 11/10/2017.
2	SEPLAG	Consultor Individual - Otimização das Rotas. (Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará). ROTEIRIZAÇÃO	Setorial está finalizando a ata da reunião de negociação e minuta de contrato, após reunião de negociação no dia 26/09.
3	SEPLAG	Contratação de Consultor Individual - Plano Estratégico de Gestão das Frotas. (Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará).	Setorial está finalizando a ata da reunião de negociação e minuta de contrato, após reunião de negociação no dia 22/09.



3.5 Pontos Principais de Aquisições / Contratos

Pontos Principais de Aquisições / Contratos


- **Qualidade Técnica dos Produtos gerados pelas Consultorias.**



4. MONITORAMENTO CONTRATOS

Contratos Assistência Técnica

Contratos Assinados

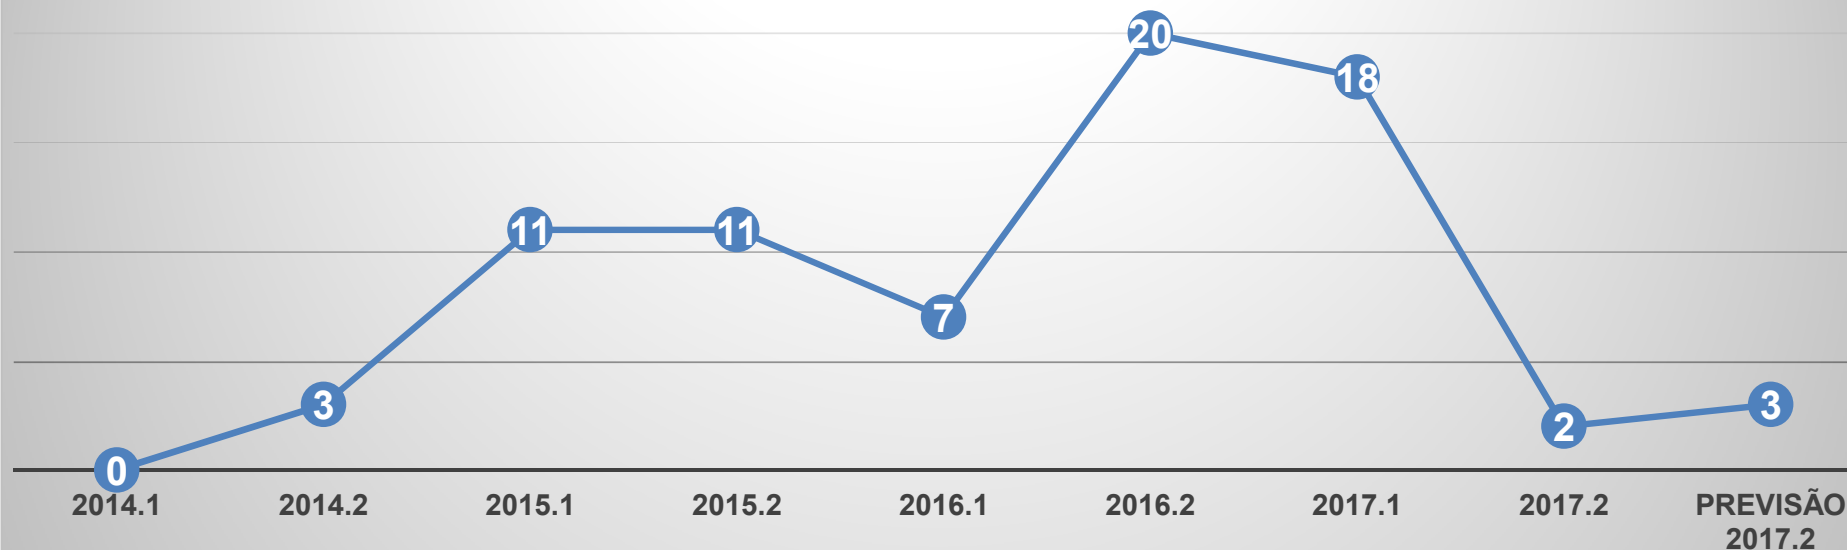


Descrição	Ano								
	2014.1	2014.2	2015.1	2015.2	2016.1	2016.2	2017.1	2017.2	Previsão 2017.2
Projetos a Contratar	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Contratos Assinados	0	3	11	11	7	20	18	2	3
Valores R\$	-	353.555	1.025.397	8.227.966	4.757.199	30.299.490	12.918.504	1.641.812	2.127.273
% Projetos a contratar por Contratos assinados	0%	4%	15%	15%	9%	27%	24%	3%	4%

Contratos Assistência Técnica

Setorial	Nº de Contratos	Nº de Contratos em Andamento	Nº de Contratos Concluídos	Valor Contratado + Patronal (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo a Pagar (R\$)	% PAGO
ARCE	1	-	1	839.982,65	839.982,65	-	100%
CGE	9	4	5	7.883.945,04	3.655.992,14	4.227.952,90	46%
COGERH	3	2	1	4.419.133,06	2.787.324,70	1.631.808,36	63%
FUNCEME	1	-	1	1.666.842,98	1.666.842,98	-	100%
IPECE	9	6	3	5.035.955,89	2.576.417,73	2.459.538,16	51%
SDE	2	0	2	1.148.959,99	1.148.959,99	-	100%
SECITECE	3	2	1	1.400.260,31	523.968,39	876.291,92	37%
SEDUC	19	11	8	8.594.233,11	4.073.916,93	4.520.316,18	47%
SEMA	7	5	2	7.223.217,54	3.423.689,65	3.799.527,89	47%
SEMACE	2	1	1	1.744.961,99	1.234.098,02	510.863,97	71%
SEPLAG	6	4	2	10.499.771,29	5.977.060,13	4.522.711,16	57%
SRH	3	2	1	3.048.215,88	1.373.815,26	1.674.400,62	45%
STDS	3	1	2	2.307.050,00	972.106,00	1.334.944,00	42%
TCE	4	1	3	3.164.958,37	1.302.314,26	1.862.644,11	41%
TOTAL	72	39	33	58.977.488,09	31.556.488,83	27.420.999,26	54%


Situação dos Contratos - Financeiro

Pago e Previsão de Pagamento da Assistência Técnica - PforR (R\$)							
Ano	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017 (Setembro)	Previsão 2017	Previsão 2018	PforR (Componente 2)
Valor	72.600	975.610	11.205.681	19.302.598	19.458.060	10.336.647	61.351.196

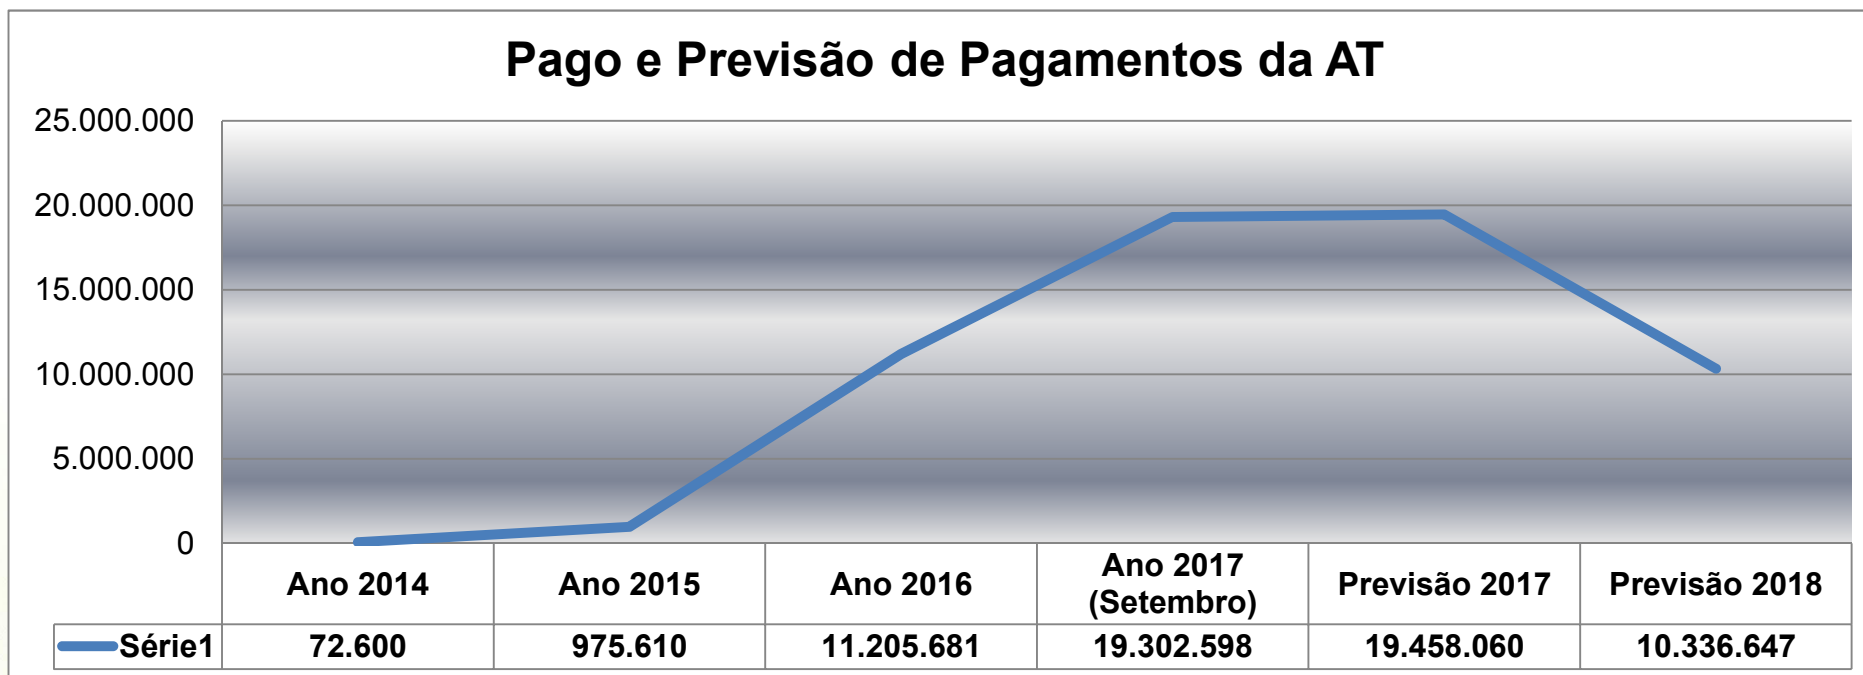

Situação dos Contratos – Aditivos de Prazo

Setorial	ARCE	CGE	COGERH	FUNCEME	SEMA	SEMACE	SEPLAG	SDE	SEDUC	STDS	SECITECE	IPECE	TCE	SRH	TOTAL
Nº Contratos	1	9	3	1	7	2	6	2	19	3	3	9	4	3	72
Aditivo de Prazo	0	1	0	1	1	0	4	0	8	4	1	10	3	1	34
%	0%	11%	0%	100%	14%	0%	67%	0%	42%	133%	33%	111%	75%	33%	47%

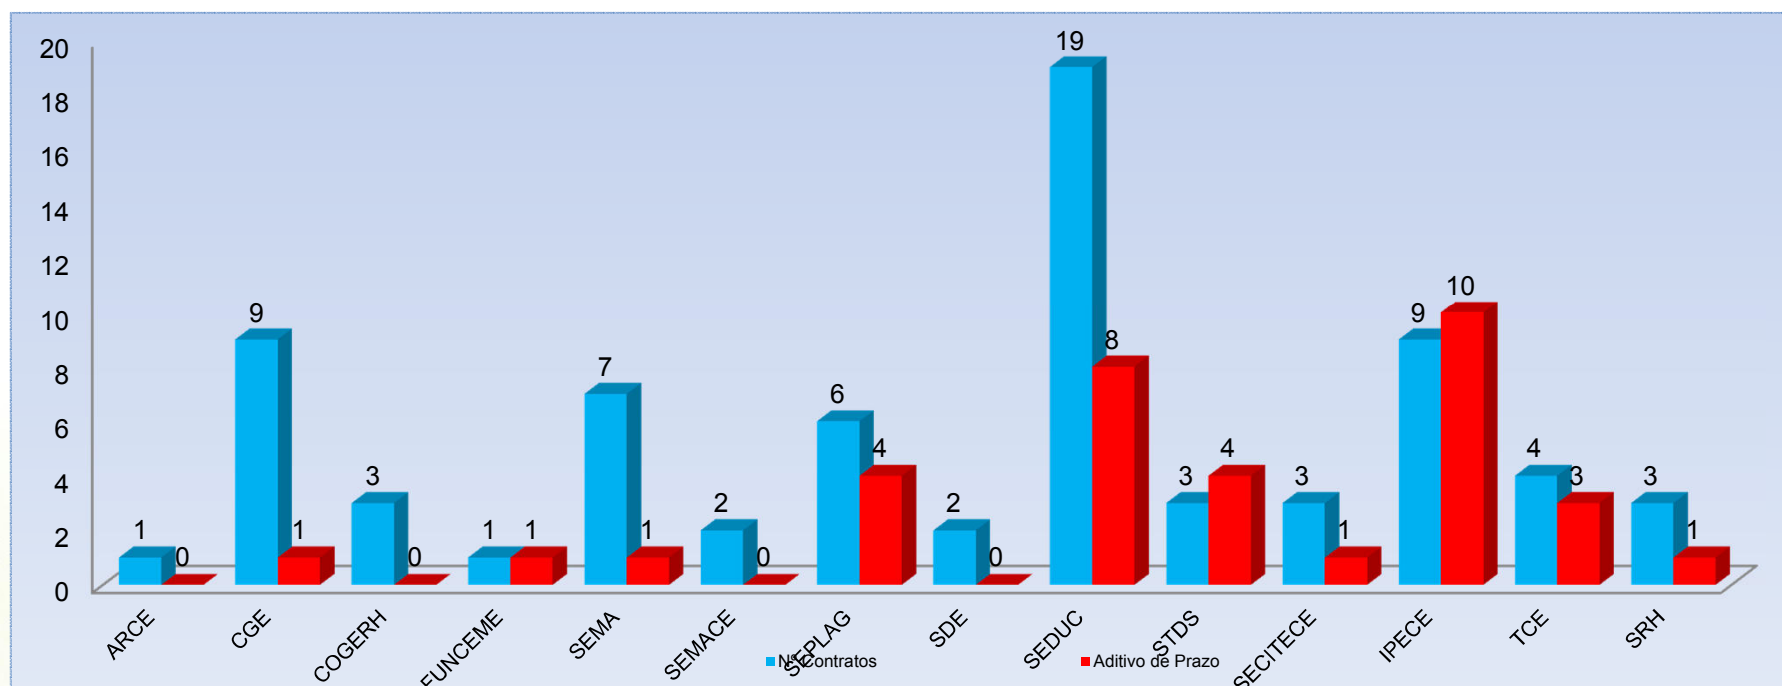

47% dos Contratos já foram elaborados Aditivos de Prazo



5. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR SETORIAL CONTRATADOS



ARCE

Subprojeto ARCE

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	ARCE	Desenvolvimento de modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

	Baixo - de 01 a 02 meses
	Médio - de 03 meses
	Alto - de 04 meses
	Altíssimo - acima de 04 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

ARCE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 1: Desenvolvimento de modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Subprojeto:** US\$ 342.109,75
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato nº 019/2016 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** RPG – Regulation, Performance and Governace Ltda.
- **Valor do Contrato + Taxas:** R\$ 839.982,65.



CGE

Subprojetos CGE

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	CGE	Auditoria Técnica dos Indicadores I.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
2	CGE	Auditoria Técnica dos Indicadores II.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	CGE	Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (NEGÓCIO SIEC).	Contrato Concluído Físico e Financeiro
4	CGE	Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SISTEMA SIEC).	Contrato em Execução
5	CGE	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	Contrato em Execução
6	CGE	Capacitação da população para o Controle Social.	Contrato em Execução
7	CGE	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	Contrato em Execução
8	CGE	Realização de treinamentos com foco no “apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público”.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
9	CGE	Consultoria individual especializada, em gestão documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

CGE- Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojetos 2 e 3: Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR. ¹

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 67.354,63
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévio
- **Início/Término:** Junho 2014 - Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contratos concluídos físico e financeiro.
- **Consultores:** Marcelo Ponte Barbosa e Túlio Cravo.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 152.302,30.

Nota 1: Auditoria será realizada pela equipe da CGE a partir do semestre 16.1

CGE - Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Subprojeto 4: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Marcelo Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 284.089,71
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2015 – Junho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato nº 08/2016 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** NTConsult Tecnologia e Consultoria LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 725.256,92

CGE - Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 5: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).

- **Responsável:** Carlos Jorge Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 658.560,58
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 026/2016 - Assinado em 07/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** Ivia Serviços de Informática Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.130.443,48.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo
2.130.443,48	745.655,20	1.384.788,28

CGE - Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 6: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.071.989,29
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 029/2016 – Assinado em 24/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** Caiena Desenvolvimento de Sistemas Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 3.467.885,35.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** [REDACTED]

Contrato	Pago	Saldo
3.467.885,35	1.525.869,53	1.942.015,82

CGE - Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 7: Capacitação da população para o Controle Social.

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 267.522,72
- **Método de Aquisição:** LPN
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 01/2017 – Assinado em 20/01/2017.
- **Consultora Vencedora:** Fundação Demócrito Rocha.
- **Valor do Contrato:** R\$ 865.436,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** [REDACTED]

Contrato	Pago	Saldo
865.436,00	173.087,20	692.348,80

CGE - Assistência Técnica - Gestão Pública

Subprojeto 8: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na “Detecção de Casos de Fraude e Corrupção” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.

- **Responsável:** Denise Andrade Araújo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 89.644,51
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Dezembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 07/2017, assinado em 13/06/2017.
- **Consultora Vencedora:** Deloitte Touche Tohatsu Consultores Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 290.000,00
- **Sinalização em relação ao Prazo:** [REDACTED]

Contrato	Pago	Saldo
290.000,00	81.200,00	208.800,00

Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 9: Realização de treinamentos com foco no “apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público”.

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 61.026,58
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 025/2016 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** KPMG Assessores Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 197.421,00.

CGE - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 10: Consultoria individual especializada, em gestão documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE.

- **Responsável:** Aglaio Soares
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 24.411,82
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Março de 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato nº 012/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultor:** Fernando Braga.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 55.200,00.



FUNCEME

Subprojeto FUNCEME

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	FUNCEME	Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

	Baixo - de 01 a 02 meses
	Médio - de 03 meses
	Alto - de 04 meses
	Altíssimo - acima de 04 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

FUNCEME - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 11: Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Francisco Hoilton
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Proposta Vencedora:** 679.677,00 (US\$ + €)
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Maio 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 10/2015, Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Aqualogus / Azurit.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.666.864,98 .



IPECE

Subprojetos IPECE

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	IPECE	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará - CONSULTORES PLENOS.	Contrato em Execução
2	IPECE	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará - CONSULTORES PLENOS.	Contrato Rescindido
3	IPECE	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. CONSULTOR JÚNIOR.	Contrato Rescindido
4	IPECE	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. ANALISTA LICITAÇÕES.	Contrato em Execução
5	IPECE	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. ANALISTA LICITAÇÕES.	Contrato Rescindido
6	IPECE	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. ANALISTA LICITAÇÕES.	Contrato em Execução
7	IPECE	Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR.	Contrato em Execução
8	IPECE	Desenvolvimento de sistemas de informação digital, para implementação e implantação de 02(dois) sistemas denominados IPECEDATA e sistema de monitoramento e avaliação dos projetos e beneficiários do FECOP.	Contrato em Execução
9	IPECE	Desenvolvimento de metodologias para planejamento e avaliação dos projetos estratégicos de investimentos do poder executivo do Estado do Ceará.	Contrato em Execução

CGE- Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojetos 12 e 13: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTORES PLENOS

- **Responsável:** Viviane Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 308.277,81
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Em Execução
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em execução. Sendo um contrato prestado os serviços na UGP da setorial e outro contrato rescindido.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

CGE- Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 14: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.
CONSULTOR JÚNIOR

- **Responsável:** Viviane Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 21.227,67
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato nº07/2014 - Rescindido.
- **Consultora:** Viviane Ramos da Costa.
- **Valor do Contrato:** R\$ 48.000,00.

CGE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojetos 15, 16 e 17: Contratação de 03 (três) **Analistas em Licitações** para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- **Responsável:** Viviane Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 247.994,30
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Em Execução
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** 01 contrato rescindido e 02 Contratos em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

CGE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 18: Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR.

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 120.504,68
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Agosto 2017
- **Estágio Atual:** Contrato nº 10/2015, assinado em 01/09/2015. Serviços em execução.
- **Consultora:** Carlos Alberto Manso.
- **Valor do Contrato:** R\$ 246.787,20.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

IPECE - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 19: Desenvolvimento de sistemas de informação digital, para implementação e implantação de 02(dois) sistemas denominados IPECEDATA e sistema de monitoramento e avaliação dos projetos e beneficiários do FECOP.

- **Responsável:** Mário Aragão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 682.482,48
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Dezembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 01/2017, assinado em 17/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** Nova Via Tecnologia e Mobilidade Ltda.
- **Valor do Contrato:** 2.187.903,10.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo
2.187.903,10	984.556,35	1.203.346,75

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 20: Desenvolvimento de metodologias para planejamento e avaliação dos projetos estratégicos de investimentos do poder executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 425.894,52
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 04/2017, assinado em 28/04/2017.
- **Consultora Vencedora:** Quadrante Consultoria Econômica Ltda.
- **Valor do Contrato:** 1.377.768,77.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** [REDACTED]

Contrato	Pago	Saldo
1.377.768,77	275.553,76	1.102.215,01



SDE / ADECE

Subprojetos SDE

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	SDE	Desenvolvimento do sistema FDI (Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas).	Contrato Concluído Físico e Financeiro
2	SDE	Impact Evaluation Workshop em Istambul.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	SDE	Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.	Em Licitação

	Baixo - de 01 a 02 meses
	Médio - de 03 meses
	Alto - de 04 meses
	Altíssimo - acima de 04 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

SDE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 21: Desenvolvimento do sistema FDI (Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas).

- **Responsável:** Fernando Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 388.117,50
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 03/2016, assinado em 26/08/2016.
- **Consultora Vencedora:** Ivia Serviços de Informática Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.142.416,04.

SDE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 22: Impact Evaluation Workshop Istambul

- **Responsável:** Inês Studart
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 2.894,02
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Maio 2015.
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** Casa Blanca / Maria Inês Cavalcante Studart Menezes.
- **Valor do Contrato:** R\$ 6.543,95.

SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 23: Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Filipe Rabelo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 569.255,26
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2016 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Solicitação de Proposta Lançada.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Solicitação de Proposta lançada em 11/09/2017. Reunião prévia realizada no dia 26/09/2017. Recebimento das Propostas Técnicas e Financeiras até as 16:00hrs do dia 11/10/2017.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SECITECE

Subprojetos SECITECE

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	SECITECE	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	Contrato em Execução
2	SECITECE	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	Contrato em Execução
3	SECITECE	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

	Baixo - de 01 a 02 meses
	Médio - de 03 meses
	Alto - de 04 meses
	Altíssimo - acima de 04 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 24: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.

- **Responsável:** Sandra Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 139.917,03
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 16/2017, assinado em 25/07/2017.
- **Consultora Vencedora:** Ferraro Projetos e Investimento Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 452.631,58
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Contrato	Pago	Saldo
452.637,58	0,00	452.637,58

SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 25: Elaboração do plano estadual de ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Sandra Monteiro / Tarcísio Hilter
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 240.716,10
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 06/2016, assinado em 20/04/2017.
- **Consultora Vencedora:** Macroplan Prospectivo, Estratégia e Gestão Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 770.291,53
- **Sinalização em relação ao Prazo:** [REDACTED]

Contrato	Pago	Saldo
770.291,53	346.631,19	423.660,34

SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 26: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

- **Responsável:** Sandra Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 57.428,61
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Abril 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato nº 16/2016, Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Maria Fatima Ludovico da Gama e Souza.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 177.593,20.



SEDUC

Subprojetos SEDUC

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	SEDUC	Elaborar as matrizes de referência e os itens para compor os testes da avaliação de desempenho dos estudantes do 3º ano de vinte cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais de educação profissional do Estado do Ceará.	Contrato em Execução
2	SEDUC	Formação Continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.	Contrato em Execução
3	SEDUC	Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará.	Contrato em Execução
4	SEDUC	Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará.	Contrato em Execução
5	SEDUC	Impact Evaluation Workshop em Istambul.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
6	SEDUC	CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
7	SEDUC	Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento.	Contrato em Execução
8	SEDUC	Desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.	Contrato em Execução
9	SEDUC	Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.	Contrato em Execução
10	SEDUC	Serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.	Contrato em Execução

Subprojetos SEDUC

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
11	SEDUC	Especialista em Avaliação de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
12	SEDUC	Desenvolvimento Infantil, com foco na educação, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Contrato Concluído Físico e Financeiro
13	SEDUC	Desenvolvimento Infantil, com foco na saúde, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Contrato Concluído Físico e Financeiro
14	SEDUC	Empresa especializada para elaboração de arte gráfica/design, revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, da Secretaria da Educação.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
15	SEDUC	Apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.	Contrato em Execução
16	SEDUC	Empresa de Consultoria especializada em visitas domiciliares e para formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Contrato em Execução
17	SEDUC	Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN. (Coleta de Dados).	Contrato em Execução
18	SEDUC	Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN.	Contrato em Execução
19	SEDUC	Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses.	Contrato em Execução

SEDUC- Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 27: Elaborar as matrizes de referência e os itens para compor os testes da avaliação de desempenho dos estudantes do 3º ano de vinte cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais de educação profissional do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 267.202,02
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Dezembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 154/2017, assinado em 16/08/2017.
- **Consultora Vencedora:** Universidade Federal de Juiz de Fora – Centro de Políticas Públicas de Avaliação da Educação (UFJF/CAED).
- **Valor do Contrato:** R\$ 864.398,52
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

SEDUC - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 28: Formação Continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 81.757,64
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Dezembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 079/2017, assinado em 18/04/2017.
- **Consultora Vencedora:** Elos Orientação e Planejamento Educacional Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 261.624,46.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** [REDACTED]

Contrato	Pago	Saldo
261.624,46	25.900,83	235.723,63

SEDUC- Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojetos 29 e 30: Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará (02 Consultores).

- **Responsável:** Luciano Nery
- **Categoria de Licitação:** CI
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 49.101,56
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2016 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contratos em Execução – Assinados no dia 15/03/2017.
- **Consultores:** Antônio Jussier de Vasconcelos Ramos e Fernando Andrade de Alcântara.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 158.843,52.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** [REDACTED]

Contrato	Pago	Saldo
158.843,52	50.541,12	108.302,40

SEDUC- Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 31: Impact Evaluation Workshop Istanbul

- **Responsável:** Luciano Nery
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 3.154,13
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Andréa Araújo Rocha Nibon.
- **Valor do Contrato:** R\$ 7.132,11.

SEDUC- Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 32: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 4.466,03
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Julho 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Maria Dagmar de Andrade Soares - Instituto de Ensino e Pesquisa INSUPER.
- **Valor do Contrato:** R\$ 10.098,59.

SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 33: Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento. WMS

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 16.506,96
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Setembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Nº 089/2017, assinado em 27/03/2017.
- **Consultor:** Samuel Simões Oliveira Franco.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 53.400,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Contrato	Pago	Saldo
53.400,00	22.162,11	31.237,89

SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 34: Desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 254.128,36
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº105/2017 em Execução. Assinado em 20/04/2017.
- **Consultora Vencedora:** Instituto da Primeira Infância - IPREDE.
- **Valor do Contrato:** R\$ 822.105,26.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** [REDACTED]

Contrato	Pago	Saldo
822.105,26	287.736,84	534.368,42

SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 35: Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 116.608,86
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2016 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução - nº 028/2017 Assinado em 07/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** ECART Projetos e Gestão Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 377.229,65.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** [REDACTED]

Contrato	Pago	Saldo
377.229,65	159.887,17	217.342,48

SEDUC- Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 36: Serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 15.956,25
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2016 – junho 2017
- **Estágio Previsto:** Em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução, nº 021/2017, assinado em 07/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** Expressão Gráfica e Editora Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 51.060,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Contrato	Pago	Saldo
51.060,00	0,00	51.060,00

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 37: Especialista em **Avaliação** de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa.*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor Subprojeto:** US\$ 4.139,40
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2014 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato nº 018/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultor:** Flávio Augusto Rezende Cunha.
- **Valor do contrato:** R\$ 9.360,00.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 38: Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 25.207,85
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato nº 017/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Fátima Maria Araújo Saboia Leitão.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 47.500,00.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 39: Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 29.188,04
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato nº 014/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Ana Cecília Silveira Lins Sucupira.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 55.000,00.

SEDUC - Assistência Técnica –Assistência à Família

*Subprojeto 40: Empresa Especializada para Elaboração de **Arte Gráfica/Design**, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 61.838,85
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Setembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato nº 029/2016 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 139.830,00.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 41: Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 372.482,21
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Setembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – nº 214/2016, assinado em 12/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** VC Promoções e Eventos Ltda – EPP.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.204.979,94 .
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Contrato	Pago	Saldo
1.204.979,94	675.810,23	529.169,71

SEDUC - Assistência Técnica –Assistência à Família

*Subprojeto 42: Empresa de Consultoria Especializada em **Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil** e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 202.891,81
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Setembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 236/2016, assinado em 30/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** CASAM – Centro de Apoio Social e de Animação Missionária.
- **Valor do Contrato:** R\$ 656.355,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Contrato	Pago	Saldo
656.355,00	360.995,25	295.359,75

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 43: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN. (Coleta de Dados).

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 1.155.818,22
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Outubro 2017
- **Estágio Previsto:** Contato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 214/2016, assinado 28/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** Overview Serviços & Informação Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 3.739.071,95.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo
3.739.071,95	2.093.879,94	1.645.192,01

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 43: Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 17.458,44
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Outubro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Rescindido – Contrato nº 253/2016, assinado 19/10/2016.
- **Consultora Vencedora:** Rafaela Martins Leite Monteiro.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 45.694,11.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 44: Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 21.653,79
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2016 – Outubro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução, nº 30/2017 – Assinado no dia 20/07/2017.
- **Consultora Vencedora:** Patrícia Simões.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 70.050,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo
70.050,00	10.828,63	59.221,37



SEMA

Subprojetos SEMA

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	SEMA	Elaboração do projeto “Avaliação do Impacto Econômico da Degradação Ambiental.”	Contrato em Execução
2	SEMA	Desenvolvimento e execução de projeto em educação ambiental para a qualidade da água nas três bacias estratégicas.	Contrato em Execução
3	SEMA	Apoio Logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas três bacias estratégicas.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
4	SEMA	Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e programas do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
5	SEMA	Desenvolver projeto de lei que institui o programa de serviços ambientais no Estado do Ceará.	Contrato em Execução
6	SEMA	Elaboração do Plano de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto – 81 municípios.	Contrato em Execução
7	SEMA	Desenvolver Implementação da Coleta Seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	Contrato em Execução

	Baixo - de 01 a 02 meses
	Médio - de 03 meses
	Alto - de 04 meses
	Altíssimo - acima de 04 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 46: Elaboração do projeto “Avaliação do Impacto Econômico da Degradação Ambiental.” (AIEDA)

- **Responsável:** Maria Dias / Magda Marinho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 376.432,70
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 18/2016, assinado em 16/08/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Aquino – Mcrit SL – Barcelona Brasil Group.
- **Valor do Contrato + Taxa:** R\$ 851.841,63.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** [REDACTED]

Contrato	Pago	Saldo
851.841,63	606.193,06	244.996,57

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 47: Desenvolvimento e execução de projeto em educação ambiental para a qualidade da água nas três bacias estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 314.274,86
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 06/2016, assinado em 25/02/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Engesoft Engenharia / Quanta Consultoria Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 710.638,32.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo
710.638,32	639.574,48	71.063,84

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 48: Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor Subprojeto:** US\$ 96.162,05
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato nº 26/2016 - Concluído Físico e Financeiro..
- **Consultora Vencedora:** Empresa MSV Multiserviços ME.
- **Valor do Contrato:** R\$ 242.557,52.

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 49: Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e programas do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Maria Dias / Francisco Leorne
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** 202.789,54
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2014 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 16/2016 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** Arcadis Logos S.A.
- **Valor do Contrato:** R\$ 563.157,73.

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 50: Desenvolver projeto de lei que institui o programa de serviços ambientais no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Maria Dias / Monica Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 217.760,38
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 08/2017, assinado em 09/02/2017.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio STCP Engenharia de Projetos Ltda – Ludovino Lopes, Ricci e Santos Sociedade de Advogados.
- **Valor do Contrato:** R\$ 696.833,21.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** [REDACTED]

Contrato	Pago	Saldo
696.833,21	0,00	696.833,21

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 51: Elaboração do Plano de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto – 81 municípios.

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 1.153.752,25
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 20/2016, assinado em 01/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** Bureau de Projetos e Consultoria Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.608.864,60.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** [REDACTED]

Contrato	Pago	Saldo
2.608.864,60	913.102,61	1.695.761,99

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 52: Desenvolver Implementação da Coleta Seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 478.827,98
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Dezembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 19/2017, assinado em 20/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** I&T Informações e Técnicas em Construção Civil Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.549.008,53.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** [REDACTED]

Contrato	Pago	Saldo
1.549.008,53	464.702,56	1.084.305,97



SEMACE

Subprojetos SEMACE

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	SEMACE	Elaboração do planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.	Contrato em Execução
2	SEMACE	Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE	Contrato Concluído Físico e Financeiro

	Baixo - de 01 a 02 meses
	Médio - de 03 meses
	Alto - de 04 meses
	Altíssimo - acima de 04 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

SEMACE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 53: Elaboração do planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.

- **Responsável:** Elizabeth Romão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 331.484,70
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Dezembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 01/2017, assinado no dia 10/01/2017.
- **Consultora Vencedora:** Tramitty Serviços LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.072.352,99.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** [REDACTED]

Contrato	Pago	Saldo
1.072.352,99	561.489,02	510.863,97

SEMACE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 54: Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE.

- **Responsável:** Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 207.916,23
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 20/2016 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** MBS CONSULTING – MBS Estratégias e Sistemas Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 672.609,00.



SEPLAG

Subprojetos SEPLAG

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	SEPLAG	Concepção de Metodologia de Planejamento de Investimentos.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
2	SEPLAG	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	SEPLAG	Empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.	Contrato em Execução
4	SEPLAG	Empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do Ceará.	Contrato em Execução
5	SEPLAG	Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.	Contrato em Execução
6	SEPLAG	Desenvolvimento do projeto de Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	Contrato em Execução
7	SEPLAG	Consultor Individual - Otimização das Rotas. (Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará). ROTEIRIZAÇÃO	Em Licitação
8	SEPLAG	Contratação de Consultor Individual - Plano Estratégico de Gestão das Frotas. (Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará).	Em Licitação

SEPLAG - Assistência Técnica - Gestão Pública

Subprojeto 55: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

- **Responsável:** Adauto Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 504.550,12
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2014 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 17/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora vencedora:** Consórcio Macroplan e Transplan.
- **Valor do Contrato:** 1.140.888,73.

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 56: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial.

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.171.522,32
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Janeiro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 23/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora vencedora:** Macroplan Prospectiva, Estratégia e Gestão S/S Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ 2.667.519,34.

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 57: Empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Dominique Gomes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 317.051,64
- **Método de Aquisição:** SBQ
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução. Contrato nº 29/2016, assinados em 04/10/2016.
- **Consultora vencedora:** Consórcio IADH x DELOS.
- **Valor do contrato:** R\$ 1.025.662,05.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**



Contrato	Pago	Saldo
1.025.662,05	820.529,64	205.132,41

SEPLAG - Assistência Técnica - Gestão Pública

Subprojeto 58: Empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Fábio Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 693.972,18
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 25/2016, assinado em 16/09/2016.
- **Consultora vencedora:** Deloitte Touche Tohatsu Consultores Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ R\$ 2.245.000,00 .
- **Sinalização em relação ao Prazo:** [REDACTED]

Contrato	Pago	Saldo
2.245.000,00	738.000,00	1.507.000,00

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 59: Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Silvana Dourado
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 818.677,30
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 02/2017, assinado em 24/03/2017.
- **Consultora vencedora:** Elogroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ 2.648.421,05.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**



Contrato	Pago	Saldo
2.648.421,05	92.694,74	2.555.726,31

SEPLAG - Assistência Técnica – Fiduciário

Subprojeto 60: Desenvolvimento do projeto de Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 238.726,47
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 32/2016, assinado em 23/11/2016.
- **Consultora vencedora:** NTConsult Tecnologia e Consultoria Ltda.
- **Valor do contrato:** R\$ 772.280,12.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Contrato	Pago	Saldo
772.280,12	517.427,68	254.852,44

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 61: Consultor Individual - Otimização das Rotas. (Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará). ROTEIRIZAÇÃO

- **Responsável:** André Theophilo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 37.620,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2017 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Negociação do Contrato
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial está elaborando a ata da reunião de negociação e minuta de contrato, após reunião no dia 26/09.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 62: Contratação de Consultor Individual - Plano Estratégico de Gestão das Frotas. (Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará).

- **Responsável:** André Theophilo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 49.335,00
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2017 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Negociação do Contrato
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial está elaborando a ata da reunião de negociação e minuta de contrato, após reunião no dia 22/09.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SRH

Subprojetos SRH

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	SRH	Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga e Cobrança.	Contrato em Execução
2	SRH	Sistema de Informação de Gestão dos Recursos Hídricos (cadastro, fiscalização, outorga, monitoramento qualitativo, segurança de barragens e medição) com Integração com o Sistema Administrativo Financeiro PROTHEUS.	Contrato em Execução
3	SRH	Consultor Individual - Malha D'agua.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

	Baixo - de 01 a 02 meses
	Médio - de 03 meses
	Alto - de 04 meses
	Altíssimo - acima de 04 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 63: Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.

- **Responsável:** Deborah Mithya e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 431.620,55
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 02/2016, assinado em 27/10/2016.
- **Consultora Vencedora:** IBI Engenharia Consultiva.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.396.292,47.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** [REDACTED]

Contrato	Pago	Saldo
1.396.292,47	936.772,62	459.519,85

SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 64: Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. **SIGERH***

- **Responsável:** Deborah Mithya e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 403.809,40
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 03/2016, assinado em 23/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** Capgemini Consulting Technology Outsourcing.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.306.323,41.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo
1.306.323,41	91.442,64	1.214.880,77

SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 65: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - **Malha D'agua**.*

- **Responsável:** Deborah Mithya e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do TOR:** US\$ 127.697,05
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Contrato 01/2016, Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Dorian Ponte Lima
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 345,600,00.



COGERH

Subprojetos COGERH

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	COGERH	Fortalecimento do Manejo Estadual de Recursos Hídricos.	Contrato em Execução
2	COGERH	Empresa para Elaborar o Plano de Segurança Hídrica.	Contrato em Execução
3	COGERH	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acaraú e Salgado).	Contrato Concluído Físico e Financeiro

	Baixo - de 01 a 02 meses
	Médio - de 03 meses
	Alto - de 04 meses
	Altíssimo - acima de 04 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 66: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Qualiquantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 677.500,59
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 48/2015, assinado em 24/11/2015.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Água e Solo / Quanta / Engeplus.
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.954.015,55.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo
1.954.015,55	1.397.696,08	556.319,47

COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 67: Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 742.914,10
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 21/2016, assinado em 19/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Nippon Koei Latin America - Caribbean Co. Ltd. / Nippon Koei LAC do Brasil Ltda.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.403.327,11.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** [REDACTED]

Contrato	Pago	Saldo
2.403.327,11	1.327.838,22	1.075.488,89

COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 68: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor Subprojeto:** US\$ 27.326,28
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Outubro 2015
- **Estágio Atual:** Contrato nº 25/2015, Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Rosana Garjulli Sales Costa.
- **Valor do Contrato + Patronal :** R\$ 61.790,40.



STDS

Subprojetos STDS

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	STDS	Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias visando o Aprofundamento desse Referencial teórico operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
2	STDS	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	STDS	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.	Contrato em Execução

	Baixo - de 01 a 02 meses
	Médio - de 03 meses
	Alto - de 04 meses
	Altíssimo - acima de 04 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 69: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 64.213,69
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Novembro 2016
- **Estágio Atual:** Contrato nº 22/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora:** Maria Cílvia Queiroz.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 145.200,00.

STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 70: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 63.174,42
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Setembro 2015
- **Estágio Atual:** Contrato nº 17/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** Empresa Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- **Valor do Contrato:** R\$ 142.850,00.

STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 71: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 892.888,73
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico (NCB)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução - Contrato nº 058/2016, assinado em 25/05/2016.
- **Consultora Vencedora:** Maestria Comunicação e Eventos LTDA - EPP.
- **Valor do Contrato:** R\$ 2.019.000,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Contrato	Pago	Saldo
2.019.000,00	684.056,00	1.334.944,00



TCE

Subprojetos TCE

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	TCE	Desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.	Contrato em Execução
2	TCE	Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.	Contrato Concluído Físico e Financeiro
3	TCE	Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).	Contrato Concluído Físico e Financeiro
4	TCE	Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem Como, o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De Direito Financeiro.	Contrato Concluído Físico e Financeiro

	Baixo - de 01 a 02 meses
	Médio - de 03 meses
	Alto - de 04 meses
	Altíssimo - acima de 04 meses - Inviabiliza o Projeto
	Contrato Concluído Físico e Financeiro
	Contratos em Execução

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 72: Desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.

- **Responsável:** Glinton Ferreira / Delinda Almeida
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 834.461,49
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/ Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 21/2016 em Execução. Assinado em 28/07/2017.
- **Consultora Vencedora:** Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
- **Valor do Contrato:** 2.699.484,21.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** [REDACTED]

Contrato	Pago	Saldo
2.699.484,21	836.840,10	1.862.644,11

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 73: Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 61.694,57
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Agosto 2016
- **Estágio Atual:** Contrato nº 15/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultor:** Roberto Vilela Resende.
- **Valor do Contrato + Despesas Reembolsáveis:** R\$ 139.503,76.

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 74: Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 100.915,62
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Atual:** Contrato nº 12/2015 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultor:** Carlos Roberto Takao Yoshioka.
- **Valor do Contrato + Patronal:** R\$ 228.190,40.

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 75: Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem Como, o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De Direito Financeiro.

- **Responsável:** Glinton Ferreira
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 30.225,66
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico (NCB)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2016 – Setembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato nº 06/2017 - Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora Vencedora:** DF Turismo e Eventos Ltda-ME.
- **Valor do Contrato:** R\$ 97.780,00.



6. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS: PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Contratos Encerrados – Consultoria de Empresa

QTD.	Setoriais	Subprojeto	Contrato	Apresentação
1	SEPLAG	Concepção de Metodologia de Planejamento de Investimentos.	Contrato Nº 017/2015	-
2	SEPLAG	Empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.	Contrato Nº 029/2016	-
3	SECITECE	Realização de estudo para avaliar a viabilidade para um parque tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Contrato Nº 016/2016	-
4	SDE	Desenvolvimento de Sistemas de Monitoramento das Empresas Incentivadas (FDI) do Estado do Ceará.	Contrato Nº 003/2016	-
5	SRH	Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Elaboração de Mapa do Estado do Ceará com a disposição das Adutoras - Malha D'Água.	Contrato Nº 001/2016	-



7. APROVAÇÃO DA ATA

43ª REUNIÃO COMITÊ *PforR* (31/08/2017)

Próxima Reunião do Comitê PforR

Próxima Reunião do Comitê PforR:

26/10/2017
14h30m - IPECE



8. ENCERRAMENTO

Unidade de Gerenciamento do Projeto PforR (UGP)
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora
Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N
Ed. SEPLAG, 2º andar- Fortaleza-CE
Tel.: (85) 3101.3499 e (85) 3101.3510
