



32ª REUNIÃO DO COMITÊ *PforR*
ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO
PROJETO *PforR*
29 DE SETEMBRO DE 2016



PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

1. Abertura e apresentação dos participantes (14h30-14h35)
2. Algumas Informações (14:35 – 14h45m):
 - 2.1 Posição da Reestruturação do PforR
 - 2.2 Missão de Supervisão do Banco Mundial
3. Indicadores, Plano de Ação, Programas e Assistência Técnica (14h45 - 16h)
 - 3.1. Indicadores Primários 2016.2 e Desembolsos - Laura Gonçalves
 - 3.2. Indicadores Secundários 2016.2 - Laura Gonçalves
 - 3.3. Plano de Ação de Mitigação de Riscos – Laura Gonçalves
 - 3.4. Programas PforR - Thâmara Teixeira
 - 3.5. Assistência Técnica: Estatísticas – Lívia Castro e Rodrigo Almeida
 - 3.6. Tempo disponível do PforR - Lívia Castro
 - 3.7. Projetos de Assistência Técnica em situação de risco - Lívia Castro
 - 3.8. Monitoramento dos Contratos – André Morel
 - 3.9. Pontos Principais de Aquisições – Giuseppe Nogueira
 - 3.10. Projetos de Assistência Técnica por Setorial - Viviane Ramos / Giuseppe Nogueira
4. Aprovação da Ata da 31ª Reunião (25/08/2016) (16h - 16h10m)
5. Encaminhamentos (16h10m - 16h20m)
6. Encerramento (16h20m)



1. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES



2. ALGUMAS INFORMAÇÕES



2.1 Posição da Reestruturação do PforR

2.1 Posição da Reestruturação do PforR

✓Cronograma:

| Atividades | Datas Previstas | Datas Realizado |
|--|-----------------|-----------------------|
| 1. A Justificativa Técnica será analisada pelo Grupo Técnico da COFIEIX | 13/07/16 | 13/07/16 |
| 2. Encaminhamento do documento à Secretaria do Tesouro Nacional - STN | 12/08/16 | 12/08/16 |
| 3. Conclusão do Parecer da PGFN | 26/08/16 | Está a 47 dias na STN |
| 4. Retorno ao Banco Mundial e ao Estado do Ceará aprovando a elaboração do Aditivo | 05/09/16 | |
| 5. Previsão para assinatura do Aditivo de reestruturação do PforR | 15/09/16 | |



2.2 Missão de Supervisão do Banco Mundial

2.2 Missão de Supervisão do Banco Mundial

I. Missão de Supervisão do Eixo Gestão Pública: **10-17/10/2016**

- ✓ Tiago Peixoto
- ✓ Ângela Porto
- ✓ Bruce Macthel

II. 6ª Missão de Supervisão: **17-21/10/2016**

- ✓ Cristian Quijada
- ✓ Ângela Porto
- ✓ Gunars Platais
- ✓ Mark Dutz



3. INDICADORES, PLANO DE AÇÃO, PROGRAMAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA



3.1. Indicadores Primários 2016.1 e Desembolsos

INDICADORES PRIMÁRIOS 1º SEMESTRE 2016: Realizado

| nº | Nome do Indicador | Setorial | Período | Meta | Realizado | Valor US\$ | |
|---|-------------------|--|---------|--------|---|--|--------------|
| 1 | 1 | DLI 1: Aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação | SDE | 2016.1 | Uma Ação do Plano de Ação Implementado | A Ação 06 do Plano de Ação foi implementada | 3.444.000,00 |
| 2 | 2 | DLI 2: estabelecimento do sistema de monitoramento para programas TVET | SEDUC | 2016.1 | Primeiro relatório de monitoramento publicado. | Primeiro relatório de acompanhamento publicado | 3.444.000,00 |
| 3 | 3 | DLI 3: número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos. | SEDUC | 2016.1 | 13 | 13 acordos firmados | 3.444.000,00 |
| 4 | 4 | DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas | SEPLAG | 2016.1 | 55% | 55% | 3.444.000,00 |
| 5 | 5 | DLI 7: Estabelecimento de um comitê multisetorial de segurança hídrica | SRH | 2016.1 | Atas das últimas duas reuniões do Comitê realizadas no primeiro semestre do ano 2016. | Duas Atas de Reuniões realizadas | 3.444.000,00 |
| 6 | 6 | DLI 9: Índice da qualidade da fiscalização ambiental | SEMA | 2016.1 | 65% | 65,74% | 3.444.000,00 |
| 7 | 7 | DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada. | SEPLAG | 2016.1 | 5% | - | 3.444.000,00 |
| Total Metas 1º semestre 2016 cumpridas | | | | | | 24.108.000,00 | |
| 8 | 1 | DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada. ¹ | SEPLAG | 2016.2 | 10% | 20% | 3.438.000,00 |
| Indicador 2º semestre 2016 cumpridas | | | | | | 3.438.000,00 | |
| 9 | 1 | DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada | SEPLAG | 2014.2 | Aprovação da metodologia | Metodologia Aprovada | 6.198.000,00 |
| Indicador 2º semestre 2014 cumpridas | | | | | | 6.198.000,00 | |
| Valor desembolsado em setembro 2016 (06/09/16) | | | | | | 33.744.000,00 | |

INDICADORES PRIMÁRIOS - Adiantamento

| Nº | Nome do Indicador | Setorial | Período | Meta | Realizado | Valor US\$ | STATUS |
|--|--|----------|---------|--|-----------|----------------------|--------|
| 1 | DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados. | SEPLAG | 2014.2 | Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará | - | 6.198.000,00 | |
| 2 | DLI 3: número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos. | SEDUC | 2016.2 | 15 | - | 3.438.000,00 | |
| 3 | DLI 7: Estabelecimento de um comitê multisetorial de segurança hídrica | SRH | 2016.2 | Atas das últimas duas reuniões do Comitê realizadas no segundo semestre do ano 2016. | - | 3.438.000,00 | |
| Valor Adiantamento desembolsado em setembro 2016 (09/09/16) | | | | | | 13.074.000,00 | |

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2016

| n° | SETORIAL RESPONSÁVEL | Indicadores | | | Metas | |
|--|----------------------|-------------|-------|---|--|---|
| | | N° | DLI | Nome | 2016 | |
| | | | | | 1° Semestre | 2° Semestre |
| 1 | SDE | 1 | DLI1 | Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação | Uma ação do plano de ação implementado | - |
| 2 | SEDUC | 2 | DLI2 | Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP | Primeiro relatório de acompanhamento publicado | - |
| | | 3 | DLI3 | Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso. | 13 | 15 |
| 3 | STDS | 4 | DLI4 | Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS. | - | 7% |
| | | 5 | DLI5 | Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família. | 42.5% | 55% |
| 4 | SEPLAG | 6 | DLI6 | Percentual de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com Marco Lógico implementado. | 55% | 70% |
| 5 | SRH | 7 | DLI7 | Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água. | Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas | Minutas de pelo menos duas reuniões |
| 6 | CAGECE | 8 | DLI8 | Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto | 85.2% | 85.5% |
| 7 | SEMA/SEMACE/COGERH | 9 | DLI9 | Índice de qualidade da fiscalização ambiental. | 65% | 70% |
| 8 | FUNCEME | 10 | DLI10 | Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água. | - | Metodologia implementada em um reservatório estratégico |
| 9 | SEPLAG | 11 | DLI11 | Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados. | 3 | 4 |
| | | 12 | DLI12 | Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada. | 5% | 10% |
| Total de Indicadores em 2016: 12 Indicadores | | | | | | |
| Total de Indicadores com metas para o 1º Semestre: 10 Indicadores | | | | | | |

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

| Indicador | Setorial Responsável | Semestres | Metas | Valores em US\$ | Farol |
|--|-----------------------------|---------------------------|-------|-----------------|-------|
| DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos. | SEDUC Rivanir Bezerra | 2015.1 | 10 | 2.744.444,00 | ■ |
| | | 2015.2 | 12 | 3.403.750,00 | ■ |
| | | 2016.1 | 13 | 3.444.000,00 | ■ |
| | | 2016.2 | 15 | 3.438.000,00 | |
| | | 2017.1 | 16 | 3.444.000,00 | |
| | | 2017.2 | 18 | 3.120.000,00 | |
| | | Total do Indicador | | | |


Legenda: ■ Metas alcançadas

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2016


| Indicador | Setorial Responsável | Meta | Realizado | Status |
|--|--------------------------|------------|---------------------|---|
| DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso. | SEDUC Rivanir Bezerra | 15 acordos | 13 acordos firmados | A SEDUC assinou o 14º Termo com a empresa Jangadeiro e já dialoga com 2 novas empresas para que sejam feitas novas parcerias. |

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

| Indicador | Setorial Responsável | Semestres | Metas* | Valores em US\$ | Farol |
|--|--------------------------------------|---------------------------|--------|-----------------|---|
| DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS. | STDS Sebastião Lopes Mary Anne | 2015.2 | 5% | 3.403.750,00 |  |
| | | 2016.2 | 7% | 3.438.000,00 | |
| | | 2017.2 | 10% | 3.120.000,00 | |
| | | Total do Indicador | | | 9.961.750,00 |

*As metas deste Indicador foram alteradas na reestruturação, anteriormente eram: 10%, 15% e 25%

Legenda:  Meta alcançada em 5,11%


INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

| Indicador | Setorial Responsável | Meta | Realizado | Status |
|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|--|
| DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS. | STDS Sebastião Lopes Mary Anne | 7% ¹ | 5,11% | A articulação está sendo realizada com os gestores e equipes municipais, para a execução do acompanhamento familiar. O Sistema de Monitoramento da STDS está em fase de teste pela Equipe de Tecnologia da Informação e do PforR na STDS, onde estão sendo inseridos o registro das visitas de acompanhamento familiar já realizadas. |

¹Meta alterada por ocasião da reestruturação do PforR

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

| Indicador | Setorial Responsável | Semestres | Metas | Valores em US\$ | Farol | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|-------|-----------------|-------|---------------|--|
| DLI 5: Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família. | STDS Sebastião Lopes Mary Anne | 2015.1 | 15% | 2.744.444,00 | | | |
| | | 2015.2 | 30% | 3.403.750,00 | | | |
| | | 2016.1 | 42.5% | 3.444.000,00 | | | |
| | | 2016.2 | 55% | 3.438.000,00 | | | |
| | | 2017.1 | 75% | 3.444.000,00 | | | |
| | | 2017.2 | 95% | 3.120.000,00 | | | |
| | | Total do Indicador | | | | 19.594.194,00 | |


Legenda:  Metas alcançadas

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2016

| Indicador | Setorial Responsável | Meta | Realizado | Status |
|---|--------------------------------------|------|-----------|---|
| DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar. | STDS Sebastião Lopes Mary Anne | 55% | 96,36% | Até julho de 2016 foram capacitados um total de 173 técnicos de referência, dentre estes, 80 de Nível Superior e 93 de Nível Médio, de 34 municípios da área de abrangência do PforR, atingindo 53 CRAS, o equivalente a 96,36% do total de 55 CRAS, cumprindo-se, portanto, as metas referentes ao 1º e 2º semestre de 2017, de 75% e 95% respectivamente. |

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

| Indicador | Setorial Responsável | Semestres | Metas | Valores em US\$ | Farol |
|--|------------------------|---------------------------|-------|-----------------|-------|
| DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas | SEPLAG José Freitas | 2015.1 | 22.5% | 2.744.444,00 | |
| | | 2015.2 | 45% | 3.403.750,00 | |
| | | 2016.1 | 55% | 3.444.000,00 | |
| | | 2016.2 | 70% | 3.438.000,00 | |
| | | 2017.1 | 82.5% | 3.444.000,00 | |
| | | 2017.2 | 95% | 3.120.000,00 | |
| | | Total do Indicador | | | |

Legenda:  Metas alcançadas

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2016

| Indicador | Setorial Responsável | Meta | Realizado | Status |
|--|------------------------|------|-----------|--|
| DLI 6: Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas. | SEPLAG José Freitas | 70% | 60% | <p>A Equipe elaborou um planejamento de atividades com o seguinte cronograma (início em outubro e término na primeira quinzena de dezembro):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Levantamento de Projetos 2. Oficinas para a elaboração dos Marco-Lógicos; 3. Revisões e elaboração do Relatório. |

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

| Indicadores | Setorial Responsável | Semestres | Metas | Valores em US\$ | Farol |
|---|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|----------------------|
| DLI 7: Estabelecimento de um Comitê multissetorial de Segurança Hídrica. | SRH Carlos Campelo | 2013.2 | Comitê instituído pelo decreto | 39.375.000,00 | |
| | | 2015.1 | Diagnóstico de Bacias completos | 2.744.444,00 | |
| | | 2016.1 | Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas | 3.444.000,00 | |
| | | 2016.2 | Minutas de pelo menos duas reuniões | 3.438.000,00 | |
| | | 2017.1 | Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas | 3.444.000,00 | |
| | | 2017.2 | Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas | 3.120.000,00 | |
| | | Total do Indicador | | | 55.565.444,00 |

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

| Indicador | Setorial Responsável | Metas | Realizado | Status |
|---|-------------------------------|--|-----------|---|
| <p>DLI 7: Estabelecimento do Comitê multisetorial de Segurança da Água.</p> | <p>SRH Carlos Campelo</p> | <p>Atas de pelo menos duas reuniões realizadas</p> | <p>-</p> | <p>Estão previstas, para o segundo semestre de 2016, três reuniões do CONERH. A próxima deverá ocorrer no dia 18/10/16 e logo que as duas atas estejam devidamente aprovadas, estas serão encaminhadas para comprovação de indicador.</p> |

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

| Indicador | Setorial Responsável | Semestres | Metas | Valores em US\$ | Farol |
|---|----------------------------|---------------------------|-------|-----------------|-------|
| DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto. | CAGECE Carlos Rossas | 2014.1 | 83.8% | 5.250.000,00 | |
| | | 2014.2 | 84.3% | 6.198.000,00 | |
| | | 2015.1 | 84.6% | 2.744.444,00 | |
| | | 2015.2 | 84.9% | 3.403.750,00 | |
| | | 2016.1 | 85.2% | 3.444.000,00 | |
| | | 2016.2 | 85.5% | 3.438.000,00 | |
| | | 2017.1 | 85.7% | 3.444.000,00 | |
| | | 2017.2 | 85.9% | 3.120.000,00 | |
| | | Total do Indicador | | | |

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

| Indicador | Setorial Responsável | Meta | Realizado | Status |
|---|-------------------------|-------|-----------|--|
| DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto | CAGECE Carlos Rossas | 85.5% | 86,63% | <p>Esse indicador foi cumprido em 2015.2 com o resultado de 86,05%.</p> <p>O resultado do mês de agosto foi de <u>86,66%</u>.</p> |





INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

| Indicadores | Semestres | Metas | Valores em US\$ | Farol |
|--|---------------------------|-------|-----------------|---------------|
| DLI 9: Índice da qualidade da fiscalização ambiental | 2014.1 | 28% | 5.250.000,00 | ■ |
| | 2014.2 | 40% | 6.198.000,00 | ■ |
| | 2015.1 | 50% | 2.744.444,00 | ■ |
| | 2015.2 | 60% | 3.403.750,00 | ■ |
| | 2016.1 | 65% | 3.444.000,00 | ■ |
| | 2016.2 | 70% | 3.438.000,00 | |
| | 2017.1 | 75% | 3.444.000,00 | |
| | 2017.2 | 80% | 3.120.000,00 | |
| | Total do Indicador | | | 31.042.194,00 |

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

| Indicador | Setorial Responsável | Meta | Realizado | Status |
|---|---|------------|-----------|---|
| DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental. | SEMA Maria Dias SEMACE Tiago Bessa COGERH Denilson Fidelis | 70% | 65,50% | 68,62% (Medição referente a agosto/2016). |

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

| Indicador | Setorial Responsável | Semestres | Metas | Valores em US\$ | Farol |
|--|-------------------------|------------------------|---|-----------------|--|
| DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água. | FUNCEME Hoilton Rios | 2015.1 | Metodologia de monitoramento definida e adotada. | 2.744.444,00 |  |
| | | 2015.2 | Protocolo de coleta de dados definida e adotada. | 3.403.750,00 |  |
| | | 2016.2 | Metodologia implementada em um reservatório estratégico. | 3.438.000,00 |  |
| | | 2017.2 | Metodologia implementada em dois reservatórios estratégicos adicionais. | 3.120.000,00 |  |
| | | Total Indicador | | | 12.706.194,00 |

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016


| Indicador | Setorial Responsável | Meta | Realizado | Status |
|---|-------------------------|--|--|---|
| DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água. | FUNCEME Hoilton Rios | Metodologia implementada em um reservatório estratégico. | Metodologia implementada em um reservatório estratégico. | De forma a cumprir a meta os resultados do estudo "Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água os Reservatórios do Estado do Ceará - Aplicação: Açude Acarape do Meio " foram apresentados ao CBH da Região Metropolitana de Fortaleza, por ocasião da sua 43ª Reunião, realizada no dia 15 de setembro de 2016. A Declaração do Comitê aprovando o estudo foi enviada à UGP. |

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

| Indicador | Setorial Responsável | Semestres | Metas | Valores em US\$ | Farol |
|---|-----------------------------|--------------|---|-----------------|----------------------|
| DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.* | SEPLAG Avilton Júnior | 2014.2 | Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará.** | 6.198.000,00 | |
| | | 2015.1 | 1 | 2.744.444,00 | |
| | | 2015.2 | 2 | 3.403.750,00 | |
| | | 2016.1 | 3 | 3.444.000,00 | |
| | | 2016.2 | 4 | 3.438.000,00 | |
| | | 2017.1 | 5 | 3.444.000,00 | |
| | | 2017.2 | 6 | 3.120.000,00 | |
| | | Total | | | 25.792.194,00 |

* Nome do Indicador alterado por ocasião da reestruturação do PforR

** Meta do Indicador alterada por ocasião da reestruturação do PforR

Legenda:  Probabilidade baixa de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 2º Semestre de 2016

| Indicador | Setorial Responsável | Metas | Realizado | Status |
|---|--------------------------|---|-----------|---|
| DLI11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados. | SEPLAG Avilton Júnior | 2014.2 | - | A primeira meta deste indicador, Aprovação do modelo de GpR, está condicionada à assinatura de um decreto por parte do Governador, institucionalizando o referido modelo no Estado do Ceará. A consultoria contratada está finalizando a proposta de regulamentação para que possamos apresentá-la ao Cogerf e, conseqüentemente, ao Governador, para assinatura e publicação no DOE. |
| | | Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará. | | |
| | | 2015.1 | | |
| | | 1 Secretaria | | |
| | | 2015.2 | | |
| | | 2 Secretarias | | |
| | | 2016.1 | | |
| | | 3 Secretarias | | |
| | | 2016.2 | | |
| 4 Secretarias | | | | |

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

| Indicador | Setorial Responsável | Semestres | Metas | Valores em US\$ | Farol |
|--|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|---------------|
| DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada | SEPLAG Adauto Oliveira | 2014.2 | Aprovação da metodologia | 6.198.000,00 | |
| | | 2015.1 | - | - | |
| | | 2015.2 | - | - | |
| | | 2016.1 | 5% | 3.444.000,00 | |
| | | 2016.2 | 10% | 3.438.000,00 | |
| | | 2017.1 | 15%* | 3.444.000,00 | |
| | | 2017.2 | 20%* | 3.120.000,00 | |
| | | Total | | | 19.644.000,00 |

*As metas deste Indicador foram modificadas na reestruturação do PforR, anteriormente as metas eram 25% e 40%

Legenda:  Metas alcançadas

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

| Indicador | Setorial Responsável | Metas | Realizado | Status |
|--|---------------------------|------------------|-----------|--|
| DLI12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada. | SEPLAG Adauto Oliveira | 2016.1 | 20% | A minuta do Decreto está em análise com previsão de publicação para o ano de 2017. |
| | | 5% dos Projetos | | |
| | | 2016.2 | | |
| | | 10% dos Projetos | | |






3.2. Indicadores Secundários 2016.2

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2016

| n° | Setorial Responsável | N° | Indicadores | Metas 2016 | |
|--|----------------------|----|--|--|-------------------------------------|
| | | | | 1° Semestre | 2° Semestre |
| 1 | IPECE | 1 | Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico). | - | 30.300 |
| 2 | SEPLAG | 2 | Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multisetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT). | - | Outras duas resoluções publicadas |
| 3 | STDS | 3 | Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada | - | 15% |
| 4 | COGERH | 4 | Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas. | - | - |
| | | 5 | Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas. | Proposta e consultas completas aos Comitês das Bacias Hidrográficas. | Encaminhamento do Projeto ao CONERH |
| | | 6 | Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza. | - | 65.9 |
| 5 | SEMA | 7 | Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista. | - | Implementação e monitoramento |
| Total de Indicadores Secundários: 7 Indicadores | | | | | |

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Meta 2º Semestre 2016

| Nome do Indicador | Setorial Responsável | Meta 2ª semestre | Realizado | Status |
|--|----------------------|------------------|-----------------|---|
| PDO1:Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico). | IPECE Victor Hugo | 30.300 | 25.463 técnicos | Houve uma queda no número de técnicos absorvidos em 2015: 25.463. (2014: 26.141 técnicos foram absorvidos). |


Legenda  Probabilidade baixa de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

| Nome do Indicador | Setorial Responsável | Meta 2ª semestre | Realizado | Status |
|---|----------------------|-----------------------------------|-----------|---|
| Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT). | SEPLAG Lara Costa | Outras duas resoluções publicadas | - | Publicada a 1ª Resolução do CPDI de 2016 no Diário Oficial do Estado do dia 05/09/16. Realizada a 3ª reunião ordinária do Comitê no dia 21/09/16 em que, dentre outros pontos, foi apresentado o sistema utilizado pela Casa Civil para monitoramento do Mais Infância Ceará. A segunda resolução do ano será elaborada e publicada posteriormente. |


INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

| Nome do Indicador | Setorial Responsável | Metas 2ª semestre | Realizado | Status |
|--|---|-------------------|-----------|--|
| <p>PDO2: Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas</p> | <p>STDS Sebastião Lopes Mary Anne</p> | <p>7%</p> | <p>-</p> | <p>O Sistema de Monitoramento da STDS encontra-se em fase de teste. Os dados do acompanhamento familiar, referentes a primeira e a segunda visitas estão sendo inseridos, para a emissão de relatórios de acompanhamento familiar, e verificação dos resultados obtidos no cumprimento do indicador.</p> |

Legenda:  Probabilidade intermediária de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Meta 2º Semestre 2016


| Nome do Indicador | Setorial Responsável | Meta 2ª semestre | Realizado | Status |
|---|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| PDO3:Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza. | COGERH Denilson Fidelis, Disney Paulino | 65,9 | 76,8 | 77,2 (referente ao mês de agosto) |

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2017

| Nome do Indicador | Setorial Responsável | Metas 2ª semestre* | Realizado | Status |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|---|
| Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas. | COGERH Zulene Almada | - | - | Os três primeiros produtos foram entregues a Cogerh, a equipe de fiscalização fez as sugestões de correções/alterações e foram reenviados ao consórcio para ajustes nos devidos relatórios. |

*De acordo com o novo Protocolo este Indicador só terá meta em 2017.2

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

| Nome do Indicador | Setorial Responsável | Metas 2ª semestre | Realizado | Status |
|---|----------------------|-------------------------------------|---|--|
| Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas. | COGERH Ana Araújo | Encaminhamento do Projeto ao CONERH | As Consultas foram realizadas nos 12 Comitês de Bacias Hidrográficas. | Finalização do processo de compilação das contribuições das Consultas realizadas junto aos Comitês das Bacias. |

*Comitês Bacias Hidrográficas

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

| Nome do Indicador | Responsável | Metas | Realizado | Status |
|--|--------------------|-------------------------------|-----------|---|
| Apresentação da Lei de gestão de resíduos sólidos revista. | SEMA Maria Dias | Implementação e monitoramento | - | Atualmente, está em execução a Estruturação dos Consórcios Municipais, e a elaboração dos Planos Regionais de Resíduos Sólidos. |



3.3. Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental

Pendências do Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental-PforR

| | Descrição da Ação | Responsável | Posição |
|---|--|-------------|--|
| 1 | A. Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar. | STDS | O Especialista do Banco, Alberto Costa enviou email solicitando informações em 11/08/16. A STDS está elaborando uma resposta com os pontos já esclarecidos pela SEDUC (email enviado em 28/09/16). |
| 2 | E. Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água | COGERH | A Empresa ainda não fez a sensibilização, mas ainda está dentro do prazo. Na próxima semana a COGERH terá uma reunião com a empresa e irão identificar as áreas para iniciar a sensibilização. |



3.4. Programas *PforR*

Posição dos Programas

| Capacitação Profissional | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| SEDUC | | | | | | | |
| 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional | Previsão | | | Execução | % | | |
| | 2016 (A) | até 28.09.16 (B) | 2017 (C) | até 28.09.16 (D) | 2016 (D)/(A) | 2016 (D)/(B) | FAROL (D)/(B) |
| 020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional. | R\$ 43,10 | R\$ 31,35 | R\$ 31,49 | R\$ 21,26 | 49% | 68% | |
| 020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional. | R\$ 15,44 | R\$ 11,23 | R\$ 8,06 | R\$ 8,30 | 54% | 74% | |
| 020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional. | R\$ 87,52 | R\$ 63,65 | R\$ 98,93 | R\$ 97,61 | 112% | 153% | |
| 020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional. | R\$ 2,47 | R\$ 1,80 | R\$ 2,30 | R\$ 0,96 | 39% | 53% | |
| 020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos. | R\$ 29,00 | R\$ 21,09 | R\$ 30,00 | R\$ 16,39 | 57% | 78% | |
| TOTAL CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | R\$ 177,53 | R\$ 129,11 | R\$ 170,78 | R\$ 144,52 | 81% | 112% | |

| Iniciativas | | Execução até 28.09.2016 | Restos a Pagar até 28.09.2016 | TOTAL |
|--------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 771 | 020.1.01 | 21.264.024,62 | - | 21.264.024,62 |
| | 020.1.02 | 3.114.610,53 | 5.186.936,32 | 8.301.546,85 |
| 328 | 020.1.03 | 95.855.648,60 | 1.752.183,60 | 97.607.832,20 |
| - | 020.1.04 | 957.810,15 | - | 957.810,15 |
| 834 | 020.1.06 | 14.609.483,09 | 1.780.936,44 | 16.390.419,53 |
| Total | | 135.801.576,99 | 8.720.056,36 | 144.521.633,35 |

IPECE INSTITUTO DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO DO ESTADO DO CEARÁ

Legenda dos faróis

81% a 100% de execução 51% a 80% de execução 0% a 50% de execução

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

Posição dos Programas

| Assistência à Família | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| STDS | | | | | | | |
| 080 – Proteção Social Básica | Previsão | | | Execução | % | | |
| | 2016 (A) | até 28.09.16 (B) | 2017 (C) | até 28.09.16 (D) | 2016 (D)/(A) | 2016 (D)/(B) | FAROL (D)/(B) |
| 080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social. | R\$ 8,10 | R\$ 5,89 | R\$ 10,51 | R\$ 5,60 | 69% | 95% | |
| TOTAL ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA | R\$ 8,10 | R\$ 5,89 | R\$ 10,51 | R\$ 5,60 | 69% | 95% | |

| Iniciativas | | Execução até 28.09.2016 | Restos a Pagar até 28.09.2016 | TOTAL |
|-------------|----------|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 03180 | 080.1.01 | 5.523.850,00 | 72.000,00 | 5.595.850,00 |

- Em missão do Banco Mundial realizada em 19.09.2016, a STDS informou que o recurso disponível para essa iniciativa é de apenas R\$ 7,30 (FECOP).
- Em 26.09.2016, STDS enviou NT 01/2016 solicitando redução da meta de 2016 de R\$ 8,10 para R\$ 7,30.

Posição dos Programas

| Qualidade da Água | | | | | | | |
|--|----------|------------------|----------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| CIDADES | | | | | | | |
| 025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana | Previsão | | | Execução | % | | |
| | 2016 (A) | até 28.09.16 (B) | 2017 (C) | até 28.09.16 (D) | 2016 (D)/(A) | 2016 (D)/(B) | FAROL (D)/(B) |
| 025.1.12 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário. | R\$ 4,99 | R\$ 3,63 | R\$ 7,01 | R\$ - | 0% | 0% | |

- Em 26.09.2016, CIDADES enviou NT 001/2016 solicitando redução do valor total de R\$ 12,00 para R\$ 8,58.

Posição dos Programas

| SEMA | | | | | | | |
|---|----------|------------------|----------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| 064 – Resíduos Sólidos | Previsão | | | Execução | % | | |
| | 2016 (A) | até 28.09.16 (B) | 2017 (C) | até 28.09.16 (D) | 2016 (D)/(A) | 2016 (D)/(B) | FAROL (D)/(B) |
| 064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos. | R\$ 2,00 | R\$ 1,45 | R\$ 3,00 | R\$ 0,26 | 13% | 18% | |
| 066 – Ceará Mais Verde | Previsão | | | Execução | % | | |
| | 2016 (A) | até 28.09.16 (B) | 2017 (C) | até 28.09.16 (D) | 2016 (D)/(A) | 2016 (D)/(B) | FAROL (D)/(B) |
| 066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas. | R\$ 2,00 | R\$ 1,45 | R\$ 3,00 | R\$ 0,01 | 1% | 1% | |
| 067 – Ceará no Clima | Previsão | | | Execução | % | | |
| | 2016 (A) | até 28.09.16 (B) | 2017 (C) | até 28.09.16 (D) | 2016 (D)/(A) | 2016 (D)/(B) | FAROL (D)/(B) |
| 067.1.05 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro. | R\$ 1,50 | R\$ 1,09 | R\$ 2,00 | R\$ - | 0% | 0% | |

| Iniciativas | | Execução até 28.09.2016 | Restos a Pagar até 28.09.2016 | TOTAL |
|--------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 03104 | 064.1.04 | 99.750,00 | 157.438,30 | 257.188,30 |
| - | 066.1.02 | 11.574,75 | - | 11.574,75 |
| Total | | 111.324,75 | 157.438,30 | 268.763,05 |

- Em 26.09.2016, SEMA enviou NT 01/2016 solicitando redução do valor total de R\$ 15,00 para R\$ 6,90.

Posição dos Programas

| Qualidade da Água | | | | | | | |
|---|----------|------------------|----------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| SEMACE | | | | | | | |
| 066 – Ceará Mais Verde | Previsão | | | Execução | % | | |
| | 2016 (A) | até 28.09.16 (B) | 2017 (C) | até 28.09.16 (D) | 2016 (D)/(A) | 2016 (D)/(B) | FAROL (D)/(B) |
| 066.1.12 – Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará. | R\$ 1,62 | R\$ 1,18 | R\$ 1,00 | R\$ 0,12 | 7% | 10% | |
| 066.1.13 – Ampliação das ações de proteção dos recursos ambientais das áreas protegidas do Estado do Ceará. | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,13 | 129% | 129% | |
| 067 – Ceará no Clima | Previsão | | | Execução | % | | |
| | 2016 (A) | até 28.09.16 (B) | 2017 (C) | até 28.09.16 (D) | 2016 (D)/(A) | 2016 (D)/(B) | FAROL (D)/(B) |
| 067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar. | R\$ 2,00 | R\$ 1,45 | R\$ 0,18 | R\$ - | 0% | 0% | |
| 500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada | Previsão | | | Execução | % | | |
| | 2016 (A) | até 28.09.16 (B) | 2017 (C) | até 28.09.16 (D) | 2016 (D)/(A) | 2016 (D)/(B) | FAROL (D)/(B) |
| 500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas. | R\$ 0,25 | R\$ 0,18 | R\$ 0,60 | R\$ - | 0% | 0% | |

| Iniciativas | | Execução até 28.09.2016 | Restos a Pagar até 28.09.2016 | TOTAL |
|--------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 05170 | 066.1.12 | 91.112,98 | 27.600,00 | 118.712,98 |
| 04815 | 066.1.13 | - | 129.000,00 | 129.000,00 |
| Total | | 91.112,98 | 156.600,00 | 247.712,98 |

- Em 27.09.2016, SEMACE enviou NT 01/2016 solicitando aumento da meta total de R\$ 12,67 para R\$ 13,00.

Posição dos Programas

| Qualidade da Água | | | | | | | |
|---|----------|------------------|----------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| FUNCEME | | | | | | | |
| 018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis | Previsão | | | Execução | % | | |
| | 2016 (A) | até 28.09.16 (B) | 2017 (C) | até 28.09.16 (D) | 2016 (D)/(A) | 2016 (D)/(B) | FAROL (D)/(B) |
| 018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias. | R\$ 1,81 | R\$ 1,32 | R\$ 1,91 | R\$ 1,24 | 69% | 94% | |
| 018.1.03 - Ampliação e modernização do sistema de monitoramento e previsão. | R\$ 0,05 | R\$ 0,03 | R\$ 0,07 | R\$ 0,04 | 97% | 133% | |

| Iniciativas | | Execução até 28.09.2016 | Restos a Pagar até 28.09.2016 | TOTAL |
|--------------|----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2846 | 018.1.01 | 1.152.420,17 | 88.499,99 | 1.240.920,16 |
| - | 018.1.03 | - | 44.890,00 | 44.890,00 |
| Total | | 1.152.420,17 | 133.389,99 | 1.285.810,16 |

| 025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana; 064 – Resíduos Sólidos; 066 – Ceará Mais Verde; 067 – Ceará no Clima; 500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada; 018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis | Previsão | | | Execução | % | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| | 2016 (A) | até 28.09.16 (B) | 2017 (C) | até 28.09.16 (D) | 2016 (D)/(A) | 2016 (D)/(B) | FAROL (D)/(B) |
| TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA | R\$ 16,22 | R\$ 10,32 | R\$ 18,76 | R\$ 1,80 | 11% | 17% | |



Legenda dos faróis

81% a 100% de execução
 51% a 80% de execução
 0% a 50% de execução



Posição dos Programas

| Sumário de Execução 2016 até 28.09.2016 | | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|------------|
| Eixo | Setorial | Previsão | Execução | % |
| Capacitação Profissional | SEDUC | R\$ 177,53 | R\$ 144,52 | 81% |
| Assistência à Família | STDS | R\$ 8,10 | R\$ 5,60 | 69% |
| Qualidade da Água | CIDADES | R\$ 4,99 | R\$ - | 0% |
| | SEMA | R\$ 5,50 | R\$ 0,27 | 5% |
| | SEMACE | R\$ 3,87 | R\$ 0,25 | 6% |
| | FUNCEME | R\$ 1,86 | R\$ 1,29 | 69% |
| Total | | R\$ 201,84 | R\$ 151,92 | 75% |

| Execução Acumulada Projeto até 28.09.2016 | | | |
|---|------------|---------------|---------------|
| Meta 2014-2017 | R\$ | 878,52 | 100% |
| Execução 2014 | R\$ | 243,35 | 27,70% |
| Execução 2015 | R\$ | 233,28 | 26,55% |
| Execução 2016 | R\$ | 151,92 | 17,29% |
| Total Executado | R\$ | 628,54 | 71,55% |
| Falta Executar | R\$ | 249,98 | 28,45% |

Posição dos Programas

Aguardando Não Objeção do Banco Mundial:

| SETORIAL | DE | PARA |
|--------------|------------------|------------------|
| STDS | R\$ 33,06 | R\$ 32,26 |
| CIDADES | R\$ 12,00 | R\$ 8,58 |
| SEMA | R\$ 15,00 | R\$ 6,90 |
| SEMACE | R\$ 12,67 | R\$ 13,00 |
| TOTAL | R\$ 72,73 | R\$ 60,74 |

| Setorial | Programas | EXECUÇÃO | | PROJEÇÃO | | TOTAL |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| SEDUC | 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional. | R\$ 228,90 | R\$ 220,13 | R\$ 177,53 | R\$ 170,78 | R\$ 797,34 |
| STDS | 080 – Proteção Social Básica. | R\$ 7,21 | R\$ 7,24 | R\$ 7,30 | R\$ 10,51 | R\$ 32,26 |
| SRH / COGERH | 017 – Gestão dos Recursos Hídricos. | R\$ 0,46 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,46 |
| CIDADES | 025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana. | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 8,58 | R\$ 8,58 |
| SEMA | 064 – Resíduos Sólidos. | R\$ 0,39 | R\$ 1,11 | R\$ 1,10 | R\$ 2,00 | R\$ 4,60 |
| | 066 – Ceará Mais Verde. | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,60 | R\$ 0,60 | R\$ 1,20 |
| | 067 – Ceará no Clima. | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,55 | R\$ 0,55 | R\$ 1,10 |
| SEMACE | 066 – Ceará Mais Verde. | R\$ 3,08 | R\$ 1,36 | R\$ 0,28 | R\$ 2,34 | R\$ 7,06 |
| | 067 – Ceará no Clima. | R\$ - | R\$ 0,02 | R\$ 2,00 | R\$ 0,18 | R\$ 2,20 |
| | 500 - Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada. | R\$ 1,52 | R\$ 1,05 | R\$ 0,42 | R\$ 0,76 | R\$ 3,74 |
| FUNCEME | 018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis. | R\$ 1,79 | R\$ 2,27 | R\$ 1,86 | R\$ 1,97 | R\$ 7,89 |
| | 079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará. | R\$ - | R\$ 0,09 | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,09 |
| TOTAL | | R\$ 243,35 | R\$ 233,28 | R\$ 191,64 | R\$ 198,27 | R\$ 866,54 |

Posição dos Programas

✓ **Lembrete:** Regras Programas


A execução dos programas deve observar as seguintes restrições:

- Devem excluir despesas que são financiadas pelo próprio BIRD ou por outras operações de crédito, ou seja, não é permitido a alocação de recursos do BIRD ou outras operações de crédito para custear despesas dos programas e iniciativas do componente
- Verificar a lista negra do BIRD a cada licitação, antes de assinar contrato. Para atender o Art. 42 da Lei 8.666/93 a SEPLAG incluiu no orçamento de cada ação um valor na fonte 69;
- Não podem apresentar impacto sócio ambiental negativo;
- Os valores dos contratos não podem exceder os limites abaixo:
 - Obras = US\$ 50 milhões
 - Bens = US\$ 30 milhões
 - Sistemas de TIC = US\$ 20 milhões
 - Consultorias = US\$ 15 milhões.



3.5. Assistência Técnica – Estatísticas


Execução dos Subprojetos de AT por Etapa

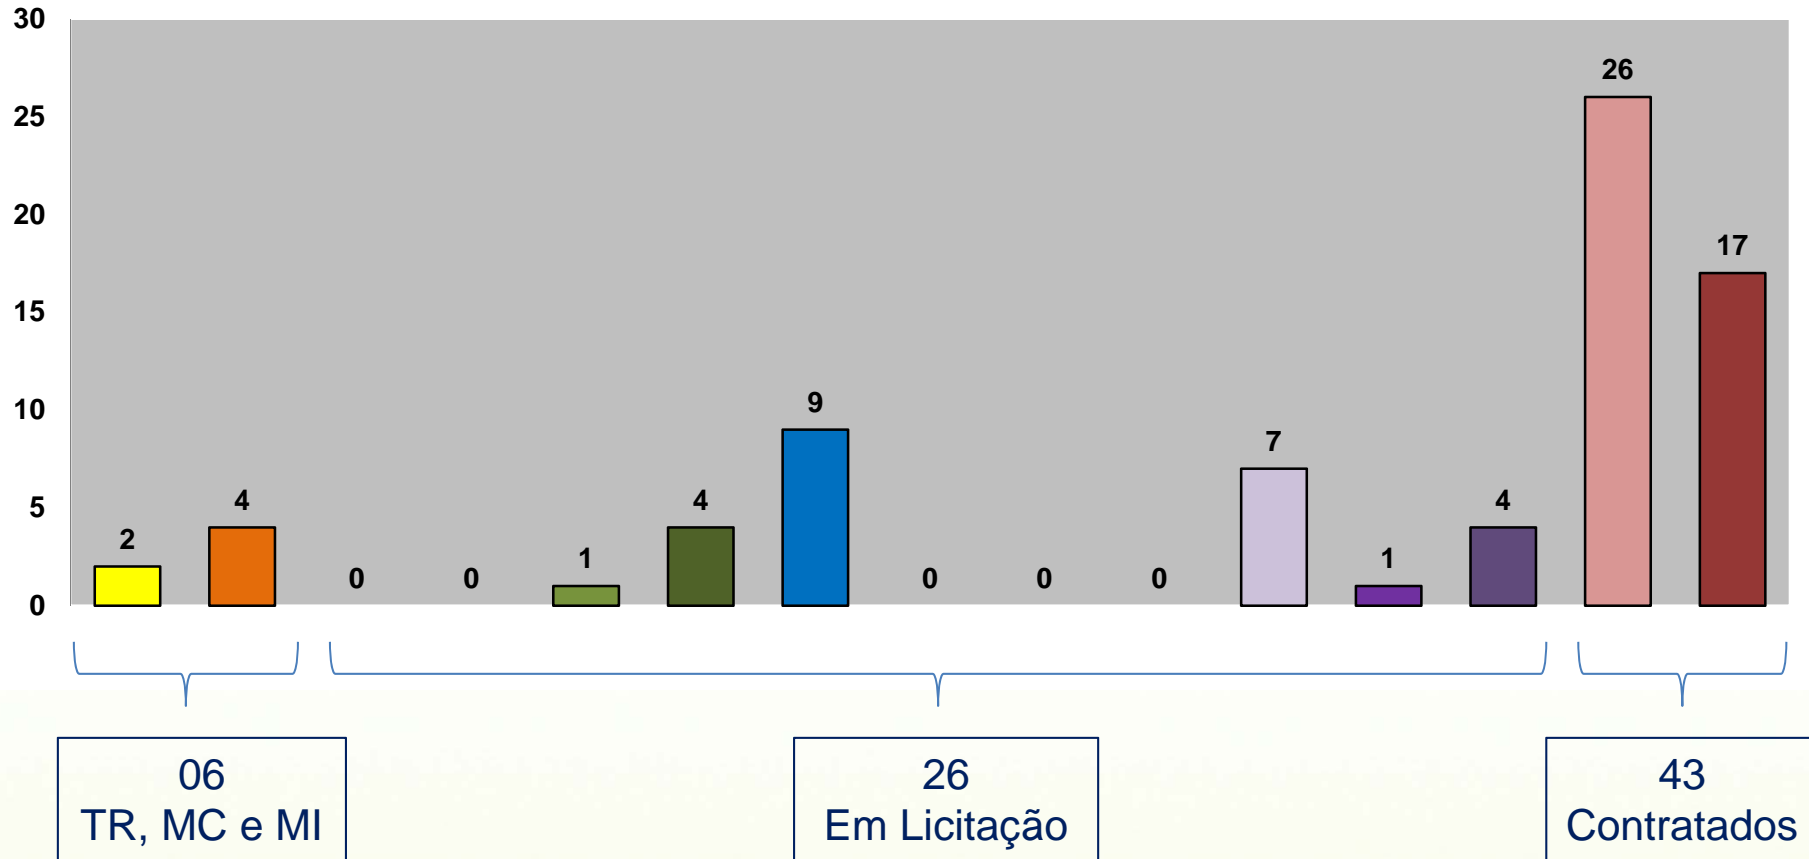

Sub projetos de Assistência Técnica por Etapa

| Etapas | | | Setoriais com Subprojetos | Valor US\$ |
|--------------|--|-----------|--|----------------------|
| 1 | TDR e MC sendo elaborados para NO BM | 2 | SEDUC(37); SEPLAG(58); | 428.949,17 |
| 2 | TDR e MC aprovado pelo BM e elaborando MI | 4 | CGE(11); SEDUC(31,34,36); | 1.159.758,45 |
| 3 | Manifestação de Interesse Publicada | 0 | - | - |
| 4 | Elaborando o Relatório Final da Lista Curta | 0 | - | - |
| 5 | Elaborando a Solicitação de Proposta | 1 | SEDUC(35); | 244.309,68 |
| 6 | Solicitação de Proposta Lançada | 4 | CGE(10); IPECE(22); SECITECE(26); SEDUC(30); | 759.274,54 |
| 7 | Elaborando o Relatório Técnico ou Curricular | 9 | CGE(07,08); IPECE(21); SECITECE(27); SEDUC(29); SEMA(50); SEPLAG(55,61,62); | 3.519.714,04 |
| 8 | Elaborando o Relatório Financeiro e o Combinado | 0 | - | - |
| 9 | Não Objeção do BM à Avaliação Combinado / Avaliação Curricular | 0 | - | - |
| 10 | Divulgação da Avaliação Combinada / Ofício para Negociação | 0 | - | - |
| 11 | Negociação do Contrato | 7 | CGE(05,06); SEMA(52,53); SEPLAG(63); SRH (64,65); | 4.145.012,10 |
| 12 | Divulgação PGE Resultado Final | 1 | CGE (09); | 127.862,23 |
| 13 | Assinando o Contrato / Publicação | 4 | SEDUC(42,44,45); SEPLAG(59); | 1.717.251,62 |
| 14 | Projetos com Contratos em Execução | 26 | ARCE(01); CGE(04); FUNCEME(13); IPECE(14,15,17,18,19,20); PGE(23); SDE(24); SECITECE(28); SEDUC(43); SEMA(46,47,48,49,51); SEMACE(54); SEPLAG(57,60); SRH(66); COGERH(67,68); STDS(72); TCE(73); | 10.423.758,10 |
| 15 | Projetos com Contratos Finalizados | 17 | CGE(02,03,12); IPECE(16); SDE(25); SEDUC(32,33,38,39,40,41); SEPLAG(56); COGERH(69); STDS(70,71); TCE(74,75). | 1.043.063,76 |
| Total | | 75 | | 23.568.953,69 |

Execução dos Subprojetos de AT por Etapa

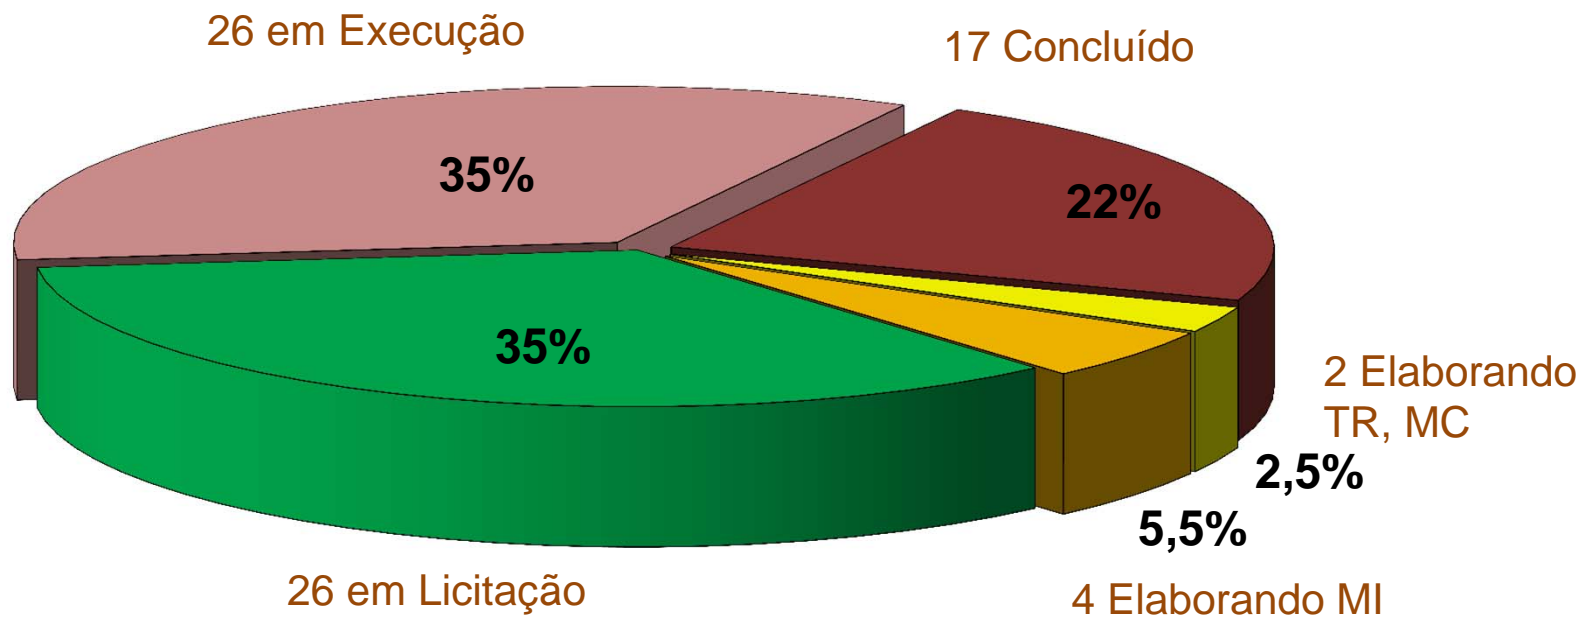



3.6 Tempo disponível até encerramento do PforR

Tempo disponível até encerramento do PforR = 31/01/2018

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| 2016 e 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 meses |
| | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | |
| 1º e 2º Semestre 2017 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 meses |
| | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | |
| 2º Semestre 2017 e Jan 2018 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 4 meses |
| | Out | Nov | Dez | Jan | | | |
| 2018 | | | | | | | |

TOTAL


**16
Meses**

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 11 meses |
| | Médio - de 12 a 14 meses |
| | Alto - de 15 e 16 meses |
| | Altíssimo - acima de 16 meses - Inviabiliza o Projeto |





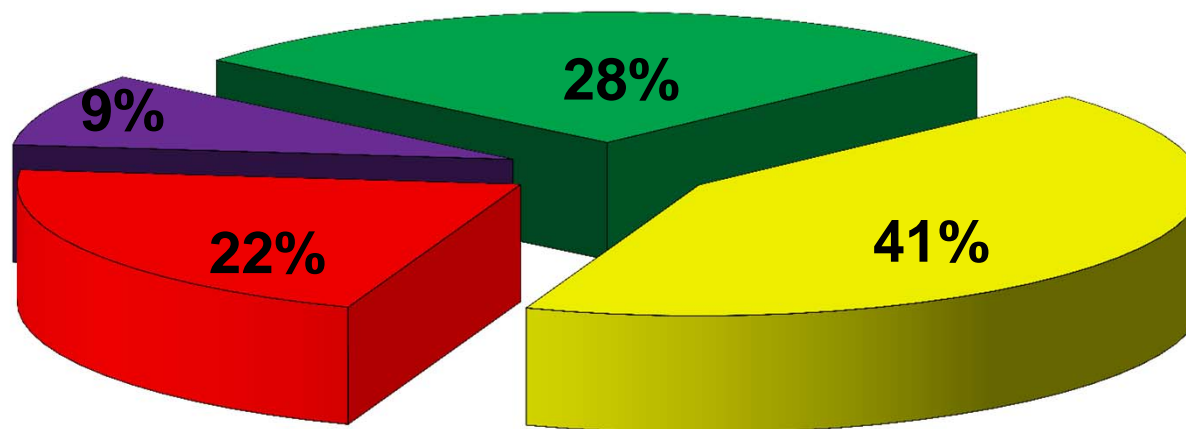

3.7. Projetos de Assistência Técnica em Situação de Risco

Subprojetos de AT em Risco



| Qtd. | | |
|------|------|---|
| 09 | 28% | CGE(3), SEDUC(3), SEPLAG(3) |
| 13 | 41% | CGE(2), IPECE(1), SECITECE(2), SEDUC(3), SEMA(1), SEPLAG(2), SRH(2) |
| 07 | 22% | CGE(2), IPECE(1), SEDUC(2), SEMACE(1), SEPLAG(1) |
| 03 | 9% | SEDUC(2), SEMA(1) |
| 32 | 100% | |

| Legenda | |
|---|---|
|  | Baixo - de 0 a 10 meses |
|  | Médio - de 12 a 14 meses |
|  | Alto - de 15 e 16 meses |
|  | Altíssimo - acima de 16 meses - Inviabiliza o Projeto |

Subprojetos de AT em Risco

| Nº | Órgão | Subprojetos | Valor US\$ | Risco |
|----|--------|--|--------------|-------|
| 1 | SEDUC | Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN. (Coleta de Dados). | 1.155.818,22 | 17 |
| 2 | SEDUC | Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN. | 41.489,95 | 17 |
| 3 | SEMA | Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver <u>implementação</u> da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas. | 723.273,62 | 17 |
| 4 | CGE | Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão. | 1.207.049,74 | 16 |
| 5 | IPECE | Metodologias para análise de impacto econômico. | 432.682,09 | 16 |
| 6 | SEDUC | Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo. | 374.353,64 | 16 |
| 7 | SEDUC | Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (02 analistas) | 54.151,20 | 16 |
| 8 | SEPLAG | Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS). | 566.481,02 | 16 |
| 9 | CGE | Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC). | 658.560,58 | 15 |
| 10 | SEMACE | Contratação de consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de <u>capacitação</u> para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - Semace. | 385.212,76 | 15 |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 11 meses |
| | Médio - de 12 a 14 meses |
| | Alto - de 15 e 16 meses |
| | Altíssimo - acima de 16 meses - Inviabiliza o Projeto |



3.8 Monitoramento Contratos

Previsão de Início dos 32 Contratos sendo Licitados

| Setoriais | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Total |
|--------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| CGE | 1 | 3 | - | 3 | 7 |
| IPECE | - | - | 1 | 1 | 2 |
| SEPLAG | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| SECITECE | - | - | 1 | 1 | 2 |
| SEMA | 1 | 1 | - | - | 2 |
| SEDUC | 3 | - | 2 | 5 | 10 |
| SEMACE | - | 1 | - | - | 1 |
| SRH | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Total | 8 | 7 | 5 | 12 | 32 |

Situação dos Contratos


| Contratos | ARCE | CGE | COGERH | FUNCEME | IPECE | PGE | SDE | SECITECE | SEDUC | SEMA | SEMACE | SEPLAG | SRH | STDS | TCE | Total |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Contratos em andamento | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| Contratos Concluídos | | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | 6 | | | 1 | | 2 | 2 | 17 |
| Total | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 43 |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Total Contratado R\$ | 29.597.604,64 |
| Total Pago R\$ | 5.459.584,35 |
| % Pago | 18,45% |

Os contratos em andamento estão atendendo de forma satisfatória os parâmetros estabelecidos/acordados no próprio contrato (valor, prazo e qualidade)

Situação dos Contratos

| | 3º Trim 2014 | 4º Trim 2014 | 1º Trim 2015 | 2º Trim 2015 | 3º Trim 2015 | 4º Trim 2015 | 1º Trim 2016 | 2º Trim 2016 | 3º Trim 2016 | Total |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|
| Pagamentos no mês | 29.040,00 | 43.560,00 | 43.560,00 | 225.462,58 | 318.578,47 | 388.008,97 | 1.128.927,92 | 1.177.960,69 | 2.104.485,72 | 5.459.584,35 |
| Valor dos contratos assinados no mês | 137.200,00 | - | 391.108,40 | 601.298,06 | 2.786.839,30 | 4.355.698,41 | 885.945,83 | 4.724.731,97 | 15.714.782,67 | 29.597.604,64 |

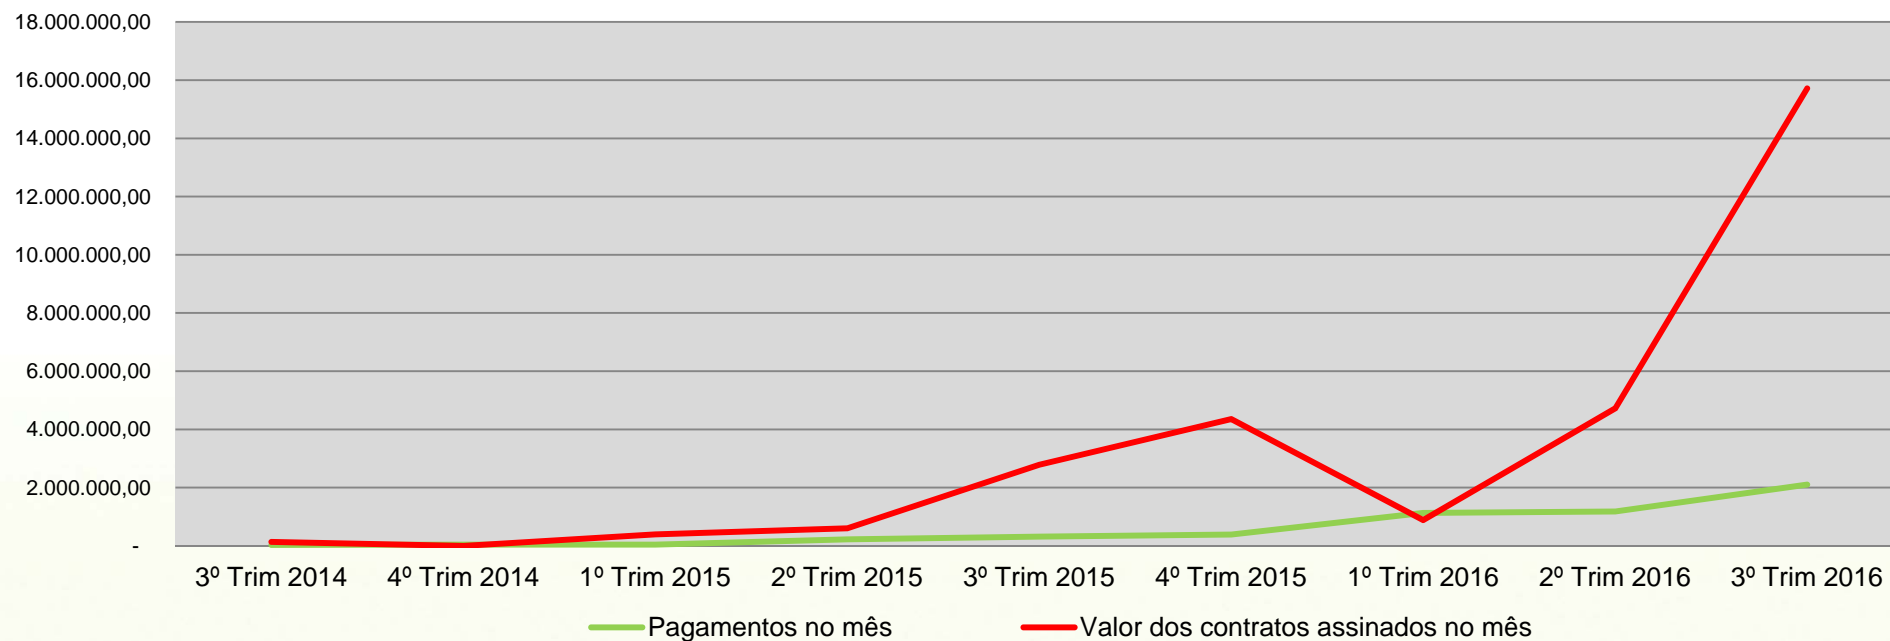



3.9 Pontos Principais de Aquisições

Pontos Principais de Aquisições

✓ **Comunicação:**

1. Utilizar email ugp.pforn@ipece.ce.gov.br;

✓ **Contratações**

1. Assinatura de Contrato x Emissão da Ordem de Serviços

“A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura” (art. 61 – Lei 8.666/93)



3.10 Projetos de Assistência Técnica por Setorial



CGE


Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

| Nº | Responsável | Subprojeto | Valor US\$ Memória de Cálculo | Tempo de Execução do Contrato em meses | Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses | Tempo Contratação + Execução em meses | Risco |
|--------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|--|-------|
| 1 | Carlos Jorge Freitas | Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC). | 658.560,58 | 13 | 2 | 15 | Alto |
| 2 | Ítalo Brígido Coelho e Tiago Peixoto | Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão. | 1.207.049,74 | 14,5 | 1,5 | 16 | Alto |
| 3 | Ítalo Brígido Coelho e Tiago Peixoto | Capacitação da população para o Controle Social. | 292.587,32 | 12 | 2 | 14 | Médio |
| 4 | Denise Andrade Araújo | Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos. | 152.225,69 | 6 | 4 | 10 | Baixo |
| 5 | Paulo Roberto | Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. | 127.862,23 | 6 | 2 | 8 | Baixo |
| 6 | Ítalo Brígido Coelho e Tiago Peixoto | consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO). | 93.436,26 | 5 | 5 | 10 | Baixo |
| 7 | Ítalo Brígido Coelho e Tiago Peixoto | Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO). | 760.937,50 | 8 | 4 | 12 | Médio |
| TOTAL | | | 3.292.659,33 | | | | |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 11 meses |
| | Médio - de 12 a 14 meses |
| | Alto - de 15 e 16 meses |
| | Altíssimo - acima de 16 meses - Inviabiliza o Projeto |

Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojetos 2 e 3: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR. ¹

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 67.354,63
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 - Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Contratos Concluídos.
- **Estágio Atual:** Contratos Concluídos.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Nota 1: Auditoria será realizada pela equipe da CGE a partir do semestre 16.1



Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Subprojeto 4: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Marcelo Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 226.642,79
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Março 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 08/2016 - Publicado em 28/06/2016. Empresa NTCONSULT TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 5: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).

- **Responsável:** Carlos Jorge Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 658.560,58
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Março 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Realizada a 3ª reunião de negociação com a empresa IVIA em 28/09/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 6: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.207.049,74
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – 1ª reunião de negociação agendada para o dia 30/09/2016 às 09:00 horas.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 7: Capacitação da população para o Controle Social.

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 292.587,32
- **Método de Aquisição:** LPN
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Assinatura Contrato.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Relatório de Julgamento da LPN para análise da UGP, com previsão de retorno em 03/10/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Gestão Pública

Subprojeto 8: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na “Detecção de Casos de Fraude e Corrupção” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.

- **Responsável:** Denise Andrade Araújo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 152.225,69
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial está elaborando o Relatório de Avaliação Técnica após o recebimento das Propostas Técnicas em 20/09/2016 e reunião de orientação no dia 21/09/2016. Previsão de envio para análise da UGP ___/___?
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 9: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamentos com foco no “Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos do processo de convergência das Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público (IPSAS).

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 127.862,23
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Publicado o Aviso de Resultado Final em 22/09/2016, aguardando prazo recursal de 05 dias úteis, que encerra-se em 29/09/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 10: Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO).

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 93.436,26
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2016 – Fevereiro 2017
- **Estágio Previsto:** Avaliação Técnica da Propostas.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Processo de SDP lançada em 14/09/2016. Recebimento das Proposta Técnica e Financeira até as 16:00hrs do dia 13/10/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 11: Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 760.937,50
- **Método de Aquisição:** LPN
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2016 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Elaborando Contrato.
- **Estágio Atual:** Em Atividades Preparatórias – Aguardando avanço do Subprojeto "Ouvidoria Ativa - Modelo" para o lançamento do processo de licitação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 12: Contratação de consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.

- **Responsável:** Aglaio Soares
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 24.411,82
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Março de 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



IPECE



Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

| Nº | Responsável | Subprojeto | Valor US\$ Memória de Cálculo | Tempo de Execução do Contrato em meses | Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses | Tempo Contratação + Execução em meses | Risco |
|-------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|--|----------|
| 1 | Mario Aragão | Desenvolvimentos de Sistemas - IPECE DATA e Monitoramento FECOP. | 820.787,10 | 8 | 3 | 11 | Amarelo |
| 2 | Nicolino Trompieri e Witalo Paiva | Metodologias para análise de impacto econômico. | 432.682,09 | 12 | 4 | 16 | Vermelho |
| TOTAL | | | 1.253.469,19 | | | | |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 11 meses |
| | Médio - de 12 a 14 meses |
| | Alto - de 15 e 16 meses |
| | Altíssimo - acima de 16 meses - Inviabiliza o Projeto |


Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojetos 14 e 15: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.
CONSULTORES PLENOS

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 322.192,82
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contratos em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 16: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTOR JÚNIOR

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 21.227,67
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído e Pago.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojetos 17,18 e 19: Contratação de 03 (três) **Analistas em Licitações** para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 223.560,31
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contratos em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojeto 20: Contratação de Consultor Individual especializado em **Políticas Públicas** para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução a Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.*

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor dos Subprojetos:** US\$ 109.139,93
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévio
- **Início/Término:** Julho 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 10/2015 publicado em 18/09/2015. Serviços em execução.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 21: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para Desenvolvidos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.

- **Responsável:** Mário Aragão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 820.787,10
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2015 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial remeteu o Relatório de Avaliação Técnica para análise da UGP em 26/09/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 22: Contratação de Consultoria de Empresa para Desenvolvimento de Metodologia para análise de impacto econômico no Estado do Ceará.



- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 432.682,09
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Setembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Processo de Solicitação de Proposta lançada em 01/09/2016. Reunião prévia realizada no dia 12/09/2016. Recebimento das Propostas Técnicas e Financeiras até as 16:00hrs do dia 13/10/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████



PGE

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Subprojeto 23: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Valéria Rodrigues
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 443.309,81
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2015 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 23/2016 assinado em 14/09. Aguardando o envio da Ordem de Serviço.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SECITECE

Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

| Nº | Responsável | Subprojeto | Valor US\$ Memória de Cálculo | Tempo de Execução do Contrato em meses | Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses | Tempo Contratação + Execução em meses | Risco |
|--------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------|
| 1 | Sandra Monteiro e Ana Iris | Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará. | 149.556,68 | 6 | 5 | 11 | |
| 2 | Sandra Monteiro e Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho | Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará. | 208.751,32 | 7 | 4 | 11 | |
| TOTAL | | | 358.308,00 | | | | |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 11 meses |
| | Médio - de 12 a 14 meses |
| | Alto - de 15 e 16 meses |
| | Altíssimo - acima de 16 meses - Inviabiliza o Projeto |



Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 26: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.

- **Responsável:** Sandra Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 149.556,68
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Notificação e Adjudicação.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Processo de SDP lançada em 16/09/2016. Reunião prévia realizada no dia 28/09/2016. Recebimento das Propostas Técnicas e Financeiras até as 15:00hrs do dia 19/10/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 27: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Sandra Monteiro / Tarcísio Hilter
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 208.751,32
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Novembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial encaminhou o Relatório de Avaliação Técnica com para análise da UGP, com previsão de retorno em 04/10/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 28: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

- **Responsável:** Sandra Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 87.362,46
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Fevereiro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato Publicado em 01/08/2016.
Consultora: Sra. Maria Fatima Ludovico da Gama e Souza.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SEPLAG



Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

| Nº | Responsável | Subprojeto | Valor US\$ Memória de Cálculo | Tempo de Execução do Contrato em meses | Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses | Tempo Contratação + Execução em meses | Risco |
|--------------|-----------------|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|
| 1 | Naiana Correia | Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos. | 85.603,96 | 10 | 3 | 13 | Amarelo |
| 2 | Avilton Júnior | Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial (2a. Etapa) | 337.500,00 | - | - | - | Verde |
| 3 | Dominique Gomes | Contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará. | 317.051,64 | 8 | 1 | 9 | Verde |
| 4 | Katia Burgos | Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará. | 776.780,21 | 10 | 4 | 14 | Vermelho |
| 5 | Valdir Silva | Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS). | 566.481,02 | 12 | 4 | 16 | Vermelho |
| 6 | Valdir Silva | Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços. | 238.726,47 | 6 | 2 | 8 | Verde |
| TOTAL | | | 2.322.143,29 | | | | |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 11 meses |
| | Médio - de 12 a 14 meses |
| | Alto - de 15 e 16 meses |
| | Altíssimo - acima de 16 meses - Inviabiliza o Projeto |

Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 55: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 85.603,96
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial está ajustando o Relatório de Avaliação Curricular após ser identificado a não avaliação de um currículo.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Gestão Pública



Subprojeto 56: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Aduino Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 481.856,65
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído. Aguardando o pagamento.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- **Sinalização em relação ao Prazo:**





Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 57: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.128.001,21
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 023/2015. Serviço em execução.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 58: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial (2a. Etapa)

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 337.500,00
- **Método de Aquisição:**
- **Revisão Prévia/Posterior:**
- **Início/Término:** Junho 2016 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:** Elaborando o Termo de Referência
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 59: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Dominique Gomes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 317.051,64
- **Método de Aquisição:** SBQ
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Novembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Cel04 encaminhou o ofício com processo final da licitação a setorial para que seja providenciado a Homologação e Adjudicação e publicação do Contrato.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Gestão Pública

*Subprojeto 60: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para **Auditar a Folha de Pagamento** do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Fábio Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 529.102,21
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato assinado e emitido a Ordem de Serviço em 16/09/2016 .
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 61: Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Silvana Dourado
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 776.780,21
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Abril 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação - Setorial está elaborando o Relatório de Avaliação Técnica após recebimentos das Propostas Técnicas em 19/09/2016 e reunião de orientação realizada em 23/09/2016. Previsão de envio para análise da UGP ___/___?
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Assistência Técnica – Fiduciário

Subprojeto 62: Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado - GCOMPRAS

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 566.481,02
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Abril 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Relatório de Avaliação Técnica encaminhado para análise da UGP em 29/09/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Fiduciário

Subprojeto 63: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.


- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 238.726,47
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Novembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial remeteu a documentação referente a negociação à PGE/Cel04 para análise e Divulgação do Aviso do Resultado Final.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



STDS



Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 70: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 64.213,69
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2014 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 71: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 63.174,42
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído. Aguardando pagamento.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 72: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará


- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 892.888,73
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico (NCB)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Dezembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



ARCE

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 1: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.



- **Responsável:** Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Subprojeto:** US\$ 371.040,45
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato Assinado, publicado em 17/08/2016.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



COGERH


Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 67: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Quali-quantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 884.094,13
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em execução - Contrato 48/2015, em execução - Publicado no DOE de 15/12/2015.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 68: Termo de Referência para Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 751.039,72
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Contrato Assinado em 19/07/2016, aguardando publicação.
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 69: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor Subprojeto:** US\$ 27.326,28
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Janeiro 2016
- **Estágio Previsto:** Concluído
- **Estágio Atual:** CONTRATO CONCLUÍDO.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



FUNCEME

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 13: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.


- **Responsável:** Francisco Hoilton
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Proposta Vencedora:** €267.442,11 + R\$ 687.325,77 equivalente a R\$ 1.492.246,27
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Março 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução
- **Estágio Atual:** Contrato em execução - Recebido da FUNCEME em 17/09/2015, o Contrato assinado. Publicado no DOE em 16/10/2015.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SDE / ADECE


Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 24: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.

- **Responsável:** Fernando Costa / Cláudio Ferreira Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 340.209,03
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução
- **Estágio Atual:** Assinatura do contrato prevista para 26/08/2016.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 25: Impact Evaluation Workshop Instambul

- **Responsável:** Inês Studart
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 2.894,02
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Maio 2015.
- **Estágio Previsto:** Concluído
- **Estágio Atual:** **CONCLUÍDO E PAGO.** Recebido os documentos comprobatórios do curso (Certificado e Relatório de Viagem).
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SEDUC

Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

| ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO E CONTRATAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SEDUC | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|-------|
| Nº | Órgão | Responsável | Subprojetos | Tempo de execução do contrato em meses | Tempo estimado para assinatura do contrato em meses | Tempo contratação + execução em meses | Risco |
| 1 | SEDUC | Jussara Batista | Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo. | 12 | 4 | 16 | Alto |
| 2 | SEDUC | Jussara Batista | Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores , professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado. Incluindo a Avaliação de Desempenho Institucional | 6 | 4 | 10 | Médio |
| 3 | SEDUC | Luciano Nery | Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (02 analistas) | 12 | 4 | 16 | Alto |
| 4 | SEDUC | Lucas Fernandes e Celana Skeff | Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey). | 3 | 2 | 5 | Médio |
| 5 | SEDUC | Lucas Fernandes e Celana Skeff | Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil. | 10 | 4 | 14 | Alto |

Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

| ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO E CONTRATAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SEDUC | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|-------|
| Nº | Órgão | Responsável | Subprojetos | Tempo de execução do contrato em meses | Tempo estimado para assinatura do contrato em meses | Tempo contratação + execução em meses | Risco |
| 6 | SEDUC | Lucas Fernandes e Celana Skeff | Contratação de empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto. | 10 | 3 | 13 | Médio |
| 7 | SEDUC | Lucas Fernandes e Celana Skeff | Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados | 1 | 3 | 4 | Baixo |
| 8 | SEDUC | Lucas Fernandes e Celana Skeff | Contratação de serviços técnicos de Empresa de Consultoria especializada em <u>visitas domiciliares e para formação dos Agentes</u> de Desenvolvimento Infantil e dos supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN). | 10 | 1 | 11 | Médio |
| 9 | SEDUC | Lucas Fernandes e Celana Skeff | Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN. (Coleta de Dados). | 16 | 1 | 17 | Alto |
| 10 | SEDUC | Lucas Fernandes e Celana Skeff | Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN. | 16 | 1 | 17 | Alto |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 11 meses |
| | Médio - de 12 a 14 meses |
| | Alto - de 15 e 16 meses |
| | Altíssimo - acima de 16 meses - Inviabiliza o Projeto |

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 29: Contratação de serviços de consultoria para avaliação de desempenho acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará. (Teste de Proficiência)

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 330.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Setembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Em licitação – Elaborando RAT, com previsão de entrega até 30/09/16.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 30: Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da **formação continuada para gestores**, professores e instrutores de educação profissional secundárias do Estado (com a inclusão da Avaliação de Desempenho Institucional).*

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 83.599,52
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Abril 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em licitação – SDP lançada, com data prevista para abertura das propostas em 17/10/2016. Reunião prévia marcada para dia 04/10/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 31: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (02 analistas).

- **Responsável:** Luciano Nery
- **Categoria de Licitação:** CI
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 52.936,96
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Atividades Preparatórias – SEDUC abrindo processo de Manifestação de Interesse, com data de envio à Cel04 em __/____.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 32: Impact Evaluation Workshop Istanbul

- **Responsável:** Luciano Nery
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 3.154,13
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** **CONCLUÍDO E PAGO.** Recebido os documentos comprobatórios do curso (Certificado, e Relatório de Viagem).
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 33: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 4.466,03
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Julho 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 34: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 21.255,20
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Negociando contrato com a consultora. Aguardando decisão quanto a disponibilidade da consultora para data prevista.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 35: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de **formação para gestores das creches e pré-escolas** dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 244.309,68
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Dezembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Processo em enviado em análise na Cel04, para lançamento da SDP desde 09/09/16 .
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 36: Contratação de empresa especializada para operacionalizar e executar os **serviços de logística** das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 318.941,00
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2016 – Fevereiro 2017
- **Estágio Previsto:** Preparação do Edital .
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Edital elaborado e enviado para SEDUC em 28/09/2016. Aguardando providencias e validação para envio a Cel04.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 37: Contratação de Empresa Especializada para serviço de **Impressão Gráfica dos materiais** de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 88.677,98
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2016 - Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Atividades Preparatórias
- **Estágio Atual:** Em Atividades Preparatórias – Processo enviado a SEDUC em 28/09 para validação de datas e assinaturas, para posterior lançamento do edital.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 38: Contratação de Consultor Individual Especialista em **Avaliação de Programas para Identificar o Impacto** do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)*

- **Responsável: SEDUC** - Lucas Fernandes/ **IPECE** - Jimmy Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor Subprojeto :** US\$ 16.557,58
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2014 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 39: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 25.207,85
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 40: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 29.188,04
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica –Assistência à Família

*Subprojeto 41: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de **Arte Gráfica/Design**, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 61.838,85
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Assistência Técnica –Assistência à Família

Subprojeto 42: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 205.110,94
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** : Em fase final de contratação – Contrato assinado providenciando publicação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 43: Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 312.490,78
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fev 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contratado.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 44: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados).

- **Responsável:** SEDUC – Lucas Fernandes / IPECE - Jimmy Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 1.168.459,98
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em fase final de contratação – SEDUC providenciando homologação e assinatura do contrato.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 45: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN

- **Responsável: SEDUC** – Lucas Fernandes/ **IPECE** - Jimmy Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 34.415,38
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Março 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Em Fase final de contratação – SEDUC providenciando assinatura do contrato.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SEMA


Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

| Nº | Responsável | Subprojeto | Valor US\$ Memória de Cálculo | Tempo de Execução do Contrato em meses | Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses | Tempo Contratação + Execução em meses | Risco |
|--------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|--|-------|
| 1 | Maria Dias e Monica Freitas | Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais. | 224.000,00 | 9 | 3 | 13 | |
| 2 | Maria Dias e Fabiola Martins | Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas. | 731.184,82 | 15 | 2 | 17 | |
| TOTAL | | | 955.184,82 | | | | |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 11 meses |
| | Médio - de 12 a 14 meses |
| | Alto - de 15 e 16 meses |
| | Altíssimo - acima de 16 meses - Inviabiliza o Projeto |

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 46: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto “AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.” (AIEDA)

- **Responsável:** Maria Dias / Magda Marinho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 391.476,75
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2014 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Contrato Assinado
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 47: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 314.274,86
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Agosto 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução - Contrato 06/2016 - Publicado em 15/04/2016. Empresa vencedora Consórcio Engesoft Engenharia / Quanta Consultoria Ltda. (R\$ 710.638,32).
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 48: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicos.

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor Subprojeto:** US\$ 107.269,38
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Fevereiro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em execução - Contrato 26/2015 - Publicado em 08/12/2015
Empresa vencedora MSV Multiserviços ME (R\$ 242.557,52).
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 49: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Maria Dias / Francisco Leorne
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** 174.236,97
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2014 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contratado – Contrato assinado e publicado em 19/08/2016.
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 50: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Maria Dias / Monica Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 224.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação - RAT com alterações revistas em 28/09/2016 ,com previsão de envio a Cel04 em ____/____ .
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 51: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 1.153.752,25
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Março 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Contrato assinado.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 52: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias e Fabiola Martins
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 731.184,42
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Novembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – SEMA realizando ajustes na Justificativa Técnica para aceitação do preço, de acordo com sugestões da UGP, para posterior envio dos documentos a Cel04 para divulgação do resultado final.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SEMACE



Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

| Nº | Responsável | Subprojeto | Valor US\$ Memória de Cálculo | Tempo de Execução do Contrato em meses | Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses | Tempo Contratação + Execução em meses | Risco |
|--------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|--|-------|
| 1 | Elizabeth Romão e Tiago Bessa | Contratação de consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE. | 358.092,90 | 14 | 1 | 15 | |
| TOTAL | | | 368.092,90 | | | | |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 11 meses |
| | Médio - de 12 a 14 meses |
| | Alto - de 15 e 16 meses |
| | Altíssimo - acima de 16 meses - Inviabiliza o Projeto |


Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 53: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de **capacitação** para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE*

- **Responsável:** Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 358.092,90
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Reunião de negociação realizada em 27/09/2016, realizando ajustes para finalização da ata.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 54: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a **Manualização dos Procedimentos Técnicos** dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.*

- **Responsável:** Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 210.190,31
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2014 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Contrato assinado.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



SRH

Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

| Nº | Responsável | Subprojeto | Valor US\$ Memória de Cálculo | Tempo de Execução do Contrato em meses | Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses | Tempo Contratação + Execução em meses | Risco |
|--------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|--|-------|
| 1 | Karine Machado e Sergio Câmara | Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga e Cobrança. | 446.328,65 | 12 | 1 | 13 | |
| 2 | Karine Machado e Sergio Camara | Sistema de Informação de Gestão dos Recursos Hídricos (cadastro, fiscalização, outorga, monitoramento qualitativo, segurança de barragens e medição) com Integração com o Sistema Administrativo Financeiro PROTHEUS. | 418.975,09 | 12 | 1 | 13 | |
| TOTAL | | | 865.303,74 | | | | |

| | |
|--|---|
| | Baixo - de 0 a 11 meses |
| | Médio - de 12 a 14 meses |
| | Alto - de 15 e 16 meses |
| | Altíssimo - acima de 16 meses - Inviabiliza o Projeto |

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 64: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.

- **Responsável:** Karine Machado e Marcilio Caetano
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 446.328,65
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Reunião de negociação ocorreu no dia 26/09/2016, SRH realizando ajustes na minuta do contrato com previsão de retorno para UGP em ____/____.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 65: Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. **SIGERH***

- **Responsável:** Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 418.975,09
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Em fase final de negociação de contrato , SRH realizando as alterações no TDR em decorrência da negociação contratual. Com previsão de retorno à UGP em ___/___.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 66: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - **Malha D'agua.***



- **Responsável:** Karine Machado
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do TOR:** US\$ 152.839,20
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contratado – Contrato assinado em 18/05/2016, aguardando publicação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



TCE


Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 73: Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.

- **Responsável:** Glinton Ferreira / Delinda Almeida
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 843.588,82
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/ Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato assinado.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 74: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 84.010,26
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Contrato concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 75: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 100.915,62
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** CONTRATO CONCLUÍDO.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



4. APROVAÇÃO DA ATA

31ª REUNIÃO COMITÊ *PforR* (25/08/2016)

Próxima Reunião do Comitê PforR

Próxima Reunião do Comitê PforR:

27/10/2016
14h30m - IPECE



6. ENCAMINHAMENTOS

Encaminhamentos da 31ª Reunião realizada em 25/08/2016

✓ Todos os encaminhamentos realizados.



6. ENCERRAMENTO
