



29ª REUNIÃO DO COMITÊ *PforR*
ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO
PROJETO *PforR*
30 DE JUNHO DE 2016



PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

1. Abertura e apresentação dos participantes (14h30-14h35)
2. Algumas Informações (14:35 – 14h45m):
 - 2.1 Posição da Reestruturação do PforR
 - 2.2 Exemplo de Melhor Prática observada durante Missão de Supervisão das Aquisições – **Hoilton Rios**
3. Indicadores, Plano de Ação, Programas e Assistência Técnica (14h45 - 16h)
 - 3.1. Indicadores Primários 2016.1 e Desembolsos - **Laura Gonçalves**
 - 3.2. Indicadores Secundários 2016.2 - **Laura Gonçalves**
 - 3.3. Plano de Ação de Mitigação de Riscos – **Laura Gonçalves**
 - 3.4. Programas PforR - **Thâmara Teixeira**
 - 3.5. Assistência Técnica: Estatísticas – **Livia Castro e Rodrigo Almeida**
 - 3.6. Tempo disponível do PforR
 - 3.7. Projetos de Assistência Técnica em situação de risco
 - 3.8. Situação Atual Aquisições dos Projetos de Assistência Técnica – **Viviane Ramos / Giuseppe Nogueira**
4. Aprovação da Ata da 28ª Reunião (25/05/2016) (16h - 16h10m)
5. Encaminhamentos (16h10m - 16h20m)
6. Encerramento (16h20m)



1. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES



2. ALGUMAS INFORMAÇÕES



2.1 Posição da Reestruturação do PforR

2.1 Posição da Reestruturação do PforR

✓Relatório de Solicitação da Reestruturação enviado a SEAIN em 21/06/16;

✓Pontos solicitados:

1. Remanejamento de Recursos no valor de US\$10.000.000,00 do Componente II para o Componente I;
2. Modificação da cláusula do limite de Adiantamento de desembolso para 25% ou US\$ 78.750.000,00;
3. Alteração do título de 1 indicador (DLI 11) e de metas de três Indicadores, DLI 4 da STDS e DLI 11 e 12 da SEPLAG;

✓Cronograma:

Atividades	Datas Previstas
1. A Justificativa Técnica será analisada pelo Grupo Técnico da COFIEX	13/07/2016
2. Encaminhamento do documento à Secretaria do Tesouro Nacional - STN	27/07/2016
3. Conclusão do Parecer da PGFN	17/08/2016
4. Retorno ao Banco Mundial e ao Estado do Ceará aprovando a elaboração do Aditivo	26/08/2016
5. Previsão para assinatura do Aditivo de reestruturação do PforR	06/09/2016



2.2 Exemplo de Melhor Prática observada durante Missão de Supervisão das Aquisições com Danilo Carvalho

13-17 de Junho de 2016:

Planilha de Gerenciamento de Contratos - FUNCEME

Planilha de Gerenciamento de Contratos - FUNCEME

PLANO DE TRABALHO - ACOMPANHAMENTO FÍSICO

ATIVIDADE	Indicadores PforR	Versão Preliminar		Versão Revisada 1		Versão Revisada 2		Versão Final				
		Entrega	Revisão	Entrega	Revisão	Entrega	Revisão	No. Processo	Data	Aprovação		
ATIVIDADE 1: DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA DE MODELAGEM DA QUALIDADE DA ÁGUA EM RESERVATÓRIOS												
PRODUTO 1	Diagnóstico e caracterização dos reservatórios	REALIZADO		04.11.15	20.11.15	18.12.15	11.01.16	22.01.16	02.02.16	0808030/2016	05.02.16	10.02.16
		PREVISTO		02.11.15							23.11.15	21.12.15
PRODUTO 2	Metodologia de Qualidade de Água para Reservatórios do Estado do Ceará - Estudo de viabilidade e hierarquização dos modelos identificados e avaliados.	REALIZADO	15.02.16	08.01.16	19/01/2016 ⁽¹⁶⁾	03.02.16				0903890/2016	12.02.16	15.02.16
		PREVISTO	31.12.15	17.12.15							18.01.16	22.02.16
ATIVIDADE 2: SISTEMA DE MONITORAMENTO E AQUISIÇÃO DE DADOS												
RELATÓRIO 1	Descrição do desenho experimental da rede de monitoramento e o sistema de monitoramento preliminar da qualidade da água	REALIZADO		26.11.15	10.12.15	20.01.16	02.02.16	N/A	N/A	0808375/2016	05.02.16	10.02.16
		PREVISTO		23.11.15							11.12.15	25.01.16
RELATÓRIO 2	Relatório documentando a atividade de coleta de dados e dificuldades encontradas	REALIZADO		06.04.16	20.04.16	24.05.16	06.06.16	14.06.16	20.06.16	4231331/2016	28.06.16	
		PREVISTO		04.04.16							25.04.16	30.05.16
PRODUTO 3	Protocolo de Coleta de Dados para o Monitoramento da Qualidade de Água	REALIZADO	05.02.16	15.12.15	23.12.15	20.01.16	02.02.16	N/A	N/A	0808626/2016	05.02.16	10.02.16
		PREVISTO	31.12.15	30.11.15							18.12.15	01.02.16
PRODUTO 4	Banco de dados georreferenciado	REALIZADO										
	Desenvolvimento ⁽¹¹⁾	PREVISTO		09.03.16	19.05.16	21.05.16	21.06.16					
	Carregamento			01.02.16							26.09.16	07.10.16
				26.12.16							09.01.17	20.01.17
ATIVIDADE 3: IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE MODELAGEM NOS RESERVATÓRIOS SELECIONADOS												
RELATÓRIO 3	Relatório da estratégia proposta e análise dos resultados: Aplicação da Estratégia Proposta - Modelagem e Sistema de Monitoramento - para o Acarape do Melo	REALIZADO		03.06.16	21/06/2016 ⁽¹⁷⁾							
		PREVISTO	31.12.16	30.05.16							04.07.16	18.07.16
RELATÓRIO 4	Relatório com avaliação da metodologia/estratégia proposta: Aplicação da Metodologia Proposta e Recomendação final da abordagem a ser adotada para a Modelagem da qualidade da água	REALIZADO										
		PREVISTO		05.09.16							10.10.16	24.10.16
PRODUTO 5	Modelo da qualidade de água para os três reservatórios objeto do estudo calibrado e validado; banco de dados atualizado; versão fonte do modelo; manual de utilização e calibração detalhado	REALIZADO										
		PREVISTO	31.12.17	21.11.16							21.11.16	20.03.17
RELATÓRIO 5	Relatório com recomendações e detalhamento do que necessita ser feito para implementar a metodologia em outros açudes do Ceará	REALIZADO										
		PREVISTO		23.01.17							20.02.17	06.03.17

Planilha de Gerenciamento de Contratos - FUNCEME

Pontos Importantes

- Indicação do gestor do contrato e formalização da comissão de acompanhamento e fiscalização.
- Leitura e discussão dos termos de referência e do contrato.
- Reunião de kick-off:
 - Discussão e detalhamento do cronograma de execução física;
 - Fluxo de comunicação;
 - Formato e meio de entrega dos produtos;
 - Definição do processo de entrega, análise e aprovação dos produtos (formato, meio ...).
- Emissão da ordem de serviço.
- Reuniões de avaliação.



3. INDICADORES, PLANO DE AÇÃO, PROGRAMAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA



3.1. Indicadores Primários 2016.1

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2016

n°	SETORIAL RESPONSÁVEL	Indicadores			Metas	
		N°	DLI	Nome	2016	
					1° Semestre	2° Semestre
1	SDE	1	DLI1	Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação	Uma ação do plano de ação implementado	-
2	SEDUC	2	DLI2	Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	-
		3	DLI3	Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso.	13	15
3	STDS	4	DLI4	Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS.	-	7%
		5	DLI5	Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	42.5%	55%
4	SEPLAG	6	DLI6	Percentual de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com Marco Lógico implementado.	55%	70%
5	SRH	7	DLI7	Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	Minutas de pelo menos duas reuniões
6	CAGECE	8	DLI8	Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	85.2%	85.5%
7	SEMA/SEMACE/COGERH	9	DLI9	Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	65%	70%
8	FUNCEME	10	DLI10	Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	-	Metodologia implementada em um reservatório estratégico
9	SEPLAG	11	DLI11	Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	3	4
		12	DLI12	Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	5%	10%
Total de Indicadores em 2016: 12 Indicadores						
Total de Indicadores com metas para o 1º Semestre: 10 Indicadores						

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 1: aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação.	SDE Filipe Rabelo	2013.2	Projeto de documento de estratégia preparado e 4 acordos com setor privado e 4 acordos com universidades assinados	39.375.000,00	
		2014.1	Comitê instituído pelo decreto	4.462.500,00	
		2014.2	Documento de estratégia finalizado	6.198.000,00	
		2015.1	Plano de ação publicado	2.744.448,00	
		2015.2	-	-	
		2016.1	Uma ação do plano de ação implementado	3.444.000,00	
		2016.2	-	-	
		2017.1	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação	3.444.000,00	
		2017.2	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação	3.120.000,00	
		Total do Indicador			

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 1º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 1: Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação.	SDE Filipe Rabelo	Uma ação do plano de ação implementado	A Ação 06 do Plano de Ação foi implementada	A meta foi alcançada. A Ação implementada é a de número 6 descrita no Plano de Ação (Diversificar a oferta do Ensino Médio, articulando-o com a Educação Profissional, com o mundo do trabalho para melhor aproveitamento da Rede de Educação Profissional). A SECITECE e a SEDUC assinaram um Termo de Cooperação a fim de formalizar a interação das Ações E-Jovem e Corredores Digitais. O Termo foi publicado no DOE em 29/06/16.

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP.	SEDUC Rivanir Bezerra	2015.1	-	-	
		2015.2	-	-	
		2016.1	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	3.444.000,00	
		2016.2	-	-	
		2017.1	Segundo relatório de acompanhamento publicado	3.444.000,00	
		2017.2	-	-	
		Total do Indicador			6.888.000,00

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 1º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	SEDUC Rivanir Bezerra	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	A meta foi alcançada. O Relatório foi publicado na página da SEDUC.

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.	SEDUC Rivanir Bezerra	2015.1	10	2.744.444,00	
		2015.2	12	3.403.750,00	
		2016.1	13	3.444.000,00	
		2016.2	15	3.438.000,00	
		2017.1	16	3.444.000,00	
		2017.2	18	3.120.000,00	
		Total do Indicador			

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 1º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.	SEDUC Rivanir Bezerra	13 acordos	13 acordos foram firmados	Indicador já foi cumprido pela SEDUC e a evidência foi enviada ao Banco Mundial em 18/05/16 que confirmou o cumprimento da meta através de e-mail em 27/05/16.

Legenda:  Meta já alcançada

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas*	Valores em US\$	Farol
DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	2015.2	5%	3.403.750,00	
		2016.2	7%	3.438.000,00	
		2017.2	10%	3.120.000,00	
		Total do Indicador		9.961.750,00	

*As metas deste Indicador foram alteradas na reestruturação, anteriormente eram: 10%, 15% e 25%

Legenda: Meta alcançada em 51,10%

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	7% ¹	5,11%	Um Cronograma de visitas foi elaborado pela equipe da STDS, aos 36 municípios no âmbito do PforR para o cumprimento do indicador até o segundo semestre de 2016. Está sendo realizada articulação com os gestores e equipes municipais, para a execução do acompanhamento familiar. E o Sistema de Monitoramento próprio está em fase de elaboração pela Equipe de Tecnologia da Informação e do PforR da STDS para registro do acompanhamento.


¹Meta alterada por ocasião da reestruturação do PforR

REESTRUTURAÇÃO: Alteração de Meta

Indicador Primário	Mudança	Período	Antes	Proposta
DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.	Alterações de Metas	2016.2	15%	7%
		2017.2	25%	10%

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol	
DLI 5: Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	2015.1	15%	2.744.444,00		
		2015.2	30%	3.403.750,00		
		2016.1	42.5%	3.444.000,00		
		2016.2	55%	3.438.000,00		
		2017.1	75%	3.444.000,00		
		2017.2	95%	3.120.000,00		
		Total do Indicador			19.594.194,00	


Legenda:  Metas alcançadas

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 1º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	42,5%	65,45%	Será realizada, no período de 18 a 22 de julho de 2016, Capacitação Geral/ Módulo I, para os Técnicos de Nível Médio, dos 36 Municípios do PforR. Os Gestores e profissionais estão sendo mobilizados pela STDS, para garantir a participação dos profissionais no eventos de Capacitação e o cumprimento do Indicador.

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	SEPLAG José Freitas	2015.1	22.5%	2.744.444,00	
		2015.2	45%	3.403.750,00	
		2016.1	55%	3.444.000,00	
		2016.2	70%	3.438.000,00	
		2017.1	82.5%	3.444.000,00	
		2017.2	95%	3.120.000,00	
		Total do Indicador			

Legenda:  Metas alcançadas

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 1º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 6: Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	SEPLAG José Freitas	55%	55%	<p>A meta foi alcançada e o Relatório foi enviado ao BM.</p> <p>Neste semestre o total de 07 Projetos do Fecop foram incluídos em Marcos Lógicos.</p> <p>(Número total de Projetos na Assistência à Família de 12/01 a 11/05 = 60, sob 55% = 33 Projetos, no acumulado de 2015.2, 26 Projetos já foram incluídos restando portanto 7 Projetos.</p>

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicadores	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 7: Estabelecimento de um Comitê multisetorial de Segurança Hídrica.	SRH Carlos Campelo	2013.2	Comitê instituído pelo decreto	39.375.000,00	
		2015.1	Diagnóstico de Bacias completos	2.744.444,00	
		2016.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.444.000,00	
		2016.2	Minutas de pelo menos duas reuniões	3.438.000,00	
		2017.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.444.000,00	
		2017.2	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.120.000,00	
		Total do Indicador			55.565.444,00

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 1º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Metas	Realizado	Status
DLI 7: Estabelecimento do Comitê multisetorial de Segurança da Água.	SRH Carlos Campelo	Atas de pelo menos duas reuniões realizadas	Duas Atas enviadas	A meta foi alcançada. As Atas foram enviadas para a UGP que encaminhou ao Banco Mundial em 17/05/16.

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	CAGECE Carlos Rossas	2014.1	83.8%	5.250.000,00	
		2014.2	84.3%	6.198.000,00	
		2015.1	84.6%	2.744.444,00	
		2015.2	84.9%	3.403.750,00	
		2016.1	85.2%	3.444.000,00	
		2016.2	85.5%	3.438.000,00	
		2017.1	85.7%	3.444.000,00	
		2017.2	85.9%	3.120.000,00	
		Total do Indicador			

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 1º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Metas	Realizado	Status
DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	CAGECE Carlos Rossas	85.2%	86,48	<p>As metas para este Indicador já foram alcançadas até o final do Projeto com o resultado de 86,05%.</p> <p>O resultado do mês de maio foi de 86,48%.</p>





INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicadores	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 9: Índice da qualidade da fiscalização ambiental	2014.1	28%	5.250.000,00	■
	2014.2	40%	6.198.000,00	■
	2015.1	50%	2.744.444,00	■
	2015.2	60%	3.403.750,00	■
	2016.1	65%	3.444.000,00	■
	2016.2	70%	3.438.000,00	
	2017.1	75%	3.444.000,00	
	2017.2	80%	3.120.000,00	
	Total do Indicador			31.042.194,00

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	SEMA Maria Dias SEMACE Tiago Bessa COGERH Denilson Fidelis	65%	65,74%	65,74% (Medição referente a 30/04/2016).

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME Hoilton Rios	2015.1	Metodologia de monitoramento definida e adotada.	2.744.444,00	
		2015.2	Protocolo de coleta de dados definida e adotada.	3.403.750,00	
		2016.2	Metodologia implementada em um reservatório estratégico.	3.438.000,00	
		2017.2	Metodologia implementada em dois reservatórios estratégicos adicionais.	3.120.000,00	
		Total Indicador			12.706.194,00

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2º Semestre de 2016


Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME Hoilton Rios	Metodologia implementada em um reservatório estratégico.	-	Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em execução no âmbito do Contrato Nº 010/2015. Foi reapresentado o Relatório 02 (Documentação da atividade de coleta de dados e dificuldades encontradas), com as correções solicitadas. Foram feitas algumas observações, por parte da comissão fiscalizadora, sobre a estrutura do Banco de Dados. Foi apresentado, pelo consórcio, a primeira versão do Relatório 03 (Estratégia proposta e análise dos resultados).

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.*	SEPLAG Avilton Júnior	2014.2	Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará.**	6.198.000,00	
		2015.1	1	2.744.444,00	
		2015.2	2	3.403.750,00	
		2016.1	3	3.444.000,00	
		2016.2	4	3.438.000,00	
		2017.1	5	3.444.000,00	
		2017.2	6	3.120.000,00	
		Total			25.792.194,00

* Nome do Indicador alterado por ocasião da reestruturação do PforR

** Meta do Indicador alterada por ocasião da reestruturação do PforR

Legenda:  Probabilidade baixa de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 1º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Metas	Realizado	Status
DLI11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	SEPLAG Avilton Júnior	2014.2	-	Ainda não foi possível cumprir as metas deste indicador, pois o mesmo depende da realização das atividades da Empresa contratada. De acordo com o cronograma, a previsão é que o modelo seja aprovado neste mês de julho ou no início de agosto.
		Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará.		
		2015.1		
		1 Secretaria		
		2015.2		
		2 Secretarias		
		2016.1		
3 Secretarias				

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada	SEPLAG Adauto Oliveira	2014.2	Aprovação da metodologia	6.198.000,00	
		2015.1	-	-	
		2015.2	-	-	
		2016.1	5%	3.444.000,00	
		2016.2	10%	3.438.000,00	
		2017.1	15%*	3.444.000,00	
		2017.2	20%*	3.120.000,00	
		Total			19.644.000,00

*As metas deste Indicador foram modificadas na reestruturação do PforR, anteriormente as metas eram 25% e 40%

Legenda:



Meta alcançada

Probabilidade intermediária de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 1º Semestre de 2016

Indicador	Setorial Responsável	Metas	Realizado	Status
DLI12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	SEPLAG Adauto Oliveira	2014.2	Aprovação da Metodologia	A meta foi alcançada. A metodologia foi aprovada e encaminhada como Evidência ao Banco Mundial.
		Aprovação da Metodologia		
		2016.1	-	A Seplag enviou a Comunicação Interna nº29/2016 informando que essa meta será alcançada em meados de Julho, pois é o período estipulado no cronograma de trabalho da Empresa de Consultoria.
		5% dos Projetos		

REESTRUTURAÇÃO: Alteração de Meta

Indicador Primário	Mudança	Período	Antes	Proposta
DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada.	Alterações de Metas	2014.2	"Aprovação da Metodologia". (Publicação de Decreto)	"Aprovação da Metodologia". (Minuta do Decreto)
		2017.1	25%	15%
		2017.2	40%	20% (Decreto publicado)




3.2. Indicadores Secundários 2016.2

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2016

n°	Setorial Responsável	N°	Indicadores	Metas 2016	
				1°Semestre	2°Semestre
1	IPECE	1	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	-	30.300
2	SEPLAG	2	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	-	Outras duas resoluções publicadas
3	STDS	3	Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada	-	15%
4	COGERH	4	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	-	-
		5	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	-	Proposta e consultas completas aos Comitês das Bacias Hidrográficas.
		6	Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	-	65.9
5	SEMA	7	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	-	Implementação e monitoramento
Total de Indicadores Secundários: 7 Indicadores					

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Meta 2º Semestre 2016

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Meta 2ª semestre	Realizado	Status
PDO1:Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	IPECE Victor Hugo	30.300	26.141 técnicos	Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos. As informações da RAIS ainda não foram disponibilizadas para 2015. Este Indicador será discutido no Comitê de Estratégia.


Legenda  Probabilidade baixa de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Meta 2ª semestre	Realizado	Status
Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	SEPLAG Lara Costa	Outras duas resoluções publicadas	-	A oficina de construção dos indicadores da Matriz Interinstitucional de Desenvolvimento Infantil, que estava marcada para o dia 06/06, teve que ser adiada, sendo agora dividida em dois dias: 01/07 e 04/07. Após a construção dessa matriz deverá ser providenciada a resolução para sua publicação.

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Metas 2ª semestre	Realizado	Status
<p>PDO2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.</p>	<p>STDS Sebastião Lopes Mary Anne</p>	<p>15%</p>	<p>-</p>	<p>Este Indicador será substituído. A STDS enviou uma proposta de Protocolo dia 29/06/16 que foi encaminhada ao Banco Mundial para análise e Não Objeção.</p>

Legenda:  Probabilidade intermediária de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Meta 2º Semestre 2016


Nome do Indicador	Setorial Responsável	Meta 2ª semestre	Realizado	Status
PDO3:Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	COGERH Denilson Fidelis, Disney Paulino	65,9	72,7	72,7 (referente ao mês de maio) IQARce: 4,23 - Críticamente degradada a poluído.

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Metas 2ª semestre*	Realizado	Status
Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	COGERH Zulene Almada	-	-	O BM enviou a NO ao Protocolo em 06/06/16. Sobre o Processo Licitatório: A Empresa selecionada foi a Nippon e aguarda-se o Aviso de Resultado final até dia 01/07/2016.

*De acordo com o novo Protocolo este Indicador só terá meta em 2017.2

Legenda:  Probabilidade baixa de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 1º Semestre 2016

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Metas 1ª semestre	Realizado	Status
Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	COGERH Ana Araújo	Proposta e consultas completas aos CBH's*	As Consultas foram realizadas nos 12 Comitês de Bacias Hidrográficas.	A meta foi alcançada. No último dia 22/06, foi apresentada no CBH Metropolitanas a Minuta do Projeto de Lei de Conservação e Recuperação dos Mananciais de interesse do Estado do Ceará, totalizando a apresentação nas 12 Bacias Hidrográficas.

*Comitês Bacias Hidrográficas

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

Nome do Indicador	Responsável	Metas	Realizado	Status
Apresentação da Lei de gestão de resíduos sólidos revista.	SEMA Maria Dias	Divulgação e implementação (2015.2)	A Lei foi aprovada e publicada	A Lei nº 16.032 de 20 de junho de 2016 que Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos no Âmbito do Estado do Ceará foi aprovada e publicada no Diário Oficial do Estado em 29/06/16.
		Implementação e monitoramento (2016.2)	-	-



3.3. Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental

Pendências do Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental-PforR

	Descrição da Ação	Responsável	Prazo	Posição
1	<p>A. Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar.</p>	STDS	1 Semestre de 2016	Aguardo da justificativa da SEDUC sobre o acompanhamento às famílias indígenas, conforme acordado na última reunião com essa setorial, para que seja possível finalizar a Nota Técnica a ser enviada a UPG/BIRD e assim ajustar as metas do Plano de Mitigação
2	<p>C. Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terras pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).</p>	SEDUC	1 Semestre de 2016	O Relatório foi finalizado e enviado ao BM.
3	<p>F. Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água.</p>	SEMA	1 Semestre de 2016	A 4ª fase da Campanha de Comunicação que trata do tema Qualidade da água foi ao ar dia 19/03/16, por ocasião da Missão em abril a Casa Civil apresentou as peças ao Banco Mundial que analisou e continua aguardando as próximas fases da campanha que irão tratar da temática Qualidade da Água de forma mais efetiva.



3.4. Programas *PforR*

Posição dos Programas

Capacitação Profissional						
SEDUC						
020 – Ensino Integrado à Educação Profissional	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Junho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 43,10	R\$ 19,59	R\$ 31,49	R\$ 10,88	56%	
020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 15,44	R\$ 7,02	R\$ 8,06	R\$ 5,38	77%	
020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 87,52	R\$ 39,78	R\$ 98,93	R\$ 53,02	133%	
020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.	R\$ 2,47	R\$ 1,12	R\$ 2,30	R\$ 0,19	17%	
020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.	R\$ 29,00	R\$ 13,18	R\$ 30,00	R\$ 3,38	26%	
TOTAL CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	R\$177,53	R\$ 80,69	R\$170,78	R\$ 72,85	90%	

* Execução até 30.06.2016



Legenda dos faróis

81% a 100% de execução
 51% a 80% de execução
 0% a 50% de execução

Posição dos Programas

Assistência à Família						
STDS						
080 – Proteção Social Básica	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Junho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.	R\$ 8,10	R\$ 3,68	R\$10,51	R\$ 3,68	100%	
TOTAL ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA	R\$ 8,10	R\$ 3,68	R\$10,51	R\$ 3,68	100%	

* Execução até 30.06.2016

Posição dos Programas

Qualidade da Água						
CIDADES						
025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Junho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
025.1.12 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário.	R\$ 4,99	R\$ 2,27	R\$ 7,01	R\$ -	0%	

SEMA						
064 – Resíduos Sólidos	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Junho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.	R\$ 2,00	R\$ 0,91	R\$ 3,00	R\$ 0,10	11%	
066 – Ceará Mais Verde	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Junho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.	R\$ 2,00	R\$ 0,91	R\$ 3,00	R\$ -	0%	
067 – Ceará no Clima	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Junho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
067.1.05 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro.	R\$ 1,50	R\$ 0,68	R\$ 2,00	R\$ -	0%	

* Execução até 30.06.2016



Legenda dos faróis

81% a 100% de execução
 51% a 80% de execução
 0% a 50% de execução



Posição dos Programas

Qualidade da Água						
SEMACE						
066 – Ceará Mais Verde	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Junho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
066.1.08 – Publicação de Inventário Florestal do Estado do Ceará Elaborado.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
066.1.12 – Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará.	R\$ 1,62	R\$ 0,74	R\$ 1,00	R\$ -	0%	
066.1.13 – Ampliação das ações de proteção dos recursos ambientais das áreas protegidas do Estado do Ceará.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,13	129%	
067 – Ceará no Clima	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Junho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.	R\$ 2,00	R\$ 0,91	R\$ 0,18	R\$ -	0%	
067.1.11 – Realização de análise da qualidade dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Junho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas.	R\$ 0,25	R\$ 0,11	R\$ 0,60	R\$ -	0%	

* Execução até 30.06.2016



Legenda dos faróis

81% a 100% de execução
 51% a 80% de execução
 0% a 50% de execução

Posição dos Programas

Qualidade da Água						
FUNCEME						
018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis	Previsão			Execução*	%	
	2016 (A)	até Junho (B)	2017 (C)	2016 (D)	2016 (D)/(B)	FAROL (D)/(B)
018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias.	R\$ 1,81	R\$ 0,82	R\$ 1,91	R\$ 1,02	125%	
018.1.03 - Ampliação e modernização do sistema de monitoramento e previsão.	R\$ 0,05	R\$ 0,02	R\$ 0,07	R\$ -	0%	
TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 16,22	R\$ 7,37	R\$ 18,76	R\$ 1,25	17%	
TOTAL	R\$ 201,84	R\$ 91,75	R\$ 200,06	R\$ 77,78	85%	39%

* Execução até 30.06.2016

Posição dos Programas

Sumário de Execução 2016 até 30.06.2016				
Eixo	Setorial	Previsão	Execução	%
Capacitação Profissional	SEDUC	R\$ 177,53	R\$ 72,85	41%
Assistência à Família	STDS	R\$ 8,10	R\$ 3,68	45%
Qualidade da Água	CIDADES	R\$ 4,99	R\$ -	0%
	SEMA	R\$ 5,50	R\$ 0,10	2%
	SEMACE	R\$ 3,87	R\$ 0,13	3%
	FUNCEME	R\$ 1,86	R\$ 1,02	55%
Total		R\$ 201,84	R\$ 77,78	39%

Execução Acumulada Projeto até 30.06.2016		
Meta 2014-2017	R\$ 878,38	100%
Execução 2014	R\$ 243,35	27,70%
Execução 2015	R\$ 233,13	26,54%
Execução 2016	R\$ 77,78	8,85%
Total Executado	R\$ 554,25	63,10%
2016-2017	R\$ 324,12	36,90%

Posição dos Programas

✓ **Lembrete:** Regras Programas


A execução dos programas deve observar as seguintes restrições:

- Devem excluir despesas que são financiadas pelo próprio BIRD ou por outras operações de crédito, ou seja, não é permitido a alocação de recursos do BIRD ou outras operações de crédito para custear despesas dos programas e iniciativas do componente
- Verificar a lista negra do BIRD a cada licitação, antes de assinar contrato. Para atender o Art. 42 da Lei 8.666/93 a SEPLAG incluiu no orçamento de cada ação um valor na fonte 69;
- Não podem apresentar impacto sócio ambiental negativo;
- Os valores dos contratos não podem exceder os limites abaixo:
 - Obras = US\$ 50 milhões
 - Bens = US\$ 30 milhões
 - Sistemas de TIC = US\$ 20 milhões
 - Consultorias = US\$ 15 milhões.




3.5. Assistência Técnica – Estatísticas

Execução dos Subprojetos de AT por Etapa

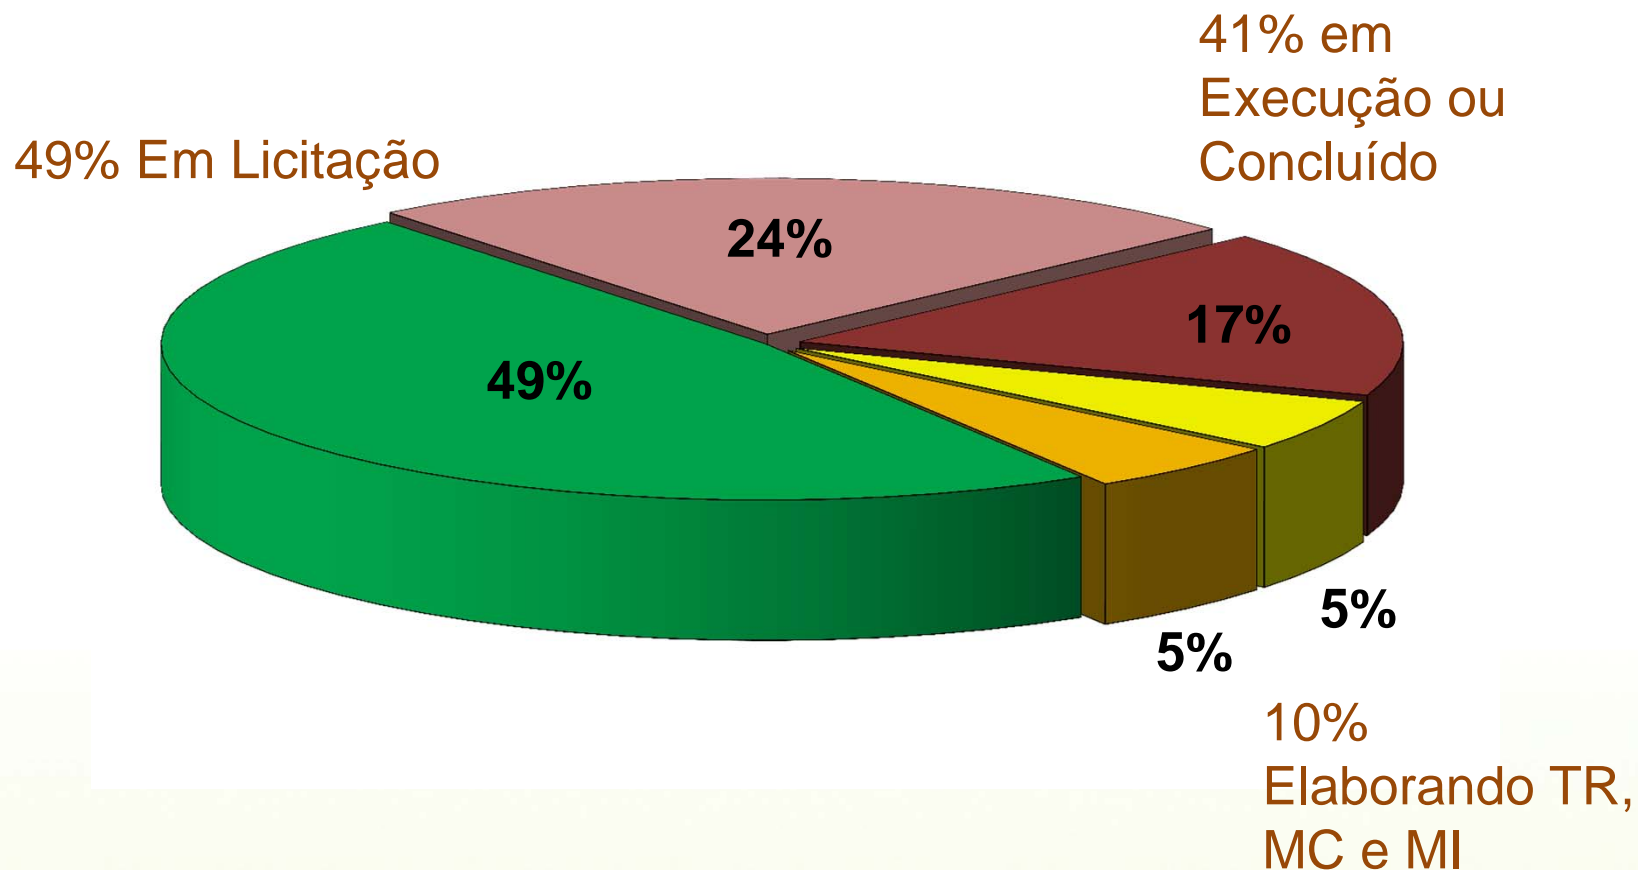

Execução dos Subprojetos de AT por Etapa

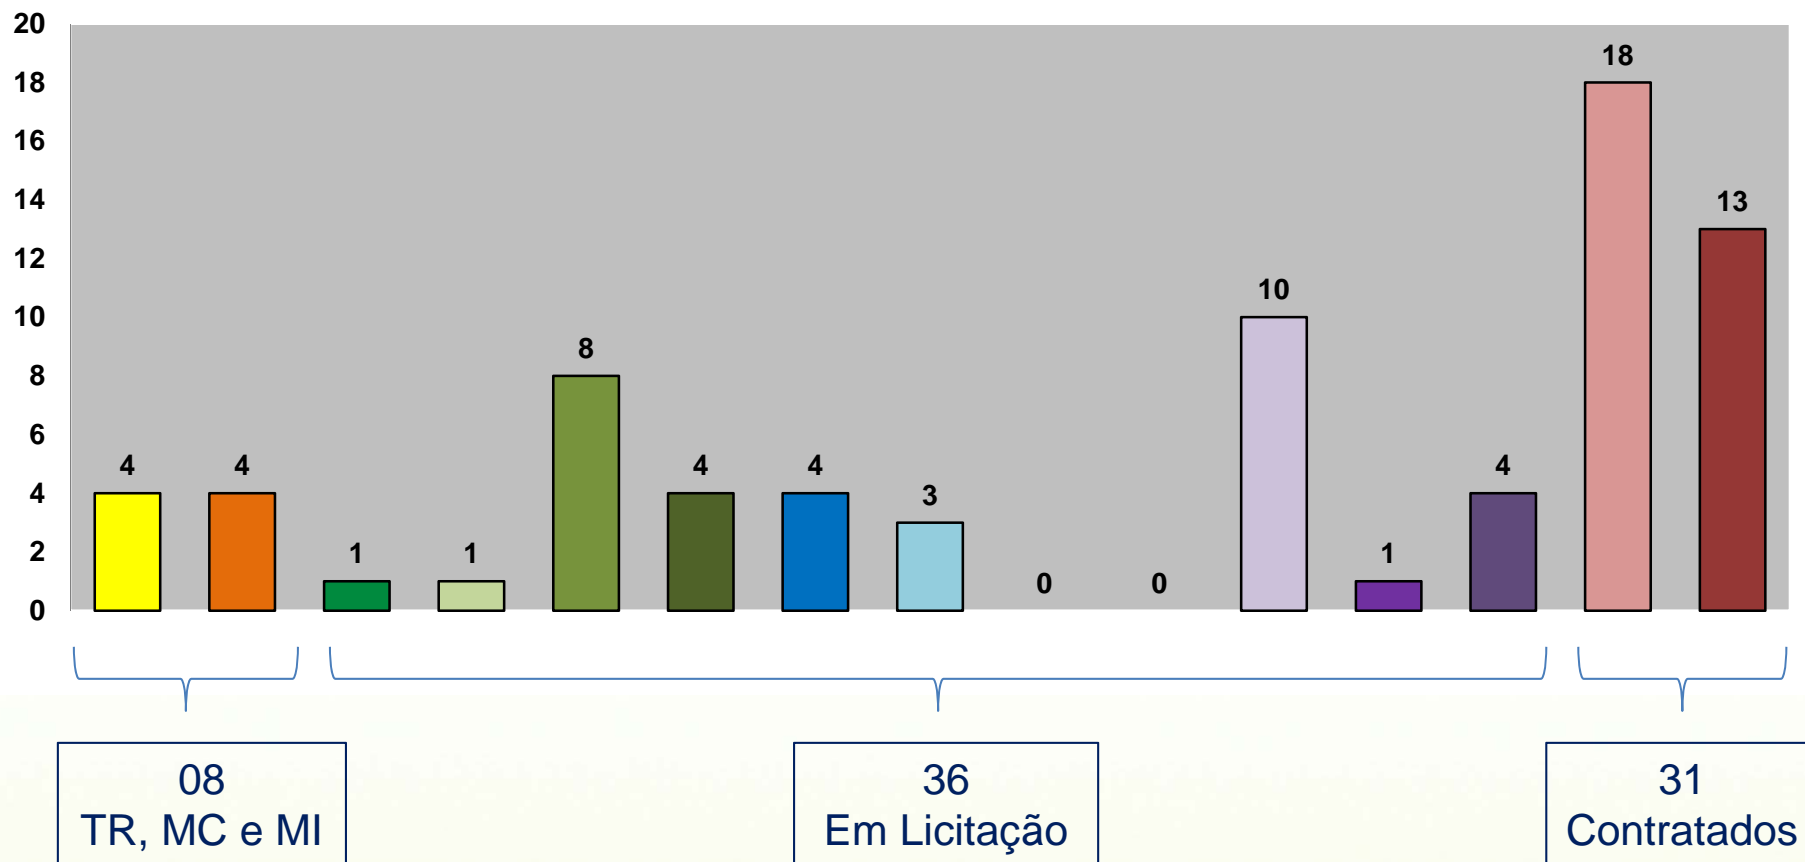

Sub projetos de Assistência Técnica por Etapa

Etapas			Setoriais com Subprojetos	Valor US\$
1	TDR e MC sendo elaborados para NO BM	4	CGE(11); SEDUC(31,37); SEPLAG(58);	\$ 1.288.028,33
2	TDR e MC aprovado pelo BM e elaborando MI	4	CGE(07); SEDUC(32,35,43);	\$ 850.348,83
3	Manifestação de Interesse Publicada	1	SEPLAG(55);	\$ 70.825,78
4	Elaborando o Relatório Final da Lista Curta	1	SEDUC(30);	\$ 61.635,53
5	Elaborando a Solicitação de Proposta	8	CGE(08,10); IPECE(21,22); SECITECE(26); SEDUC(36); SEPLAG(61,62);	\$ 3.140.594,41
6	Solicitação de Proposta Lançada	4	SECITECE(27); SEDUC(29); SEMA(50); SEMACE(53);	\$ 1.102.951,24
7	Elaborando o Relatório Técnico ou Curricular	4	CGE(05, 09); SEDUC(45); SRH(64);	\$ 1.945.188,06
8	Elaborando o Relatório Financeiro e o Combinado	3	CGE(06); SEMA(52); TCE(73);	\$ 1.388.696,21
9	Não Objeção do BM à Avaliação Combinado / Avaliação Curricular	0	-	\$ -
10	Divulgação da Avaliação Combinada / Ofício para Negociação	0	-	\$ -
11	Negociação do Contrato	10	PGE(23); SDE(24); SEDUC(42,44); SEMA(51); SEMACE(54); SEPLAG(63, 59, 60); SRH (65); COGERH(68);	\$ 4.866.242,86
12	Divulgação PGE Resultado Final	1	-	\$ 866.937,02
13	Assinando o Contrato / Publicação	4	ARCE(01); SECITECE(28); SEMA(46,49);	\$ 1.030.615,84
14	Projetos com Contratos em Execução	18	CGE(04); FUNCEME(13); IPECE(14,15,17,18,19,20); SEDUC(41); SEMA(47,48); SEPLAG(56,57); SRH(66); COGERH(67); STDS(71,72); TCE(74);	\$ 5.672.719,08
15	Projetos com Contratos Finalizados	13	CGE(02,03,12); IPECE(16); SDE(25); SEDUC(33,34,38,39,40); COGERH(69); STDS(70); TCE(75).	\$ 386.917,46
Total		75		\$ 22.671.700,66



3.6 Tempo disponível até encerramento do PforR

Tempo disponível até encerramento do PforR = 31/01/2018

2016	1	2	3	4	5	6	6 meses
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
1º Semestre 2017	7	8	9	10	11	12	6 meses
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	
2º Semestre 2017	13	14	15	16	17	18	6 meses
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
2018	19						1 mês
	Jan						
TOTAL							19 meses

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 16 meses
	Alto - de 17 a 19 meses
	Altíssimo - acima de 19 meses - Inviabiliza o Projeto



3.7. 10 Projetos de Assistência Técnica em Situação de Risco

Subprojetos de AT em Risco

Nº	Órgão	Subprojetos	Valor US\$	Risco
1	TCE	Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.	806.274,68	19
2	COGERH	Plano de Segurança Hídrica.	866.937,02	19
3	SEMACE	Contratação de consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.	358.092,90	19
4	CGE	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	1.027.580,50	18
5	SEPLAG	Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do Ceará.	529.102,21	18
6	IPECE	Metodologias para análise de impacto econômico.	364.824,94	17
7	CGE	Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).	436.863,53	17
8	SEPLAG	Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS).	523.590,31	17

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 16 meses
	Alto - de 17 a 19 meses
	Altíssimo - acima de 19 meses - Inviabiliza o Projeto



3.8 Projetos de Assistência Técnica por Setorial



CGE


Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	Carlos Jorge Freitas	Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SISTEMA SIEC).	436.863,53	13	4	17	Alto
2	Ítalo Brígido Coelho e Tiago Peixoto	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	1.027.580,50	14	4	18	Alto
3	Ítalo Brígido Coelho e Tiago Peixoto	Capacitação da população para o Controle Social.	251.474,31	12	3	15	Alto
4	Denise Andrade Araújo	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	131.654,65	6	6	12	Médio
5	Paulo Roberto	Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	110.302,49	6	4	10	Baixo
6	Ítalo Brígido Coelho e Tiago Peixoto	Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO).	64.572,29	5	7	12	Médio
7	Ítalo Brígido Coelho e Tiago Peixoto	Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).	650.613,72	8	6	14	Médio
TOTAL			2.673.061,49				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 16 meses
	Alto - de 17 a 19 meses
	Altíssimo - acima de 19 meses - Inviabiliza o Projeto

Assistência Técnica – Gestão Pública



Subprojetos 2 e 3: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR. ¹

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 67.354,63
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Nota 1: Auditoria será realizada pela equipe da CGE a partir do semestre 16.1



Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Subprojeto 4: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Marcelo Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 226.642,79
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Março 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Contrato nº 08/2016 - Publicado em 28/06/2016.
Empresa NTCONSULT TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 5: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).

- **Responsável:** Carlos Jorge Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 436.863,53
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Março 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – UGP remeteu o Relatório de Avaliação Técnica para ajustes finais da CGE, após a revisão da UGP em 29/06/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 6: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.027.580,50
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial está elaborando o Relatório de Avaliação Técnica após o recebimento das propostas em 22/06/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 7: Capacitação da população para o Controle Social.

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 251.474,31
- **Método de Aquisição:** LPN
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Assinatura Contrato.
- **Estágio Atual:** Em Atividades Preparatórias – Minuta do edital NCB, E.T e Orçamento em análise na UGP após comentários do Banco Mundial em 13/06/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Assistência Técnica - Gestão Pública

Subprojeto 8: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na “Detecção de Casos de Fraude e Corrupção” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.

- **Responsável:** Denise Andrade Araújo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 131.654,65
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial aguardando a suplementação para atualização da Intenção de Gasto - IG, e posterior envio do processo da Solicitação de Proposta à Cel04/PGE para o relançamento, após contato em 28/06/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto9: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamentos com foco no “Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos do processo de convergência das Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público (IPSAS).

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 110.302,49
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Cel04/PGE divulgou o Resultado da Avaliação da Proposta Técnica as empresas em 29/06/2016 e a Abertura Pública das Propostas Financeiras, marcada o dia 04 de julho de 2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 10: Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO).

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 64.572,29
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Janeiro 2016 – Fevereiro 2017
- **Estágio Previsto:** Avaliação Técnica da Propostas.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – CGE remeteu a SDP, RFLC e MC para análise da UGP em 17/06/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 11: Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 650.613,72
- **Método de Aquisição:** LPN
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2016 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Elaborando Contrato.
- **Estágio Atual:** Em Atividades Preparatórias - CGE remeteu o TDR e as Cotações para análise da UGP em 17/06/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 12: Contratação de consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.

- **Responsável:** Aglaio Soares
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 24.411,82
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Março de 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



IPECE



Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	21	Mario Aragão	Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.	769.636,60	8	5	13	Amarelo
2	22	Nicolino Trompieri e Witalo Paiva	Metodologias para análise de impacto econômico.	364.824,94	12	5	17	Vermelho
TOTAL				1.134.461,54				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 16 meses
	Alto - de 17 a 19 meses
	Altíssimo - acima de 19 meses - Inviabiliza o Projeto


Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojetos 14 e 15: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTORES PLENOS

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 322.192,82
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contratos em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 16: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTOR JÚNIOR

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 21.227,67
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído e Pago.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojetos 17,18 e 19: Contratação de 03 (três) **Analistas em Licitações** para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- **Responsável:** Cristina Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 223.560,31
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contratos em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojeto 20: Contratação de Consultor Individual especializado em **Políticas Públicas** para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução a Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.*

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 109.139,93
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévio
- **Início/Término:** Julho 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 10/2015 publicado em 18/09/2015. Serviços em execução.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 21: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para Desenvolvidos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.

- **Responsável:** Mário Aragão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 769.636,60
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2015 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação - Encaminhado o Relatório Final da Lista Curta para encerramento da 1ª Fase e o Processo de SDP nº 3772509/2016 para lançamento à PGE/Cel04 em 30/06/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 22: Contratação de Consultoria de Empresa para Desenvolvimento de Metodologia para análise de impacto econômico no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 364.824,94
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Relatório Final da Lista Curta validado pela UGP. Setorial finalizando a Solicitação de Proposta, com previsão de envio a UGP em 30/06/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████



PGE

Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	23	Valéria Rodrigues	Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.	319.520,21	14	2	16	
TOTAL				319.520,21				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 16 meses
	Alto - de 17 a 19 meses
	Altíssimo - acima de 19 meses - Inviabiliza o Projeto

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Subprojeto 23: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Valéria Rodrigues
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 319.520,21
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2015 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Reunião de negociação realizada em 28/06/2016. Setorial está providenciando as assinaturas de minuta de contrato, para posterior envio a Cel04 para divulgação do Resultado Final.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SECITECE

Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	26	Sandra Monteiro e Ana Iris	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	118.460,74	6	8	14	
2	27	Sandra Monteiro e Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	190.858,35	7	6	13	
3	28	Sandra Monteiro e Ana Iris	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	87.362,46	7	1	8	
TOTAL				396.681,54				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 16 meses
	Alto - de 17 a 19 meses
	Altíssimo - acima de 19 meses - Inviabiliza o Projeto

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 26: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.

- **Responsável:** Sandra Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 118.460,74
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Notificação e Adjudicação.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial está ajustando o Relatório Final da Lista Curta após análise da UGP em 22/06/2016, com previsão de envio para análise da UGP em 07/06/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 27: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Sandra Monteiro / Tarcísio Hilter
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 190.858,35
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Processo de SDP lançada em 09/06/2016. Reunião prévia realizada no dia 30/06/2016. Recebimento das Propostas Técnicas e Financeiras até as 15:00hrs do dia 11/07/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 28: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

- **Responsável:** Sandra Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 87.362,46
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial recebeu o resultado final da licitação em 08/06/2016. Contrato remetido a Casa Civil para publicação, após contato em 28/06/2016. Consultora Selecionada: Sra. Maria Fatima Ludovico da Gama e Souza.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SEPLAG



Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
55	Naiana Correia	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	70.825,78	10	3	13	Amarelo
59	Dominique Gomes	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.	446.073,87	8	2	10	Verde
60	Fábio Miranda	Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do Ceará.	529.102,21	16	2	18	Vermelho
61	Katia Burgos	Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.	694.599,97	10	6	16	Amarelo
62	Valdir Silva	Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS).	483.526,68	12	5	17	Vermelho
63	Valdir Silva	Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	206.373,44	6	2	8	Verde
TOTAL			2.470.565,58				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 16 meses
	Alto - de 17 a 19 meses
	Altíssimo - acima de 19 meses - Inviabiliza o Projeto



Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 55: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 70.825,78
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Apresentado apenas 01 (um) currículo para a Manifestação de Interesse nº 20160002, setorial encaminhou ofício solicitando a prorrogação por igual período, em 30/06/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Assistência Técnica - Gestão Pública

Subprojeto 56: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Aduino Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 481.856,65
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 17/2015 - Publicado em 05/11/2015. Consórcio MACROPLAN/TRANSPLAN. Serviço em execução. Contrato Aditivado.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 57: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 1.128.001,21
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 023/2015. Serviço em execução. Contrato Aditivado.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 58: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial (2a. Etapa)

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 300.000,00
- **Método de Aquisição:**
- **Revisão Prévia/Posterior:**
- **Início/Término:** Junho 2016 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Elaborando o Termo de Referência
- **Estágio Atual:**
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 59: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Dominique Gomes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 446.073,87
- **Método de Aquisição:** SBQ
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Novembro 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Banco Mundial encaminhou e-mail com os comentários acerca da Ata da reunião de negociação e Minuta do Contrato em 30/06/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Gestão Pública

*Subprojeto 60: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para **Auditar a Folha de Pagamento** do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Fábio Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 529.102,21
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Maio 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Banco Mundial encaminhou e-mail com os comentários acerca da Ata da reunião de negociação e Minuta do Contrato em 29/06/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 61: Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Fábio Miranda e Katia Burgos
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 694.559,97
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Abril 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação - Setorial está elaborando finalizando a Solicitação de Proposta, após revisão da UGP em 22/06/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Assistência Técnica – Fiduciário

Subprojeto 62: Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado - GCOMPRAS

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 523.590,31
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Abril 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
 - **Estágio Atual:** Em Licitação – Encaminhado o Relatório Final da Lista Curta para encerramento da 1ª Fase e instruindo o processo de SDP para posterior envio à PGE/Cel04 para lançamento, após contato em 28/06/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** ██████████
- **Sinalização em relação ao Prazo:** ██████████

Assistência Técnica – Fiduciário

Subprojeto 63: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.


- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 206.373,44
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Cel04/PGE encaminhará a SEPLAG o ofício nº 216/2016 de autorização/convocação com empresa melhor qualificada para reunião de negociação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



STDS



Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 70: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 64.213,69
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2014 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 71: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 63.174,42
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 72: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 892.888,73
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico (NCB)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Dezembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



ARCE

Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	Alexandre Caetano	Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.	443.428,54	7	1	8	
TOTAL			443.428,54				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 16 meses
	Alto - de 17 a 19 meses
	Altíssimo - acima de 19 meses - Inviabiliza o Projeto

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 1: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.

- **Responsável:** Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Subprojeto:** US\$ 370.112,85
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Aguardando contrato assinado, remetido a empresa em 02 de junho.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



COGERH



Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	68	Zulene Almada e Davi Pereira	Plano de Segurança Hídrica.	866.937,02	18	1	19	
TOTAL				866.937,02				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 16 meses
	Alto - de 17 a 19 meses
	Altíssimo - acima de 19 meses - Inviabiliza o Projeto

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 67: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Quali-quantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 884.094,13
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em execução - Contrato 48/2015, em execução - Publicado no DOE de 15/12/2015.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 68: Termo de Referência para Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 866.094,02
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Publicado Aviso de Resultado Final em 29/06/2016, aguardando prazo recursal de 5 dias úteis, que encerra-se em 06/07/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Status:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 69: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas


- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor Subprojeto:** US\$ 27.326,28
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Janeiro 2016
- **Estágio Previsto:** Concluído
- **Estágio Atual:** CONTRATO CONCLUÍDO.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



FUNCEME

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 13: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.

- **Responsável:** Francisco Hoilton
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Proposta Vencedora:** €267.442,11 + R\$ 687.325,77 equivalente a R\$ 1.492.246,27
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Março 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução
- **Estágio Atual:** Contrato em execução - Recebido da FUNCEME em 17/09/2015, o Contrato assinado. Publicado no DOE em 16/10/2015.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SDE / ADECE

Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
24	Fernando Costa e Inês Studart	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas.	340.209,03	10	2	12	
TOTAL			340.209,03				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 16 meses
	Alto - de 17 a 19 meses
	Altíssimo - acima de 19 meses - Inviabiliza o Projeto

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 24: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.

- **Responsável:** Fernando Costa / Cláudio Ferreira Lima
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 340.209,03
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução
- **Estágio Atual:** Em Licitação - Realizada 2ª reunião de negociação em 29/06/16.
Documentação (Atas e Minuta do Contrato) remetidas a CEL04 em 30/06/16.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 25: Impact Evaluation Workshop Instambul

- **Responsável:** Inês Studart
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 2.894,02
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Maio 2015.
- **Estágio Previsto:** Concluído
- **Estágio Atual:** **CONCLUÍDO E PAGO.** Recebido os documentos comprobatórios do curso (Certificado e Relatório de Viagem).
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- **Sinalização em relação ao Prazo:**





SEDUC

Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	29	Jussara Batista	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	330.000,00	11	5	16	
2	30	Jussara Batista	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado. Incluindo a Avaliação de Desempenho Institucional	61.635,53	6	7	13	
3	31	Luciano Nery	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Coleta de Dados.	314.613,18	7	5	12	
4	32	Luciano Nery	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Estatístico .	19.975,94	12	3	15	
5	35	Lucas Fernandes e Celena Skeff	Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey).	21.255,20	3	1	4	
6	36	Lucas Fernandes e Celena Skeff	Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.	473.254,91	10	5	15	
7	37	Lucas Fernandes e Celena Skeff	Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados	22.801,43	1	5	6	
TOTAL				1.243.536,18				

Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de execução do contrato em meses	Tempo estimado para assinatura do contrato em meses	Tempo contratação + execução em meses	Risco
8	42	Lucas Fernandes e Celana Skeff	Contratação de serviços técnicos de Empresa de Consultoria especializada em visitas domiciliares e para formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	169.793,60	10	2	12	
9	43	Lucas Fernandes e Celana Skeff	Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.	557.643,38	10	4	14	
10	44	Lucas Fernandes e Celana Skeff	Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN. (Coleta de Dados) .	1.069.268,38	12	2	14	
11	45	Lucas Fernandes e Celana Skeff	Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN.	34.415,38	12	2	14	
TOTAL PROJETOS				1.831.120,74				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 16 meses
	Alto - de 17 a 19 meses
	Altíssimo - acima de 19 meses - Inviabiliza o Projeto

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 29: Contratação de serviços de consultoria para avaliação de desempenho acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará. (Teste de Proficiência)

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 330.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Em licitação – SDP lançada, data final para recebimento das propostas 04/07/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 30: Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da **formação continuada para gestores**, professores e instrutores de educação profissional secundárias do Estado (com a inclusão da Avaliação de Desempenho Institucional).*

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 61.635,53
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em licitação – RFLC em análise na UGP desde 27/06/16, com previsão de retorno para 04/07/16.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 31: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Coleta de Dados.

- **Responsável:** Luciano Nery
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 314.613,18
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Aguardando retorno da SEDUC em relação ao CANCELAMENTO do projeto.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 32: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Estatístico .

- **Responsável:** Luciano Nery
- **Categoria de Licitação:** CI
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 19.975,94
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Aguardando TDR ajustado de acordo com novo escopo do projeto, previsão de envio pela SEDUC __/__/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 33: Impact Evaluation Workshop Istanbul

- **Responsável:** Marta Emília
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 3.154,13
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Maio 2015
- **Estágio Previsto:** Concluído.
- **Estágio Atual:** **CONCLUÍDO E PAGO.** Recebido os documentos comprobatórios do curso (Certificado, e Relatório de Viagem).
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 34: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 4.466,03
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Julho 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 35: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 21.255,20
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Atividades Preparatórias – TDR ajustado em análise na UGP desde 13/06/16. Previsão de retorno (elaboração da minuta do contrato e estimativa dos custos pela UGP) em 07/04/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 36: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de **formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.***

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 473.254,91
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Dezembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – TDR ajustado em análise na UGP desde 21/06/16, com previsão de retorno para o dia 05/04/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 37: Contratação de Empresa Especializada para serviço de **Impressão Gráfica dos materiais** de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 22.801,43
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2016 - Setembro 2016
- **Estágio Previsto:** Atividades Preparatórias
- **Estágio Atual:** Em Atividades Preparatórias – Edital de shopping em análise na UGP desde 21/06/16, com previsão de retorno para o dia 05/04/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 38: Contratação de Consultor Individual Especialista em **Avaliação de Programas para Identificar o Impacto** do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)*

- **Responsável: SEDUC** - Lucas Fernandes/ **IPECE** - Jimmy Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor Subprojeto :** US\$ 16.557,58
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2014 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 39: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 25.207,85
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 40: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 29.188,04
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Assistência Técnica –Assistência à Família

*Subprojeto 41: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de **Arte Gráfica/Design**, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 61.838,85
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Maio 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica –Assistência à Família

Subprojeto 42: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 169.793,60
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – SEDUC elaborando Minuta do Contrato. Aguardando ajustes (parecer de substituição). Previsão de envio a UGP no dia 01/07/16.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 43: Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.

- **Responsável:** Lucas Fernandes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 557.643,38
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Em Licitação - Edital Pregão Eletrônico, encontra-se na PGE. (aguardando ajustes no Mapa Comparativo). Previsão de envio do Mapa Comparativo a PGE em __/__/16.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 44: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados).

- **Responsável:** SEDUC – Lucas Fernandes / IPECE - Jimmy Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 931.503,15
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior (acertada em VC realizada em 18/08/15)
- **Início/Término:** Abril 2015 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Negociando contrato, SEDUC/UGP estão aguardando proposta revisada, em virtude da solicitação de adequação do prazo (de 22, para 16 meses). Prazo estipulado para envio a UGP até 30/06/16.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 45: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN

- **Responsável: SEDUC** – Lucas Fernandes/ **IPECE** - Jimmy Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US\$ 34.415,38
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Março 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato Concluído
- **Estágio Atual:** : Em Licitação – RAC em análise na CEL04 desde 15/06/2016, com previsão de publicação do aviso resultado final até 01/07/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SEMA


Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	46	Maria Dias e Magda Marinho	Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.	391.476,75	6	2	8	
2	49	Maria Dias e Francisco Leorne	Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.	174.236,97	6	1	7	
3	50	Maria Dias e Monica Freitas	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.	224.000,00	9	6	15	
4	51	Maria Dias e Ilana Fernandes	Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por licitações a céu aberto.	1.153.752,25	12	1	13	
5	52	Maria Dias e Fabiola Martins	Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	472.119,04	6	3	9	
TOTAL				2.415.585,02				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 16 meses
	Alto - de 17 a 19 meses
	Altíssimo - acima de 19 meses - Inviabiliza o Projeto

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 46: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto “AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.” (AIEDA)

- **Responsável:** Maria Dias / Magda Marinho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 391.476,75
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2014 – Fevereiro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Aguardando divulgação do resultado final. Processo na PGE na auditoria com previsão de envio a SEMA até 01/07/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 47: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 314.274,86
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Março 2015 – Agosto 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução - Contrato 06/2016 - Publicado em 15/04/2016. Empresa vencedora Consórcio Engesoft Engenharia / Quanta Consultoria Ltda. (R\$ 710.638,32).
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 48: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicos.

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor Subprojeto:** US\$ 107.269,38
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Fevereiro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em execução - Contrato 26/2015 - Publicado em 08/12/2015
Empresa vencedora MSV Multiserviços ME (R\$ 242.557,52).
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 49: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Maria Dias / Francisco Leorne
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** 174.236,97
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2014 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – CEL04 publicou a Corrigenda do Aviso de Resultado Final, encaminhado a SEMA para providências.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 50: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Maria Dias / Monica Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 224.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação- SDP lançada, prazo para recebimento das propostas 11/07/2016.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 51: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US\$ 1.153.752,25
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Março 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Aguardando receber Atas e Minuta do Contrato assinadas por parte da empresa vencedora, prazo estimado ate 04/07/16.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 52: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias e Fabiola Martins
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 472.119,04
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Novembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Abertura das Propostas financeiras em 29/06/2016, aguardando envio de ofício para SEMA.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SEMACE



Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	53	Elizabeth Romão e Tiago Bessa	Contratação de consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.	334.350,85	14	5	19	
2	54	Elizabeth Romão e Tiago Bessa	Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE.	213.174,78	8	2	10	
TOTAL				547.525,63				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 16 meses
	Alto - de 17 a 19 meses
	Altíssimo - acima de 19 meses - Inviabiliza o Projeto



Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 53: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de **capacitação** para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE*

- **Responsável:** Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 334.350,85
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Junho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Relançamento da SDP em 30/06/2016, com data para recebimento das propostas estipulada até 01/08/16.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 54: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a **Manualização dos Procedimentos Técnicos** dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.*

- **Responsável:** Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 213.174,78
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2014 – Julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Ata e Minuta do Contrato encontram-se com procurador para assinatura do ofício e posterior divulgação de resultado final.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



SRH



Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Nº Lista	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
1	64	Karine Machado e Sergio Câmara	Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga e Cobrança.	446.328,65	12	3	15	
2	65	Karine Machado e Sergio Camara	Sistema de Informação de Gestão dos Recursos Hídricos (cadastro, fiscalização, outorga, monitoramento qualitativo, segurança de barragens e medição) com Integração com o Sistema Administrativo Financeiro PROTHEUS.	418.975,09	12	3	15	
TOTAL				865.303,74				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 16 meses
	Alto - de 17 a 19 meses
	Altíssimo - acima de 19 meses - Inviabiliza o Projeto



Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 64: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.

- **Responsável:** Karine Machado e Marcilio Caetano
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 446.328,65
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação - RAT analisado pela UGP em 29/06/16, com ajustes a serem realizados pela comissão. Previsão de retorno estimada em __/__/16.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 65: Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. **SIGERH***

- **Responsável:** Karine Machado e Fernanda Benevides
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US\$ 418.975,09
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – julho 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Agendada reunião de negociação contratual para 01/07/16 às 14:00 hrs.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 

Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 66: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Aduoras - **Malha D'agua.***

- **Responsável:** Karine Machado
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do TOR:** US\$ 152.839,20
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contratado – Contrato assinado em 18/05/2016, aguardando publicação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 



TCE



Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº	Responsável	Subprojeto	Valor US\$ Memória de Cálculo	Tempo de Execução do Contrato em meses	Tempo Estimado para Assinatura do Contrato em meses	Tempo Contratação + Execução em meses	Risco
73	Glinton Ferreira e Delinda Almeida	Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.	806.274,68	18	1	19	
TOTAL			806.274,68				

	Baixo - de 0 a 11 meses
	Médio - de 12 a 16 meses
	Alto - de 17 a 19 meses
	Altíssimo - acima de 19 meses - Inviabiliza o Projeto


Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 73: Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.

- **Responsável:** Glinton Ferreira / Delinda Almeida
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 806.712,10
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/ Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Outubro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Aviso de resultado final a ser publicado em __/__/16.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 
- **Sinalização em relação ao Prazo:** 


Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 74: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 84.010,26
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em execução.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 

Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 75: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US\$ 100.915,62
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual:** CONTRATO CONCLUÍDO.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:** 



4. APROVAÇÃO DA ATA DA 28ª REUNIÃO (25/05/2016)

COMITÊ *PforR*

Próxima Reunião do Comitê PforR

Próxima Reunião do Comitê PforR:

28/07/2016
14h30m - IPECE



5. ENCAMINHAMENTOS

Encaminhamentos da 28ª Reunião realizada em 25/05/2016

- ✓ Todos os encaminhamentos da 28ª Reunião realizada em 25/05/2016 foram resolvidos.



6. ENCERRAMENTO
