

23ª REUNIÃO DO COMITÊ *PforR*ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO PROJETO *PforR*

17 DE DEZEMBRO DE 2015







PAUTA DA REUNIÃO





Pauta da Reunião

- Abertura e apresentação dos participantes (14h30-14h40)
- 2. Algumas Informações:
 - 2.1 Disseminando CLEAR: Aperfeiçoando Políticas Públicas no Brasil a partir de Resultados apresentações (14h40-14h50);
 - 2.2 Agradecimento pela participação (14h50-15h)
- 3. Posição Novembro/2015 Programas, Indicadores, Assistência Técnica e Plano de Ação (15h 16h):
 - 3.1. Desembolsos Laura Gonçalves;
 - 3.2. Indicadores Primários Laura Gonçalves;
 - 3.3. Indicadores Secundários Laura Gonçalves;
 - 3.4 Plano de Ação de Mitigação de Riscos Laura Gonçalves;
 - 3.5. Programas PforR Thâmara Teixeira;
 - 3.6. Assistência Técnica: Situação Atual das Aquisições dos Projetos de Assistência Técnica e Principais Pontos de Atenção nos Processos de Licitação Viviane Costa e Giuseppe Nogueira;
- 4. Mensagem do Tom Kenyon (16h 16h10m)
- 5. Aprovação da Ata da 22ª Reunião (26/11/15) (16h10m 16h20m)
- 6. Encaminhamentos (16h20m 16h30m)
- 7. Encerramento (16h30m)



1. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES







2. ALGUMAS INFORMAÇÕES







2.1 DISSEMINANDO O CLEAR:


Aperfeiçoando Políticas Públicas no Brasil a partir de Resultados





CLEAR - Center for Learning on Evaluation and Results

- ✓ CLEAR) foi criado em 2010 por uma parceria global de vários países: Governo Britânico, Governo Australiano, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Asiático de Desenvolvimento, Banco Africano de Desenvolvimento, Banco Belga de Cooperação para o Desenvolvimento, Fundação Rockfeller, Agência Suíça Cooperação para o Desenvolvimento. A secretaria executiva do CLEAR está localizada no Banco Mundial.
- ✓ O objetivo do CLEAR é de fortalecer competências e sistemas de monitoramento e avaliação e a Gestão por Resultados para orientar as decisões de desenvolvimento dos países.
- ✓ As atividades do Centro são: desenvolvimento de programas de aprendizagem inovadores, apoio ao intercâmbio de conhecimentos práticos entre pares, serviços de consultoria.







CLEAR - Center for Learning on Evaluation and Results

O CLEAR trabalha com governos e organizações da sociedade civil por meio de seis centros regionais:

- √dois na África,
- ✓um no leste da Ásia,
- ✓um no sul da Ásia,
- √um no México e
- ✓um no Brasil inaugurado em Setembro.







CLEAR no BRASIL

- ✓ CLEAR no Brasil esta sediada na Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV), que conta com programa acadêmico em Administração Pública e Governo da Escola de Administração de Empresas de São Paulo.
- ✓ A inauguração do CLEAR Brasil foi nos dias 28 e 29 de Setembro de 2015 com o Seminário APERFEIÇOANDO POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL A PARTIR DE RESULTADOS








CLEAR no BRASIL: APERFEIÇOANDO POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL A PARTIR DE RESULTADOS

- ✓ O Estado do Ceará foi convidado como vários Estados para participar do Seminário organizado pelo CLEAR Brasil, IPEA, com o patrocínio do Governo Federal, BNSD e Instituto UNIBANCO com a contribuição do BID e Banco Mundial.
- ✓ Como resultado o Diretor do CLEAR Brasil foi palestrante no Encontro do Ceará em Debate (04/12) e o mesmo foi apresentado para o Coordenador da CPLOG/SEPLAG que irá articular parcerias com o Estado.
- ✓ As 23 apresentações estão disponíveis nos links enviados ao Comitê PforR:
 http://cmicro.fgv.br/centros_regionais e no link: http://www.ipece.ce.gov.br/arquivos/seminario-clear-brasil.url










2.2 Agradecimento pela participação





Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê PforR Janeiro/2015 a Novembro/2015

- ✓ O comitê iniciou suas atividades em Fevereiro de 2014
- ✓ Houve 23 reuniões com participação de 180 representantes das 19 Setoriais.
- ✓ 12 Setoriais tiveram representadas em todas reuniões de 2015, duas em 91% das reuniões, duas em 82% das reuniões e uma em 73% das reuniões.

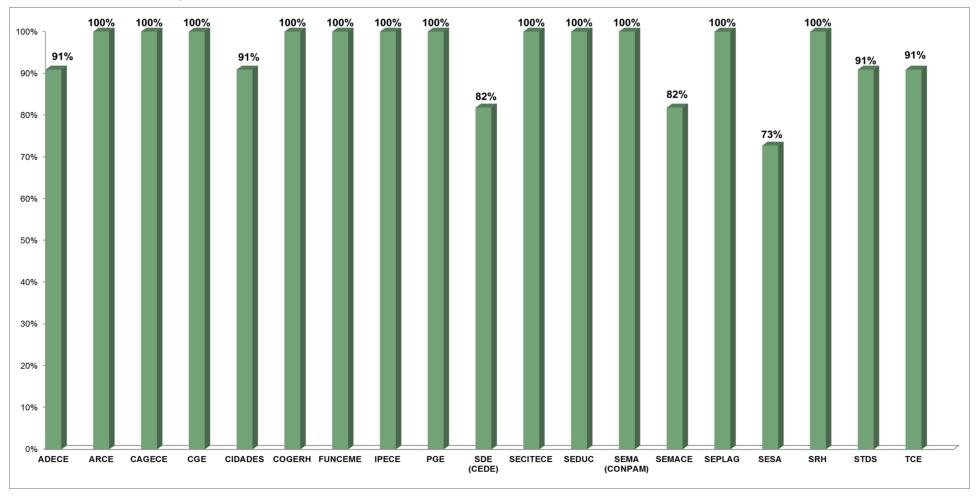

Agradecimento pela Participação nas Reuniões do Comitê PforR

- ✓ 11 Representantes de 9 Setoriais participaram de forma assíduos em 2015
- ✓ 6 Representantes de 5 Setoriais participaram de forma assíduos em 2014 e
 2015

1	ARCE	Alexandre Caetano da Silva	TITULAR	82%
2	CAGECE	Carlos Rossas Mota Filho	SUPLENTE	91%
3	CGE	Denise Andrade Araújo	ASS. TÉCNICA	73%
4	COGERH	Denilson Marcelino Fidelis	SUPLENTE	82%
5	FUNCEME	Francisco Hoilton Araripe Rios	TITULAR	82%
6	FUNCEME	Meiry Sayuri Sakamoto	SUPLENTE	73%
7	SDE	Filipe Rabelo	REPRESENTANTE	83%
8	SDE	Fernando Barreto da Costa	REPRESENTANTE	73%
9	SEMA	Magda Marinho Braga	SUPLENTE	83%
10	SEPLAG	Francisco Adauto Oliveira	TITULAR	73%
11	SRH	Sérgio Câmara	SUPLENTE	91%







3. POSIÇÃO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015:

- 3.1. Desembolsos
- 3.2. Indicadores Primários
- 3.3. Indicadores Secundários
- 3.4. Plano de Ação Mitigação de Riscos
- 3.5. Programas PforR
- 3.6. Projetos de Assistência Técnica







3.1. Desembolsos





Desembolso Previsto Marco de 2016

	INDICADORES PRIMÁRIOS COM MET					_		
n		Setorial	Responsáveis	META	VALOR US\$	FAROL		
1	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada	SEPLAG	Francisco Adauto	Aprovação da metodologia	6.198.000,00			
2	DLI 11: Número de secretarias que estejam usando o modelo para alinhamento dos incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.	SEPLAG	Avilton Júnior	Aprovação do modelo para o alinhamento dos incentivos.	6.198.000,00			
	Sub Total Indicadores do 2º Semestre 2014 com sinaliza	ação de não	cumprimento da meta		12.396.000,00			
3	DLI 11: Número de secretarias que estejam usando o modelo para alinhamento dos incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.	SEPLAG	Avilton Júnior	1	2.744.444,00			
	Sub Total Indicadores 1º semestre 2015 com sinalizaç	ção de não cu	ımprimento da meta		2.744.444,00			
4	1 DLI 10: Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME	Hoiton Rios	Metodologia de monitoramento definida e adotada.	2.744.444,00			
	Sub Total Indicadores 1º semestre 2015 com sinaliz	ação de cun	nprimento da meta		2.744.444,00			
5	DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS	STDS	Sebastião Lopes	10% ¹	1.701.875,00			
6	2 DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar	STDS	Sebastião Lopes	30%	3.403.750,00			
7	3 DLI 10: Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME	Hoiton Rios	Protocolo de coleta de dados definido e adotado.	3.403.750,00			
8	DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.	SEDUC	Marta Emilia	12	3.403.750,00			
9	5 DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	SEPLAG	José Freitas	45%	3.403.750,00			
10	6 DLI 8:Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	CAGECE	Carlos Rossas	84.9%	3.403.750,00			
11	7 DLI 9: Índice da qualidade da fiscalização ambiental	SEMA	Tiago, Denilson, Ulisses	60%	3.403.750,00			
	Sub Total Indicadores 2º semestre 2015 com sinaliz	zação de cun	primento da meta		22.124.375,00			
12	incentivos com seus respectivos objetivos estrategicos.	SEPLAG	Avilton Júnior	2	3.403.750,00			
	Sub Total Indicadores 2º semestre 2015 com sinaliz	zação de cun	nprimento da meta		3.403.750,00			
13	DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.	STDS	Sebastião Lopes	10%¹	1.701.875,00			
	Sub Total 2º Semestre de 2015 com metade dos recursos da meta	a da STDS qu	e não será cumprida em 20	15.2	1.701.875,00			
14	1 DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	CAGECE	Carlos Rossas	85.2%	3.444.000,00			
15	2 DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	CAGECE	Carlos Rossas	85.5%	3.438.000,00			
	Sub Total Indicador 1º e 2º Semestre de 2016	com metas já	cumpridas		6.882.000,00			
Sub	Total Indicadores 2º semestre 2015 (PAD)				27.230.000,00]		
Tota	l Metas 2014 e 1º e 2º semestre 2015 com sinalização não cumprimento da meta				18.544.194,00			
Valor previsto a ser desembolsado em março 2016 ²								

¹ A STDS sinalizou o cumprimento de apenas 5% da meta, logo o recurso a ser desembolsado será de US\$ 1.701.875,00 (50% do recurso total).

² O valor Total previsto para desembolso é composto de uma meta de 2015.1 da FUNCEME de \$ 2.744.444,00 com sinalização amarela (probabilidade de cumprimento em fevereiro de 2016) + cinco metas de 2015.2 com sinalização verde, uma meta da STDS de \$ 1.701.875,00 (metade do valor total, conforme explicado abaixo) e duas metas do Indicador da CAGECE para o ano de 2016 que já estão cumpridas o que totaliza \$ 31.750.819,00) menos uma meta da Seplag (DLI 11) com sinalização vermelha no valor de 3.403.750,00.




3.2. Indicadores Primários





Nº	Setorial	Responsável	Tema	Indicador	Meta	Status
1	SEDUC	Marta Emília Andréa Rocha	rescimento Econôr	DLI 3:Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.	12 Valor:	A SEDUC cumpriu a meta. Enviou as evidências para a UGP que irá encaminhar ao Banco Mundial. (Fonte: SIMA em 23/11/15).








No	Setorial	Responsável	Tema	Indicador	Meta	Status
2	STDS	Sebastião Lopes	Redução da Pobreza	DLI4: Porcentagem de famílias com crianças de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS	somente 5%) Valor: US\$ 3.403.750,00	O referido indicador está em fase de execução, tendo sido iniciado dia 23 de novembro de 2015, por meio de visitas aos municípios com equipes técnicas capacitadas em junho/2015 para preenchimento de instrumental de acompanhamento e monitoramento às famílias com crianças até 5 anos. Em fase de Conclusão. A Setorial solicitou ao Banco a revisão das metas posteriores em Metas: 2015: 5%, 2016: 7%, 2017 - 10%. (Fonte: SIMA em 16/12/15).








١	10	Setorial	Responsável	Tema	Indicador	Meta	Status
	3	STDS	Sebastião Lopes	ıção da F	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.	Valor:	Realizada no período de 23 a 27 de novembro 2015, a segunda Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS, com recursos próprios. O Total de 17 municípios participaram da Capacitação. O Relatório Final está em Fase de Conclusão e será enviado como evidência no dia 21/12/15. (Fonte: SIMA 16/12/15).








No	Setorial	Responsável	Tema	Indicador	Meta	Status
4	SEPLAG	José Freitas	edução da Pobreza	DLI6: Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	Valor:	Até o dia 18/12/2015 serão concluídos os trabalhos de revisão dos Marcos Lógicos respectivos. No dia 21/12/2015 será preparado o Relatório. E em 22/12/2015 o mesmo será enviado à UGP. (Fonte: SIMA em 14/12/15).





Nº	Setorial	Responsável	Tema	Indicador	Meta	Status
5	CAGECE	Carlos	\triangleleft	DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada		85,83% NMPRIDA
3	ONOLOL	Rossas	billic	ao sistema de esgoto		NETA CL








Nº	Setorial	Responsável	Tema	Indicador	Meta	Status	
			le Ambiental	DLI 9: Índice de		62,14 %	IPRIDA
6	SEMA	Maria Dias	lida	qualidade da fiscalização ambiental.	Valor: US\$ 3.403.750,00	A Setorial já encaminhou a evidência à UGP.	META CUMPRIDA








Nº	Setorial	Responsável	Tema	Indicador	Meta	Status
			a		monitoramento definida e	A versão preliminar do protocolo de coleta de dados foi entregue pelo consórcio
			Ambie	DLI10:Imple mentação do monitorame	Valor: US\$ 2.744.444,00	Aqualogus/Azurit em 15/12/15 e encontra-se em análise pela comissão de acompanhamento e
7	FUNCEME	Hoilton Rios	ntabilidad	nto participativo da Qualidade	Protocolo de Coleta de	fiscalização. Conforme Plano de trabalho do Consórcio os Produtos (Metas) deverão ser entregues em fevereiro
			Sns	da Água.	Valor: US\$ 3.403.750,00	de 2016. (Fonte: SIMA em 16/12/15).








Nº	Setorial	Responsável	Tema	Indicador	Metas/V	alor US\$	Status
			ública		Aprovação do	\$6.198.000,00	A primeira meta do indicador nãos será alcançada neste ano, visto que somente neste mês de dezembro conseguimos finalizar o processo de contratação
8	SEPLAG	SEPLAG Avilton Júnior	Gestão P	modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos		5.1	da empresa de consultoria Macroplan que conduzirá, junto com a equipe da Seplag, os trabalhos do
						5.2	Fortalecimento do Modelo
				osti atogiooo	2 Secretarias		de GPR do Estado do Ceará. (Fonte: SIMA em 15/12/15).








Nº	Setorial	Responsável	Tema	Indicador	Metas/Valor US\$	Status
					2014.2	O Consórcio
9	SEPLAG	Adauto Oliveira	o Pública	DLI12:Porcentag em total de investimentos públicos no âmbito do Programa	Aprovação da Metodologia	Macroplan/Transplan entregou o Produto I do contrato - Análise de Benchmarking e a previsão é que tenhamos a metodologia aprovada
			Ges	preparada com metodologia aprovada	Valor:	em Maio/16 quando será cumprida a primeira meta do indicador. (Fonte: SIMA em 16/12/15).










3.3. Indicadores Secundários





No	Setorial	Responsável	Tema	Nome do Indicador	Metas 2 ^a semestre	Status
1	IPECE	Victor Hugo	Crescimento Econômico	PDO1:Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	29.000	A RAIS divulgou os dados. O estoque absolvido foi de 26.141 profissionais no ano de 2014.








No	Setorial	Responsável	Tema	Nome do Indicador	Metas 2 ^a semestre	Status
2	STDS	Sebastião Lopes	ıção d	PDO2:Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios- alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.	5%	Conforme acordado, a STDS enviou uma proposta de Indicador - "Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas.". A STDS terá uma reunião com o BM na próxima semana sobre este Indicador. (Fonte: SIMA em 16/12/15).








Nº	Setorial	Responsável	Tema	Nome do Indicador	Metas 2 ^a semestre	Status
3	COGERH	Denilson Fidelis	Sustentabilidade Ambiental	PDO3:Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	64.3	76,5 IQARce: 4,40 - criticamente degrada a poluído. A Setorial já encaminhou a evidência à UGP.







I	Nº	Setorial	Responsável	Tema	Nome do Indicador	Metas 2 ^a semestre	Status
	4	SEPLAG	Lara Maria Silva Costa	Redução da Pobreza	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	Outras duas Resoluções Publicadas	A Resolução nº 01/2015 foi publicada em 15/12/15. A Resolução nº 02/2015 foi concluída e a previsão de encaminhamento para publicação até o dia 18/12/15. (Fonte: SIMA em 15/12/15).




Legenda:



No	Setorial	Responsável	Tema	Nome do Indicador	Metas 2 ^a semestre	Status
5	COGERH	Zulene Almada	ıtabilidade Am	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	Planos	A Setorial enviou no dia 16/12/15 uma Nota Técnica informando ao Banco o não cumprimento da meta de 2015.2 e solicitando a revisão das metas posteriores. A UGP encaminhou a NT ao BM no mesmo dia. (Fonte: SIMA em 16/12/15).








No	Setorial	Responsável	Tema	Nome do Indicador	Metas 2 ^a semestre	Status
6	COGERH	Inah Abreu	oilidade /	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	Projetos de Lei apresentados	Em reunião com COGERH e a UGP foi discutida a necessidade de alteração do calendário e escopo do Projeto de minuta de Lei inicialmente previstos. Para tanto, está sendo elaborada uma NT que será enviada até dia 18/12/2015. A Setorial informou que nos dias 10 e 11/12 foi realizada reunião com os presidentes de Comitês de Bacia (12), onde se falou do Projeto de Lei, na oportunidade foi solicitado agendamento de apresentação do citado projeto nas primeiras reuniões ordinárias dos CBH's que ocorrerão em meados do ano de 2016. (Fonte: SIMA em 16/12/15).






Legenda:



Nº	Setorial	Responsável	Tema	Nome do Indicador	Metas 2 ^a semestre	Status
7	SEMA	Marias Dias	Sustentabilidade Ambiental	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	Divulgação e Implementação	Este Indicador não será cumprido este ano. O IPECE enviou um ofício ao Procurador Geral solicitando celeridade ao Processo. O mesmo encontra-se em análise pelo Procurador Adjunto, Dr Ariano Pontes e após parecer o anteprojeto de Lei segue para a Assembléia, caso não necessite de alguma alteração. (Fonte: SIMA em 16/12/15.

Legenda:









3.4. Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental





Posição do Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental- PforR

Risco	Descrição da Ação	Responsável	Indicador	Posição
	A. Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar	STDS - Sebastião Lopes com SEDUC, e Gabinete do Governador	quilombolas atendidas em creches ou	O início das atividades ocorrerá em 2016 seguindo o cronograma da SEDUC. Os primeiros eventos com os Quilombolas ocorrerá dia
1	B. Inclusão de um módulo de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas de ensino) no programa de treinamento de professores dos cursos de capacitação profissional	SEDUC e Gabinete do Governador	Módulo desenvolvido em colaboração com a FUNAI, Associações Quilombolas e Coordenadoria para a Igualdade Racial.	Durante os meses de dezembro/2015 e janeiro/2016, serão realizados encontros regionais com lideranças indígenas para discutir o currículo das escolas. Durante esses encontros, serão apresentadas novamente as etapas da formação e a proposta de finalização da mesma. As atas e documentos desses encontros serão encaminhados até final de janeiro/2016.

Posição do Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental - PforR

	Descrição da Ação	Responsável	Período	Indicador	Posição
2	C. Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas). D. Exclusão das áreas em que a execução das obras civis venha a requerer o reassentamento involuntário ou a relocação de famílias (com ou sem título de propriedade)	SEDUC	Durante o primeiro ano	selecionados para as	A PGE e a SEDUC ainda estão finalizando o processo de busca por informações sobre os métodos de aquisição dos terremos que foram doados pelas prefeituras.





Posição do Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental- PforR

Descrição da Ação	Responsável	Indicador	Posição
E. Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água	COGERH e SEMA, SRH (em consulta junto à FUNAI)	impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (definidas em consulta junto às comunidades afetadas – inclusive os povos	A COGERH enviou para a UGP em 16/12/15 o TR, a MC e a SDP reformuladas enxugando o prazo da consultoria. A UGP está analisando a documentação. O TOR do Plano contempla a ação para a mitigação deste risco.
F. Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água	SEMA, SEMACE, CAGECE, COGERH, SRH	Campanha de comunicação estabelecida e sob execução.	Em reunião com o BM e a Casa Civil foi apresentada a campanha publicitária que foca na conscientização no uso da água, mas ficou acordado que o Gunars irá avaliar o cumprimento da Meta em Janeiro de 2016 quando ocorrerá a implantação da 4ª fase da Campanha de Comunicação que trata do tema Qualidade da agua de maneira mais direta.



3.5. Programas *PforR*





Posição dos Programas

					REVISÃO	(R\$ milhõe	es)	EXECU	ÇÃO (R\$	milhões)	EXECUÇÃO/PREVISÃO (%)		
Programa	Setorial	Iniciativa		2014- 2017	2014 (A)	2015 (B)	Acumulado (C)	2014 (D)	2015 (E)	Acumulado 2014/2015 (F)	2015 (E)/(B)	Acumula do (F)/(C)	Farol (F)/(C)
				(Capacitaç	ão Profissi	onal						
		1	00328	327,53	132,40	145,69	266,05	121,58	115,41	236,99	79,2%	89,1%	
014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional	SEDUC ¹	2	00771	368,91	168,02	76,81	229,56	77,26	52,79	130,05	68,7%	56,7%	
		3	00834	126,27	36,66	40,95	74,28	30,06	23,35	53,41	57,0%	71,9%	
Tota	al			822,71	337,08	263,45	,	228,90	191,55	420,45	72,7%	73,8%	
					Assistên	icia à Famí	lia						
2 050 - Assistência Social	STDS	4	03180	34,58	7,30	7,30	13,94	7,21	6,47	13,68	88,6%	98,1%	
					Qualida	ade da Águ	а						
3 041 - Gestão dos Recursos Hídricos	SRH / COGERH ²	5	05273	0,46	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46	0,0%	100,0%	
4 032 - Saneamento Ambiental	CIDADES/ CAGECE	6	05384	15,83	5,65	0,20	5,34	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	SEMA	7	03104	15,12	0,00	1,82	1,82	0,39	0,66	1,05	36,4%	57,7%	
082 - Gestão da Qualidade	SEMACE ³	8	04815	0,50	0,50	0,00	0,45	0,50	0,02	0,52	0,0%	113,7%	
5 dos Recursos Naturais e Ambientais	SEMACE	9	02840	0,62	0,62	0,00	0,56	0,62	0,00	0,62	0,0%	110,0%	
Ambientais	SEMACE	10	02466 ⁴	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	100,0%	100,0%	
	SEMACE	11	05170 ⁴	9,47	2,75	1,92	4,42	1,97	0,95	2,92	49,7%	66,2%	
500 - Gestão e Manutenção do CONPAM e vinculada	SEMACE	12	00001	2,30	1,29	1,01	2,18	1,47	0,00	1,47	0,0%	67,1%	
Tota	ıl			44,32	11,27	4,97	15,26	5,40	1,65	7,06	33,3%	46,25%	
079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do	FUNCEME ⁵	13	02846 ⁶	7,16	1,79	1,79	3,42	1,80	1,90	3,71	106,3%	108,5%	
7 Ceará	FUNCEME	14	02847	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,11	0,20	122,0%	222,0%	
Tota	al			7,25	1,79	1,88	3,51	1,89	2,01	3,91	107,1%	111,41%	
Total		14		908,86	357,44	277,60	602,59	243,41	201,68	445,09	72,65%	73,86%	

Posição dos Programas

	2015 - Execução até 15.12.15								
Setorial	Pr	evisão	Exe	Execução		RPP		otal	Execução/ Previsão
SEDUC	R\$:	263,45	R\$	157,21	R\$	37,41	R\$	194,62	74%
STDS	R\$	7,30	R\$	7,08	R\$	•	R\$	7,08	97%
SEMA	R\$	1,82	R\$	0,66	R\$	•	R\$	0,66	36%
SEMACE	R\$	2,95	R\$	0,36	R\$	0,63	R\$	0,99	34%
FUNCEME	R\$	1,88	R\$	1,71	R\$	0,41	R\$	2,12	113%
Total	R\$	277,40	R\$	167,02	R\$	38,45	R\$	205,47	74%

Até o dia	descrição	Meta 2014-2017	Ano	Executado acumulado	%
15.12.15	no projeto todo		2014	R\$ 243,40	27%
10.12.10		R\$ 908,86	2015	R\$ 205,47	23%
	เป็นป		Total	R\$ 448,87	49%

ESTADO DO CEARÁ

Secretaria do Planejamento

Obs:

- (1) A SEDUC nos informou em Abril/2015 que possui Restos a Pagar pagos em 2014 no valor de R\$ 18,65 milhões. Houve um aumento na execução de 2014 decorrente desses Restos a Pagar, autorizados pelo Banco Mundial a serem inclusos na execução do referido ano. As informações relativas aos restos a pagar de 2015 acumulados até novembro foram cedidas pela SEPLAG.
- (2)
 A Nota Técnica 01/2015 enviada pela SRH/COGERH em 20/07/2015 foi submetida ao Banco que na missão de Outubro/2015 entendeu que a inclusão do Programa 039 Transferência Hídrica e Suprimento de Água não representa a ideia proposta do PforR que preza pela melhoria da qualidade da água. Aguardamos Não-objeção oficial do Gerente Geral do Projeto confirmando que não terá mais execução dentro do PforR, ficando apenas a iniciativa 5273 com R\$ 0,46 milhões em 2014.
- (3) Na missão de Outubro/2015, o Banco aprovou Nota Técnica da SEMACE com a proposta de realocação de todos os valores das iniciativas do Programa 82 (04815, 02466, 05170, 05155), bem como a estimativa dos anos de 2016 e 2017 baseada no PPA (2016-2019), justificando a redução do valor total de R\$ 30,54 milhões para aproximadamente R\$ 10 milhões. Também foi incluso nesse programa a iniciativa 02840 e a iniciativa 00001 do Programa 500 Gestão e Manutenção do CONPAM e vinculada totalizando o valor de R\$ 12,91.
- (4) A SEMACE nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2466 no valor de R\$ 20.130,00 e na iniciativa 5170 no valor de R\$ 607.198,46.
- (5) Em 08.09.2015, o Banco Mundial aprovou Nota Técnica nº 01/2015 enviada pela FUNCEME solicitando redução dos valores na iniciativa 02846 Ampliação e Operacionalização da Rede de Monitoramento de Hidroagrometereológico do Estado do Ceará de R\$ 15,93 milhões para R\$ 7,16 milhões e na iniciativa 02847 Elaboração do Mapeamento e Monitoramento Hidroambiental do Ceará de R\$ 13,69 milhões para R\$ 0,09 milhões.
- (6) A FUNCEME nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2846 no valor de R\$ 412.032,86, autorizados pelo Banco Mundial a serem inclusos na execução de 2015.



Posição dos Programas

✓ Lembrete: Regras Programas

A execução dos programas deve observar as seguintes restrições:

- Devem excluir despesas que são financiadas pelo próprio BIRD ou por outras operações de crédito, ou seja, não é permitido a alocação de recursos do BIRD ou outras operações de crédito para custear despesas dos programas e iniciativas do componente
- Verificar a lista negra do BIRD a cada licitação, antes de assinar contrato. Para atender o Art. 42 da Lei 8.666/93 a SEPLAG incluiu no orçamento de cada ação um valor na fonte 69;
- Não podem apresentar impacto sócio ambiental negativo;
- Os valores dos contratos não podem exceder os limites abaixo:
 - Obras = US\$ 50 milhões
 - Bens = US\$ 30 milhões
 - Sistemas de TIC = US\$ 20 milhões
 - Consultorias = US\$ 15 milhões.







3.6. Assistência Técnica








Desafio Atual das Aquisições dos Projetos de Assistência Técnica





Execução Subprojetos de AT em Relação ao Plano de Licitação

71% dos subprojetos em Atraso




	22	Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações	CGE(02,10); IPECE(13,14,15,16); SEDE(22); SEMA(47); FUNCEME(12); SEDUC(31,32,35,36,37); COGERH(69); TCE(76,77); SEPLAG(56,57); STDS (70,71) SRH(66);
77	17	Amarelo - Realização do projeto com atraso de 01 a 90 dias	CGE (03,04,06,11); IPECE(19); SECITECE(24); SEMA(46,50,52); SEDUC(33,34,41,42,44); SEPLAG(58); SRH(63,64,65);
	38	Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 90 dias	ARCE(01); CGE(05,07,08,09); IPECE(17,18); PGE(20); SDE(21,23); SECITECE(25,26); SEMA(45,48,49,51); SEMACE(53,54); SEDUC(27, 28, 29,30,38,39,40,43); COGERH(67,68); TCE(75); SEPLAG(55,58,59, 60,61,62); STDS(72,73,74).






Execução dos Subprojetos de AT por Setorial

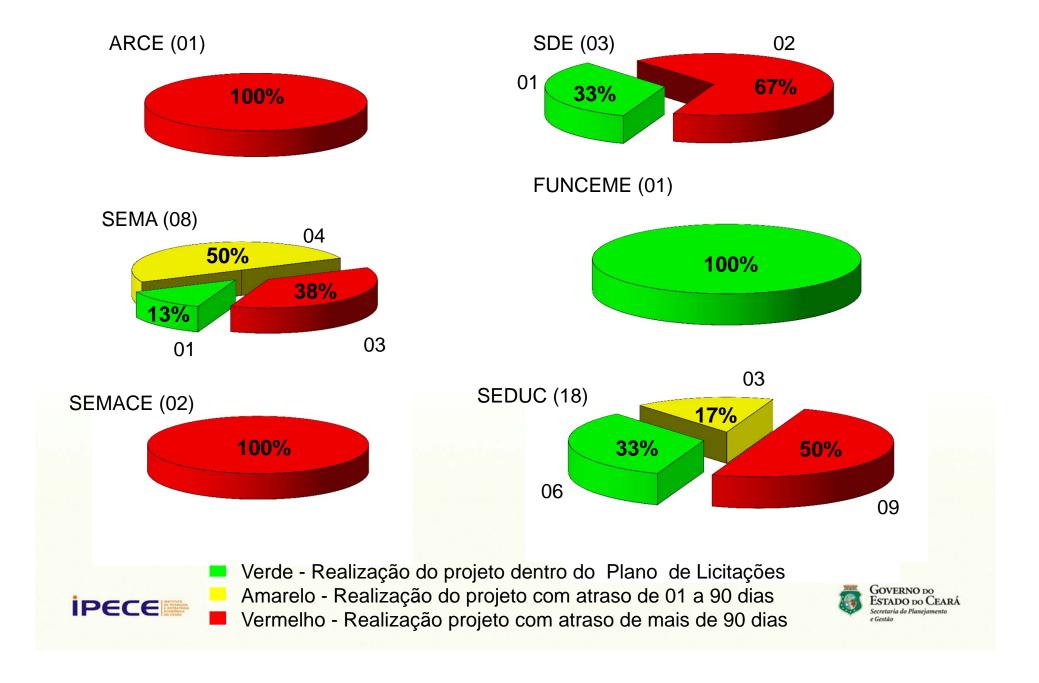



Execução dos Subprojetos de AT por Setorial

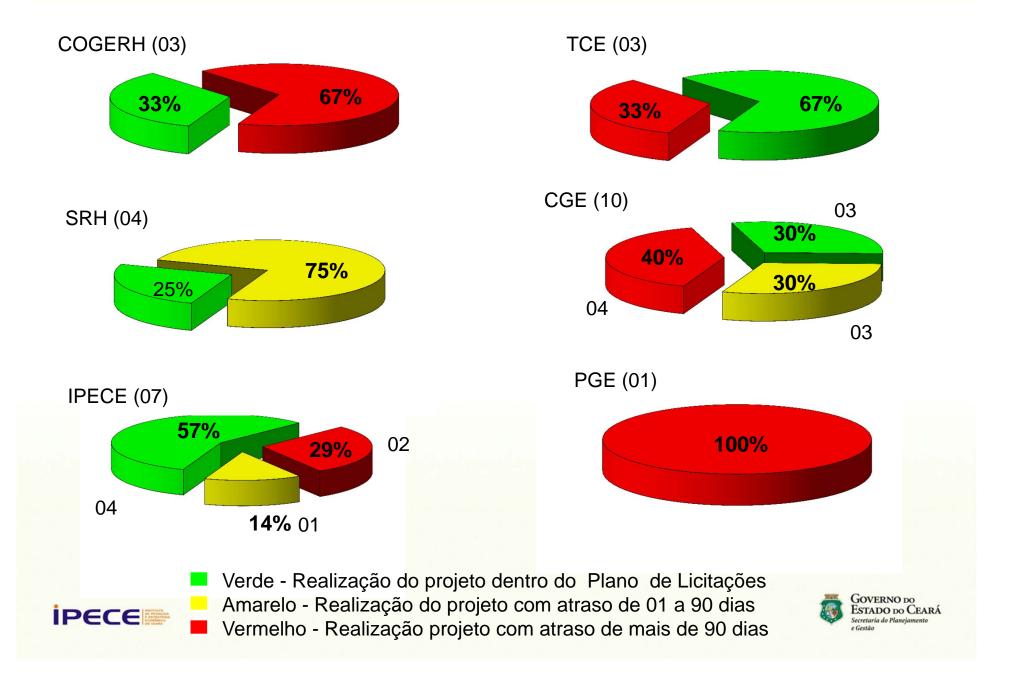


Execução dos Subprojetos de AT por Setorial

IPECE STRATEGIS

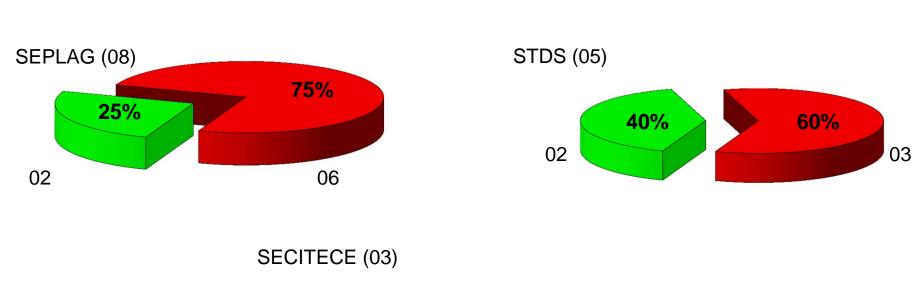








Histórico da Execução Subprojetos de AT em Relação ao Plano

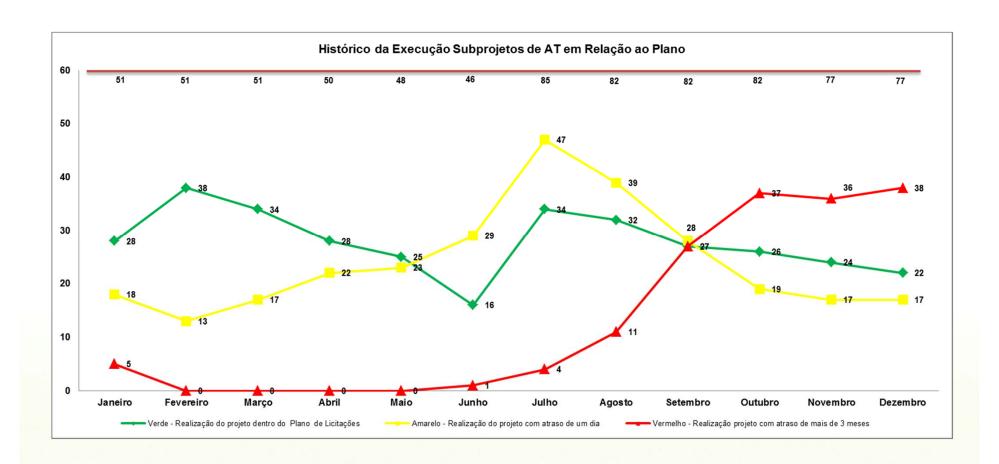






Execução dos Subprojetos de AT por Atividade

71% dos Subprojetos estão em licitação




			não iniciadas ano de Licitação	-
		Atividades Iniciadas	Preparatórias	CGE(06,09); CGE(11); IPECE(17,18,19); SDE(23); SECITECE(24); SEDUC(28,29,30,33,40,41,42); SEMA(52); SEPLAG(55,60); SRH(65,66); STDS(73,74);
77			Em Licitação	ARCE(01); CGE(3,4,5,7,8); PGE(20); SDE(21); SECITECE (25,26); SEDUC(27,34,38,39,43,44); SEMA(45,46,48,49,50,51); SEMACE(53,54); SEPLAG(58,59,61,62); SRH(63,64); COGERH(67,68); STDS(72); TCE(75);
	13	Atividades e	em Execução	CGE(02,10); FUNCEME(12); IPECE(13,15,16); SEDUC(35); SEMA(47); SEPLAG(56,57); STDS(70,71); TCE(76);
	08	Concluídas		IPECE(14); SDE(22); SEDUC(31,32,36,37); COGERH(69); TCE(77).






Histórico da Execução dos Subprojetos de AT por Atividade

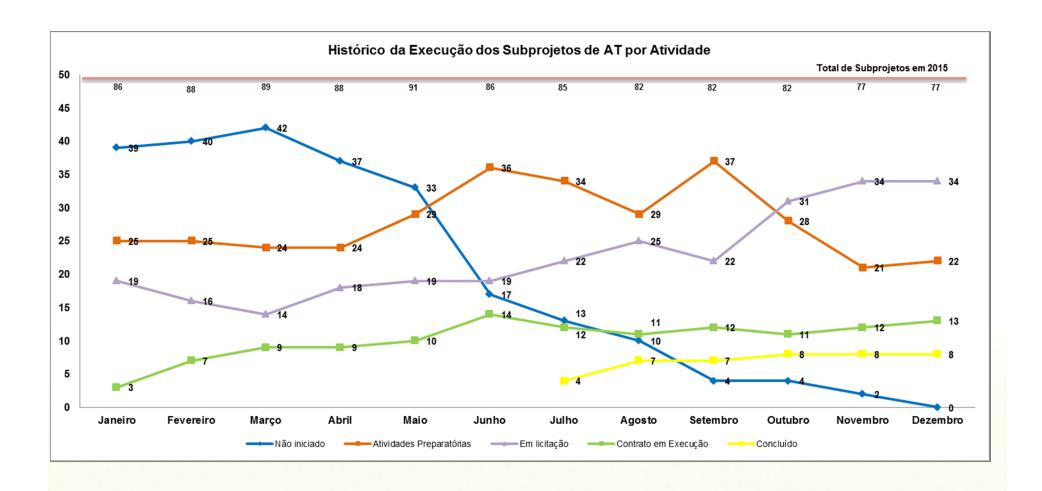





Subprojetos Com Atividades Iniciadas por Etapa



		Etapas	Setoriais		
	0	Não Iniciados			
	13	Elaborando TOR	CGE(06,09,11); IPECE(18); SDE(23); SEDUC(29,30,33,41,42); SEPLAG(55); SRH(65); STDS(73);		
	3	Revisando TOR após envio ao BM	SEDUC(28,34); SEMA(52);		
	3	No objeção TOR	IPECE(17); SECITECE(24); SEPLAG(60);		
	3	Elaboração MI	IPECE(19); SEDUC(40); SRH(66);		
	6	Publicação da MI / Edital	SECITECE(25); SEDUC(27,44); SEMA(49); SEPLAG(61); STDS(74);		
77	14	Recebimento portfólios / Currículos, Preparação Lista Curta e SDP	CGE(04,05,08); SECITECE(26); SEDUC(38,43); SEMA(50,51); SEMACE(53); SRH(63,64); COGERH(68); STDS(72); TCE(75);		
	10	IAValiacao Pronoctae / Chrichine	CGE(03); PGE(20); SDE(21); SEDUC(39); SEMA(45,48); SEMACE(54); SEPLAG(58,59,62);		
	1	Não Objeção do BM à RFLC/Avaliação Técnica	CGE(07);		
	3	Negociação do contrato	ARCE(01); SEMA(46); COGERH(67);		
	0	Não Objeção do BM ao contrato rubricado / Julgamento de propostas.	-		
	13	Contrato assinado/ Prestando Serviço	CGE(02,10); FUNCEME(12); IPECE(13,15,16); SEDUC(35); SEMA(47); SEPLAG(56,57); STDS(70,71); TCE(76);		
	8	Concluídos	IPECE(14); SDE(22); SEDUC(31,32,36,37); COGERH(69); TCE(77).		


Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais

Sumário dos valores dos Projetos de Assistência Técnica em 15/12/15						
Projetos com contratos Finalizados	8	\$ 219.845,01				
Projetos com contratos em Execução	13	\$ 3.001.697,04				
Projetos em fase de Licitação (MI publicada)	34	\$ 14.273.818,49				
Projetos Iniciados (TDR e MC remetidos a UGP)	16	\$ 5.926.401,53				
Projetos ainda não iniciados	0	\$ -				
Projetos de Aquisições	6	\$ 1.948.437,02				
Total (A)	77	\$ 25.370.199,09				





Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais



Critérios		ojetos	Setoriais Setoriais	
Ontenos	Quat.	%	Setorials	
Projetos com contratos Finalizados	8	1 1119/2	IPECE(14); SDE(22); SEDUC(31,32,36,37); COGERH(69); TCE(77).	
Projetos com contratos em Execução	13		CGE(02,10); FUNCEME(12); IPECE(13,15,16); SEDUC(35); SEMA(47); SEPLAG(56,57); STDS(70,71); TCE(76).	
Projetos em fase de Licitação (MI publicada)	34	44%	ARCE(01); CGE(03,04,05,07,08); PGE(20); SDE(21); SECITECE (25,26); SEDUC(27,34,38,39,43,44); SEMA(45,46,48, 49,50,51); SEMACE(53,54); SEPLAG(57,58,59,61,62); SRH(63,64); COGERH(67,68); STDS(72); TCE(75);	
Projetos Iniciados (TDR e MC remetidos a UGP)	16	21%	CGE(06,09); IPECE(17,19); SECITECE(24); SEDUC(28,29,30,33,40,41,42); SEPLAG(55,60); SRH(66); STDS(74).	
Projetos ainda não iniciados	0	0%	-	
Projetos de Aquisições	6	8%	CGE(11); IPECE(18); SDE(23); SEMA(52); SRH(65); STDS(73).	
TOTAL	77	100%		



Principais Pontos de Atenção nos Processos de Licitação





Principais Pontos de Atenção nos Processo de Licitação

- ✓ Lei nº 15.241/2015 Conta para pagamento EXCLUSIVAMENTE no Banco BRADESCO para contratos com Empresas Nacionais.
- ✓ Projetos de Aquisição de Equipamentos







Projetos de Assistência Técnica por Setorial







CGE





Projetos Assistência Técnica – Eixo: Gestão Pública

Projeto 2: Auditoria Técnica dos Indicadores

Subprojeto 2: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.

Responsável: Paulo Roberto

Categoria de Licitação: Consultoria Individual

Valor do Projeto: US\$ 89.192,29

Valor do TOR: US\$ 89.192,29

Valor do Contrato – Ano 1: US\$ 49.564,77*

Método de Aquisição: Cl

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Abril 2014 – Novembro 2018

Estágio Previsto: Contrato em execução

 Estágio Atual: Setorial sinalizou a rescisão contratual, visto o pedido por parte do consultor. CGE encaminhou em 14/12/15, Termo de Rescisão publicado.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:



^{*} Consultor Marcelo Ponte Barbosa, Valor do contrato R\$ 116.616,00.





Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 3: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais

Subprojeto 3: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC) do Poder Executivo do Estado do Ceará

Responsável: Marcelo Monteiro

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor do Projeto : US\$ 858,990,05

Valor do TOR: US\$ 203.852,33

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Março 2015 – Setembro 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

Estágio Atual: Propostas Técnicas em análise na CGE.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:





Assistência Técnica - Gestão Financeira

Projeto 3: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais

Subprojeto 4: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle.

Responsável: Carlos Jorge Freitas

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor do Projeto: US\$ 858,990,05

Valor do TOR: US\$ 665.137,71

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Agosto 2015 – Março 2017

Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).

 Estágio Atual: Relatório Final da Lista Curta sendo finalizando pela CGE, para posterior envio a CEL04. SDP sendo elaborado pela Setorial.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Assistência Técnica - Gestão Financeira

Projeto 4: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social

Subprojeto 5: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.

Responsável: Ítalo José Brígido Coelho

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor do Projeto: US\$ 1.350.000,00

Valor do TOR: US\$ 1.000.000,00

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Prévio

Início/Término: Março 2015— Abril 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

 Estágio Atual: Relatório Final da Lista Curta sendo finalizando pela CGE, com previsão do envio a UGP em 18/12/15.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:









Assistência Técnica – Gestão Financeira

Projeto 4: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social

Subprojeto 6: Capacitação da população para o Controle Social

Responsável: Ítalo José Brígido Coelho

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor do Projeto: US\$ 1.350.000,00

Valor do TOR: US\$ 350.000,00

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016

Estágio Previsto: Não Objeção do TdR.

 Estágio Atual: UGP encaminhou a CGE em 11/12/15, TdR com os ajustes para análise da setorial e posterior envio ao BM para 'não objeção'.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:





Assistência Técnica - Gestão Pública

Projeto 5: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.

Subprojeto 7: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na "Detecção de Casos de Fraude e Corrupção" tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.

Responsável: Denise Andrade Araújo

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor do Projeto: US\$ 142.735,64

Valor do TOR: US\$ 142.735,64

Método de Aquisição: SMC

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Março 2015 – Fevereiro de 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

Estágio Atual: UGP reenviou para 'não objeção' do BM em 11/12/2015, minuta SDP,
 RFLC e MC.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Assistência Técnica – Gestão Financeira

Projeto 6: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Subprojeto 8: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamentos com foco no "Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público" tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos do processo de convergência das Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público (IPSAS).

Responsável: Marcelo Monteiro

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas

Valor do Projeto: US\$ 149.149,18

Valor do TOR: US\$ 149.149,18

Método de Aquisição: SMC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Março 2015 – Maio 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

Estágio Atual: RFLC E SDP encaminhados À UGP para análise em 08/12/2015.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Assistência Técnica – Gestão Financeira

Projeto 7: Ouvidoria Ativa

Subprojeto 9: Ouvidoria Ativa.

- Responsável: Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação:
- Valor do Projeto: US\$ 677.617,33
- Método de Aquisição: Ainda sendo discutido
- Revisão Prévia/Posterior: Início/Término: Prévia
- Estágio Previsto: Elaboração do TOR
- Estágio Atual: Após reunião na CGE em 11/12/15, onde foi discutido que o projeto será desenvolvido com dois termos.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:
- Sinalização em relação ao Status:





Projetos Assistência Técnica - Eixo: Gestão Pública

Projeto 8: Gestão Documental.

Subprojeto 10: Contratação de consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivistica da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.

Responsável: Aglaio Soares

Categoria de Licitação: Consultoria Individual

Valor do Projeto : US\$ 24.411,82

Método de Aquisição: SDC

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Abril 2015 – Setembro de 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

Estágio Atual: Ordem de Serviço emitida em 29/09/15. Serviços em execução.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Assistência Técnica – Gestão Financeira

Projeto 9: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria

Subprojeto 11: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria.

Responsável: Carlos Jorge

Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria

Valor do Projeto: US\$ 191.250,00

Método de Aquisição: Pregão eletrônico

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Agosto 2015 – Janeiro de 2016

Estágio Previsto: Abertura Pública de Propostas.

Estágio Atual: Setorial elaborando as Especificações Técnicas em 11/12/15.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







IPECE





Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Projeto 11: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

Subprojeto 13: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTORES PLENOS

Responsável: Cristina Medeiros

Categoria de Licitação: Consultoria Individual

Valor do Projeto: US\$ 500.000,36

Valor do TOR: US\$ 307.181,18

Método de Aquisição: Cl

Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos

Início/Término: Abril 2014 – janeiro 2018

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

Estágio Atual: Contrato em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Projeto 11: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

Subprojeto 14: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTOR JÚNIOR

Responsável: Cristina Medeiros

Categoria de Licitação: Consultoria Individual

Valor do Projeto: US\$ 500.000,36

Valor do TOR: US\$ 21.227,67

Método de Aquisição: Cl

Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos

Início/Término: Abril 2014 – janeiro 2018

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

Estágio Atual: CONTRATO ENCERRADO.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Assistência Técnica - Gestão Transversal - UGP

Projeto 11: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

Subprojeto 15: Contratação de 03 (três) **Analistas em Licitações** para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.

Responsável: Cristina Medeiros

Categoria de Licitação: Consultoria Individual

Valor do Projeto: US\$ 500.000,36

Valor do TOR : US\$ 171.591,51

Método de Aquisição: Cl

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2018

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

 Estágio Atual: Contratos assinados em 17/07/2015 e 16/11/2015. Prestando serviços na UGP.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Projeto 12: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.

Subprojeto 16: Contratação de Consultor Individual especializado em **Políticas Públicas** para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução a Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.

Responsável: Nicolino Trompieri

Categoria de Licitação: Serviços

Valor do Projeto: US\$ 100.266,76

Valor do TOR: US\$ 100.266,76

Método de Aquisição: Cl

Revisão Prévia/Posterior: Prévio

Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

Estágio Atual: Contrato nº 10/2015 publicado em 18/09/2015. Serviços em execução.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:





Projeto 13: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.

Subprojeto 17: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.

Responsável: Mário Aragão

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor do Projeto: US\$ 1.105.000,00

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Junho 2015 – Outubro 2016

Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.

Estágio Atual: UGP remeteu para 'não objeção' do BM, o TDR e MC em 15/12/15.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Projeto 14: Modernização Institucional do IPECE

Subprojeto 18: Modernização Institucional do IPECE

Responsável: Deusimar Lira

Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria

Valor do Projeto: US\$ 195.000,00

Método de Aquisição: NCB

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Agosto 2015 – Fevereiro 2016

Estágio Previsto: Abertura Pública de Propostas.

Estágio Atual: Setorial elaborando o TdR, com previsão de envio a UGP em 18/12/2015.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:





Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Projeto 15: Metodologia para análise de impacto econômico.

Subprojeto 19: Contratação de Consultoria de Empresa para Desenvolvimento de Metodologia para análise de impacto econômico no Estado do Ceará.

Responsável: Nicolino Trompieri

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor do Projeto: US\$ 364.824,94

Valor do TOR: US\$ 364.824,94

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Setembro 2015 – Fevereiro 2016

Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.

Estágio Atual: Recebido a NO do BM em 14/12/15. Encaminhado ao IPECE no mesmo dia, com modelos de minuta de CI, minuta de Ofício e modelo de MI.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







PGE





Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Projeto 16: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.

Subprojeto 20: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.

Responsável: Valéria Rodrigues

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor do Projeto: US\$ 384.658,38

Valor do TOR: US\$ 384.658,38

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Fevereiro 2015 – Fevereiro 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

Estágio Atual: Setorial elaborando o Relatório de Avaliação Técnica em 27/11/2015.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







SECITECE





Projeto 19: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.

Subprojeto 24: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.

Responsável: Sandra Monteiro

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor do Projeto: US\$ 210.156,98

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Novembro 2015 – Julho 2016

Estágio Previsto: Manifestação de interesse.

Estágio Atual: TdR e MC encaminhados para 'não objeção' do BM em 08/12/15.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:





Projeto 19: Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

Subprojeto 25: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

Responsável: Sandra Monteiro / Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor do Projeto: US\$ 172.166,03

Valor do TOR: US\$ 172.166,03

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Junho 2015 – Julho 2016

Estágio Previsto: Convite à Empresa Vencedora para Negociação.

Estágio Atual: Aviso da manifestação de Interesse validada em 03/12/2015, com data limite de recebimento de Portfólio até às 16:00 do dia 22/12/2015. Publicado a M.I em 02/12/2015.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Projeto 21: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

Subprojeto 26: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

Responsável: Sandra Monteiro

Categoria de Licitação: Consultoria Individual

Valor: US\$ 33.678,47

Valor do TOR: US\$ 33.678,47

Método de Aquisição: Cl

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Junho 2015 – Março 2016

Estágio Previsto: Contrato execução.

Estágio Atual: Setorial finalizando os Relatório de Avaliação Curricular. Previsão ______.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:











SEPLAG





Assistência Técnica – Gestão Pública

Projeto 33: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.

Subprojeto 55: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.

Responsável: Naiana Corrêa Lima

Categoria de Licitação: Consultoria Individual

Valor Total do Projeto: US\$ 200.000,00

Método de Aquisição: Cl

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Julho 2015 – Dezembro 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

 Estágio Atual: TOR e MC analisados pela UGP em 16/12/15. Enviados a setorial para aprovação do Secretário, antes do envio ao BM para NO.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:





Assistência Técnica - Gestão Pública

Projeto 34: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

Subprojeto 56: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.

Responsável: Adauto Oliveira

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor Total do Projeto: US\$ 399.001,94

Valor do TOR: US\$ 399.001,94

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Junho 2014 – Setembro 2015

Estágio Previsto: Contrato em execução.

 Estágio Atual: Contrato 17/2015 - Publicado em 05/11/2015. Consórcio MARCROPLAN/TRANSPLAN.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Assistência Técnica – Gestão Pública

Projeto 35: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.

Subprojeto 57: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará (1ª Etapa).

Responsável: Avilton Júnior

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor: US\$ 935.928,05

Valor do TOR: US\$ 935.928,05

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Agosto 2014 – Fevereiro 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

Estágio Atual: Contrato 23/2015 - Publicado em 03/12/2015 - MARCROPLAN.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:





Assistência Técnica – Gestão Pública

Projeto 36: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.

Subprojeto 58: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.

Responsável: Dominique Gomes

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor: US\$ 446.073,87

Valor do TOR: US\$ 446.073,87

Método de Aquisição: SBQ

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Outubro 2014 – Agosto 2015

Estágio Previsto: Contrato em execução.

 Estágio Atual: RAT sendo ajustadas após comentários do BM. Recebido "não objeção" do BM em 19/11/15. Previsão______.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Assistência Técnica - Gestão Pública

Projeto 37: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.

Subprojeto 59: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para **Auditar a Folha de Pagamento** do Poder Executivo do Estado do Ceará.

Responsável: Fábio Miranda

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor: US\$ 2.113,467,61

Valor do TOR: US\$ 1.089.866,72

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Março 2015 – Maio 2017

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

 Estágio Atual: Setorial está analisando as Propostas Técnicas. Após reunião realizada em 24/11/2015.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Assistência Técnica – Gestão Pública

Projeto 37: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.

Subprojeto 60: Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.

Responsável: Fábio Miranda

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor: US\$ 2.113,467,61

Valor do TOR: 1.023.600,89

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Junho 2015 – Dezembro 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

 Estágio Atual: TdR e MC com o novo escopo encaminhado para 'não objeção' do BM em 09/11/2015.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:





Assistência Técnica – Eixo: Aquisições

Projeto 38: Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).

Subprojeto 61: Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado - GCOMPRAS

Responsável: Valdir Silva

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor: US\$ 483.526,68

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

 Estágio Atual: Aviso da Manifestação de Interesse em 11/12/2015 com recebimento de portfólios até o dia 19/01/2016. Publicado no UNDB em 17/12/2015.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Assistência Técnica – Eixo: Aquisições

Projeto 40: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.

Subprojeto 62: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.

Responsável: Valdir Silva

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor: US\$ 206.373,44

Valor do TOR: US\$ 206.373,44

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Dezembro 2014 – Junho 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

Estágio Atual: Setorial está finalizando o Relatório de Avaliação Técnica.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:









STDS





Projeto 45: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

Subprojeto 70: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- Responsável: Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 950.477,43
- Valor do TOR: US\$ 63.406,11
- Método de Aquisição: Cl
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2014 Novembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Aditivo_____?
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:
- Sinalização em relação ao Status:





Projeto 45: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

Subprojeto 71: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

Responsável: Sebastião Lopes

Categoria de Licitação: Serviços

Valor do Projeto: US\$ 950.477,43

Valor do TOR: US\$ 62.379,91

Método de Aquisição: Shopping

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Julho 2014 – Março 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

- Estágio Atual: Contrato prorrogado. Solicitação a Setorial o aditivo ao contrato publicado para providenciarmos a retificação no Client Connection. Aditivo Cláusula____?
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:





Projeto 45: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

Subprojeto 72: Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PfroR

Responsável: Sebastião Lopes

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor: US\$ 950.477,43

Valor do TOR: US\$ 210.332,11

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Maio 2015 - Janeiro 2017

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

 Estágio Atual: Relatório Final da Lista Curta sendo finalizando pela STDS desde 27/11/2015.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Projeto 45: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

Subprojeto 73: Aquisição de Tablets para coletar de dados a ser inserido no Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PfroR

Responsável: Sebastião Lopes

Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria

Valor: US\$ 950.477,43

Valor do TOR: US\$ 11.177,26

Método de Aquisição: Shopping

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Julho 2015 - Dezembro 2015

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

Estágio Atual: Setorial está elaborando Especificações Técnicas e Memória de Cálculo.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:





Projeto 45: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

Subprojeto 74: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

Responsável: Sebastião Lopes

Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria

Valor do Projeto: US\$ 950.477,43

Valor do TOR: US\$ 603.182,03

Método de Aquisição: Pregão

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

 Estágio Atual: Pregão Eletrônico nº 20150023, Processo nº 6714817/2015, encontra-se para assinatura do Secretário.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:









ARCE





Projeto 1: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.

Termo 1: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.

Responsável: Alexandre Caetano

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor Total do Projeto: US\$ 443.428,54

Valor TOR: US\$ 443.428,54

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2015

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

 Estágio Atual: Ata da reunião de negociação e Minuta do Contrato remetidas a empresa para assinaturas em 14/12/15.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:









COGERH





Projeto 42: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos

Subprojeto 67: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Qualiquantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

Responsável: Zulene Almada

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor Total do Projeto: US\$ 668.936,77

Valor do TOR: US\$ 668.936,77

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Todas etapas

Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017

Estágio Previsto: Contrato em execução.

 Estágio Atual: Processo de SDP concluído. Após contato em 14/12/15, onde foi informado que o Contrato encontra-se na Casa Civil para publicação.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Projeto 43: Plano de Segurança Hídrica

Subprojeto 68: Termo de Referência para Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.

Responsável: Zulene Almada

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor Total do Projeto: US\$ 707.018,10

Valor do TOR: US\$ 707.018,10

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Abril 2015 – Julho 2016

Estágio Previsto: Contrato em execução.

Estágio Atual: Após mudanças no prazo de execução e no valor estimado, MC, TDR e SDP foram remetidos para análise da UGP em 16/12/15.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:





Projeto 44: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica

Subprojeto 69: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas

Responsável: Zulene Almada

Categoria de Licitação: Contratação Direta

Valor: US\$ 32.791,65

Método de Aquisição: CD

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016

Estágio Previsto: Contrato em execução

Estágio Atual: CONTRATO ENCERRADO.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

Cincline a construction of the transfer of the









FUNCEME





Projeto 10: Metodologia de modelagem de qualidade da água.

Subprojeto 12: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.

Responsável: Francisco Hoilton

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor do Projeto: US\$ 639.268,69

Proposta Vencedora: €267.442,11 + R\$ 687.325,77 equivalente a R\$ 1.492.246,27

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Junho 2014 – Julho 2016

Estágio Previsto: Contrato em execução

Estágio Atual: Recebido da FUNCEME em 17/09/2015, o Contrato assinado.
 Publicado no DOE em 16/10/15.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:









SDE / ADECE





Projeto 17: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas

Subprojeto 21: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.

Responsável: Fernando Costa / Inês Studart

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor do Projeto: US\$ 396.053,05

Valor do TOR: US\$ 340.209,03

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Janeiro 2015 – Julho 2016

Estágio Previsto: Contrato em execução

 Estágio Atual: Reunião agendando para o dia 17/12/15, acerca das orientações -RAT.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Projeto 17: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas

Subprojeto 22: Impact Evaluation Workshop Instambul

Responsável: Inês Studart

Categoria de Licitação: Contratação Direta

Valor do Projeto: US\$ 396.053,05

• Valor do TOR: US\$ 2.894,02

Método de Aquisição: CD

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015.

Estágio Previsto: Concluído

 Estágio Atual: CONCLUÍDO E PAGO. Recebido os documentos comprobatórios do curso (Certificado e Relatório de Viagem).

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Projeto 17: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas

Subprojeto 23: Aquisição de equipamentos de T.I para operacionalização dos sistema de Monitoramento.

Responsável: Fernando Costa / Inês Studart

Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria

Valor do Projeto: US\$ 396.053,05

Valor do TOR: US\$ 52.950,00

Método de Aquisição: Pregão Eletrônico

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Julho 2015 – Outubro 2015

Estágio Previsto: Contrato em execução.

 Estágio Atual: Em fase de pesquisa de ata de registro de preços e elaboração das Especificações Técnicas.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







SEDUC





Projeto 21: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.

Subprojeto 27: Contratação de serviços de consultoria para avaliação de desempenho acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará.

Responsável: Marta Emília

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor do Projeto: US\$ 330.000,00

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2015

Estágio Previsto: Contrato em execução.

Estágio Atual: Tendo em vista a participação insuficiente de empresas para a formação da lista curta, foi solicitada a prorrogação para apresentação de portfólios até o dia 08/01/2016.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:





Projeto 22: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.

Subprojeto 28: Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da formação continuada para gestores, professores e instrutores de educação profissional secundárias do Estado (com a inclusão da Avaliação de Desempenho Institucional).

Responsável: Marta Emília

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor do Projeto: US\$ 371.845,87

Método de Aquisição: SOF/SMC ou SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

 Estágio Atual: TDR e MC revisados, remetidos para análise da UGP em 15/12 e 16/12, respectivamente.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Projeto 23: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.

Subprojeto 29: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Coleta de Dados.

Responsável: Marta Emília / Andréa Rocha

Categoria de Licitação: Serviço de não Consultoria

Valor do Projeto: US\$ 103.154,13

Valor do TOR US\$ 50.000,00

Método de Aquisição: Shopping

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

Estágio Atual: TDR remetidos para a análise da UGP no dia 17/12/15.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:





Projeto 23: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.

Subprojeto 30: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Estatístico .

Responsável: Marta Emília / Andréa Rocha

Categoria de Licitação: Cl

Valor do Projeto: US\$ 103.154,13

Valor do TOR US\$ 50.000,00

Método de Aquisição: Cl

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016

Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.

Estágio Atual: TDR remetidos para a análise da UGP no dia 17/12/15.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:





Projeto 23: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.

Subprojeto 31: Impact Evaluation Worshop Istambul

Responsável: Andréa Rocha / Marta Emília

Categoria de Licitação: Contratação Direta

Valor do Projeto: US\$ 103.154,13

Valor do TOR: US\$ 3.031,33

Método de Aquisição: CD

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015

Estágio Previsto: Concluído

 Estágio Atual: CONCLUÍDO E PAGO. Recebido os documentos comprobatórios do curso (Certificado, e Relatório de Viagem).

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Projeto 24: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.

Subprojeto 32: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.

Responsável: Henrique Cézar Martins

Categoria de Licitação: Contratação Direta

Valor do Projeto: US\$ 746.306,25

Valor do TOR: US\$ 4.665,00

Método de Aquisição: CD

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Março 2015 – Julho 2015

Estágio Previsto: Concluído.

Estágio Atual: CONCLUÍDO E VALIDADO A PARCELA.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Projeto 24: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.

Subprojeto 33: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)

Responsável: Henrique Cézar Martins

Categoria de Licitação: Consultoria Individual

Valor do Projeto: US\$ 746.306,25

Valor do TOR: US\$ 21.255,20

Método de Aquisição: CD

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2015

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

- Estágio Atual: Pacote de documentos (justificativa, TDR e Memória de Cálculo) remetido a UGP para análise em 03/11/15. UGP analisará tão logo o processo de consultoria da "Formação dos Gestores" seja iniciado.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:
- Sinalização em relação ao Status:





Projeto 24: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.

Subprojeto 34: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.

Responsável: Henrique Cézar Martins

Responsável: Consultoria de Empresa

Valor do Projeto: US\$ 746.306,25

Valor: do TOR US\$ 720.585,02

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Setembro 2015 – Dezembro 2017

Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.

 Estágio Atual: Pacote de documentos (TdR e Memória de Cálculo) remetido a UGP para análise em 15/12/15.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Projeto 25: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 35: Contratação de Consultor Individual Especialista em **Avaliação de Programas para Identificar o Impacto** do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)

Responsável: Henrique Cézar Martins(SEDUC) / Jimmy Oliveira (IPECE)

Categoria de Licitação: Consultoria Individual

• **Valor:** US\$ 2.117.653,10

Valor do Projeto: US\$ 16.557,58

Método de Aquisição: Cl

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Março 2014 – Setembro 2015

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

Estágio Atual: Contrato Prorrogado até o dia 11/05/2015.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:





Projeto 25: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avalição do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 36: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

Responsável: Henrique Cézar Martins

Categoria de Licitação: Consultoria Individual

Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10

Valor do TOR: US\$ 25.207,85

Método de Aquisição: Cl

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: MARÇO 2015 – AGOSTO 2015

Estágio Previsto: Contrato concluído

Estágio Atual: Contrato concluídos e produtos entregues com sucesso!

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:





Projeto 25: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avalição do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 37: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

Responsável: Henrique Cézar Martins

Categoria de Licitação: Consultoria Individual

Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10

Valor do TOR: US\$ 29.188,04

Método de Aquisição: Cl

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: MARÇO 2015 – AGOSTO 2015

Estágio Previsto: Contrato concluído

Estágio Atual: Contrato concluídos e produtos entregues com sucesso!

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:









Projeto 25: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avalição do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 38: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de **Arte Gráfica/Design,** Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- Responsável: Henrique Cézar Martins
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10
- Valor do TOR: US\$ 71.219,89
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: 03 Propostas enviadas para análise da SEDUC em 11/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:









Projeto 25: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avalição do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 39: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em **Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil** e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

Responsável: Henrique Cézar Martins

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10

• **Valor do TOR:** US\$ 169.793,60

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Fevereiro 2015 – Agosto 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

 Estágio Atual: Após reunião realizada no dia 16/12/15, para orientações acerca da elaboração do RAT. Previsão de envio a UGP 18/12/15.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:



Sinalização em relação ao Status:



*ocorrido desmembramento do TdR de consultoria para 01 subprojeto: "Apoio Logístico", serviço de não consultoria.





Projeto 25: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avalição do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 40: Contratação de Empresa para realizar Apoio Logístico das formações do PADIN

Responsável: Henrique Cézar Martins

Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria

Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10

Valor do TOR: US\$ 486.491,39

Método de Aquisição: Pregão Eletrônico

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução

Estágio Atual: Recebido a 'não objeção' do BM referente ao TDR e MC em 15/12/15.
PE será elaborado pela UGP até 30/12/15.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:





Projeto 25: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avalição do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 41: Contratação de consultoria individual para trabalhar as Relações Sociais.

Responsável: Henrique Cézar Martins

Categoria de Licitação: Consultoria Individual

Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10

Valor do TOR: US\$ 56.490,16

Método de Aquisição: Cl

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Agosto 2015 – Janeiro 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução

Estágio Atual: TDR e MC encontra-se na SEDUC para análise desde 30/11/15.

Previsão de retorno até ____.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:





Projeto 25: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avalição do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 42: Desenvolvimento e construção do kit de brinquedos usados para JAD e ADI para PADIN.

Responsável: Henrique Cézar Martins

Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria

Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10

Valor do TOR: US\$ 296.550,60

Método de Aquisição: Pregão Eletrônico

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução

Estágio Atual: TDR e MC encontra-se na SEDUC para análise desde 07/12/15.

Previsão de retorno até ____.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:





Projeto 25: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avalição do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 43: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN

Responsável: Henrique Cézar Martins (SEDUC) / Jimmy Oliveira (IPECE)

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10

Valor do TOR: US\$ 931.503,15

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior (acertada em VC realizada em 18/08/15)

Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

Estágio Atual: Processo Referente ao RFLC concluído. Tramitado para os procedimentos de Auditoria Preventiva em 11/12/15. Processo referente a SDP encontra-se em revisão pela Cel04 desde 15/12/15.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Projeto 25: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avalição do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto 44: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN

Responsável: Henrique Cézar Martins(SEDUC) / Jimmy Oliveira (IPECE)

Categoria de Licitação: Consultoria Individual

Valor do Projeto: US\$ 2.117.653,10

Valor do TOR: US\$ 34.650,83

Método de Aquisição: Cl

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Agosto 2015 – Março 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

 Estágio Atual: Aviso de Manifestação de Interesse republicado com data limite para recebimento dos CV estipulada até as 16:00 hrs do dia 18/01/2016.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







SEMA





Projeto 27: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.

Subprojeto 45: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto "AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL."

Responsável: Maria Dias e Magda Marinho

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas

Valor Total do Projeto: US\$ 471.579,58

Valor do TOR: US\$ 471.579,58

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Julho 2014 – Fevereiro 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

Estágio Atual: Aprovação do RAT final encaminhada a SEMA em 14/12/15.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:









Projeto 28: Capacitação para o pessoal técnico municipal.

Subprojeto 46: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas

Responsável: Maria Dias e Ulisses Rolim

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas

Valor Total do Projeto: US\$ 355.343,39

Valor do TOR: US\$ 250.777,42

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Março 2015 – Agosto 2017

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

 Estágio Atual: Reunião de negociação realizada em 15/12/15, com o Consórcio Engesoft/Quanta.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:





Projeto 28: Capacitação para o pessoal técnico municipal.

Subprojeto 47: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicos.

Responsável: Maria Dias e Ulisses Rolim

Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria

Valor Total do Projeto: US\$ 355.343,39

Valor do TOR: US\$ 104.565,97

Método de Aquisição: Shopping

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Junho 2015 – Fevereiro 2017

Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.

Estágio Atual: Contrato 26/2015 - Publicado em 08/12/2015 Empresa vencedora MSV Multiserviços ME (R\$ 242.557,52).

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Projeto 29: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.

Subprojeto 48: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.

Responsável: Maria Dias e Francisco Leorne

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas

Valor Total do Projeto: 174.236,97

Valor do TOR: US\$ 174.236,97

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Junho 2014 – Dezembro 2015

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

 Estágio Atual: Reunião para orientações (sugestões de melhoria) quanto ao preenchimento do RAT ocorreu em 11/12/15.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Projeto 30: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.

Subprojeto 49: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.

Responsável: Maria Dias e Monica Freitas

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas

Valor Total do Projeto: US\$ 224.000,00

Valor do TOR: US\$ 224.000,00

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

- Estágio Atual: Encontra-se na fase de elaboração do RFLC. Portfolios encontram-se na SEMA para análise desde 04/11/15. Tendo em vista a participação insuficiente de empresas para a formação da lista curta, será solicitada a prorrogação para apresentação de portfólios até o dia 18/01/2016.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:
- Sinalização em relação ao Status:







Projeto 31: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.

Subprojeto 50: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".

Responsável: Maria Dias, Carla Passos e Ilana Fernandes

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas

Valor Total do Projeto: US\$ 844.660,13

Valor do TOR: US\$ 844.660,13

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Abril 2015 – Março 2017

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

Estágio Atual: Processo de SDP lançada em 13/11/15. Recebimento das propostas Técnicas e Financeiras até as 16:00hrs do dia 14/12/15. Reunião prévia realizada no dia 23/11/15.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Projeto 32: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

Subprojeto 51: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

Responsável: Maria Dias e Fabiola Martins

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor Total do Projeto: US\$ 1.839.456,10

Valor do TOR: US\$ 472.119,04

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Abril 2015 – Novembro 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

Estágio Atual: Processo de SDP lançada em 03/12/15. Recebimento das propostas Técnicas e Financeiras até as 16:00hrs do dia 16/01/16. Reunião prévia realizada no dia 10/12/15.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Projeto 32: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

Subprojeto 52: Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas (Equipamentos).

Responsável: Maria Dias

Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria

Valor Total do Projeto: US\$ 1.839.456,10

Valor do TOR: US\$ 1.367.337,05

Método de Aquisição: Pregão Eletrônico

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2015

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

 Estágio Atual: ET e MC elaborados pela SEMA. No entanto, aguarda definição quanto a inserção do componente "aquisição de bens" no PforR.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







SEMACE





Projeto 32: Fortalecimento da gestão ambiental estadual

Subprojeto 53: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE

Responsável: Mauricio Gifonni, Elizabeth Romão e Tiago Bessa

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor: US\$ 547.525,63

Valor do TOR: US\$ 334.350,85

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Junho 2015 – Junho 2016

Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.

Estágio Atual: UGP remeteu a Cel04 em 03/12/15, pacote de documentos (SDP, RFLC e MC) para análise prévia da Cel04.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Projeto 32: Fortalecimento da gestão ambiental estadual

Subprojeto 54: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a **Manualização dos Procedimentos Técnicos** dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.

Responsável: Mauricio Gifonni, Elizabeth Romão e Tiago Bessa

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor Total do Projeto: US\$ 547.525,63

Valor do TOR: US\$ 213.174,78

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Julho 2014 – Julho 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

Estágio Atual: Relatório de Análise das Propostas Técnicas em análise na UGP em 11/12/15. Previsão de retorno da análise até 18/12/15.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







SRH





Projeto 40: Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.

Subprojeto 63: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.

Responsável: Karine Machado e Marcilio Caetano

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor Total do Projeto: US\$ 1.077.421,94

Valor do TOR: US\$ 446.303,53

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016

Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.

Estágio Atual: Setorial elaborando a RFLC e SDP desde 05/12/15.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Projeto 40: Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.

Subprojeto 64: Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos.

- Responsável: Karine Machado e Fernanda Benevides
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.077.421,94
- Valor do TOR: US\$ 441.009,58
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 Maio 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas .
- Estágio Atual: Setorial elaborando a RFLC e SDP desde 05/12/15.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:
- Sinalização em relação ao Status:





Projeto 40: Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.

Subprojeto 65: Aquisição de equipamentos para suporte aos sistemas que serão implantados.

- Responsável: Karine Machado e Bruno Carvalho
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.077.421,94
- Valor do TOR: US\$ 130.722,71
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 Maio 2016
- Estágio Previsto: Avaliar Propostas.
- Estágio Atual: TDR e MC recebidos pela UGP em 24/11/15. No entanto, aguarda definição quanto a inserção do componente "aquisição de bens" no PforR.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação:
- Sinalização em relação ao Status:





Projeto 41: Malha D'agua

Subprojeto 66: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - **Malha D'agua**.

Responsável: Karine Machado

Categoria de Licitação: Consultoria Individual

Valor Total do Projeto: US\$ 1.077.421,94

Valor do TOR: US\$ 59.386,13

Método de Aquisição: Cl

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016

Estágio Previsto: Manifestação de interesse e recebimento de Currículos

 Estágio Atual: Recebido do BM em 14/12/15, 'não objeção' do TDR e MC. Setorial deve elaborar o Aviso de Manifestação de Interesse.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:









TCE





Projetos Assistência Técnica - Eixo: Gestão Financeira

Projeto 47: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

Subprojeto 75: Reformulação do Processo eletrônico do TCE

Responsável: Auriço Oliveira e Raimir Holanda

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor: US\$ 995.573,94

Valor do TOR: US\$ 806.712,10

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Setembro 2014 – Outubro 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

 Estágio Atual: RFLC e SDP em elaboração pela equipe do TCE, com previsão de envio a UGP em _____.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Projetos Assistência Técnica – Eixo: Gestão Financeira

Projeto 46: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

Subprojeto 76: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará

Responsável: Auriço Oliveira

Categoria de Licitação: Consultoria Individual

Valor do Projeto: US\$ 995.573,94

Valor do TOR: US\$ 87.946,22

Método de Aquisição: Cl

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Dezembro 2014 – Novembro 2015

Estágio Previsto: Contrato em execução.

 Estágio Atual: Contrato em execução. Aditivo de Prazo encaminhado para cadastramento no Client Connection.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:







Projetos Assistência Técnica - Eixo: Gestão Financeira

Projeto 46: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

Subprojeto 77: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

Responsável: Auriço Oliveira

Categoria de Licitação: Consultoria Individual

Valor do Projeto: US\$ 995.573,94

Valor do TOR: US\$ 100.915,62

Método de Aquisição: Cl

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015

Estágio Previsto: Contrato em execução.

Estágio Atual: CONTRATO ENCERRADO COM SUCESSO!

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:









4. MENSAGEM DO TOM KENYON







4. APROVAÇÃO DA ATA DA 22ª REUNIÃO (26/11/15) COMITÊ *PforR*







5. ENCAMINHAMENTOS







6. ENCERRAMENTO





