38ª REUNIÃO DO COMITÊ *PforR*

ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO

PROJETO *PforR*

30 DE MARÇO DE 2017

IPECE

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

PAUTA DA REUNIÃO

IPECE INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

Pauta da Reunião

1. Abertura e apresentação dos participantes (14h30-14h35)
2. Algumas Informações (14h35 – 14h40m):
   2.1 Posição da Reestruturação do PforR;
   2.2 Auditoria TCE – Plano de Ação;
   2.3 Missão do Banco Mundial
3. Indicadores, Plano de Ação, Programas e Assistência Técnica (14h40 - 15h10m)
   3.1. Indicadores Primários 2017.1 e Desembolsos – Laura Gonçalves
   3.2. Indicadores Secundários 2017.1 – Laura Gonçalves
   3.3. Programas PforR - Lívia Castro
   3.4. Assistência Técnica: Estatísticas – Lívia Castro
   3.5. Tempo disponível até o encerramento do PforR - Lívia Castro
   3.6. Pontos Principais de Aquisições – Giuseppe Nogueira
4. Projetos de Assistência Técnica em Situação de Risco e Previsão de Assinatura dos Contratos – Giuseppe Nogueira (15h10 – 15h30)
   4.1 Risco de Prazo dos subprojetos – Giuseppe Nogueira
   4.2 Previsão de Assinatura dos contratos dos 20 Subprojetos sendo licitados – Giuseppe Nogueira
5. Monitoramento Contratos – André Morel (15h30 – 15h40)
6. Projetos de Assistência Técnica por Setorial Contratados
7. Aprovação da Ata da 37ª Reunião (26/01/2017) (15h40m - 15h45m) – Laura Gonçalves
8. Encaminhamentos (15h45m - 16h) - Lívia Castro
9. Encerramento (16h)

1. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

IPECE INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

2. ALGUMAS INFORMAÇÕES

2.1 Posição da Reestruturação do PforR

2.1 Posição da Reestruturação do PforR

✓Cronograma:

Atividades	Datas Previstas	Datas Realizado
1. A Justificativa Técnica será analisada pelo Grupo Técnico da COFIEX	13/07/16	13/07/16
2. Encaminhamento do documento à Secretaria do Tesouro Nacional - STN	12/08/16	09/12/2016
3. Conclusão do Parecer da PGFN	26/08/16	19/01/07
4. Retorno ao Banco Mundial e ao Estado do Ceará aprovando a assinatura do Aditivo	Novembro/16	19/01/17
5. Envio do Aditivo para assinatura do Estado do Ceará	03/04/17	
5. Previsão para assinatura do Aditivo de reestruturação do PforR	14/04/17	

2.2 Auditoria TCE – Plano de Ação

IPECE INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

Relatório de Auditoria - TCE

- ✓ O Plano de Ação, referente ao Relatório de Auditoria do TCE dos Programas eleitos no escopo do Projeto *PforR* do ano de 2015 foi elaborado pelas setoriais **IPECE, SDE, SEDUC, SEMA, SEMACE e STDS** e será enviado hoje para o TCE.

2.3 Missão do Banco Mundial

Missão do Banco Mundial

- ✓ Missão de Gestão Pública com Tiago Peixoto: 01-15/02/2017;
- ✓ Missão de Gerenciamento Financeiro com Susana Amaral: 20-22/03/2017;
- ✓ Missão de Educação com Rita Almeida e Leandro Costa: 28-31/03/2017;
- ✓ Missão de Supervisão com Tiago Peixoto, Cristian Quijada, Gunars Platais, Concha Gandara: 17-20/04/2017.

3. INDICADORES, PLANO DE AÇÃO, PROGRAMAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

3.1. Indicadores Primários 2017.1 e Desembolsos

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2016.2 - Desembolso

Nº	Setorial	Nome do Indicador	Valor Desembolso US$
1	SEPLAG	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência a Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	3.438.000,00
2	SEMA	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	3.438.000,00
3	FUNCEME	DLI 10: Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.	3.438.000,00
Total de metas de 2016.2 atingidas e ainda não desembolsadas			**10.314.000,00**
1	STDS	DLI 5: Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	3.444.000,00
2	SEMA	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	3.444.000,00
Total de metas de 2017.1 atingidas			**6.888.000,00**
1	STDS	DLI 5: Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	3.120.000,00
2	SEMA	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	3.120.000,00
Total de meta de 2017.2 atingida			**6.240.000,00**
Total Geral a ser desembolsado pelas metas alcançadas no período de 2016.2 (Previsão)			**23.442.000,00**
Desembolso realizado em 16/03/17 – conversão com taxa cambial de R$ 3,1055			**R$ 72.799.131,00**

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2017.1

Setorial Responsável	n°	Nome	Metas
SDE	1	DLI 1: Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação.	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação
SEDUC	2	DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	Segundo relatório de acompanhamento publicado
	3	DLI 3: Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso	16
STDS	4	DLI 5: Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	75%
SEPLAG	5	DLI 6: Percentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	82.5%
	6	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	5
	7	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	15%
SRH	8	DLI 7: Estabelecimento de comitê multisetorial de Segurança Hídrica.	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas
CAGECE	9	DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	85.7%
SEMA	10	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	75%

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US$	Farol
DLI 1: Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação.	SDE Filipe Rabelo	2013	Projeto de documento de estratégia preparado e 4 acordos com setor privado e 4 acordos com universidades assinados	39.375.000,00	
		2014.1	Comitê instituído pelo decreto	4.462.500,00	
		2014.2	Documento de estratégia finalizado	6.198.000,00	
		2015.1	Plano de ação publicado	2.744.448,00	
		2016.1	Uma ação do plano de ação implementado	3.444.000,00	
		2017.1	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação	3.444.000,00	
		2017.2	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação	3.120.000,00	
		Total do Indicador		62.787.948,00	

Legenda: Metas alcançadas

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 1º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 1: Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação.	SDE Filipe Rabelo	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação	1 Ação já implementada em 2016.1	O Comitê tem trabalhado para justificar a inovação e a expansão do Programa **Aprendiz na Escola** como uma meta a ser executada até o fim deste semestre. Esta sendo elaborado um documento para a apreciação do Banco e, posterior, apresentação e comprovação da Ação implementada.

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US$	Farol
DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP.	SEDUC Rivanir Bezerra	2016.1	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	3.444.000,00	
		2017.1	Segundo relatório de acompanhamento publicado	3.444.000,00	
		Total do Indicador		6.888.000,00	

Legenda: Metas alcançadas

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 1º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	SEDUC Rivanir Bezerra	Segundo relatório de acompanhamento publicado	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	A SEDUC está trabalhando na divulgação do sistema junto aos alunos, em paralelo um Analista da Setorial está finalizando todos os levantamentos estatísticos que irão compor o sistema.

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US$	Farol
DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.	SEDUC Rivanir Bezerra	2015.1	10	2.744.444,00	
		2015.2	12	3.403.750,00	
		2016.1	13	3.444.000,00	
		2016.2	15	3.438.000,00	
		2017.1	16	3.444.000,00	
		2017.2	18	3.120.000,00	
		Total do Indicador		19.594.194,00	

Legenda: Metas alcançadas

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 1º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso.	SEDUC Rivanir Bezerra	16 acordos	15 acordos firmados	A SEDUC já dialoga com novas empresas para que seja feita novas parcerias, em paralelo está visitando as empresas que já são parceiras para que possa acompanhar o desenvolvimento de todas as atividades.

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US$	Farol
DLI 5: Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	2015.1	15%	2.744.444,00	
		2015.2	30%	3.403.750,00	
		2016.1	42.5%	3.444.000,00	
		2016.2	55%	3.438.000,00	
		2017.1	75%	3.444.000,00	
		2017.2	95%	3.120.000,00	
		Total do Indicador		19.594.194,00	

Legenda: Metas alcançadas

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 1º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	75%	100%	As Capacitações foram realizadas nos CRAS dos 36 municípios mais pobres. Portanto, todas as metas do Indicador já foram alcançadas. No entanto, a STDS continuará realizando as capacitações tendo em vista a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão em alguns municípios.

Legenda: Meta atingida

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US$	Farol
DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	SEPLAG José Freitas	2015.1	22.5%	2.744.444,00	
		2015.2	45%	3.403.750,00	
		2016.1	55%	3.444.000,00	
		2016.2	70%	3.438.000,00	
		2017.1	82.5%	3.444.000,00	
		2017.2	95%	3.120.000,00	
		Total do Indicador		19.594.194,00	

Legenda: Metas alcançadas

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 1º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 6: Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	SEPLAG José Freitas	82,5%	70%	A Equipe da Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza - CCOPI, realizará reunião com o Analista Jimmy, do IPECE no período de 03 a 07 de abril, para elaborar o planejamento das atividades necessárias ao cumprimento da meta. Após isso, será elaborado o cronograma de atividades.

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicadores	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US$	Farol
DLI 7: Estabelecimento de um Comitê multissetorial de Segurança Hídrica.	SRH Carlos Campelo	2013.2	Comitê instituído pelo decreto	39.375.000,00	
		2015.1	Diagnóstico de Bacias completos	2.744.444,00	
		2016.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.444.000,00	
		2016.2	Minutas de pelo menos duas reuniões	3.438.000,00	
		2017.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.444.000,00	
		2017.2	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.120.000,00	
		Total do Indicador		55.565.444,00	

Legenda: Metas alcançadas

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 1º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Metas	Realizado	Status
DLI 7: Estabelecimento do Comitê multisetorial de Segurança da Água.	SRH Carlos Campelo	Atas de pelo menos duas reuniões realizadas	Duas Atas já encaminhadas	No de 21 de março foi realizada a segunda reunião do ano de 2017 onde foi aprovada a ata 79ª da Reunião do CONERH, do dia 21/02/2017, que em seguida será encaminhada ao IPECE.

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US$	Farol
DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	CAGECE Carlos Rossas	2014.1	83.8%	5.250.000,00	
		2014.2	84.3%	6.198.000,00	
		2015.1	84.6%	2.744.444,00	
		2015.2	84.9%	3.403.750,00	
		2016.1	85.2%	3.444.000,00	
		2016.2	85.5%	3.438.000,00	
		2017.1	85.7%	3.444.000,00	
		2017.2	85.9%	3.120.000,00	
		Total do Indicador		31.042.194,00	

Legenda: Meta alcançada

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 1º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	CAGECE Carlos Rossas	85.5%	86,93%	86,93% (mês de fevereiro)

Legenda: Meta já alcançada

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicadores	Semestres	Metas	Valores em US$	Farol
DLI 9: Índice da qualidade da fiscalização ambiental	2014.1	28%	5.250.000,00	
	2014.2	40%	6.198.000,00	
	2015.1	50%	2.744.444,00	
	2015.2	60%	3.403.750,00	
	2016.1	65%	3.444.000,00	
	2016.2	70%	3.438.000,00	
	2017.1	75%	3.444.000,00	
	2017.2	80%	3.120.000,00	
	Total do Indicador		**31.042.194,00**	

Legenda: Meta alcançada

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 1º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	SEMA Maria Dias SEMACE Tiago Bessa COGERH Denilson Fidelis	75%	81,16%	81,16% (Medição referente a 31/01/16).

Legenda: Meta já alcançada

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US$	Farol
DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.*	SEPLAG Avilton Júnior	2014.2	Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará.**	6.198.000,00	
		2015.1	1	2.744.444,00	
		2015.2	2	3.403.750,00	
		2016.1	3	3.444.000,00	
		2016.2	4	3.438.000,00	
		2017.1	5	3.444.000,00	
		2017.2	6	3.120.000,00	
		Total		**25.792.194,00**	

* Nome do Indicador alterado por ocasião da reestruturação do PforR
** Meta do Indicador alterada por ocasião da reestruturação do PforR

Legenda: Probabilidade baixa de atingir a meta

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 1º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Metas	Realizado	Status
DLI11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	SEPLAG Avilton Júnior	**2014.2** Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará. **2015.1** 1 Secretaria **2015.2** 2 Secretarias **2016.1** 3 Secretarias **2016.2** 4 Secretarias **2017.1** 5 Secretarias	-	A meta é finalizar os trabalhos de estruturação dos acordos de resultados, com a análise de financiabilidade do investimento proposto e o impacto no custeio até o dia 11 de abril. O processo de expansão da implantação do modelo para outras duas secretarias: Sejus e STDS já foi finalizado. Sobre a regulamentação do modelo foi minutado um Decreto que atualmente está em análise jurídica, no entanto é interesse da atual gestão da Seplag intensificar esta institucionalização com a elaboração de um projeto de lei ordinária. Quanto às demais metas do indicador, foi retomado o processo junto às sete secretarias inicialmente escolhidas (Seduc, Sesa, SSPDS, Sema, SRH, Seinfra e Scidades).

Legenda: Probabilidade baixa de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US$	Farol
DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada	SEPLAG Adauto Oliveira	2014.2	Aprovação da metodologia	6.198.000,00	
		2015.1	-	-	
		2015.2	-	-	
		2016.1	5%	3.444.000,00	
		2016.2	10%	3.438.000,00	
		2017.1	15%*	3.444.000,00	
		2017.2	20%*	3.120.000,00	
		Total		**19.644.000,00**	

*As metas deste Indicador foram modificadas na reestruturação do PforR, anteriormente as metas eram 25% e 40%

Legenda: Metas alcançadas

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 1º Semestre de 2017

Indicador	Setorial Responsável	Meta	Realizado	Status
DLI12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	SEPLAG Adauto Oliveira	15%	-	Encontra-se em revisão o decreto envolvendo GPR e Gestão do Investimento Público. Os projetos a serem objeto da metodologia de investimentos para cumprimento da meta de 2017 estão em fase de análise e definição. A previsão é de conclusão em Maio/17.

Legenda Probabilidade alta de atingir a meta

3.2. Indicadores Secundários 2017.2

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2017

nº	Setorial	Indicadores	Metas 2017.1	2017.2	Status
1	IPECE	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	-	31.600	
2	SEPLAG	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	-	Outras duas resoluções publicadas e relatório sobre as atividades do Comitê publicado	
3	STDS	Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas	-	10%	
4	COGERH	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa	-	
		Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.	-	Plano de Segurança Hídrica elaborados e apresentados em Reunião do CONERH. Resolução do CONERH criando Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução dos Planos	
		Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	-	67.5	
5	SEMA	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	-	Implementação e monitoramento	
Total de Indicadores Secundários no semestre 2017: 7 Indicadores					

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Meta 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Meta 2ª semestre	Realizado	Status
PDO1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	IPECE Victor Hugo	31.600	25.463 técnicos	Os dados referentes ao não de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS. Em 2015 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).

Legenda Probabilidade baixa de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Meta 2ª semestre	Realizado	Status
Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	SEPLAG Lara Costa	Outras duas resoluções publicadas e relatório sobre as atividades do Comitê publicado	-	O CPDI se reuniu no dia 13/03/17, quando foi aprovada a alteração no Decreto de criação do Comitê, incorporando a responsabilidade pela articulação intersetorial, monitoramento e avaliação das ações do Programa Criança Feliz implementadas no Ceará. Essa mudança será conteúdo da 1ª Resolução do CPDI de 2017, a qual está no Gabinete do Primeira-dama para revisão e assinatura.

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Metas 2ª semestre	Realizado	Status
PDO2: Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	10%	7,11%	O sistema PforR encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, já foram inseridos os dados dos instrumentais (90% noventa por cento dos municípios) no sistema. Os passos que estão sendo realizados agora são as consultas no banco de dados, e uma vez o sistema finalizado e homologado, será realizado o cruzamento de dados para a criação dos Relatórios quantitativos e qualitativos.

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Meta 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Meta 2ª semestre	Realizado	Status
PDO3:Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	COGERH Denilson Fidelis, Disney Paulino	67.5	74,3	74,3 (referente ao mês de fevereiro) IQARce: 4,40 (criticamente degradado a poluído)

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Metas 2ª semestre	Realizado	Status
Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	COGERH Ana Araújo	Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa	A minuta do Decreto foi encaminhada ao CONERH.	O Banco Mundial não deu a NO à solicitação para modificar o instrumento legal de Lei para Decreto. A UGP contra-argumentou a decisão e estamos aguardando email com um retorno deles.

*Comitês Bacias Hidrográficas

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Setorial Responsável	Metas 2ª semestre	Realizado	Status
Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.	COGERH Zulene Almada	Plano de Segurança Hídrica elaborados e apresentados em Reunião do CONERH. Resolução do CONERH criando Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução dos Planos	-	Em 14/03/17 houve reunião presencial do coordenador do projeto por parte do consórcio/Cogerh / profissional K3, na sede da Cogerh para discutir os relatórios R3, R4, R5 e R13. Estes estão sendo ajustados/formatados pelo consórcio. A Cogerh está aguardando as versões finais dos Relatórios.

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2017

Nome do Indicador	Responsável	Metas	Realizado	Status
Apresentação da Lei de gestão de Resíduos Sólidos revista.	SEMA Maria Dias	Implementação e monitoramento	Foi encaminhado Relatório demonstrando os resultados da implementação e do monitoramento da Política Estadual de Resíduos Sólidos.	Está sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi assinado o TAC para os Consórcios de Sobral e Cascavel.

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta

3.3. Programas *PforR*

De – Para após Missão de Gerenciamento Financeiro

Setorial	Programas	EXECUÇÃO			Antes da Missão		Após Missão	
					Projeção	Total	Projeção	Total
		2014	2015	2016	2017		2017	
SEDUC	020 – Ensino Integrado à Educação Profissional.	R$ 228,90	R$ 220,13	R$ 270,00	R$ 170,78	R$ 889,81	R$ 170,78	R$ 889,81
STDS	080 – Proteção Social Básica.	R$ 7,21	R$ 7,24	R$ 7,36	R$ 10,51	R$ 32,32	R$ 7,30	R$ 29,11
SRH/COGERH	017 – Gestão dos Recursos Hídricos.	R$ 0,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,46	R$ -	R$ 0,46
CIDADES	025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8,58	R$ 8,58	R$ 5,00	R$ 5,00
SEMA	064 – Resíduos Sólidos.	R$ 0,39	R$ 1,11	R$ 0,43	R$ 2,00	R$ 3,93	R$ 1,10	R$ 3,03
	066 – Ceará Mais Verde.	R$ -	R$ -	R$ 0,05	R$ 0,60	R$ 0,65	R$ 0,47	R$ 0,51
	067 – Ceará no Clima.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 0,55
SEMACE	066 – Ceará Mais Verde.	R$ 3,08	R$ 1,36	R$ 0,70	R$ 29,30	R$ 34,44	R$ 2,50	R$ 7,64
	067 – Ceará no Clima.	R$ -	R$ 0,02	R$ 1,87	R$ 0,18	R$ 2,07	R$ 0,10	R$ 1,99
	500 - Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada.	R$ 1,52	R$ 1,05	R$ 0,72	R$ 0,76	R$ 4,04	R$ 0,76	R$ 4,04
FUNCEME	018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis.	R$ 1,79	R$ 2,27	R$ 1,82	R$ 1,97	R$ 7,86	R$ 1,60	R$ 7,49
	079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará.	R$ -	R$ 0,09	R$ -	R$ -	R$ 0,09	R$ -	R$ 0,09
TOTAL		**R$ 243,35**	**R$ 233,28**	**R$ 282,94**	**R$ 225,23**	**R$ 984,80**	**R$ 190,16**	**R$ 949,72**

De – Para após Missão de Gerenciamento Financeiro

Previsão Antes da Missão de Gerenciamento					
Setorial	EXECUÇÃO			PROJEÇÃO (R$ milhões)	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
SEDUC	R$ 228,90	R$ 220,13	R$ 270,00	R$ 170,78	R$ 889,81
STDS	R$ 7,21	R$ 7,24	R$ 7,36	R$ 10,51	R$ 32,32
SRH/COGERH	R$ 0,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,46
CIDADES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8,58	R$ 8,58
SEMA	R$ 0,39	R$ 1,11	R$ 0,47	R$ 3,15	R$ 5,13
SEMACE	R$ 4,60	R$ 2,43	R$ 3,29	R$ 30,24	R$ 40,55
FUNCEME	R$ 1,79	R$ 2,37	R$ 1,82	R$ 1,97	R$ 7,95
TOTAL	**R$ 243,35**	**R$ 233,28**	**R$ 282,94**	**R$ 225,23**	**R$ 984,80**

Previsão Após Missão de Gerenciamento					
Setorial	EXECUÇÃO			PROJEÇÃO (R$ milhões)	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
SEDUC	R$ 228,90	R$ 220,13	R$ 270,00	R$ 170,78	R$ 889,81
STDS	R$ 7,21	R$ 7,24	R$ 7,36	R$ 7,30	R$ 29,11
SRH/COGERH	R$ 0,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,46
CIDADES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5,00	R$ 5,00
SEMA	R$ 0,39	R$ 1,11	R$ 0,47	R$ 2,12	R$ 4,09
SEMACE	R$ 4,60	R$ 2,43	R$ 3,29	R$ 3,36	R$ 13,67
FUNCEME	R$ 1,79	R$ 2,37	R$ 1,82	R$ 1,60	R$ 7,58
TOTAL	**R$ 243,35**	**R$ 233,28**	**R$ 282,94**	**R$ 190,16**	**R$ 949,73**

Houve uma redução de R$ 35,07 milhões

Posição do Programa 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional - SEDUC

Iniciativas	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 31/03/2017 (B)	Até 29.03.2017 (C)	FAROL MARÇO (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R$ 31,49	R$ 5,73	R$ 7,15	125%	23%
020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R$ 8,06	R$ 1,47	R$ 0,25	17%	3%
020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R$ 98,93	R$ 17,99	R$ 23,88	133%	24%
020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.	R$ 2,30	R$ 0,42	R$ 0,01	3%	1%
020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.	R$ 30,00	R$ 5,45	R$ 0,19	3%	1%
TOTAL SEDUC - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	**R$ 170,78**	**R$ 31,05**	**R$ 31,49**	101%	18%

IPECE

Legenda dos faróis

81% a 100% de execução | 51% a 80% de execução | 0% a 50% de execução

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

Posição do Programa 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional - SEDUC

Iniciativas		Execução até 29.03.2017	Restos a Pagar até 29.03.2017	TOTAL
771	020.1.01	R$ 5.931.004,04	R$ 1.216.989,98	R$ 7.147.994,02
	020.1.02	R$ -	R$ 253.284,82	R$ 253.284,82
328	020.1.03	R$ 14.308.312,30	R$ 9.571.421,70	R$ 23.879.734,00
-	020.1.04	R$ -	R$ 14.304,54	R$ 14.304,54
834	020.1.06	R$ -	R$ 189.954,38	R$ 189.954,38
Total		**R$ 20.239.316,34**	**R$ 11.245.955,42**	**R$ 31.485.271,76**

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

Legenda dos faróis

81% a 100% de execução | 51% a 80% de execução | 0% a 50% de execução

Posição do Programa 080 – Proteção Social Básica - STDS

Iniciativa	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 31/03/2017 (B)	Até 29.03.2017 (C)	FAROL MARÇO (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.	R$ 7,30	R$ 1,33	R$ -	0%	0%
TOTAL STDS - ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA	**R$ 7,30**		**R$ -**		

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

Legenda dos faróis

81% a 100% de execução | 51% a 80% de execução | 0% a 50% de execução

Posição do Programa 025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana - CIDADES

Iniciativa	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 31/03/2017 (B)	Até 29.03.2017 (C)	FAROL MARÇO (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
025.1.12 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário.	R$ 5,00	R$ 0,91	R$ -	0%	0%
TOTAL CIDADES - QUALIADE DA ÁGUA	**R$ 5,00**		**R$ -**		

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

Legenda dos faróis

81% a 100% de execução | 51% a 80% de execução | 0% a 50% de execução

Posição do Programa 064 – Resíduos Sólidos - SEMA

Iniciativa	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 31/03/2017 (B)	Até 29.03.2017 (C)	FAROL MARÇO (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.	R$ 1,10	R$ 0,20	R$ -	0%	0%

IPECE

Legenda dos faróis

81% a 100% de execução | 51% a 80% de execução | 0% a 50% de execução

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

Posição do Programa 066 – Ceará Mais Verde - SEMA

Iniciativa	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 31/03/2017 (B)	Até 29.03.2017 (C)	FAROL MARÇO (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.	R$ 0,47	R$ 0,09	R$ -	0%	0%

IPECE

Legenda dos faróis

81% a 100% de execução | 51% a 80% de execução | 0% a 50% de execução

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

Posição do Programa 067 – Ceará no Clima - SEMA

Iniciativa	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 31/03/2017 (B)	Até 29.03.2017 (C)	FAROL MARÇO (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
067.1.05 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro.	R$ 0,55	R$ 0,10	R$ -	0%	0%
TOTAL SEMA (Programas 64, 66 e 67) - QUALIDADE DA ÁGUA	**R$ 2,12**	**R$ 0,39**	**R$ -**	0%	0%

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

Legenda dos faróis

81% a 100% de execução | 51% a 80% de execução | 0% a 50% de execução

Posição do Programa 066 – Ceará Mais Verde - SEMACE

Iniciativa	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 31/03/2017 (B)	Até 29.03.2017 (C)	FAROL MARÇO (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais.	R$ 2,50	R$ 0,45	R$ -	0%	0%

Legenda dos faróis

81% a 100% de execução | 51% a 80% de execução | 0% a 50% de execução

Posição do Programa 067 – Ceará no Clima - SEMACE

067 – Ceará no Clima	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 31/03/2017 (B)	Até 29.03.2017 (C)	FAROL MARÇO (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.	R$ 0,10	R$ 0,02	R$ 0,08	400%	79%

Legenda dos faróis

81% a 100% de execução | 51% a 80% de execução | 0% a 50% de execução

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

Posição do Programa 500 – Gestão e Manutenção - SEMACE

Iniciativa	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 31/03/2017 (B)	Até 29.03.2017 (C)	FAROL MARÇO (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas.	R$ 0,76	R$ 0,14	R$ 0,02	13%	2%
TOTAL SEMACE (Programas 66, 67 e 500) - QUALIDADE DA ÁGUA	**R$ 3,36**	**R$ 0,61**	**R$ 0,10**	16%	3%

IPECE

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

Legenda dos faróis

81% a 100% de execução | 51% a 80% de execução | 0% a 50% de execução

Posição do Programa 500 – Gestão e Manutenção - SEMACE

Iniciativas		Execução até 29.03.2017	Restos a Pagar até 29.03.2017	TOTAL
-	066.1.09	R$ -	R$ -	R$ -
-	067.1.09	R$ -	R$ 78.750,00	R$ 78.750,00
00001	500.1.02	R$ -	R$ 17.586,17	R$ 17.586,17
Total		**R$ -**	**R$ 96.336,17**	**R$ 96.336,17**

IPECE

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

Legenda dos faróis

81% a 100% de execução | 51% a 80% de execução | 0% a 50% de execução

Posição do Programa 018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis - FUNCEME

Iniciativa	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 31/03/2017 (B)	Até 29.03.2017 (C)	FAROL MARÇO (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias.	R$ 1,60	R$ 0,29	R$ 0,19	64%	12%
TOTAL FUNCEME - QUALIDADE DA ÁGUA	**R$ 1,60**	**R$ 0,29**	**R$ 0,19**	64%	12%

TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA	**R$ 12,08**	**R$ 2,20**	**R$ 0,28**	13%	2%

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

Legenda dos faróis

81% a 100% de execução | 51% a 80% de execução | 0% a 50% de execução

Posição de Execução dos Programas de 2017 até 29/03/2017

Sumário de Execução 2017 até 29.03.2017				
Eixo	**Setorial**	**Previsão**	**Execução**	**%**
Capacitação Profissional	**SEDUC**	R$ 170,78	R$ 31,49	18%
Assistência à Família	**STDS**	R$ 7,30	R$ -	0%
Qualidade da Água	**CIDADES**	R$ 5,00	R$ -	0%
	SEMA	R$ 2,12	R$ -	0%
	SEMACE	R$ 3,36	R$ 0,10	3%
	FUNCEME	R$ 1,60	R$ 0,19	12%
Total		**R$ 190,16**	**R$ 31,77**	**16,71%**

Posição de Execução dos Programas de 2017 até 29/03/2017

Execução Acumulada Projeto até 29.03.2017				
Meta 2014-2017	Documentado ao Banco	R$	949,73	100,00%
Execução 2014	Ok	R$	243,35	25,62%
Execução 2015	Ok	R$	233,28	24,56%
Execução 2016	Aguardando Auditoria do TCE	R$	282,94	29,79%
Execução 2017	Em execução	R$	31,77	3,34%
Total Executado		**R$**	**791,34**	**83,32%**
Falta Executar		**R$**	**158,39**	**16,68%**

Obs: O total auditado pelo TCE e documentado ao Banco foi de R$ 476,62 milhões (IFR 2014 e IFR 2015)

Posição dos Programas

EIXO	SETORIAL	PROGRAMAS	Previsão		Execução		FAROL (C)/(A)
			2017 (A)	Até 31.03.2017 (B)	Até 29.03.2017 (C)	FAROL MARÇO (D)	
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	SEDUC	020 – Ensino Integrado à Educação Profissional	R$ 170,78	R$ 31,05	R$ 31,49	101%	18%
TOTAL CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			**R$ 170,78**	**R$ 31,05**	**R$ 31,49**	**101%**	**18%**
ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA	STDS	080 – Proteção Social Básica	R$ 7,30	R$ 1,33	R$ -	0%	0%
TOTAL ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA			**R$ 7,30**	**R$ 1,33**	**R$ -**	**0%**	**0%**
QUALIDADE DA ÁGUA	CIDADES	025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana;	R$ 5,00	R$ 0,91	R$ -	0%	0%
	SEMA/SEMACE	064 – Resíduos Sólidos;	R$ 1,10	R$ 0,20	R$ -	0%	0%
		066 – Ceará Mais Verde;	R$ 2,97	R$ 0,54	R$ -	0%	0%
		067 – Ceará no Clima;	R$ 0,65	R$ 0,12	R$ 0,08	67%	12%
	SEMACE	500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada;	R$ 0,76	R$ 0,14	R$ 0,02	13%	2%
	FUNCEME	018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis.	R$ 1,60	R$ 0,29	R$ 0,19	64%	12%
TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA			**R$ 12,08**	**R$ 2,20**	**R$ 0,28**	**13%**	**2%**
TOTAL EXECUÇÃO DE 2017			**R$ 190,16**	**R$ 34,57**	**R$ 31,77**	**91,88%**	**16,71%**

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

Legenda dos faróis

81% a 100% de execução | 51% a 80% de execução | 0% a 50% de execução

Posição dos Programas

✓ **Lembrete**: Regras Programas

A execução dos programas deve observar as seguintes restrições:

- Devem excluir despesas que são financiadas pelo próprio BIRD ou por outras operações de crédito, ou seja, não é permitido a alocação de recursos do BIRD ou outras operações de crédito para custear despesas dos programas e iniciativas do componente
- Verificar a lista negra do BIRD a cada licitação, antes de assinar contrato. Para atender o Art. 42 da Lei 8.666/93 a SEPLAG incluiu no orçamento de cada ação um valor na fonte 69;
- Não podem apresentar impacto sócio ambiental negativo;
- Os valores dos contratos não podem exceder os limites abaixo:
  - Obras = US$ 50 milhões
  - Bens = US$ 30 milhões
  - Sistemas de TIC = US$ 20 milhões
  - Consultorias = US$ 15 milhões.

3.4. Assistência Técnica – Estatísticas

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

Execução dos Subprojetos de AT por Etapa

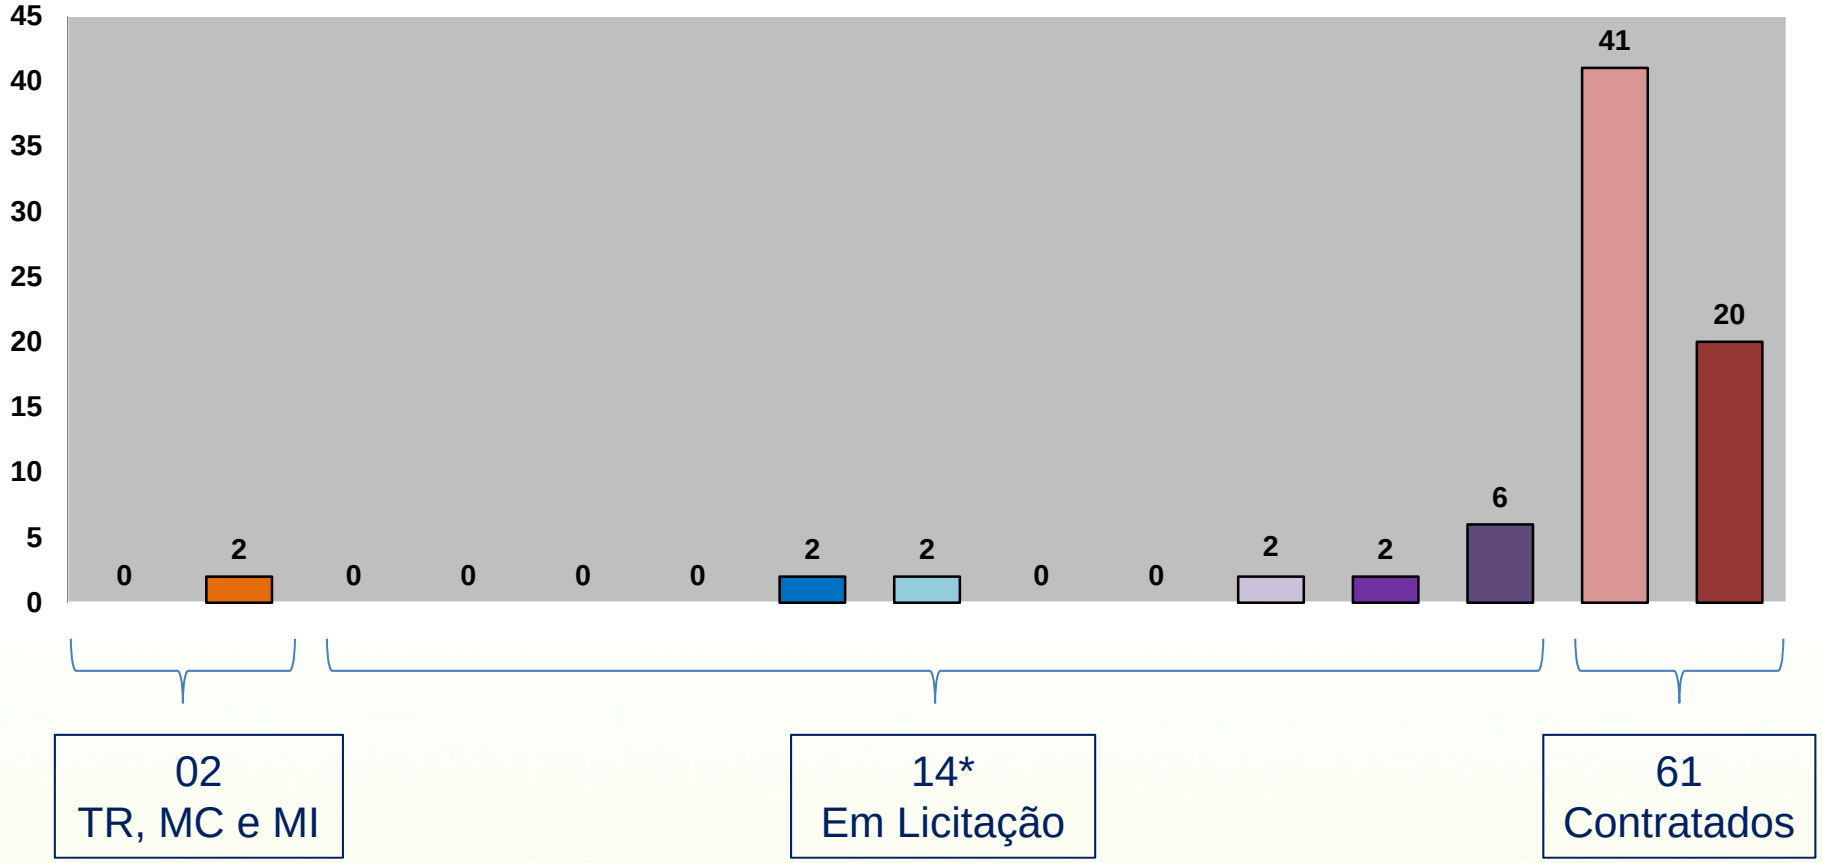

* Aguardando a confirmação do cancelamento oficial por parte do Secretário de Planejamento. (02 SEPLAG e 02 CGE)

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

Subprojetos de Assistência Técnica por Etapa

Etapas			Setoriais com Subprojetos	Valor US$
1	TDR e MC sendo elaborados para NO BM	0	-	-
2	TDR e MC aprovado pelo BM e elaborando MI	2	SEDUC (29); SEPLAG(60);	434.225,84
3	Manifestação de Interesse Publicada	0	-	-
4	Elaborando o Relatório Final da Lista Curta	0	-	-
5	Elaborando a Solicitação de Proposta	0	-	-
6	Solicitação de Proposta Lançada	0	-	-
7	Elaborando o Relatório Técnico ou Curricular	2	CGE(11); SEPLAG(57);	846.541,46
8	Elaborando o Relatório Financeiro e o Combinado	2	SECITECE(26); SEPLAG(64);	716.037,70
9	Não Objeção do BM à Avaliação Combinado / Avaliação Curricular	0	-	-
10	Divulgação da Avaliação Combinada / Ofício para Negociação	0	-	-
11	Negociação do Contrato	2	CGE(10); IPECE(22);	532.830,98
12	Divulgação PGE Resultado Final	2	CGE(08); SEDUC(36);	343.772,88
13	Assinando o Contrato / Publicação	6	SECITECE(27); SEDUC (30,31,32,35); SEMA (54);	866.910,24
14	Projetos com Contratos em Execução	41	CGE(04,05,06,07,09); FUNCEME(13); IPECE(14,17,18,19,20,21); PGE(23); SDE(24); SECITECE(28); SEDUC(37,38,43,44,45,46,47); SEMA(48,49,50,51,52,53); SEMACE(55,56); SEPLAG(61,62,63,65); SRH(66,67,68); COGERH(69,70); STDS(74); TCE(75);	15.825.975,10
15	Projetos com Contratos Finalizados	20	ARCE(01); CGE(02,03,12); IPECE(15,16); SDE(25); SEDUC(33,34,39,40,41,42); SEPLAG(58,59); COGERH(71); STDS(72,73); TCE(76,77).	2.642.885,02
Total		**77**		**2.642.885,02**

Execução dos Subprojetos de AT por Etapa

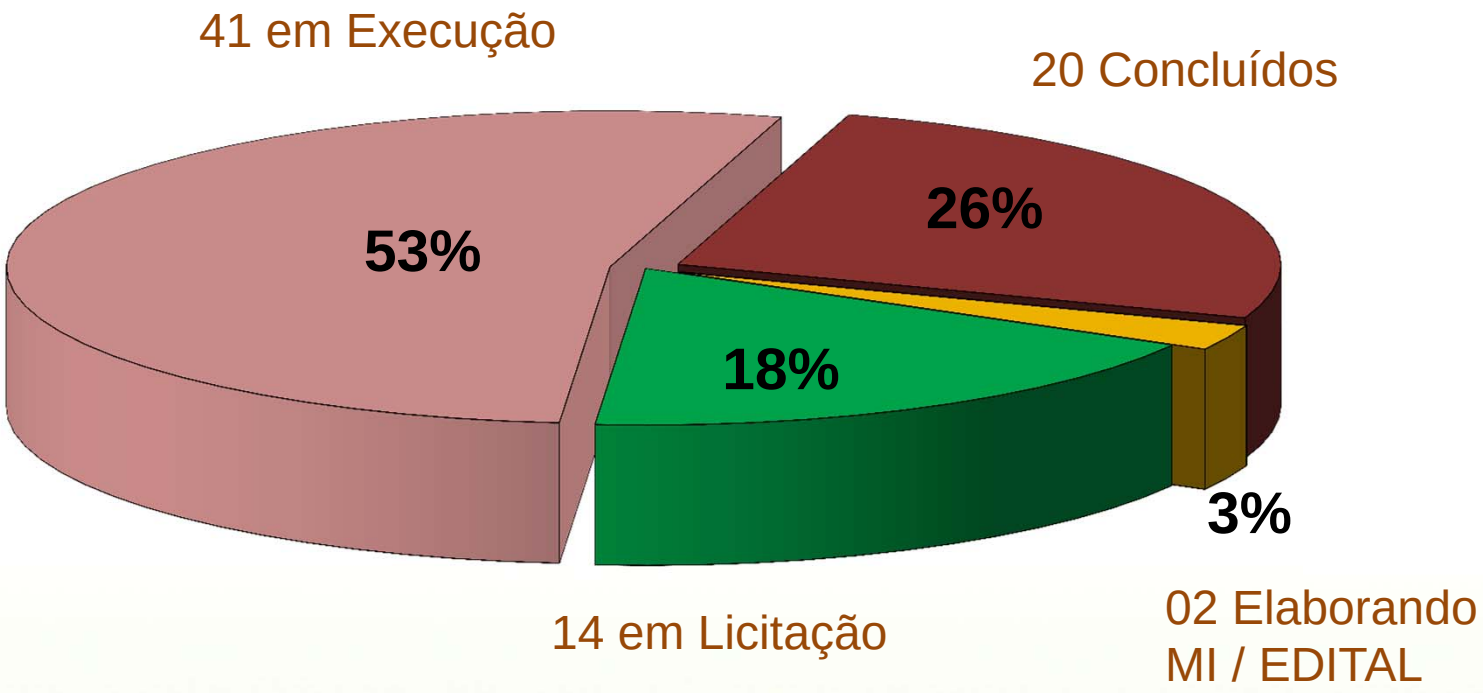

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

3.5 Tempo disponível até encerramento do *PforR*

Tempo disponível até encerramento do PforR = 31/01/2018

	1	2	3	4	5	6	
1º e 2º Semestres 2017	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	6 meses
2º Semestre 2017 e Jan de 2018	7	8	9	10			
	Out	Nov	Dez	Jan			4 meses
A partir de fev de 2018							
TOTAL							10 Meses

	Baixo - de 05 a 06 meses
	Médio - de 07 e 08 meses
	Alto - de 09 e 10 meses
	Altíssimo - acima de 10 meses - Inviabiliza o Projeto

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

3.6 Pontos Principais de Aquisições / Contratos

Pontos Principais de Aquisições / Contratos

✓ **Gerenciamento dos Contratos**

1. Prazo de execução/vigência dos contratos (até 31/01/2018);
2. Acompanhamento e monitoramento no MAPP.

4. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SITUAÇÃO DE RISCO E PREVISÃO DE ASSINATURA DOS CONTRATOS

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

4. 1 Risco de Prazo dos Subprojetos

Resumo dos Riscos de Prazo dos Subprojetos de AT

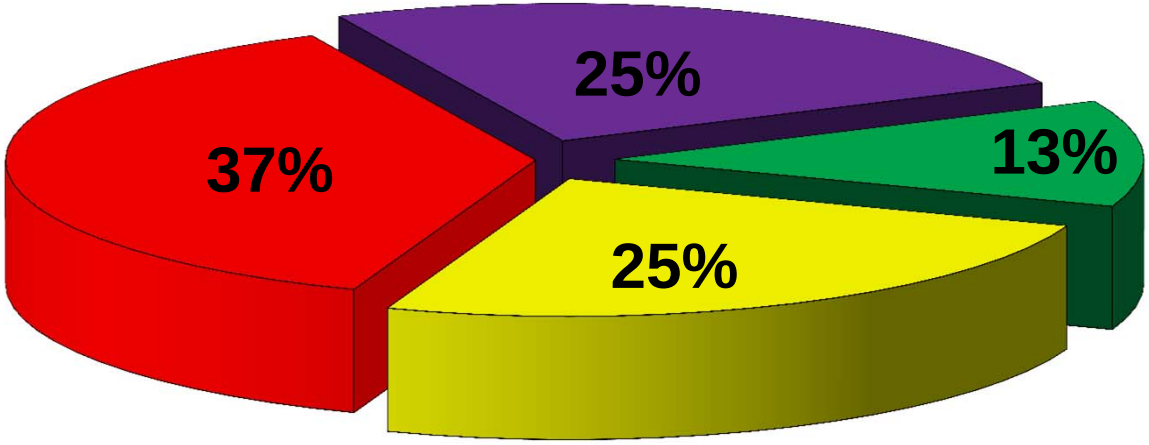

Qtd.	%	Setoriais
02	13%	CGE(1), SEDUC(1),
04	25%	CGE(01), SECITECE(1), SEDUC(1), SEPLAG(1),
06	37%	CGE(1), IPECE(1), SEDUC(3), SEMA(1), SECITECE(1),
04	25%	IPECE(1), SEDUC(1), SEPLAG(2).
16	100%	

	Baixo - de 05 a 06 meses
	Médio - de 07 e 08 meses
	Alto - de 09 e 10 meses
	Altíssimo - acima de 10 meses - Inviabiliza o Projeto

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

Subprojetos de AT em Risco Altíssimo - Inviabilizado

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	SEPLAG	Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS).	14
2	SEPLAG	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	12
3	IPECE	Metodologias para análise de impacto econômico.	11
4	SEDUC	Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.	11

* Aguardando a confirmação do cancelamento oficial por parte do Secretário de Planejamento.

	Baixo - de 05 a 06 meses
	Médio - de 07 e 08 meses
	Alto - de 09 e 10 meses
	Altíssimo - acima de 10 meses - Inviabiliza o Projeto

Subprojetos de AT em Risco Alto

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	CGE	Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).	10
2	SEDUC	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	10
3	SEDUC	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (01 analistas	10
4	SEDUC	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (01 analistas	10
5	SEMA	Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	10
6	SECITECE	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	9

* Aguardando a confirmação do cancelamento oficial por parte do Secretário de Planejamento.

	Baixo - de 05 a 06 meses
	Médio - de 07 e 08 meses
	Alto - de 09 e 10 meses
	Altíssimo - acima de 10 meses - Inviabiliza o Projeto

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

Subprojetos de AT em Risco Médio

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	CGE	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	8
2	SECITECE	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	8
3	SEPLAG	Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada em Gestão Pública para a Avaliação do Processo de Elaboração e Implementação do Modelo de Gestão para Resultados do Governo do Estado Do Ceará. (2a. Etapa)	8
4	SEDUC	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado. Incluindo a Avaliação de Desempenho Institucional	7

	Baixo - de 05 a 06 meses
	Médio - de 07 e 08 meses
	Alto - de 09 e 10 meses
	Altíssimo - acima de 10 meses - Inviabiliza o Projeto

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

Subprojetos de AT em Risco Baixo

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	CGE	consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO).*	5,5
2	SEDUC	Contratação Direta de Consultor(a) Especializado(a) para Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento. WMS	5

* Aguardando a confirmação do cancelamento oficial por parte do Secretário de Planejamento.

	Baixo - de 05 a 06 meses
	Médio - de 07 e 08 meses
	Alto - de 09 e 10 meses
	Altíssimo - acima de 10 meses - Inviabiliza o Projeto

4.2. Previsão de Assinatura dos contratos dos 16 Subprojetos sendo licitados

Previsão de Assinatura dos Contratos dos 16 Subprojetos sendo Licitados - Sumário

Previsão de Assinatura dos Contratos					
Setoriais	Março		Abril		Total
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
CGE	2 *		1		3
IPECE	1	1	1		2
SEPLAG	3 *	1	1		4
SECITECE	1		1		2
SEMA	2	1			1
SEDUC	5	2	3		7
Total	14	5	7	0	16

* Aguardando a confirmação do cancelamento oficial por parte do Secretário de Planejamento. (02 SEPLAG e 02 CGE)

Previsão de Assinatura dos Contratos dos 09 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Março 2017

Setorial		Projeto	Risco (Tempo execução em meses)	Risco (Previsão de Contratação em meses)	Risco (Tempo contratação + execução em meses)
1	CGE	consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO).*	3,5	2	**5,5**
2	CGE	Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).*	8	2	**10**
3	SECITECE	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	7	1	**8**
4	SEDUC	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (01 analistas	10,5	0,5	**11**
5	SEDUC	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (01 analistas	10,5	0,5	**11**

* Aguardando a confirmação do cancelamento oficial por parte do Secretário de Planejamento.

	Baixo - de 05 a 06 meses
	Médio - de 07 e 08 meses
	Alto - de 09 e 10 meses
	Altíssimo - acima de 10 meses - Inviabiliza o Projeto

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

Previsão de Assinatura dos Contratos dos 09 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Março 2017

Setorial		Projeto	Risco (Tempo execução em meses)	Risco (Previsão de Contratação em meses)	Risco (Tempo contratação + execução em meses)
6	SEDUC	Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.	9	2	**11**
7	SEMA	Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	9	1	**10**
8	SEPLAG	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.*	10	2	**12**
9	SEPLAG	Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS).*	12	2	**14**

	Baixo - de 05 a 06 meses
	Médio - de 07 e 08 meses
	Alto - de 09 e 10 meses
	Altíssimo - acima de 10 meses - Inviabiliza o Projeto

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

CGE - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 10: Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema (MODELO).

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US$ 86.553,32
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2016 – Junho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Em Fase de Licitação – Aguardado o Termo de Revogação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação**:
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

CGE - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 11: Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferreamente tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US$ 760.937,50
- **Método de Aquisição:** LPN
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2015 – Dezembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Aguardado o Termo de Revogação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação**:
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 27: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Sandra Monteiro / Tarcísio Hilter
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US$ 240.716,10
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual**: Em fase de assinatura de contrato – Homologação publicado em 10/03/2017, assinatura no dia 17/03/2017 e aguardando a publicação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEDUC- Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojetos 31 e 32: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (02 analistas).

- **Responsável:** Luciano Nery
- **Categoria de Licitação:** CI
- **Valor do Subprojeto:** US$ 52.255,68
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2016 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em fase de assinatura de contrato - Contratos assinados pelos Consultores, aguardando assinatura do Secretário e posterior envio para publicação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 36: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de **formação para gestores das creches** e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US$ 254.128,36
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual**: Em fase de negociação de contrato – Publicação do Aviso de Resultado Final no dia 29/03/2017, abrindo o prazo recursal até o dia 05/04/2017.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 54: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da **coleta seletiva** nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US$ 723.273,62
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Dezembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual**: Em fase de assinatura de contrato – Aguardando a publicação da Homologação e Adjudicação para posterior assinatura do Contrato.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 57: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima
- **Categoria de Licitação**: Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US$ 85.603,96
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Agosto 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Aguardado o Termo de Revogação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEPLAG - Assistência Técnica – Fiduciário

Subprojeto 64: Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado – GCOMPRAS.

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US$ 566.481,02
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Aguardado o Termo de Revogação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Previsão de Assinatura dos Contratos dos 07 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Abril 2017

Setorial		Projeto	Risco (Tempo execução em meses)	Risco (Previsão de Contratação em meses)	Risco (Tempo contratação + execução em meses)
1	CGE	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	6	2	**8**
2	IPECE	Metodologias para análise de impacto econômico.	9	2	**11**
3	SECITECE	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	6	3	**9**
4	SEDUC	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	7	3	**10**
5	SEDUC	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado. Incluindo a Avaliação de Desempenho Institucional	6	1	**7**
6	SEDUC	Contratação Direta de Consultor(a) Especializado(a) para Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento. WMS	3	2	**5**
7	SEPLAG	Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada em Gestão Pública para a Avaliação do Processo de Elaboração e Implementação do Modelo de Gestão para Resultados do Governo do Estado Do Ceará. (2a. Etapa)	6	2	**8**

CGE - Assistência Técnica - Gestão Pública

Subprojeto 8: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na "Detecção de Casos de Fraude e Corrupção" tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.

- **Responsável:** Denise Andrade Araújo
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US$ 89.644,51
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Dezembro 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual**: Em Licitação – Publicação do Aviso de Resultado Final no dia 24/03/2017, abrindo o prazo recursal até o dia 31/03/2017. Setorial está elaborando a resposta do Recurso?
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

IPECE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 22: Contratação de Consultoria de Empresa para Desenvolvimento de Metodologia para análise de impacto econômico no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US$ 446.277,65
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Outubro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Setorial encaminhou a Ata e Minuta do Contrato para assinatura da empresa em 28/03/2017.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 26: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.

- **Responsável:** Sandra Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US$ 149.556,68
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Julho 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Em Licitação – Marcado a abertura das Propostas Financeiras para o dia 31/03/2017.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEDUC- Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 29: Contratação de serviços de consultoria para avaliação de desempenho acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará. ***(Teste de Proficiência)***

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US$ 374.353,64
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Dezembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução.
- **Estágio Atual**: Em fase de negociação do contrato – Recebido do BM em 23/03/2017 "não objeção" para mudança de método. Enviado a setorial para providência da documentação de contratação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEDUC - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

*Subprojeto 30: Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da **formação continuada para gestores**, professores e instrutores de educação profissional secundárias do Estado (com a inclusão da Avaliação de Desempenho Institucional).*

- **Responsável:** Jussara Batista
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US$ 81.757,64
- **Método de Aquisição:** SQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Abril 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual**: Em fase de assinatura de contrato – Homologação e Adjudicação publicada no dia 15/03/2017, aguardando assinatura e publicação do Contrato.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 35: Contratação Direta de Consultor(a) Especializado(a) para Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento. WMS

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US$ 16.506,96
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Novembro 2015 – Maio 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual**: Em fase de assinatura de contrato – Encaminhado a documentação para assinatura do Consultor.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 60: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada em Gestão Pública para a Avaliação do Processo de Elaboração e Implementação do Modelo de Gestão para Resultados do Governo do Estado Do Ceará. (2a. Etapa)

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US$ 59.872,20
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2016 **–** Setembro 2017
- **Estágio Previsto:** Manifestação de Interesse Publicada
- **Estágio Atual:** Em atividades preparatórias – TDR em verificação pelo novo secretário. Aguardando validação.
- **Sinalização em relação ao Plano de Licitação:**
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

5. MONITORAMENTO CONTRATOS

Contratos Assistência Técnica

Setorial	N° de Contratos	N° de Contratos em Andamento	N° de Contratos Concluídos	Valor Contratado + Patronal (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo a Pagar (R$)	% PAGO
ARCE	1	-	1	840.025,65	840.025,65	-	100%
CGE	8	5	3	7.593.945,05	1.202.405,24	6.391.539,81	16%
COGERH	3	2	1	4.419.133,06	1.680.561,17	2.738.571,89	38%
FUNCEME	1	1	-	1.493.596,27	1.243.394,93	250.201,34	83%
IPECE	8	6	2	3.498.300,70	1.090.981,20	2.407.319,50	31%
PGE	1	1	-	1.434.107,25	-	1.434.107,25	0%
SDE	2	1	1	1.148.959,99	280.723,80	868.236,19	24%
SECITECE	1	1	-	192.364,00	20.527,45	171.836,55	11%
SEDUC	13	7	6	6.256.357,80	2.135.631,64	4.120.726,16	34%
SEMA	6	6	-	5.673.591,01	1.266.538,24	4.407.052,77	22%
SEMACE	2	2	-	1.744.961,99	504.456,75	1.240.505,24	29%
SEPLAG	6	4	2	10.054.771,29	4.491.243,61	5.563.527,68	45%
SRH	3	3	-	3.048.215,88	624.360,28	2.423.855,60	20%
STDS	3	1	2	2.307.050,00	585.556,00	1.721.494,00	25%
TCE	3	1	2	3.067.178,37	772.616,79	2.294.561,58	25%
TOTAL	**61**	**41**	**20**	**52.772.558,31**	**16.739.022,75**	**36.033.535,56**	**32%**

Pago até 24/03/2017.

Situação dos Contratos - Financeiro

Pago e Previsão de Pagamento da Assistência Técnica - PforR							
Ano	**Ano 2014**	**Ano 2015**	**Ano 2016**	**Ano 2017 (março)**	**Previsão 2017**	**Previsão 2018**	**PforR (Componente 2)**
Valor	72.600,00	975.610,02	11.205.680,55	4.485.132,18	40.716.133,82	2.727.488,53	60.182.645,10

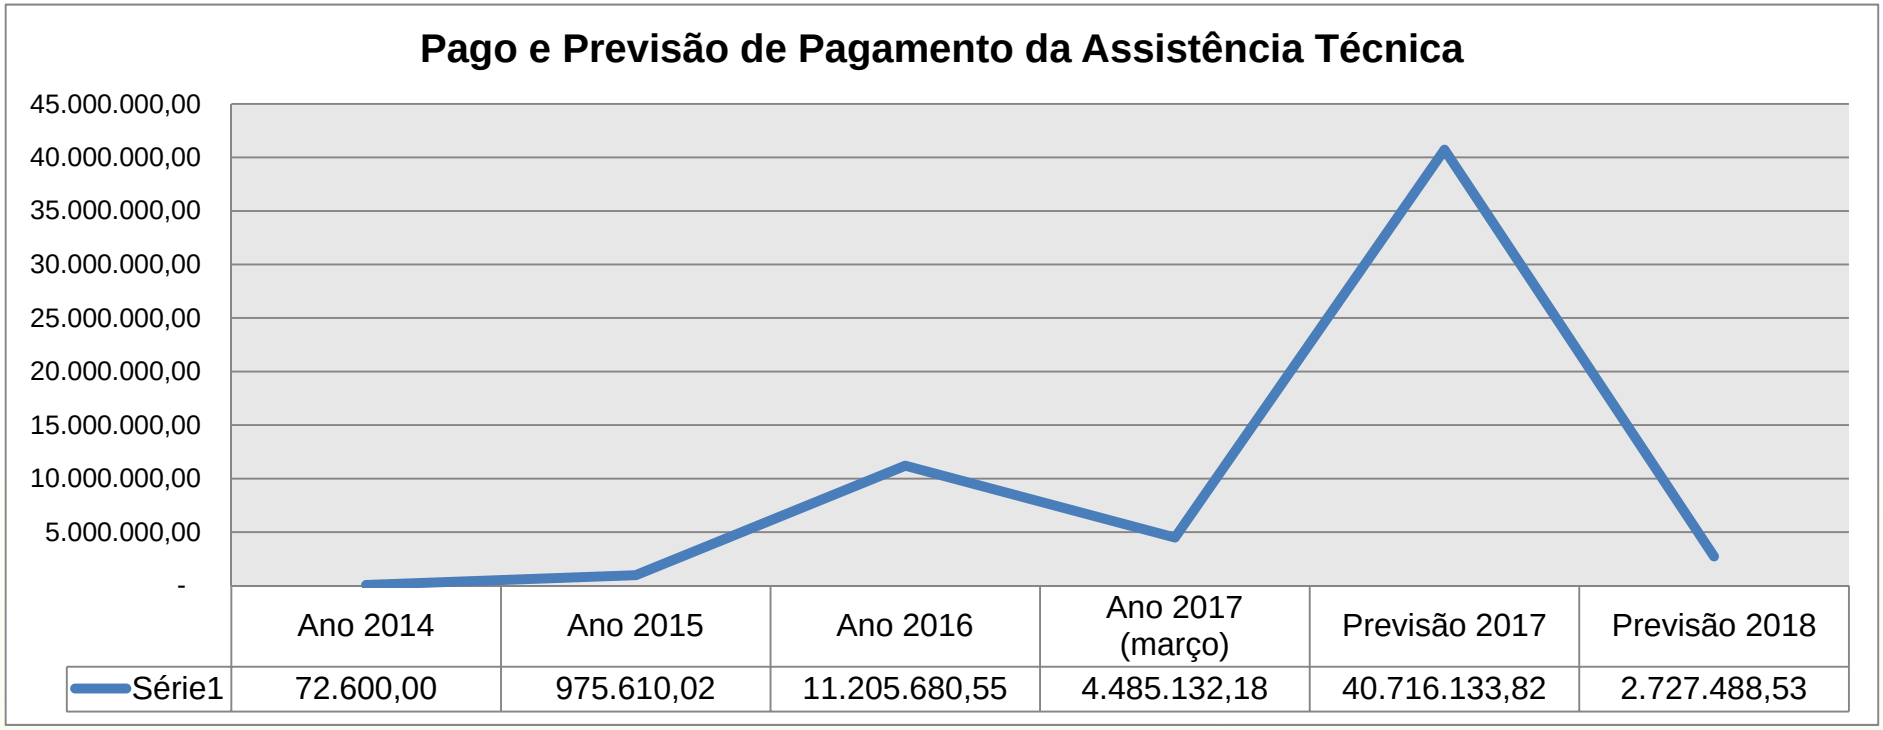

Situação dos Contratos – Aditivos de Prazo

Setorial	ARCE	CGE	COGERH	FUNCEME	PGE	SEMA	SEMACE	SEPLAG	SDE	SEDUC	STDS	SECITECE	IPECE	TCE	SRH	TOTAL
Nº Contratos	1	8	3	1	1	6	2	5	2	12	3	1	7	3	3	**61**
Aditivo de Prazo	0	1	1	1	0	0	0	3	0	5	4	1	7	3	0	**26**

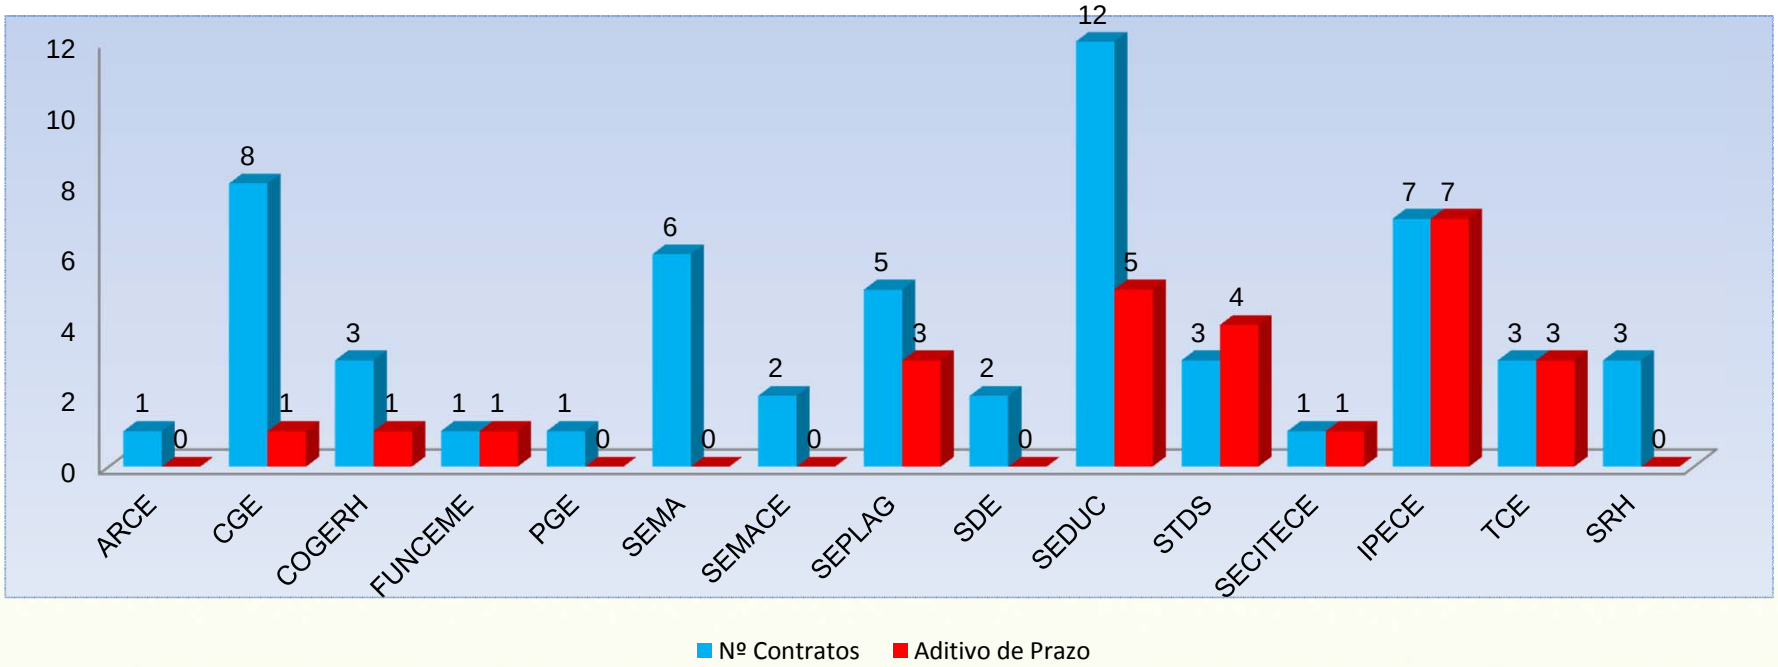

43% dos Contratos já foram elaborados Aditivos de Prazo

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

Divulgação dos Contratos e Produtos no Site

20/01/2017, Sexta-Feira

Buscar OK Destaques

Governo do Estado do Ceará

Secretaria do Planejamento e Gestão
Governo do Estado do Ceará

Institucional — Nossa Identidade e Estrutura
Planejamento — Planejamento e Orçamento
Gestão — Ações e informações de Gestão
Gestão do Servidor
Compras — Acesso ao Portal de Compras
RSS

Acesso à Informação

- Gestão para Resultados
- Plano Plurianual
- Lei de Diretrizes Orçamentárias
- Lei Orçamentária Anual
- Execução Orçamentária
- Mensagem à A.L.
- Plano Operativo
- MAPP Gestão
- Descentralização Orçamentária
- Parceria Público-Privadas
- Cooperação Técnico-Financeira
- Contrato de Gestão
- Consórcio Público

Órgãos Vinculados

COHAB - Companhia de Habi
EGP - Escola de Gestão Públ
ETICE - Empresa de Tecnolo
IPECE - Instituto de Pesquisa
ISSEC - Instituto de Saúde do

OK

VOLTAR IMPRIMIR A+ A-

Projeto de Fortalecimento do Modelo de Gestão para Resultados - GPR

O projeto de Fortalecimento do Modelo de Gestão Pública para Resultados – GPR, adotado pelo Governo do Estado do Ceará, tem como objetivos:

- Avaliar o modelo de Gestão Pública para Resultados em implementação no Governo do Estado, fundamentando-se nas referências de boas práticas adotadas por países e estados da federação;
- Revisar o modelo de GPR aperfeiçoando o processo de coordenação, melhorando a qualidade dos indicadores a serem monitorados, com base na sua relevância para o alcance dos resultados esperados (ou dos componentes do modelo), estruturando um ciclo integrado de planejamento, orçamento, monitoramento e avaliação;
- Apoiar o fortalecimento da governança para resultados, aprimorando os mecanismos de coordenação e colaboração intersetorial entre secretarias, focada, em especial nos temas de assistência familiar, qualidade da água e capacitação;
- Dispor de um plano de implementação da metodologia de GPR com Modelo de Incentivos para o Estado e sua aplicação em áreas-piloto; e
- Dotar o Governo do Estado de capacidade institucional (estrutura organizacional, e capacitação) para implementação do modelo revisado de GPR.

Neste projeto está prevista a entrega dos seguintes produtos, devidamente analisados e validados por uma Comissão formada por técnicos servidores da Secretaria do Planejamento e Gestão – Seplag (coordenadora do projeto), Secretaria da Fazenda – Sefaz, Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado – CGE, Casa Civil e Procuradoria Geral do Estado – PGE:

- Relatório com a análise de benchmarking consolidando as práticas e metodologias de GPR e de modelos de incentivos;
- Relatório do diagnóstico e conclusões do modelo de GPR adotado no Estado do Ceará e da análise de mecanismos de incentivos existentes no Estado;
- Relatório consolidado de Avaliação do Modelo de GPR do Ceará;
- Carteira de Projetos Estratégicos Prioritários do Governo do Estado do Ceará;
- Relatório com o detalhamento dos planos dos projetos selecionados e implantação do monitoramento intensivo
- Metodologia que consolide o Modelo de GPR, com e sem Modelo de Incentivos alinhado ao alcance dos objetivos estratégicos, a ser adotado pelo Estado do Ceará;
- Relatório de requisitos ao desenvolvimento de ferramentas de suporte à aplicação do Modelo de GPR e do Modelo de Incentivos;
- Minuta de regulamentação para a efetiva execução do Modelo de GPR;
- Plano de Implantação do Modelo de GPR e do Modelo de Incentivos;
- Relatório de implantação do Modelo de GPR em uma secretaria-piloto;
- Relatório de implantação do Modelo de GPR em cinco secretarias;
- Termo de Referência para Avaliação do Modelo de GPR adotado no Estado e respectivo Modelo de Incentivos.

Serviços

- Servidor Online
- Ouvidoria
- Manuais da SEPLAG
- Acesso a Sistemas
- Acesso Cidadão - Catálogo Eletrônico de Serviços do Estado do Ceará
- Diário Oficial
- Acompanhamento de Processos - VIPROC
- Concursos Públicos
- Consulta às Licitações Publicadas
- Banco de Talentos
- Registro de Preço
- Rotas
- WEBMAIL
- Programas orçamentários para execução de parcerias
- Certidão de Acumulação de Cargos

1 2 3 4 5 6

PROGRAMAS ORÇAMENTÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE PARCERIAS

LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2012

6. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR SETORIAL CONTRATADOS

CGE

IPECE INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

CGE- Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojetos 2 e 3: Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR. [1]

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor dos Subprojetos:** US$ 67.354,63
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévio
- **Início/Término:** Junho 2014 - Fevereiro 2016
- **Estágio Atual:** Contratos Concluídos.
- **Consultores:** Marcelo Ponte Barbosa e Túlio Cravo.
- **Valor do Contrato:** R$ 133.160,00.

Nota 1: Auditoria será realizada pela equipe da CGE a partir do semestre 16.1

CGE - Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Subprojeto 4: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Marcelo Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US$ 224.190,70
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2015 – Abril 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 08/2016 - Publicado em 28/06/2016.
- **Consultora Vencedora:** Empresa NTConsult Tecnologia e Consultoria LTDA.
- **Valor do Contrato:** R$ 725.256,92
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

CGE - Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 5: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).

- **Responsável:** Carlos Jorge Freitas
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US$ 658.560,58
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2015 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 026/2016 - Publicado em 16/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** Ivia Serviços de Informática Ltda.
- **Valor do Contrato:** R$ 2.130.443,48.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

CGE - Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 6: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US$ 1.071.989,29
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 029/2016 – Publicado em 02/12/2016.
- **Consultora Vencedora:** CAIENA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.
- **Valor do Contrato:** R$ 3.467.885,35.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

CGE - Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 7: Capacitação da população para o Controle Social.

- **Responsável:** Ítalo José Brígido Coelho
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US$ 267.522,72
- **Método de Aquisição:** LPN
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Assinatura Contrato.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 01/2017 – Assinado em 20/01/2017.
- **Consultora Vencedora:** Fundação Demócrito Rocha.
- **Valor do Contrato:** R$ 865.436,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

Assistência Técnica – Gestão Financeira

*Subprojeto 9: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamentos com foco no "**Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade** aplicada ao setor público" tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos do processo de convergência das Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público (IPSAS).*

- **Responsável:** Paulo Roberto
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor do Subprojeto:** US$ 63.341,12
- **Método de Aquisição:** SMC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 025/2016 - Publicado em 30/11/2016.
- **Consultora Vencedora:** KPMG ASSESSORES LTDA.
- **Valor do Contrato:** R$ 197.421,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

CGE - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 12: Contratação de consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.

- **Responsável:** Aglaio Soares
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US$ 24.411,82
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Março de 2016
- **Estágio Atual**: Contrato Concluído.
- **Consultor:** Fernando Braga.
- **Valor do Contrato:** R$ 46.000,00.

IPECE

IPECE INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

CGE- Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojetos 14 e 15: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTORES PLENOS

- **Responsável:** Viviane Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US$ 322.192,82
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contratos em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

CGE- Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 16: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTOR JÚNIOR

- **Responsável:** Viviane Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US$ 21.227,67
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2014 – Maio 2015
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Consultora:** Viviane Ramos da Costa.
- **Valor do Contrato:** R$ 48.000,00.

CGE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojetos 17,18 e 19: Contratação de 03 (três) ***Analistas em Licitações*** *para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.*

- **Responsável:** Viviane Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor dos Subprojetos:** US$ 223.560,31
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Julho 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contratos em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

CGE - Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

*Subprojeto 20: Contratação de Consultor Individual especializado em **Políticas Públicas** para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução a Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.*

- **Responsável:** Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Serviços
- **Valor dos Subprojetos:** US$ 109.139,93
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Agosto 2016
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato nº 10/2015 publicado em 18/09/2015. Serviços em execução.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

IPECE - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 21: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.

- **Responsável:** Mário Aragão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US$ 682.482,48
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Dezembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato assinado em 17/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** Nova Via Tecnologia e Mobilidade Ltda.
- **Valor do Contrato:** 2.187.903,10
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

PGE

IPECE INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

PGE - Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Subprojeto 23: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Valéria Rodrigues
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto**: US$ 443.309,81
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 23/2016 assinado em 14/09.
- **Consultora Vencedora:** NTConsult Tecnologia e Consultoria Ltda.
- **Valor do Contrato:** 1.434.107,25
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SECITECE

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

SECITECE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 28: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

- **Responsável:** Sandra Monteiro
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US$ 85.071,64
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Abril 2017
- **Estágio Atual**: Contrato em Execução – Contrato nº 16/2016, assinado em 06/07/2016.
- **Consultora**: Maria Fatima Ludovico da Gama e Souza.
- **Valor do Contrato:** R$ 138.720,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEPLAG

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

SEPLAG - Assistência Técnica - Gestão Pública

Subprojeto 58: Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Adauto Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US$ 504.550,12
- **Método de Aquisição**: SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Junho 2014 – Outubro 2016
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- **Consultora vencedora:** Consórcio Macroplan e Transplan.
- **Valor do contrato:** 1.140.888,73.

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 59: Consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US$ 1.128.001,21
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2014 **–** Janeiro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 023/2015.
- **Consultora vencedora:** Macroplan Prospectiva, Estratégia e Gestão S/S Ltda.
- **Valor do contrato:** R$ 2.667.519,34.

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 61: Consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Dominique Gomes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US$ 317.051,64
- **Método de Aquisição:** SBQ
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Contrato e ordem de serviço assinados em 04/10/2016. Realizado 1ª reunião de partida do projeto. Aguardando a publicação no DOE.
- **Consultora vencedora:** Consórcio IADH x DELOS.
- **Valor do contrato:** R$ 1.025.662,05.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEPLAG - Assistência Técnica - Gestão Pública

*Subprojeto 62: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para **Auditar a Folha de Pagamento** do Poder Executivo do Estado do Ceará.*

- **Responsável:** Fábio Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US$ 556.414,22
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato assinado e emitido a Ordem de Serviço em 16/09/2016.
- **Consultora vencedora:** Deloitte Touche Tohatsu Consultores LTDA .
- **Valor do contrato:** R$ 1.800.000,00
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEPLAG - Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 63: Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Silvana Dourado
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US$ 818.677,30
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato assinado e emitido a Ordem de Serviço em 24/03/2017.
- **Consultora vencedora:** Elogroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda.
- **Valor do contrato:** R$ 2.648.421,05
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEPLAG - Assistência Técnica – Fiduciário

Subprojeto 65: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US$ 238.726,47
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Dezembro 2014 – Julho 2017
- **Estágio Atual**: Contrato em Execução **–** Contrato nº 32/2016 assinado.
- **Consultora vencedora:** NTConsult Tecnologia e Consultoria Ltda.
- **Valor do contrato:** R$ 772.280,12
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

STDS

IPECE INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 72: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US$ 64.213,69
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Novembro 2016
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído
- **Consultora:** Maria Cilvia Queiroz.
- **Valor do Contrato:** R$ 121.000,00.

STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 73: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US$ 63.174,42
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Setembro 2015
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Consultora Vencedora:** Empresa Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- **Valor do Contrato:** R$ 142.850,00.

STDS - Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 74: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

- **Responsável:** Sebastião Lopes
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US$ 892.888,73
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico (NCB)
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução - Contrato nº 058/2016, assinado em 25/05/2016.
- **Consultora Vencedora:** Maestria Comunicação e Eventos LTDA- EPP.
- **Valor do Contrato:** R$ 2.019.000,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

ARCE

IPECE INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

ARCE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 1: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.

- **Responsável:** Alexandre Caetano
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Total do Subprojeto:** US$ 371.040,45
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Janeiro 2017
- **Estágio Atual**: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato 019/2016.
- **Consultora Vencedora:** RPG – Regulation, Performance and Governace LTDA.
- **Valor do Contrato:** R$ 838.996,66.

COGERH

IPECE INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 69: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Qualiquantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US$ 677.500,59
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em execução – Contrato 48/2015, assinado em 24/11/2015.

  Consultora Vencedora: Consórcio Água e Solo / Quanta / Engeplus.
- **Valor do Contrato:** R$ 1.954.015,55.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 70: Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US$ 742.914,10
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Contrato em execução – Contrato 21/2016, assinado em 19/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Nippon Koei Latin America - Caribbean Co. Ltd. / Nippon Koei LAC do Brasil Ltda.
- **Valor do Contrato:** R$ 2.403.327,11.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

COGERH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 71: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas

- **Responsável:** Zulene Almada
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor Subprojeto:** US$ 27.326,28
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Outubro 2015
- **Estágio Atual**: Contrato Concluído.
- **Consultora:** Rosana Garjulli Sales Costa.
- **Valor do Contrato:** R$ 51.492,00.

FUNCEME

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

FUNCEME - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 13: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.

- **Responsável:** Francisco Hoilton
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Proposta Vencedora:** € 267.442,11 + R$ 687.325,77 equivalente a R$ 1.492.246,27
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Março 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 10/2015, assinado em 09/09/2015.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Aqualogus / Azurit.
- **Valor do Contrato:** R$ 1.492.246,27.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SDE / ADECE

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

SDE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 24: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.

- **Responsável:** Fernando Costa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US$ 353.142,52
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato assinado em 26/08/2016.
- **Consultora Vencedora:** Ivia Serviços de Informática Ltda.
- **Valor do Contrato:** R$ 1.142.416,04
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SDE - Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 25: Impact Evaluation Workshop Istambul

- **Responsável:** Inês Studart
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US$ 2.894,02
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Abril 2015 – Maio 2015.
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Consultora Vencedora:** Casa Blanca / Maria Inês Cavalcante Studart Menezes.
- **Valor do Contrato:** R$ 6.543,95.

SEDUC

IPECE INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

SEDUC- Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 33: Impact Evaluation Worshop Istambul

- **Responsável:** Luciano Nery
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US$ 3.154,13
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Maio 2015 – Maio 2015
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Consultora**: Andréa Araújo Rocha Nibon.
- **Valor do Contrato**: R$ 7.132,11.

SEDUC- Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 34: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Contratação Direta
- **Valor do Subprojeto:** US$ 4.466,03
- **Método de Aquisição:** CD
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2015 – Julho 2015
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Consultora**: Maria Dagmar de Andrade Soares - Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER.
- **Valor do Contrato:** R$ 10.098,59.

SEDUC - Assistência Técnica - Assistência à Família

*Subprojeto 37: Contratação de empresa especializada para operacionalizar e executar os **serviços de logística** das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto:** US$ 116.608,86
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2016 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução. Contrato nº 028/2017 Assinado em 07/03/2017 e Publicado no dia 24/03/2017.
- **Consultora Vencedora:** ECART PROJETOS E GESTÃO LTDA-ME.
- **Valor do Contrato:** R$ 377.229,65.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEDUC- Assistência Técnica - Assistência à Família

Subprojeto 38: Contratação de Empresa Especializada para serviço de ***Impressão Gráfica dos materiais*** *de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não Consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US$ 15.956,25
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2016 – Abril 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução.
- **Consultora Vencedora:** Expressão Gráfica e Editora Ltda.
- **Valor do Contrato:** R$ 51.060,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 39: Contratação de Consultor Individual Especialista em **Avaliação de Programas para Identificar o Impacto** do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor Subprojeto:** US$ 4.139,40
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2014 – Maio 2016
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Consultor:** Flávio Augusto Rezende Cunha.
- **Valor do contrato:** R$ 9.360,00.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 40: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US$ 25.207,85
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Março 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Consultora:** Fátima Maria Araújo Saboia Leitão.
- **Valor do Contrato:** R$ 47.500,00.

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

*Subprojeto 41: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US$ 29.188,04
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Consultora**: Ana Cecília Silveira Lins Sucupira.
- **Valor do Contrato:** R$ 55.000,00.

SEDUC - Assistência Técnica –Assistência à Família

*Subprojeto 42: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de **Arte Gráfica/Design,** Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US$ 61.838,85
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Setembro 2016
- **Estágio Atual:** Contrato Concluído.
- **Consultora Vencedora:** Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- **Valor do Contrato:** R$ 139.830,00.

SEDUC - Assistência Técnica –Assistência à Família

Subprojeto 43: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em ***Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil*** *e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN*

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US$ 202.891,81
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Setembro 2017
- **Estágio Atual:** Contratado em Execução – Contrato nº 236/2016, assinado em 30/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** CASAM – Centro de Apoio Social e de Animação Missionária.
- **Valor do Contrato:** R$ 656.355,00
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 44: Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Serviços de não consultoria
- **Valor do Subprojeto :** US$ 309.109,89
- **Método de Aquisição:** Pregão Eletrônico
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Setembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato nº 214/2016, assinado em 12/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** VC Promoções e Eventos Ltda – EPP.
- **Valor do Contrato:** R$ 999.970,50.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 45: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados).

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto :** US$ 1.155.818,22
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2015 – Outubro 2017
- **Estágio Atual:** Contratado em Execução – Contrato nº 214/2016, assinado 28/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** OVERVIEW SERVICOS & INFORMACAO LTDA.
- **Valor do Contrato:** R$ 3.739.071,95
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 46: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto :** US$ 22.627,51
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Julho 2015 – Outubro 2017
- **Estágio Atual:** Contratado em Execução – Contrato nº 253/2016, assinado 19/10/2016.
- **Consultora Vencedora:** Rafaela Martins Leite Monteiro.
- **Valor do Contrato:** R$ 63.000,00
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEDUC - Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 47: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN

- **Responsável:** Celena Skeff
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US$ 21.653,79
- **Método de Aquisição:** CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Outubro 2016 – Outubro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato 30/2017 – Assinado no dia 20/07/2017.
- **Consultora Vencedora:** Patrícia Simões.
- **Valor do Contrato:** R$ 69.850,00
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEMA

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 48: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto "AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL." (AIEDA)

- **Responsável:** Maria Dias / Magda Marinho
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US$ 376.432,70
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Julho 2017
- **Estágio Atual**: Contrato em Execução – Contrato 18/2016, assinado em 16/08/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Aquino – Mcrit SL – Barcelona Brasil Group.
- **Valor do Contrato:** R$ 885.207,23.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 49: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US$ 314.274,86
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Abril 2014 – Novembro 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 06/2016, assinado em 25/02/2016.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio Engesoft Engenharia / Quanta Consultoria Ltda.
- **Valor do Contrato:** R$ 710.638,32.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 50: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicos.

- **Responsável:** Maria Dias / Ulisses Rolim
- **Categoria de Licitação:** Serviço de não consultoria
- **Valor Subprojeto:** US$ 107.269,38
- **Método de Aquisição:** Shopping
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 26/2016, assinado em 26/11/2015.
- **Consultora Vencedora:** Empresa MSV Multiserviços ME.
- **Valor do Contrato:** R$ 242.557,52.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 51: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.

- **Responsável:** Maria Dias / Francisco Leorne
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** 174.082,76
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Maio 2014 – Julho 2017
- **Estágio Atual**: Contrato em Execução – Contrato 16/2016, assinado em 05/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** Arcadis Logos S.A.
- **Valor do Contrato:** R$ 563.157,73.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 52: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.

- **Responsável:** Maria Dias / Monica Freitas
- **Categoria de Licitação**: Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US$ 217.760,38
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual**: Contrato em Execução – Contrato 08/2017, assinado em 09/02/2017.
- **Consultora Vencedora:** Consórcio STCP Engenharia de Projetos Ltda – Ludovino Lopes, Ricci e Santos Sociedade de Advogados.
- **Valor do Contrato:** R$ 696.833,21.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEMA - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 53: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".

- **Responsável:** Maria Dias
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresas
- **Valor Subprojeto:** US$ 1.153.752,25
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Atual**: Contrato em Execução – Contrato 20/2016, assinado em 01/09/2016.
- **Consultora Vencedora:** Bureau de Projetos e Consultoria Ltda.
- **Valor do Contrato:** R$ 2.608.864,60.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEMACE

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

SEMACE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 55: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE

- **Responsável:** Elizabeth Romão
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US$ 331.484,70
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior**: Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Dezembro 2017
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato assinado.
- **Consultora Vencedora:** Tramitty Serviços LTDA.
- **Valor do Contrato:** R$ 1.072.352,99.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SEMACE - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 56: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a ***Manualização dos Procedimentos Técnicos*** *dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.*

- **Responsável:** Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US$ 207.916,23
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior**: Posterior
- **Início/Término:** Janeiro 2014 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 20/2016, assinado em 13/07/2016.
- **Consultora Vencedora:** MBS CONSULTING – MBS Estratégias e Sistemas LTDA.
- **Valor do Contrato:** R$ 672.609,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SRH

IPECE INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 66: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.

- **Responsável:** Deborah Mithya e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US$ 431.620,55
- **Método de Aquisição**: SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior**: Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato Nº 02/2016, assinado em 27/10/2016.
- **Consultora Vencedora:** IBI Engenharia Consultiva.
- **Valor do Contrato:** R$ 1.396.292,47
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

Subprojeto 67: Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. ***SIGERH***

- **Responsável:** Deborah Mithya e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor Subprojeto:** US$ 403.809,40
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior**: Posterior
- **Início/Término:** Agosto 2015 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 03/2016.
- **Consultora Vencedora:** CAPGEMINI CONSULTING TECNOLOGY OUTSOURCING.
- **Valor do Contrato:** R$ 1.306.323,41.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

SRH - Assistência Técnica - Qualidade da Água

*Subprojeto 68: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - **Malha D'agua.***

- **Responsável:** Deborah Mithya e Sergio Câmara
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do TOR:** US$ 152.839,20
- **Método de Aquisição**: CI
- **Revisão Prévia/Posterior**: Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2015 – Julho 2017
- **Estágio Atual:** Contrato em Execução – Contrato 01/2016, assinado em 18/05/2016.
- **Consultora:** Dorian Ponte Lima – R$ 288.000,00.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

TCE

IPECE INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 75: Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.

- **Responsável:** Glinton Ferreira / Delinda Almeida
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor do Subprojeto:** US$ 834.461,49
- **Método de Aquisição**: SBQC
- **Revisão Prévia/ Posterior:** Posterior
- **Início/Término:** Setembro 2014 – Janeiro 2018
- **Estágio Previsto:** Contrato em Execução.
- **Estágio Atual:** Contrato Nº 21/2016 em Execução.
- **Consultora Vencedora:** Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
- **Valor do Contrato:** 2.699.484,21.
- **Sinalização em relação ao Prazo:**

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 76: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto:** US$ 61.694,57
- **Método de Aquisição**: CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Agosto 2016
- **Estágio Atual**: Contrato concluído.
- **Consultor:** Roberto Vilela Resende.
- **Valor do Contrato:** R$ 165.720,00.

TCE - Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 77: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- **Responsável:** Auriço Oliveira
- **Categoria de Licitação:** Consultoria Individual
- **Valor do Subprojeto**: US$ 100.915,62
- **Método de Aquisição**: CI
- **Revisão Prévia/Posterior:** Prévia
- **Início/Término:** Junho 2014 – Agosto 2015
- **Estágio Atual**: Contrato concluído.
- **Consultor:** Carlos Roberto Takao Yoshioka.
- **Valor do Contrato:** R$ 196.004,40.

7. APROVAÇÃO DA ATA

37ª REUNIÃO COMITÊ *PforR* (23/02/2017)

IPECE

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

Próxima Reunião do Comitê PforR:

27/04/2017
14h30m - IPECE

1: Última quinta-feira do mês.

8. ENCAMINHAMENTOS

Encaminhamentos da 37ª Reunião realizada em 23/02/2017

- ✓ Não houve encaminhamentos.

9. ENCERRAMENTO

Unidade de Gerenciamento do Projeto PforR (UGP)
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora
Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N
Ed. SEPLAG, 2º andar- Fortaleza-CE
Tel.: (85) 3101.3499 e (85) 3101.3510

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão
